




### ACTA PARCIAL DE COBRO N° 3

ITEMS	DESCRIPCIÓN	LUGAR	ACTIVO	ACTA INSPECTIVA N° 1		ACTA INSPECTIVA N° 2		ACTA INSPECTIVA N° 3		VALOR ACTA	VALOR	COMIT.	COMIT.	TOTAL
				VR	VITOTAL	VR	VITOTAL	VR	VITOTAL					
N° 1	suministro e instalación de tubería, PVC de 60 mm x 3.025-1 y m.c. 4764 (100% de)	m		\$ 317,802.00	\$	12.0	\$ 3,514,344.00	0.00	\$	0	\$	0.00	\$	
N° 2	suministro e instalación de tubería plástica de 60 mm x 3.025-1 y m.c. 4764 (100% de)	m		\$ 483,712.00	\$	135.9	\$ 24,559,088.78	120.05	\$	48,468,215.80	0.10	\$	120.05	\$ 48,465,225.85
N° 3	suministro e instalación de tubería plástica de 75 mm x 3.525-1 y m.c. 4764 (100% de)	m		\$ 322,036.00	\$	70.8	\$ 24,798,344.26	16.00	\$	8,133,656.00	16.50	\$	40,50	\$ 40,50
N° 4	suministro e instalación de tubería plástica de 75 mm x 3.525-1 y m.c. 4764 (100% de)	m		\$ 498,333.00	\$	270.3	\$ 14,095,023.36	105.11	\$	43,642,170.71	0.15	\$	197.00	\$ 80,441,287.00
N° 5	suministro e instalación de tubería plástica de 75 mm x 3.525-1 y m.c. 4764 (100% de)	m		\$ 423,180.00	\$	25.0	\$ 10,577,780.00	0.00	\$	-	6.00	\$	6.00	\$ 2,538,060.00
N° 6	suministro e instalación de tubería plástica de 75 mm x 3.525-1 y m.c. 4764 (100% de)	m		\$ 545,513.00	\$	60.0	\$ 33,210,900.00	27.00	\$	16,078,905.00	0.00	\$	27.00	\$ 16,079,915.00
N° 7	suministro e instalación de tubería plástica de 75 mm x 3.525-1 y m.c. 4764 (100% de)	m		\$ 663,380.00	\$	72.30	\$ 47,788,316.40	77.38	\$	41,780,348.40	0.00	\$	77.38	\$ 47,780,348.40
N° 8	suministro e instalación de tubería plástica de 75 mm x 3.525-1 y m.c. 4764 (100% de)	m		\$ 505,833.00	\$	8.0	\$ 2,810,460.00	1.00	\$	505,833.00	0.00	\$	1.00	\$ 505,833.00
N° 9	suministro e instalación de tubería plástica de 75 mm x 3.525-1 y m.c. 4764 (100% de)	m		\$ 343,433.00	\$	29.7	\$ 4,304,470.40	28.10	\$	4,092,953.00	1.36	\$	29.66	\$ 4,194,910.76
N° 10	suministro e instalación de tubería plástica de 75 mm x 3.525-1 y m.c. 4764 (100% de)	m		\$ 27,633.02	\$	329.47	\$ 91,745,872.23	303.26	\$	50,721,791.76	1355.54	\$	3,189.00	\$ 80,207,559.40
N° 11	suministro e instalación de tubería plástica de 75 mm x 3.525-1 y m.c. 4764 (100% de)	m		\$ 25,780.70	\$	125.4	\$ 3,984,059.80	151.43	\$	3,904,628.08	-	\$	151.43	\$ 3,991,659.80
N° 12	suministro e instalación de tubería plástica de 75 mm x 3.525-1 y m.c. 4764 (100% de)	m		\$ 505,978.00	\$	91.7	\$ 51,877,548.18	66.57	\$	37,677,155.46	33.09	\$	91.66	\$ 51,877,548.18

CÓDIGO CUADRO: RESUMEN GENERAL  
FECHA: 21 DE JUNIO DE 2021  
PERIODO DE VALORACIÓN: 01 DE JUNIO DE 2021  
FECHA DE EMISIÓN: 21 DE JUNIO DE 2021  
FECHA DE RECEPCIÓN: 21 DE JUNIO DE 2021  
FECHA DE PAGAMENTO: 21 DE JUNIO DE 2021  
MONEDA: DÓLARES ESTADUNIDENSES  
VALOR TOTAL: 489,102,217.28



**ACTA PARCIAL DE COBRO N° 3**

CONTRATO DE COBRO N° 001 DEL 14 DE JULIO DE 2020

EL PRESENTE ACTA PARCIAL DE COBRO SE REALIZA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE COBRO N° 001 DEL 14 DE JULIO DE 2020 Y AL CANCELAMIENTO DEL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COBRO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ORIGINAL EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

CONTRATADA: UNION TEMPORAL AGUAS T81

INTERVENIDA Y SUBCONTRATADA: CONSORCIO INTERMUNICIPAL EXTERMINAL

ITEMS	DESCRIPCION	UNID	ACTUALIZADO			ACUMULADO ACTA PRETERIOR			ACUMULADO TOTAL		
			CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
13	Caja de inspeccion 60x80x100 con conector de 3000 paly tapa estirada en concreto de 3000 esp	URD	1	\$ 35,00	\$ 35,00	1	\$ 35,00	\$ 35,00	1	\$ 35,00	\$ 35,00
14	camara de calor diametro 12" revestida en concreto, malla con vena	MU	1	\$ 1.043.859,50	\$ 1.043.859,50	1	\$ 1.043.859,50	\$ 1.043.859,50	1	\$ 1.043.859,50	\$ 1.043.859,50
15	Corte de Pavimento Bijido con Conduccion	HAL	1	\$ 99,20	\$ 99,20	1	\$ 99,20	\$ 99,20	1	\$ 99,20	\$ 99,20
16	Instalacion de 150' de tubo de sifon de 150' PVC Incandescente caudal y adherencia	URD	1	\$ 8,00	\$ 8,00	1	\$ 8,00	\$ 8,00	1	\$ 8,00	\$ 8,00
17	Soportado e instalacion de todo pvc de 12"	URD	1	\$ 2,00	\$ 2,00	1	\$ 2,00	\$ 2,00	1	\$ 2,00	\$ 2,00
18	Trabajo de instalacion de tubo de 200' PVC Incandescente caudal y adherencia	URD	1	\$ 2.977.575,00	\$ 2.977.575,00	1	\$ 2.977.575,00	\$ 2.977.575,00	1	\$ 2.977.575,00	\$ 2.977.575,00
19	Suministro e instalacion de terminco PVC de 6"	URD	1	\$ 66.637,00	\$ 66.637,00	1	\$ 66.637,00	\$ 66.637,00	1	\$ 66.637,00	\$ 66.637,00
<b>TOTALES</b>			<b>8</b>	<b>\$ 3.328.154.038,84</b>	<b>\$ 3.328.154.038,84</b>	<b>8</b>	<b>\$ 3.328.154.038,84</b>	<b>\$ 3.328.154.038,84</b>	<b>8</b>	<b>\$ 3.328.154.038,84</b>	<b>\$ 3.328.154.038,84</b>


CORRECCIONES CONTRA TALLER		
VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL	VALOR DIFERENCIA
\$ 3.328.154.038,84	\$ 3.328.154.038,84	\$ 0,00


BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	\$ 3.328.154.038,84
VALOR ACTUAL	\$ 3.328.154.038,84
VALOR DIFERENCIA	\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.328.154.038,84</b>


BANCOS DE LA OBRA	
VALOR INICIAL	\$ 214.980.652,07
VALOR ACTUAL	\$ 442.624.220,83
VALOR DIFERENCIA	\$ 227.643.568,76
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 685.248.441,66</b>


VALORES POR PAGAR	
VALOR INICIAL	\$ 214.980.652,07
VALOR ACTUAL	\$ 442.624.220,83
VALOR DIFERENCIA	\$ 227.643.568,76
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 685.248.441,66</b>

VALORES RECIBIDOS	
VALOR INICIAL	\$ 0,00
VALOR ACTUAL	\$ 0,00
VALOR DIFERENCIA	\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0,00</b>

  
 Representante legal Consorcio Inter municipal Exterma BIAL

  
 Representante legal Consorcio Inter municipal Exterma BIAL

  
 Representante legal Consorcio Inter municipal Exterma BIAL

	<b>CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PARA CONTRATOS DE OBRA</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-061
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2019-09-19
		<b>VERSIÓN:</b> 01
		<b>Página 1 de 2</b>
<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		


<b>CONTRATO DE OBRA N° 041 DEL 07 DE ABRIL DE 2021</b>	
<b>CONTRATANTE</b>	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
<b>CONTRATISTA</b>	UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021

<b>OBJETO</b>	REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 3 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SAESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE
<b>PLAZO INICIAL</b>	CIENTO OCHENTA (180) DÍAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
<b>FECHA DE INICIO</b>	02 DE JUNIO DE 2021
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	28 DE NOVIEMBRE DE 2021
<b>VALOR INICIAL</b>	TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$3'528.154.037,00).
<b>INTERVENTORÍA</b>	CONSORCIO INTERVENTORÍA EXTERNA DEL IBAL

El suscrito LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMÍREZ representante legal del CONSORCIO INTERVENTORÍA EXTERNA IBAL, en su calidad de INTERVENTOR del contrato en mención:


**CERTIFICA:**

Contratista persona natural <input type="checkbox"/>	Contratista persona jurídica <input checked="" type="checkbox"/>
2. El contratista presentó la planilla número _____ de fecha _____ en la que consta que ha efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión, y riesgos	2. El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social

	<b>CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PARA CONTRATOS DE OBRA</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-061
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2019-09-19
		<b>VERSIÓN:</b> 01
		<b>Página 2 de 2</b>
<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		


laborales, de él y del personal a cargo (Cuando a ello hubiere lugar), para el período de _____. Verificado el monto de cada uno de los aportes en la planilla, se constató que se ajusta a la base de liquidación que aplica para este tipo de contratos.	Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.
--	--

Se expide la presente constancia para efectos del respectivo pago en la ciudad de Ibagué,  
a los 1 días del mes de septiembre del año 2021.




---

LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMÍREZ  
Representante legal  
Consortio interventoría externa IBAL



# UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021

**EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL AGUAS 2021  
NIT 901.471.171-1**

## CERTIFICA

Qué la UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021 NIT 901.471.171-1, como los miembros que lo conforman, ASFALTEMOS S.A.S con NIT 900.278.276-4 - GRUPO EMPRESARIAL INGECOL S.A.S con NIT 900.379.869-5, el personal utilizado y vinculado para la ejecución del contrato No 0041 del 07 de abril de 2021, suscrito con la EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL, cuyo objeto es, "REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 3 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE", han cumplido con la afiliación y pago de los aportes al sistema de seguridad social integral del periodo comprendido entre el 01 y 31 de agosto 2021.

De igual forma manifiesto que asumimos cualquier clase de responsabilidad derivada de los pagos del sistema de seguridad social del personal utilizado y vinculado para la ejecución del contrato No 0041 del 07 de abril de 2021.

La presente certificación se expide para que haga parte de los documentos de cobro del acta parcial No 03.

Cordialmente,

**ANDRES EDUARDO TRUJILLO ARANGO**

Representante Legal

UNION TEMPORAL AGUAS 2021

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación: NT 900287276 / Razon Social: ASFALTENOS S.A.S. / Clave Aportante: B - AERIOS DE DOS COTIZANTES / Sector Principal: GASTOS ADMINISTRACION / Direccion: AVENIDA ANABALA #69-30 / Ciudad/Departamento: BIAQUE-TOLIMA / Teléfono: 3755412 / Exonerado SENIA y ICBF: SI

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo: 2021-09 / Tipo: P / Fecha: 2021/09/17 / Pago: 707169.17 / Banco: BANCOLOMBIA / Valor: \$14,561,200


No.	Manifestación	Nombre	Tipo de Ingresos	Novedades	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PANAFTSICALES	
					Codig	Días	Codig	Días	Codig	Días	Codig	Días		Blas
1	CC	1311761	AGUIRRE LUIS	X		14070	30	EP5017	30	CCF516	30	14-11	30	SI
2	CC	6024392	ALFARO LUIS	X		12099	30	EP5017	30	CCF516	30	14-11	30	SI
3	CC	5795830	MELTRAN ALEXANDER	X		15-14	30	EP5005	30	CCF516	30	14-11	30	SI
4	CC	10046885	METARLOS SUSANA	X		14007	30	EP5005	30	CCF516	30	14-11	30	SI
5	CC	2044170	MONTELLA TITO	X		12005	30	EP5005	30	CCF516	30	14-11	30	SI
6	CC	1401949	RODRA JOSE	X		13009	30	EP5005	30	CCF516	30	14-11	30	SI
7	CC	3733338	RODRIGUEZ ANDRÉS	X		13000	30	EP5002	30	CCF516	30	14-11	30	SI
8	CC	2313189	CARRELES JORGE	X		12010	30	EP5005	30	CCF516	30	14-11	30	SI
9	CC	11105751	CARVALLO CHRISTIAN	X		12001	30	EP5005	30	CCF516	30	14-11	30	SI
10	CC	11109169	CASTRO SANTIAGO	X		15-14	30	EP5002	30	CCF516	30	14-11	30	SI
11	CC	2220071	COCCOLLO CARLOS	X		12001	30	EP5002	30	CCF516	30	14-11	30	SI
12	CC	11109323	DECARO EDUAR	X		12001	30	EP5002	30	CCF516	30	14-11	30	SI
13	CC	7110847	DELAO JUAN	X		15-14	5	EP5002	5	CCF516	5	14-11	5	SI
14	CC	11108141	DEPA RUBEN	X		15-14	8	EP5002	8	CCF516	8	14-11	8	SI
15	CC	14138143	DEPA RUBEN	X		15-14	30	EP5002	30	CCF516	30	14-11	30	SI
16	CC	14138143	DEPA RUBEN	X		15-14	30	EP5002	30	CCF516	30	14-11	30	SI
17	CC	2853285	DIAZ ANDRÉS	X		12001	30	EP5005	30	CCF516	30	14-11	30	SI
18	CC	1344974	DIAZ ANDRES	X		15-14	30	EP5002	30	CCF516	30	14-11	30	SI
19	CC	2326272	FERNANDEZ DAVID	X		15-14	30	EP5005	30	CCF516	30	14-11	30	SI
20	CC	14073167	FLOREZ JUAN	X		13001	30	EP5002	30	CCF516	30	14-11	30	SI
21	CC	11108242	FLOREZ RESTON	X		13001	30	EP5002	30	CCF516	30	14-11	30	SI
22	CC	0341628	FLOREZ OSCAR	X		13001	30	EP5002	30	CCF516	30	14-11	30	SI
23	CC	141509256	FOUERO EDWIN	X		13001	30	EP5002	30	CCF516	30	14-11	30	SI
24	CC	111057986	GANTAN MARTA	X		13001	30	EP5002	30	CCF516	30	14-11	30	SI
25	CC	111017523	GOMEZ CRISTIANE	X		13001	30	EP5002	30	CCF516	30	14-11	30	SI
26	CC	111046216	GUERRERO CHRISTIAN	X		13001	30	EP5002	30	CCF516	30	14-11	30	SI
27	CC	111045121	GUTIERREZ BRUN	X		13001	30	EP5002	30	CCF516	30	14-11	30	SI
28	CC	111048525	GUTIERREZ ANDRES	X		13001	30	EP5002	30	CCF516	30	14-11	30	SI
29	CC	14181769	HERRERA RAJLO	X		13001	30	EP5002	30	CCF516	30	14-11	30	SI
30	CC	100605231	IBARRA ALDAR	X		13001	30	EP5002	30	CCF516	30	14-11	30	SI
31	CC	14157464	MENDEZ CESAR	X		13001	30	EP5002	30	CCF516	30	14-11	30	SI
32	CC	10110411	MIRANDA JUAN	X		13001	30	EP5002	30	CCF516	30	14-11	30	SI
33	CC	111174256	MISA ANDER	X		13001	30	EP5002	30	CCF516	30	14-11	30	SI
34	CC	111099989	MUSA LUIS	X		13001	30	EP5002	30	CCF516	30	14-11	30	SI

ID	CC	PROYECTO	INDICADOR	20-14	20	2020-14	20	CCF20	30	06-11	30	20	40
15	CC	10377300	ANDRÉS HUARTE		X								
16	CC	10377300	ANDRÉS HUARTE		X								
17	CC	10377300	JUAN CARLOS		X								
18	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
19	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
20	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
21	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
22	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
23	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
24	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
25	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
26	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
27	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
28	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
29	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
30	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
31	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
32	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
33	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
34	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
35	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
36	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
37	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
38	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
39	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
40	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
41	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
42	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
43	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
44	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
45	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
46	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
47	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
48	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
49	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
50	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
51	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
52	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
53	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
54	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
55	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
56	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
57	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
58	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
59	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
60	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
61	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
62	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
63	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
64	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
65	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
66	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
67	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
68	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
69	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
70	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
71	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
72	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
73	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
74	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
75	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
76	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
77	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
78	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
79	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
80	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
81	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
82	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
83	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
84	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
85	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
86	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
87	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
88	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
89	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
90	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
91	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
92	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
93	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
94	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
95	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
96	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
97	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
98	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
99	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								
100	CC	11180005	ORTEL BERNAR		X								

RESUMEN DE PAGO					
APP (ADMINISTRADORAS: 4)				69	\$75,368,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$627,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	\$7,068,200
PORVEHIR	230301	000,224,808	8	25	\$7,467,100
PROTECCIÓN	230201	800,229,739	0	26	\$10,205,800
AIL (ADMINISTRADORAS: 1)				66	\$9,634,000
AIL SURA	14-11	890,903,790	5	66	\$9,634,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				66	\$6,161,300
COMFABOY	CCF10	891,860,213	8	1	\$166,000
CONFEMALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	65	\$5,995,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				70	\$0,767,300
ASHET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$73,800
COOMEVA	EPS016	805,680,427	1	2	\$169,500
PAMISANAR	EPS617	830,083,564	7	1	\$87,100
POSYGA	HIRN001	901,037,916	1	2	\$89,400
ANEDIMAS EPS	EPS044	901,097,493	5	4	\$2,257,400
NIJEVA E.P.S.	EPS037	980,156,264	2	13	\$821,700
NIJEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$54,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	23	\$1,644,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	23	\$3,569,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$979,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,230	2	2	\$979,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$653,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$653,000







# UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021

## CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50

**LEY 789 DE 2002**  
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **ANDRÉS EDUARDO TRUJILLO ARANGO**, identificada con C.C Nro. 79.689.814 de Bogotá, en mi condición de representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021**, identificada con Nit 901.471.171-1, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Ibagué, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, CERTIFICO que la **UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021** se encuentra al día en el pago de los aportes de salud, Pensión, Riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje (1), por los aportes pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, incluido el mes de agosto.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002

La presente se expide a los 1 días del mes de septiembre del año 2021

**ANDRÉS EDUARDO TRUJILLO ARANGO**  
CC. 79.689.814 de Bogotá  
Representante legal

---

(1) La empresa aplica a la exoneración de aportes consagrada en el artículo 114 E.T.

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES  
PARAFISCALES ARTICULO 50  
LEY 789 DE 2002  
(PERSONAS JURÍDICAS)**

Yo, **YENNY MILENA AGUIAR OVIEDO**, identificada con C.C Nro. 28.548.551 de Ibagué, y con tarjeta profesional No. 95111-T de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de la empresa **ASFALTEMOS S.A.S**, identificada con Nit 900.278.276-4, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Ibagué, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, CERTIFICO que la empresa **ASFALTEMOS S.A.S** se encuentra al día en el pago de los aportes de salud, Pensión, Riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje (1), por los aportes pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, incluido el mes de AGOSTO.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002

La presente se expide a los 1 días del mes de septiembre del año 2021



**YENNY MILENA AGUIAR OVIEDO**  
C. de C. N° 28.548.551 de Ibagué  
T.P 95111 - T  
Revisor fiscal

---

(1) La empresa aplica a la exoneración de aportes consagrada en el artículo 114 E.T.

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

**3 4 5 0 C E 0 C R 9 5 4 1 3 5 5**

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YENNY MILENA AGUIAR OVIEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 28548551 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 95111-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en **BOGOTA** a los 2 días del mes de Septiembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

**ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005**

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



**95111-T**

**YENNY MILENA AGUIAR OVIEDO**  
C.C. 28543551  
RES. INSCRIPCIÓN 173 DEL 26/09/2003  
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA




*[Signature]*  
**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**  
DIRECTOR GENERAL

260751 98451

Resolución Presidencial S.A. 18017/2112

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C

*[Signature]*


FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO: 28.548.551

APELLIDO: AGUIAR-OVIEDO

NOMBRES: YENNY MILENA

NOMBRE DEL PUEBLO:

FECHA DE NACIMIENTO: 24-SEP-1979


LUGAR DE NACIMIENTO: SAN ANTONIO (TOLIMA)

ESTADUS: 1.50 O+ F  
 G.S. PH SEXO

FECHA Y LUGAR DE EMISIÓN: 05-DIC-1997 ISAGUE

FIRMADO: *[Signature]*

REGISTRADO EN:



A-2801170-2801172 P-303554451-28032004 0678901234-02-00000000

Bogotá D.C., 28 de septiembre de 2021

## CERTIFICACIÓN

El Revisor Fiscal, **MÓNICA ANDREA MARTÍNEZ IDÁRRAGA** identificada con la C.C. 1.110.470.422 de Ibagué, certifica que la empresa **GRUPO EMPRESARIAL INGECOL SAS**, identificada con Nit. No. 900.379.869-5, se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, correspondiente a los seis (6) meses anteriores. Así mismo, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 1828 de 2013 y el artículo 65 de la Ley 1819 del 2016 la compañía **GRUPO EMPRESARIAL INGECOL SAS**, identificada con Nit. No. 900.379.869-5, se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cardialmente;



**MÓNICA ANDREA MARTÍNEZ IDÁRRAGA**

**C.C. No. 1.110.470.422 de Ibagué**

**T.P: 172.198-T**

**Revisora Fiscal Designada por la firma Audi-Gestión Ltda.**

**GRUPO EMPRESARIAL INGECOL SAS**

**NIT. 900.379.869-5**

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

**5 8 9 0 F 0 C 5 6 8 C E 0 8 2 3**

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MONICA ANDREA MARTINEZ IDARRAGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1110470422 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 172198-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Agosto de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

**ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005**

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.110.470.422**  
**MARTINEZ IDARRAGA**

APELLIDOS  
**MONICA ANDREA**

NOMBRES  
**MONICA ANDREA MARTINEZ**  
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **04-MAR-1988**  
**IBAGUE**  
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.55** **0+** **F**  
ESTATURA G.S. P. SEXO  
**27-ABR-2008 IBAGUE**

INDICE DERECHO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Asesorado por el  
HONORABLE SECRETARIO  
DE LA POLICIA NACIONAL



A 2406103-90420507-F-11 00470422-20081008 00315 00104 000000000

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**172198-T**

MONICA ANDREA  
MARTINEZ DARRASA  
C.C. 1110470422

RESOLUCION INSERCIÓN 355 FECHA 25/10/2012  
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA




**PRESIDENTE**

**DANIEL SARRIENTO PAVAS** 183571

*MONICA ANDREA MARTINEZ*

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
**CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central  
de Contadores.





## FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-058

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación:  Fecha evaluación 01-09-2021 Reevaluación:  Fecha reevaluación: \_\_\_\_\_  
 Acta Parcial N° X Acta Final \_\_\_\_\_

## INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 07 DE ABRIL DE 2021  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AGUAS 2021 NIT: 901.471.171-1  
 FECHA DE INICIO: 2 JUNIO DE 2021 FECHA DE TERMINACION: 28 DE NOVIEMBRE DE 2021  
 OBJETO DEL CONTRATO: "REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 3 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SAESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE"

CLASE DE CONTRATO

1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION
2. SUMINISTRO Y ADQUISICION
3. ARRENDAMIENTO
4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA
5. SERVICIO
6. SEGUROS
7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS
8. OBRA PUBLICA

## ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

## 2. OBRA PUBLICA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	3.8	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	3.8
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	3.8	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL CONTRATADO.	3.8
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.	3.8	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	3.8
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	3.8	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	3.8
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	3.8	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	3.8
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	3.8	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	3.8
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA OPORTUNA DEL PEGMA	3.8	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	2.5
		PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3
		ATENCION DE REQUERIMIENTOS	4.5
TOTAL PROMEDIO	3.8	TOTAL PROMEDIO	3.7

## CRITERIOS DE CALIDAD

PUNTAJE

COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	3.8
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	3.8
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	3.8
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	3.8
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	3.8
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	3.8
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y DEMAS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL CONTRATO	3.8
TOTAL PROMEDIO	

EVALUACION TOTAL

3.8

ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION \_\_\_\_\_ REEVALUACION \_\_\_\_\_ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION \_\_\_\_\_ REEVALUACION \_\_\_\_\_ POR PARTE DEL CONTRATISTA:

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION      SI          NO   


INTERPONE RECURSO DE APELACION      SI          NO   

**NOTA INFORMATIVA:** (Aplica únicamente para la reevaluación) De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.


La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual término a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).


Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluación de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripción.      SI          NO   

**NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)

  
 \_\_\_\_\_  
 MATEO CASAS MIRANDA

**NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA**

  
 \_\_\_\_\_  
 ANDRÉS EDUARDO TRUJILLO ARANGO



INFORME DE  
INTERVENTORIA No. 03

CONTRATO No. 063 DE  
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA  
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 31/08/2021  
PERIODO: 01/08/2021 - 31/08/2021

# INFORME DE INTERVENTORIA No.3

DE 01-08-2021 A 31-08-2021

CONTRATO No. 063 DE 06 DE  
MAYO DE 2021


INTERVENTORIA TECNICA,  
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y  
AMBIENTAL PARA LA EJECUCION  
DE OBRAS DE REHABILITACION  
Y/O RECUPERACION Y/O  
REPOSICION DE LAS REDES DE  
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
PARA GARANTIZARLA  
CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN  
LOS DISTRITOS HIDRAULICOS DEL  
PERIMETRO HIDROSANITARIO  
DEL IBALS.A. E.S.P OFICIAL EN LA  
CIUDAD DE IBAGUE.

**CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL**

R.L. LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ


Dirección: Centro Comercial Arroyuelos, Local 6, Ibagué, Tolima.

Teléfono: 300 596 1508 - Correo electrónico: [interventoriaexterna@ibals.com](mailto:interventoriaexterna@ibals.com)


 <b>IBAL</b> <small>S.A. E.S.P. OFICIAL</small>	<b>INFORME DE INTERVENTORIA No. 03</b>  <b>CONTRATO No. 063 DE 2021</b>	<b>CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</b> <b>FECHA INFORME: 31/08/2021</b> <b>PERIODO: 01/08/2021 – 31/08/2021</b>
---	---	--

## Contenido

1.	INFORMACION GENERAL.....	5
1.1.	SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y AMBIENTAL.....	5
2.	CONTROL Y SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y AMBIENTAL A CONTRATOS DE OBRA EJECUTADOS POR IBAL S.A E.S.P OFICIAL.....	7
2.1.	DISTRITO HIDRÁULICO No. 1 y 2 CONTRATO DE OBRA No. 092 DEL 29 DE JUNIO DE 2021. 7	7
2.1.1.	Información general del contrato.....	7
2.1.2.	Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes.....	8
2.1.3.	Seguimiento a garantías contractuales.....	20
2.1.4.	Avance Físico.....	20
2.1.5.	Avance financiero.....	21
2.1.6.	Balance del contrato.....	21
2.1.7.	Gestión de las comunicaciones.....	21
2.1.8.	Información relacionada con los ensayos de laboratorio.....	21
2.1.9.	Dificultades en la ejecución de los proyectos.....	22
2.2.	DISTRITO HIDRÁULICO No. 3. CONTRATO DE OBRA No. 041 DEL 07 DE ABRIL DE 2021....	23
2.2.1.	Información general del contrato.....	23
2.2.2.	Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes.....	24
2.2.3.	Seguimiento a garantías contractuales.....	40
2.2.4.	Avance físico.....	40
2.2.5.	Avance financiero.....	41
2.2.6.	Balance del contrato.....	41
2.2.7.	Gestión de las comunicaciones.....	41
2.2.8.	Información relacionada con los ensayos de laboratorio.....	41
2.2.9.	Dificultades en la ejecución de los proyectos.....	42
2.3.	DISTRITO HIDRÁULICO No. 4. CONTRATO DE OBRA No. 069 DEL 14 DE MAYO DE 2021... 43	43
2.3.1.	Información general del contrato.....	43
2.3.2.	Estado de Frentes de obra.....	44
2.3.3.	Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes.....	45
2.3.4.	Seguimiento de garantías contractuales.....	66


	<b>INFORME DE INTERVENTORIA No. 03</b>	<b>CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA ISAL</b>
	<b>CONTRATO No. 063 DE 2021</b>	<b>FECHA INFORME: 31/08/2021 PERIODO: 01/08/2021 – 31/08/2021</b>

2.3.5. Avance Físico .....	65
2.3.6. Avance Financiero .....	67
2.3.7. Balance del Contrato .....	67
2.3.8. Gestión de las comunicaciones.....	67
2.3.9. Información relacionada con los ensayos de Laboratorio .....	67
2.4. DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 CONTRATO DE OBRA No. 089 DEL 18 DE JUNIO DE 2021. ...	69
2.4.1. Información general del contrato.....	69
2.4.2. Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes. ....	70
2.4.3. Seguimiento a garantías contractuales.....	86
2.4.4. Avance Físico .....	86
2.4.5. Avance Financiero .....	87
2.4.6. Balance del Contrato .....	87
2.4.7. Gestión de las comunicaciones.....	87
2.4.8. Información relacionada con los ensayos de Laboratorio. ....	87
2.4.9. Dificultades en la ejecución de los proyectos .....	88
2.5. DISTRITO HIDRÁULICO No. 7 CONTRATO DE OBRA No. 062 DEL 06 DE MAYO DE 2021....	89
2.5.1. Información general del contrato.....	89
2.5.2. Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes. ....	90
2.5.3. Seguimiento a garantías contractuales.....	131
2.5.4. Avance Físico .....	131
2.5.5. Avance Financiero .....	132
2.5.6. Balance del Contrato .....	132
2.5.7. Gestión de las comunicaciones.....	132
2.5.8. Información relacionada con los ensayos de Laboratorio. ....	132
2.5.9. Dificultades en la ejecución de los proyectos .....	133
2.6. DISTRITO HIDRÁULICO No. 9 y 10 CONTRATO DE OBRA No. 093 DEL 29 DE JULIO DE 2021	134
2.6.1. Información general del contrato.....	134
2.6.2. Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes. ....	135
2.6.3. Seguimiento a garantías contractuales.....	150
2.6.4. Avance Físico .....	150

	<p style="text-align: center;"><b>INFORME DE INTERVENTORIA No. 03</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONTRATO No. 063 DE 2021</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FECHA INFORME: 31/08/2021</b> <b>PERIODO: 01/08/2021 – 31/08/2021</b></p>
---	--	--

2.6.5. Avance Financiero .....	151
2.6.6. Balance del Contrato .....	151
2.6.7. Gestión de las comunicaciones.....	152
2.6.8. Información relacionada con los ensayos de Laboratorio. ....	152
2.6.9. Dificultades en la ejecución del proyecto .....	152
<b>3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. ....</b>	<b>153</b>
3.1. Información general del contrato.....	153
3.2. Control del equipo de la Interventoría .....	153
3.3. Control del personal de Interventoría .....	154
3.4. Trabajo de campo y actividades realizadas .....	154
3.5. Informes técnicos mensuales .....	154
3.6. Estado contrato interventoría .....	155
3.7. Información financiera del Interventor .....	155
3.8. Balance del Contrato de Interventoría. ....	156
3.9. Información financiera contrato de interventoría. ....	157
3.10. Informe de Inversión y buen manejo del anticipo. ....	157
3.11. Seguimiento a garantías contractuales.....	158





INFORME DE  
INTERVENTORIA No. 03

CONTRATO No. 063 DE  
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA  
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 31/08/2021  
PERIODO: 01/08/2021 - 31/08/2021


### 1. INFORMACION GENERAL

INFORME	PERIÓDICO: <u>  x  </u> UNICO :	No. 03
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	Desde 01/08/2021 hasta 31/08/2021	
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		
TIPO CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO No. Y FECHA:	063 DE 06 DE MAYO DE 2021	
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL Rep. Leg. LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ	
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS DISTRITOS HIDRAULICOS DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S.A. E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE.	
VALOR DEL CONTRATO:	MIL TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE (\$1.038.941.400,00).	
PLAZO:	DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS	
ACTA DE INICIO	01 DE JUNIO DE 2021	
PRORROGAS-SI APLICA (No. DE DIAS/MESES)	N/A	
ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	N/A	
SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	N/A	
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	28 DE DICIEMBRE DE 2021	

#### 1.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y AMBIENTAL


Como contratista del contrato de interventoría No. 063 de 06 de Mayo de 2021, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS DISTRITOS HIDRAULICOS DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S.A. E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE, presento el siguiente informe de interventoría No. 03.

Que el presente informe de interventoría No. 3, donde se describe las actividades llevadas a cabo por los contratistas de obra de los distintos distritos hidráulicos el perímetro urbano de la Ciudad de


	<b>INFORME DE INTERVENTORIA No. 03</b>	<b>CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</b>
	<b>CONTRATO No. 063 DE 2021</b>	<b>FECHA INFORME: 31/08/2021 PERIODO: 01/08/2021 – 31/08/2021</b>

Ibagué y la interventoría en los ámbitos técnicos, administrativos, financieros y ambientales durante el periodo comprendido entre el 01 de Agosto de 2021 y el 31 de Agosto 2021.

DISTRITO HIDRAULICO/CONTRATO	PORCENTAJE DE AVANCE	ESTADO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
DISTRITO No. 1 y 2/CTO 092 de 29 de Junio de 2021.	50 %	EN EJECUCION	
DISTRITO No. 3/CTO 041 de 07 de Abril de 2021.	32 %	EN EJECUCION	
DISTRITO No. 4/CTO 069 de 14 de Mayo de 2021.	28 %	EN EJECUCION	
DISTRITO No. 5, 5A Y 8/ SIN NUMERO.	0.00 %	SIN INICIAR	En proceso de legalización.
DISTRITO No. 6/ CTO 089 de 18 de Junio de 2021.	21 %	EN EJECUCION	
DISTRITO No. 7/CTO 062 de 06 de Mayo de 2021.	28%	EN EJECUCION	
DISTRITO No. 9 Y 10 CTO 093 de 29 de Junio de 2021.	48 %	EN EJECUCION	


	<b>INFORME DE INTERVENTORIA No. 03</b>	<b>CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</b>
	<b>CONTRATO No. 063 DE 2021</b>	<b>FECHA INFORME: 31/08/2021 PERIODO: 01/08/2021 - 31/08/2021</b>

## 2.2. DISTRITO HIDRÁULICO No. 3. CONTRATO DE OBRA No. 041 DEL 07 DE ABRIL DE 2021


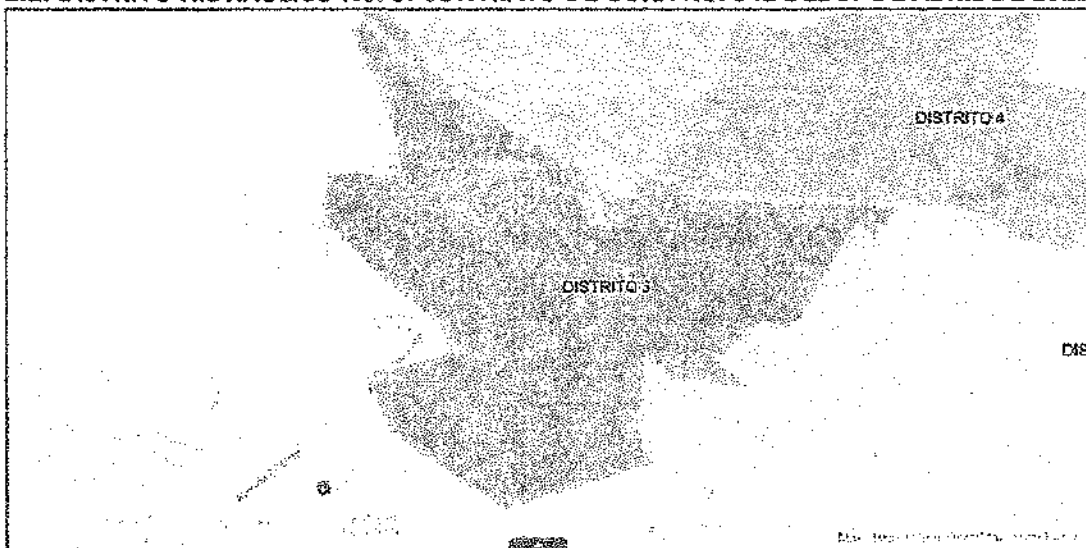


### 2.2.1. Información general del contrato.

<b>CONTRATO No</b>	041
<b>FECHA</b>	07 DE ABRIL DE 2021
<b>CONTRATISTA</b>	UNION TEMPORAL AGUAS 2021 R.L. ANDRES EDUARDO TRUJILLO ARANGO
<b>CLASE</b>	OBRA
<b>VALOR</b>	TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SIETE PESOS MCTE (\$3.528.154.037)
<b>PLAZO</b>	CIENTO OCHENTA (180) DIAS
<b>FECHA DE INICIO</b>	02 DE JUNIO DE 2021
<b>FECHA DE TERMINACION</b>	28 DE NOVIEMBRE DE 2021
<b>OBJETO</b>	REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPREDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 3 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE.

 <p><b>IBAL</b> S.A. ESP. OFICIAL</p>	<p><b>INFORME DE INTERVENTORIA No. 03</b></p> <p><b>CONTRATO No. 063 DE 2021</b></p>	<p><b>CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</b></p> <p><b>FECHA INFORME: 31/08/2021</b></p> <p><b>PERIODO: 01/08/2021 – 31/08/2021</b></p>
--	--	---

**2.2.2. Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes**

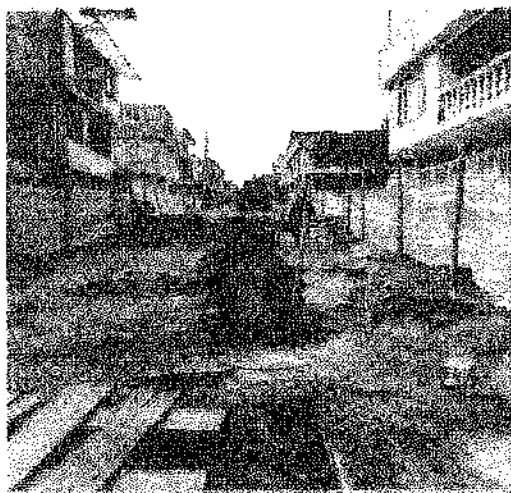CALLE/TRAMO	ESTADO INICIAL
<p><b>CARRERA 10 SUR ENTRE CALLES 24 Y 27 BARRIO VILLA CLAUDIA</b></p>	<p>VIA CON PAVIMENTO EN MAL ESTADO. RED DE ALCANTARILLADO EN AVANZADO ESTADO DE DETERIORO, COLAPSADA EN ALGUNOS TRAMOS, CON HUNDIMIENTOS Y CARCAVAS SOBRE LA VIA</p>
<p><b>LOCALIZACIÓN</b></p>	<p><b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR</b></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Reposición de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial con sus correspondientes acometidas domiciliarias.</li> <li>➤ Excavaciones con medio mecánico y entibado en los tramos donde la altura y condición del terreno lo requieran.</li> <li>➤ Protección de los tramos a construir con revestimiento de la tubería en tramos donde el sistema no cuenta con la profundidad necesaria para estar acorde con la normativa vigente.</li> <li>➤ Transporte interno de materiales y tuberías.</li> <li>➤ Rellenos en recebo compactado sobre las líneas del alcantarillado y acueducto.</li> </ul>
<p><b>REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL</b></p> 	



INFORME DE  
INTERVENTORIA No. 03

CONTRATO No. 063 DE  
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA  
EXTERNA IBAI

FECHA INFORME: 31/08/2021  
PERIODO: 01/08/2021 – 31/08/2021

### DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE AGOSTO


#### ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES

- ✓ Se llevó a cabo la reposición de la red de alcantarillado de aguas residuales en los siguientes tramos: PZ 26 – PZ 25, PZ 25 – PZ 21, PZ 19 – PZ 18 , PZ 18 – PZ 18A y PZ 18A - PZ 14.
- ✓ Se llevó a cabo la rotura del pavimento asfáltico tanto de la red principal como de las acometidas domiciliarias.
- ✓ Se llevaron a cabo las excavaciones a máquina a lo largo de los tramos antes mencionados.
- ✓ Se realizó entibado en madera a lo largo de los tramos intervenidos, dada la profundidad de la excavación y la inestabilidad del terreno.
- ✓ Se realizó la instalación de la cama de grava para la tubería a lo largo de la línea de la red
- ✓ Se instaló tubería plástica de 20" en los tramos ya mencionados
- ✓ Se llevaron a cabo los llenos en recebo compactado a lo largo de los tramos intervenidos
- ✓ Se realizaron las acometidas domiciliarias del alcantarillado a lo largo de los tramos citados.
- ✓ Se llevó a cabo el cargue y retiro de sobrantes producto de las excavaciones.


#### ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS

- ✓ En el presente período no se llevaron a cabo trabajos sobre la red de aguas lluvias.


### REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO

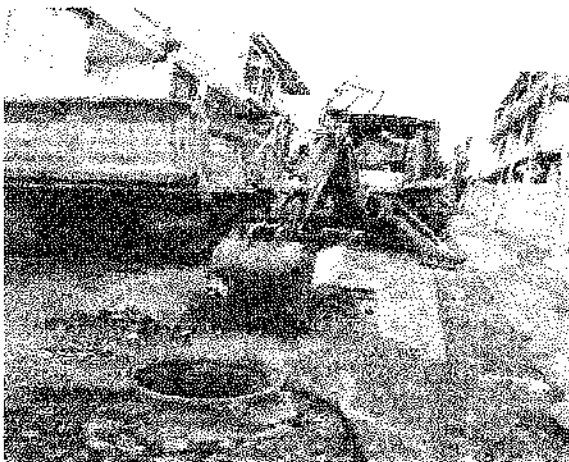

EXCAVACION DE 5 TRAMOS DE RED RESIDUAL 20"

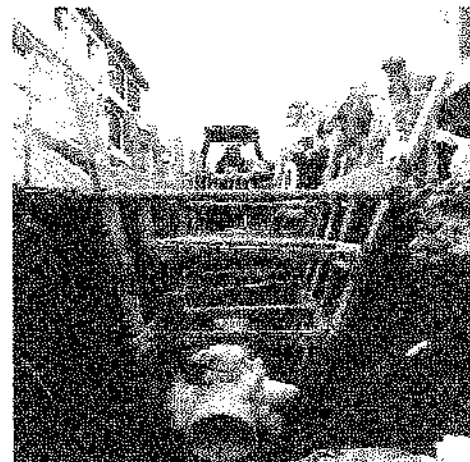

ENTIBADO DE ZANJA



INFORME DE  
INTERVENTORIA No. 03


CONTRATO No. 063 DE  
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA  
EXTERNA IBAI


FECHA INFORME: 31/08/2021  
PERIODO: 01/08/2021 - 31/08/2021




DERRUMBES SOBRE RED

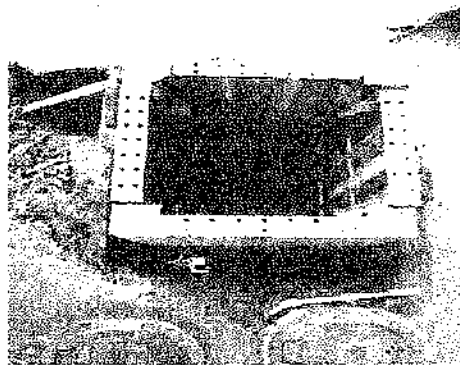

CONSTRUCCION DE CAJAS DOMICILIARIAS

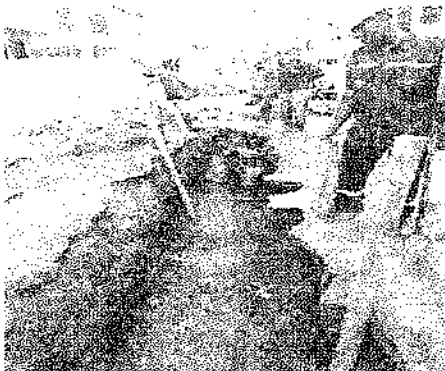

COMPACTACION MECANICA DE RELLENO

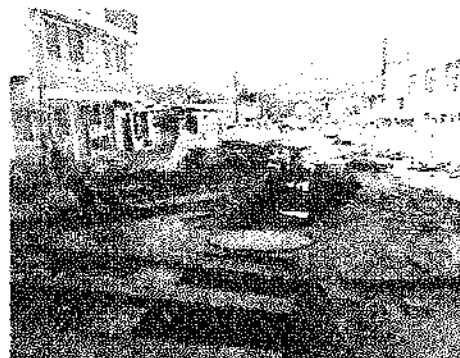

EXCAVACION PARA DOMICILIARIAS



INSTALACION TUERIAS DE 6" DOMIC.





**INFORME DE  
INTERVENTORIA No. 03**

**CONTRATO No. 063 DE  
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA  
EXTERNA IBAI**

**FECHA INFORME: 31/08/2021  
PERIODO: 01/08/2021 - 31/08/2021**
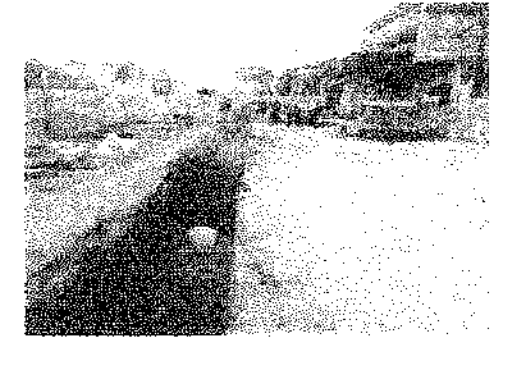
<p><b>CALLE 24 ENTRE KRA 1 Y 2 SUR BARRIO LAS FERIAS</b></p>	<p>VIA PAVIMENTADA EN MAL ESTADO CON POZOS TOTALMENTE COLMATADOS AL IGUAL QUE UNOS TRAMOS DE TUBERIA, SOCAVACION DE GRAN TAMAÑO. TRAMO EN TUBERIA DE 20" EN CONCRETO DE DETERIORO, TRAMOS COLAPSADA O TAPONADA O DESENCAJADA O ETC.</p> <p>VIA PAVIMENTADA EN MAL ESTADO CON BACHES, POZOS SIN TAPAS, TUBERIA DE ALCANTARILLADO APLASTADAS, QUE COLAPSAN CUANDO LLUEVE, TUBERIA DE 24 Y 30 EN CONCRETO QUE ENTREGAN AL BOX COULVER DE LA KRA 2 SUR, SE ESTA PENDIENTE DE INSPECCION CON EL ROBOT EN UN RAMAL.</p>
<p><b>LOCALIZACIÓN</b></p>	<p><b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR</b></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Instalación de tubería novafort en dos ramales uno de aguas servidas de 24 pulgadas y el otro en 33 pul de aguas lluvias que entregan al Box coulvert</li> <li>➤ Protección de los tramos a construir con revestimiento de la tubería en tramos donde el sistema no cuenta con la profundidad necesaria para estar acorde con la normativa vigente.</li> <li>➤ Transporte interno de materiales y tuberías.</li> <li>➤ Retiro de material de excavación y llevado a la escombrera</li> </ul>
<p><b>REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL</b></p>	
	



INFORME DE  
INTERVENTORIA No. 03

CONTRATO No. 063 DE  
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA  
EXTERNA IBAI

FECHA INFORME: 31/08/2021  
PERIODO: 01/08/2021 - 31/08/2021

#### DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE AGOSTO

##### RED NO.1 – AGUAS RESIDUALES

- ✓ Se realizó la reparación puntual de 3 metros de tubería de 24" en el tramo PZ 14 al PZ 13
- ✓ Se realizó la reparación puntual de 3.6 metros de tubería de 24" en el tramo PZ 13 al PZ 10.

##### RED NO.2 – AGUAS LLUVIAS

- ✓ Se llevó a cabo la reposición de la red de alcantarillado de aguas lluvias en el tramo PZ 17 – PZ 11
- ✓ Se iniciaron trabajos de reposición de tubería en el tramo PZ 11 - PZ 8
- ✓ Se llevó a cabo la rotura del pavimento asfáltico en la red principal.
- ✓ Se llevaron a cabo las excavaciones a máquina a lo largo del tramo antes mencionado.
- ✓ Se instaló tubería plástica de 33" en los tramos ya mencionados
- ✓ Se realizó la protección de la tubería mediante un revestimiento en concreto en una longitud de 18 metros a lo largo del tramo PZ 17 – PZ 11 , dado que el relleno sobre la clave de la tubería es inferior a 1.20 metros, de acuerdo a lo especificado en la norma RAS.
- ✓ Se llevaron a cabo los llenos en recebo compactado.
- ✓ Se llevó a cabo el cargue y retiro de sobrantes producto de las excavaciones.

##### RED NO.3 – AGUAS RESIDUALES

- ✓ Se llevó a cabo la reposición de la red de alcantarillado de aguas residuales del PZ 15 al PZ 12 y del PZ 12 al PZ 9
- ✓ Se iniciaron excavaciones en el tramo PZ 9 al PZ 6
- ✓ Se llevó a cabo la rotura del pavimento asfáltico tanto de la red principal como de sus acometidas domiciliarias.
- ✓ Se llevaron a cabo las excavaciones a máquina a lo largo de los tramos antes mencionados.
- ✓ Se instaló tubería plástica de 18" en los tramos ya mencionados
- ✓ Se llevaron a cabo los llenos en recebo compactado.
- ✓ Se llevó a cabo el cargue y retiro de sobrantes producto de las excavaciones
- ✓ Se efectuó la reposición de la tubería de 6" en las acometidas domiciliarias encontradas en el tramo, las cuales fueron revestidas dada la profundidad de las mismas.





INFORME DE  
INTERVENTORIA No. 03


CONTRATO No. 063 DE  
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA  
EXTERNA IBAL


FECHA INFORME: 31/08/2021  
PERIODO: 01/08/2021 - 31/08/2021



RUTURA DE PAVIMENTO

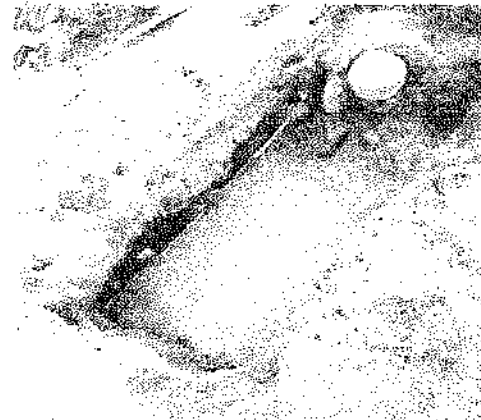

REVESTIMIENTO EN CONCRETO

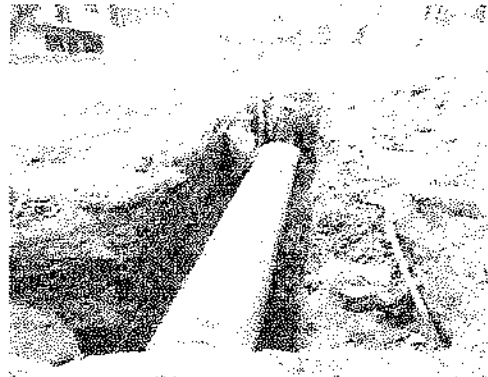


INSTALACION TUBERIA DE 24"




ENTIBADO CON MADERA





EXCAVACIONES PARA LA RED PPAL

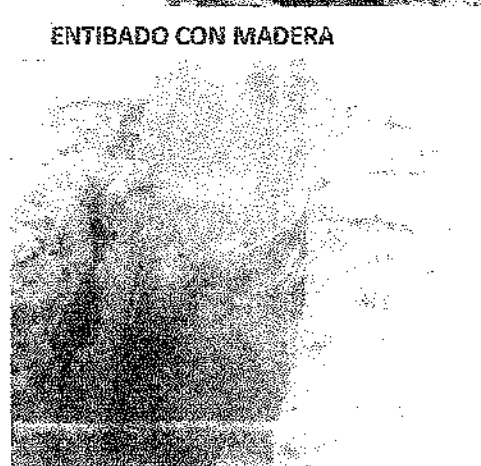

DEMOLICION DE ROCA

	<p align="center"><b>INFORME DE INTERVENTORIA No. 03</b></p> <p align="center"><b>CONTRATO No. 063 DE 2021</b></p>	<p align="center"><b>CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</b></p> <p align="center"><b>FECHA INFORME: 31/08/2021</b> <b>PERIODO: 01/08/2021 – 31/08/2021</b></p>
---	--	--

CALLE/TRAMO	ESTADO INICIAL
<b>CALLE 20 A ENTRE CARRERAS 11 B SUR Y 11 C SUR BARRIO RICAURTE</b>	VIA CON PAVIMENTO EN MAL ESTADO. RED DE ALCANTARILLADO EN MORTERO POZOS DE INSPECCION TAPADOS BAJO LA RAZANTE DE LA VIA
LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reposición de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario con sus correspondientes acometidas domiciliarias.</li> <li>✓ Excavaciones con medio mecánico y entibado en donde la altura y condición del terreno lo requieran.</li> <li>✓ Transporte interno de materiales y tuberías.</li> <li>✓ Rellenos en recebo compactado sobre las líneas del alcantarillado y acueducto.</li> </ul>
REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL	
	



**INFORME DE  
INTERVENTORIA No. 03**

**CONTRATO No. 063 DE  
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA  
EXTERNA IBAL**

**FECHA INFORME: 31/08/2021  
PERIODO: 01/08/2021 – 31/08/2021**

**DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE AGOSTO  
ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES**

✓ Se llevó a cabo la construcción de las cajas de inspección de las acometidas domiciliarias en el tramo comprendido entre los pozos PZ 1 y PZ 2.

**REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO**



**EXCAVACIONES PARA LA RED**



**ENTIBADO EN MADERA**



**EXCAVACION TUBERIA DOMICILIARIA**



**CONSTRUCCION CAJAS DOMICILIARIA**



Dirección: Centro Comercial Arroyuelos, Local 5, Ibagué, Tolima.


Teléfono: 300 556 1508 - Correo electrónico: [interventoriaexterna2021@sqwaf.com](mailto:interventoriaexterna2021@sqwaf.com)



INFORME DE  
INTERVENTORIA No. 03  
  
CONTRATO No. 063 DE  
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA  
EXTERNA IEAL  
FECHA INFORME: 31/08/2021  
PERIODO: 01/08/2021 - 31/08/2021

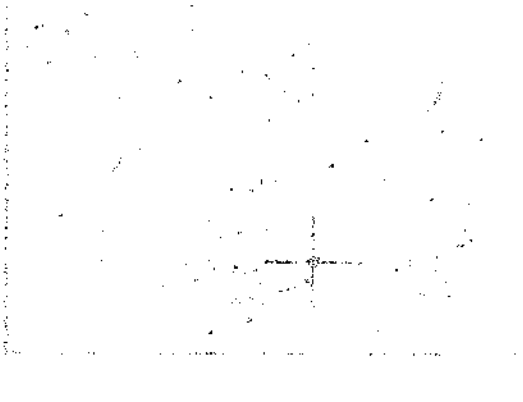CALLE/TRAMO	ESTADO INICIAL
CALLE 20 A ENTRE CARRERAS 11 C SUR y 12 SUR BARRIO RICAURTE	VIA CON PAVIMENTO EN MAL ESTADO. RED DE ALCANTARILLADO EN MORTERO POZOS DE INSPECCION TAPADOS BAJO LA RAZANTE DE LA VIA
LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR
	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Reposición de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario con sus correspondientes acometidas domiciliarias.</li><li>✓ Excavaciones con medio mecánico y entibado en donde la altura y condición del terreno lo requieran.</li><li>✓ Transporte interno de materiales y tuberías.</li><li>✓ Rellenos en recebo compactado sobre las líneas del alcantarillado y acueducto.</li></ul>
<p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">REGISTRÓ FOTOGRAFICO INICIAL</p> 	



INFORME DE  
INTERVENTORIA No. 03

CONTRATO No. 063 DE  
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA  
EXTERNA IBAI

FECHA INFORME: 31/08/2021  
PERIODO: 01/08/2021 - 31/08/2021

## DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE AGOSTO

### ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES

- Se realizaron las excavaciones para las acometidas domiciliarias en el tramo comprendido entre los pozos PZ 1 y PZ 3.
- Se llevó a cabo la instalación de cama de grava para la tubería de las domiciliarias.
- Se instaló tubería pvc 6" en las acometidas domiciliarias
- Se construyeron las cajas de inspección en las respectivas acometidas
- Se realizó el cargue y retiro de sobrantes producto de las excavaciones.



### REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO



EXCAVACION PARA DOMICILIARIAS



EXCAVACION PARA CAJAS DOMICILIA.

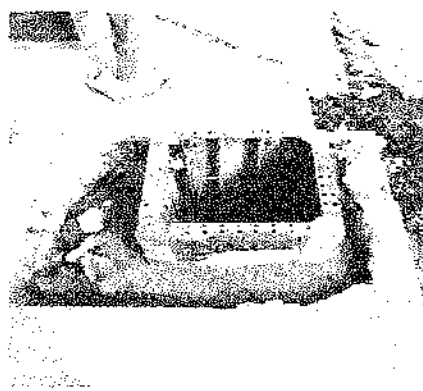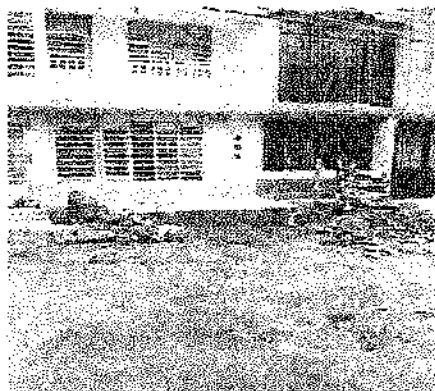





**IBAI**  
S.A. ESP. DE IBAI

**INFORME DE  
INTERVENTORIA No. 03**

**CONTRATO No. 063 DE  
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA  
EXTERNA IBAI**

**FECHA INFORME: 31/08/2021  
PERIODO: 01/08/2021 - 31/08/2021**

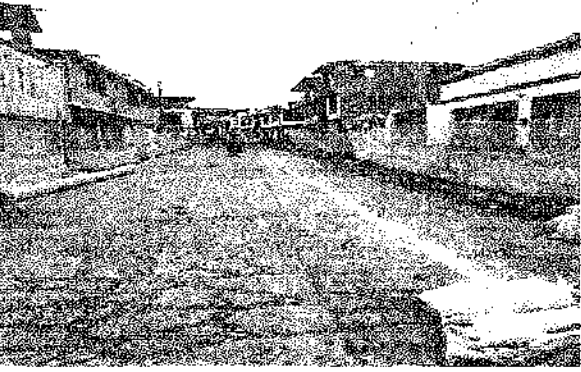CALLE/TRAMO	ESTADO INICIAL
<b>CARRERA 11 C SUR ENTRE CALLES 20 B , 20 A Y 20 BARRIO RICAURTE</b>	VIA CON PAVIMENTO EN CONCRETO EN MAL ESTADO. RED DE ALCANTARILLADO EN MORTERO.
LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR.
	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Reposición de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario con sus correspondientes acometidas domiciliarias.</li><li>✓ Excavaciones con medio mecánico y entibado en donde la altura y condición del terreno lo requieran.</li><li>✓ Transporte interno de materiales y tuberías.</li><li>✓ Rellenos en recebo compactado sobre las líneas del alcantarillado y acueducto.</li></ul>
REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL	
	

Dirección: Centro Comercial Arroyueños, Local 6, Ibagué, Tolima.

Teléfono: 300 556 1508 - Correo electrónico: [interventoriaexterna@ibai.com](mailto:interventoriaexterna@ibai.com)



INFORME DE  
INTERVENTORIA No. 03

CONTRATO No. 063 DE  
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA  
EXTERNA IBAL


FECHA INFORME: 31/08/2021  
PERIODO: 01/08/2021 - 31/08/2021

#### DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE AGOSTO

##### ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES:

- ✓ Se realizó la demolición del pavimento rígido  $e = 0.15$  m a lo largo de la carrera 11 C sur entre calles 20 y 20 A, tramo comprendido entre los pozos PZ 1 al PZ 4 y PZ 4 al PZ 4A.
- ✓ Se llevaron a cabo las excavaciones sobre la red principal a lo largo de los tramos mencionados y se iniciaron las excavaciones para las acometidas domiciliarias.
- ✓ Se instaló tubería pvc 8" entre los pozos PZ 4 y PZ 4 A, y de 10" entre los pozos PZ 4 al PZ 1
- ✓ Se llevó a cabo el lleno en recebo compactado en los tramos mencionados.
- ✓ Se instaló tubería pvc de 6" en acometidas domiciliarias de los tramos anotados.
- ✓ Se llevó a cabo la demolición del pavimento en concreto sobre el tramo comprendido entre los pozos PZ 5 y PZ 5 A
- ✓ Se iniciaron excavaciones en el citado tramo
- ✓ Se realizó cargue y retiro de sobrantes producto de las demoliciones y excavaciones realizadas.

#### REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO

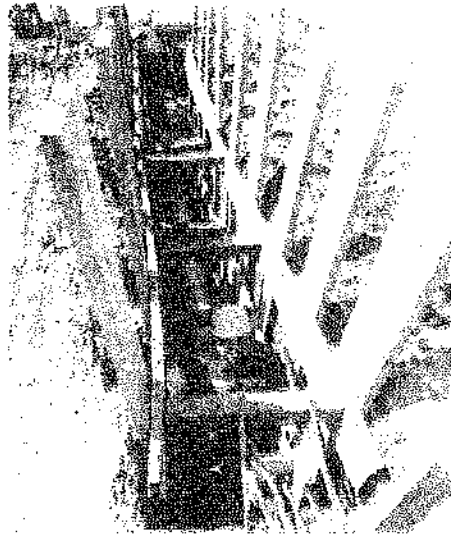

Proceso de excavación, entibado e instalación de Tubería Red Principal




INFORME DE  
INTERVENTORIA No. 03


CONTRATO No. 053 DE  
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA  
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 31/08/2021  
PERIODO: 01/08/2021 - 31/08/2021

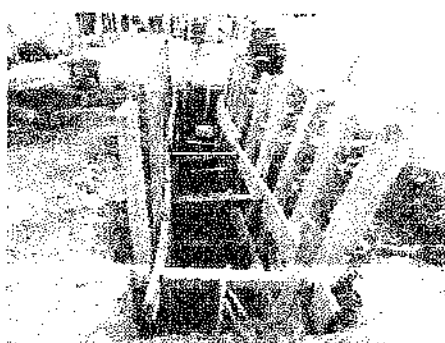


Construcción de domiciliarias

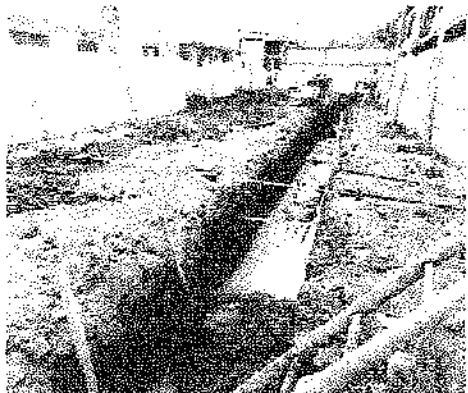

Excavación sobre la red principal







**INFORME DE  
INTERVENTORIA No. 03**

**CONTRATO No. 063 DE  
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA  
EXTERNA IBAL**

**FECHA INFORME: 31/08/2021**

**PERIODO: 01/08/2021 - 31/08/2021**

CALLE/TRAMO	ESTADO INICIAL
CALLE 23 C CON CARRERAS 12 SUR - 12 A - 13 Y 13 A BARRIO VILLA LUCES	VIA CON PAVIMENTO EN CONCRETO EN MAL ESTADO. RED DE ALCANTARILLADO EN MORTERO
LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR
	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Reposición de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario con sus correspondientes acometidas domiciliarias.</li><li>➤ Excavaciones con medio mecánico y entibado en donde la altura y condición del terreno lo requieran.</li><li>➤ Transporte interno de materiales y tuberías.</li><li>➤ Rellenos en recebo compactado sobre las líneas del alcantarillado y acueducto.</li></ul>
REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL	
	



INFORME DE  
INTERVENTORIA No. 03

CONTRATO No. 063 DE  
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA  
EXTERNA IBAL



FECHA INFORME: 31/08/2021  
PERIODO: 01/08/2021 - 31/08/2021

#### DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE AGOSTO


##### ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES

- Se llevó a cabo la construcción del cerramiento perimetral en fona en los tramos a intervenir.
- Se realizó la demolición del pavimento rígido en los tramos comprendidos entre los pozos PZ 5 al PZ 6 , PZ 6 al PZ 7 y PZ 5 al PZ 5 A.
- Se llevaron a cabo las excavaciones sobre la red principal a lo largo de los tramos mencionados y se iniciaron las excavaciones para las acometidas domiciliarias en el tramo comprendido entre los pozos PZ 5 al PZ 7.
- Se instaló tubería pvc 8" entre los pozos PZ 6 al PZ 7 y PZ 5 al PZ 6.
- Se llevó a cabo el lleno en recebo compactado en los tramos PZ 6 al PZ 7 y PZ 5 al PZ 6.
- Se instaló tubería pvc de 6" en acometidas domiciliarias del tramo PZ 6 al PZ 7.
- Se realizó cargue y retiro de sobrantes producto de las demoliciones y excavaciones realizadas.

##### REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO

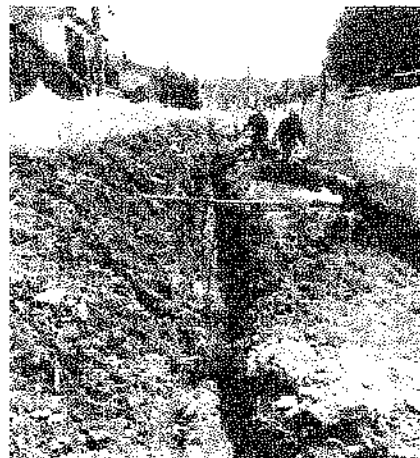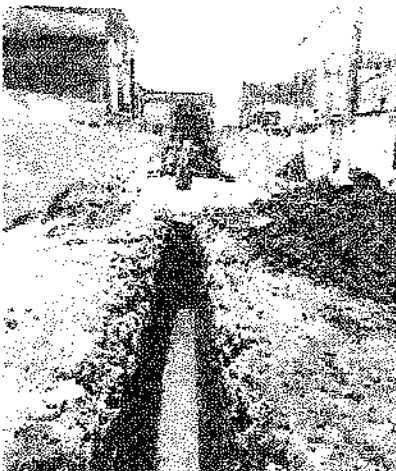

Proceso de excavación e instalación de Tubería Red Principal



**INFORME DE  
INTERVENTORIA No. 03**




**CONTRATO No. 063 DE  
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA  
EXTERNA IBAL**

**FECHA INFORME: 31/08/2021  
PERIODO: 01/08/2021 - 31/08/2021**




**LLENOS COMPACTADOS SOBRE LA RED PRINCIPAL**

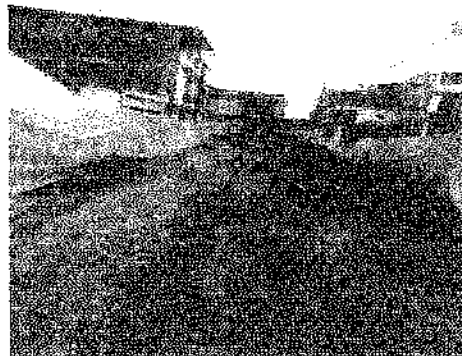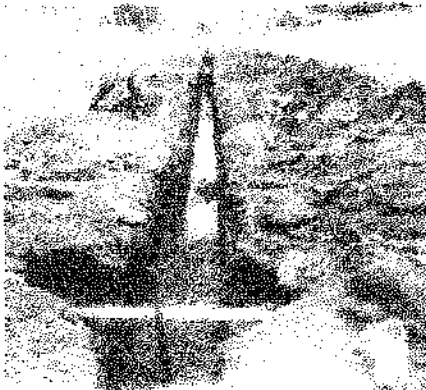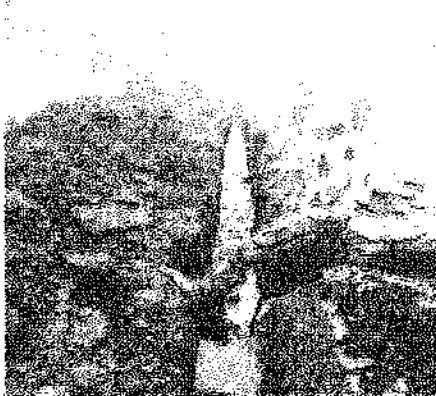

**INSTALACIÓN GRAVA**

**RETIRO DE SOBANTES**

	<b>INFORME DE INTERVENTORIA No. 03</b>	<b>CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</b> FECHA INFORME: 31/08/2021 PERIODO: 01/08/2021 – 31/08/2021
	<b>CONTRATO No. 063 DE 2021</b>	

### 2.2.3. Seguimiento a garantías contractuales


Contrato de Obra No. 041 de 2021				
No.	Aseguradora	Amparo	Vigencia	Observaciones
I-100004333	SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	07/04/2021 04/04/2022	
I-100004333	SEGUROS MUNDIAL	SALARIOS Y PRESTACIONES	07/04/2021 04/10/2024	
I-100004333	SEGUROS MUNDIAL	CALIDAD DEL SERVICIO	07/04/2021 04/10/2022	
I-100004333	SEGUROS MUNDIAL	ESTABILIDAD	04/10/2021 04/10/2026	
I-100001109	SEGUROS MUNDIAL	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC.	07/04/2021 04/10/2022	

### 2.2.4. Avance físico

A la fecha del presente informe se evidencia el siguiente avance

CUADRO COMPARATIVO DE ACTIVIDADES						
MESES	1	2	3	4	5	6
PROGRAMADO	12%	15%	23%	20%	15%	15%
EJECUTADO	7.21%	24.79%	0%	0%	0%	0%
EJECUTADO ACUMULADO	7.21%	32%				

### AVANCE DISTRITO 3

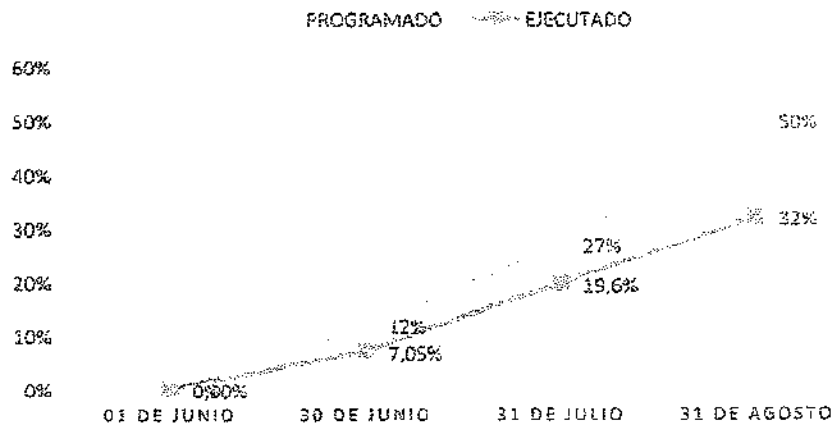

	<b>INFORME DE INTERVENTORIA No. 03</b>	<b>CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</b>
	<b>CONTRATO No. 063 DE 2021</b>	<b>FECHA INFORME: 31/08/2021</b> <b>PERIODO: 01/08/2021 – 31/08/2021</b>


### 2.2.5. Avance financiero

A la fecha del presente informe se ha ejecutado en obra un porcentaje del 32% del valor del contrato correspondiente a \$1.129.009.291.84.

### 2.2.6. Balance del contrato

<b>VALOR CONTRATADO</b>	<b>\$3.528.154.037,00</b>	
<b>VALOR EJECUTADO</b>		<b>\$ 1.129.009.291,84</b>
<b>VALOR POR EJECUTAR</b>		<b>\$ 2.399.144.745,16</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$3.528.154.037,00</b>	<b>\$3.528.154.037,00</b>

### PORCENTAJE DE EJECUCION

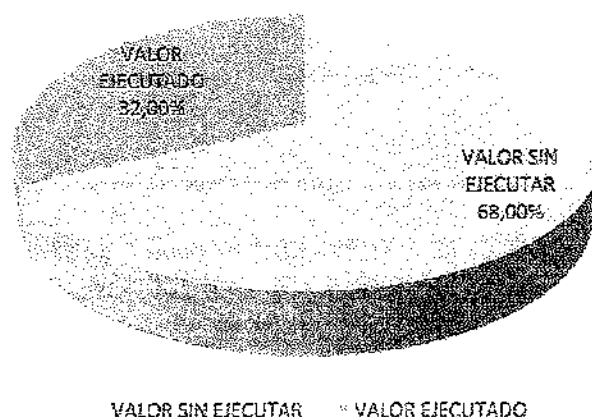


### 2.2.7. Gestión de las comunicaciones

Se anexa correspondencia relacionada al distrito 3.

### 2.2.8. Información relacionada con los ensayos de laboratorio.

Se anexan resultados de ensayos de laboratorio practicados durante el periodo del presente informe.

	<p align="center"><b>INFORME DE INTERVENTORIA No. 03</b></p> <p align="center"><b>CONTRATO No. 063 DE 2021</b></p>	<p align="center"><b>CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</b></p> <p align="center"><b>FECHA INFORME: 31/08/2021</b> <b>PERIODO: 01/08/2021 – 31/08/2021</b></p>
---	--	--

**2.2.9. Dificultades en la ejecución de los proyectos**

INCONVENIENTE	SOLUCIÓN	PROCESO / AVANCE A FECHA DE CORTE DE ESTE INFORME
Presencia de redes de alcantarillado muy superficiales en algunos tramos que no cumplen lo establecido en el RAS en cuanto a la profundidad mínima	Se realizó revestimiento en concreto tanto en la red principal como en sus acometidas domiciliarias.	Ya se encuentran revestidos en su totalidad los tramos intervenidos.

Espacio para  
Logo Corporativo

UNION TEMPORAL AGUAS 2021  
NIT 901471.171-  
AV AMBALA No. 69-80 CENTRO COMERCIAL  
PLAZAS DEL BOSQUE LOCAL 305  
Tel: (038) 2755412  
Ibagué - Colombia  
contador@asfaltamos.co



Factura electrónica de venta  
No. UTAG-5

Señores EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL  
NIT 800.089.809-6 Teléfono (038) 2756000  
Dirección Carrera 3 No. 1 - 04 B/La Pola Ciudad Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura  
Generación 02/11/2021, 10:19  
Expedición 02/11/2021, 10:19  
Vencimiento 02/11/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE OBRA	1.00	409,102,717.28

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Cuatrocientos nueve millones ciento dos mil setecientos diecisiete pesos m/cto con veintiocho cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-11-02 por \$ 409,102,717.28

Total Bruto	409,102,717.28
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	409,102,717.28

Observaciones:


ACTA PARCIAL DE COBRO No. 3  
OBJETO: REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y  
ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS  
PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 3 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA  
ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764014533928 aprobado en 20210624 prefijo UTAG desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses Bimestres

- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa

CUFE: 5786de225caa4c06e657bf2cac36ad5088df762e2f3647e3623af4f6a3d9d1cbed14bb2594340e81c9e1a57a41f1d9

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A. S (Itz: 830.046.145-6)

	<b>SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA</b>	<b>CÓDIGO: GJ-R-050</b>
		<b>FECHA VIGENCIA: 2016-10-12</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>VERSIÓN: 02</b>
		<b>Página 1 de 1</b>

Ibagué, noviembre 05 de 2021

Doctora  
**OLGA LUCIA LIEVANO RODRIGUEZ**  
 Secretaria General  
 IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL  
 Ibagué

*Al Doms  
 08-11-21  
 10448*

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 054 del 28 de abril de 2021.**


Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

**DOCUMENTOS ACTA FINAL:**


- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Acta final                             | Original y 2 copias. |
| 2. Informe de actividades                 | Original             |
| 3. Planilla seguridad social - Octubre/21 | 2 copias             |
| 4. Ficha evaluación                       | original             |
| 5. Ficha Reevaluación                     | original             |
| 6. Cuenta de Cobro                        | Original y 2 copias  |

Atentamente,




**WILLINTON JARAMILLO HERRERA**  
 Profesional Especializado III  
 Gestión Atención al Cliente y PQR  
 Supervisor



	<b>ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-055
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-07-15
		<b>VERSIÓN:</b> 06
		<b>Página 1 de 3</b>

<b>Contrato No.</b>	Servicio de Apoyo a la Gestión No. 054 del 28 de abril de 2021			
<b>Objeto</b>	<b>CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL PROCESO DE GESTIÓN COMERCIAL, ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y PQR DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL</b>			
<b>Valor total</b>	\$ 14.400.000,00			
<b>Contratista</b>	LUZ KARLA VARGAS BURITICA			
<b>Supervisor</b>	Profesional Especializado III – Gestión al Cliente y PQR			
<b>Fecha de Inicio</b>	06 de Mayo de 2021			
<b>Fecha de terminación</b>	05 de noviembre de 2021			
<b>Plazo de Ejecución</b>	SEIS (06) MESES			
<b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA FINAL</b>		<b>Año</b>	<b>Mes</b>	<b>Día</b>
		2021	11	05
En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta final de entrega y recibo a satisfacción del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.				
<b>Periodo informado</b>	Del 06 de Octubre de 2021 al 05 de Noviembre de 2021			
<b>Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoyar el proceso de elaboración de relación y entrega al servicio de mensajería de los documentos o notificaciones elaboradas por el área de PQR siguiendo el procedimiento de notificación personal y por aviso.</li> <li>2. Brindar apoyo en el desarrollo de la actividad de archivo que concierne al proceso de mensajería del área de PQR, permitiendo la consulta de documentos enviados, recibidos o devueltos.</li> <li>3. Apoyar en la organización y control de lo entregado y recibido por parte del servicio de mensajería utilizando las herramientas que permitan su fácil ubicación a los funcionarios.</li> <li>4. Colaborar con las solicitudes del usuario interno y externo en la búsqueda de los documentos relacionados con el proceso de notificación.</li> <li>5. Apoyar el control de las notificaciones por aviso, y rendir informe del estado de las mismas cuando sea requerido. Esto acorde al procedimiento de notificación pro aviso de la empresa.</li> </ol>			

	<b>ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-055
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-07-15
		<b>VERSIÓN:</b> 06
		<b>Página</b> 3 de 3

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
<b>PERSONA JURIDICA</b>			
El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.			
<b>APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL</b> (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PERSONA NATURAL</b>			
<b>Entidad en donde se realiza el pago.</b>	BANCO DE OCCIDENTE	<b>Valor total del aporte</b>	\$ 292.800,00
<b>Planilla No.</b>	9426196682	<b>Salud</b>	\$120.000,00
<b>Periodo cotizado</b>	<b>De:</b>	01/10/2021	<b>Pensión</b>
	<b>Hasta:</b>	31/10/2021	<b>ARL</b>
			\$153.600,00
			\$ 19.200,00
<b>ANEXOS:</b>			Marque con x
Recibo de pago de seguridad social			X
Copias planillas de aporte			X
<b>Firma</b>			
<b>Nombre</b>	LUZ KARLA VARGAS BURITICA		WILLINTON JARAMILLO HERRERA Profesional Especializado III – Gestión Atención al Cliente y PQR
	<b>Contratista</b>		<b>Supervisor</b>
<b>V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL</b>	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO		

Ibagué, 05 de noviembre de 2021

**WILINTON JARAMILLO HERRERA**

Líder Gestión de Atención al Cliente y PQR  
IBAL S.A E.S.P OFICIAL

**Asunto:** informes de actividades

Fecha 06 de Octubre hasta 05 de Noviembre de 2021
Apoyar el proceso de notificaciones en la página N2 y al funcionario David Mejía en las respuestas para la notificación electrónica de Atención al cliente y PQR. Se realiza Diariamente.
Apoyar el proceso de las organizaciones cartera y PQR Se realiza diariamente.
Apoyar el proceso de buscar las 50 guías de actos administrativo personal y notificación por aviso. Se realiza diariamente.
Apoyar el proceso de las organización de archivar Se realiza diariamente.
Apoyar el proceso de las organización de los libros y guardar Se realiza diariamente.



LUZ KARLA VARGAS BURITICA  
Gestión al apoyo  
PQR



**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**


Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE e ICBF
CC 118918242		LUIZ KARLA VARGAS BURBICA	INDEPENDIENTE	Principal	ave. 9 casa 5 barrio Lonarico	IBAGUIE-TOLIMA	2555988	No

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago
2021-10	9436196682	1	2021/11/10	0

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	VALORES APLICABLES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)						
	230901	800,234,808	8	\$153,600	\$0	\$153,600
				\$153,600	\$0	\$153,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)						
	CCF48	800,211,025	1	\$19,200	\$0	\$19,200
				\$19,200	\$0	\$19,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)						
	EPS002	800,130,907	4	\$120,000	\$0	\$120,000
				\$120,000	\$0	\$120,000
<b>TOTAL</b>				<b>\$592,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$592,800</b>

	<b>FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CÓDIGO: GJ-R-056
		FECHA VIGENCIA: 2021/07/15
		VERSIÓN: 01

Evaluación:  Fecha evaluación 05/11/2021      Reevaluación:  Fecha reevaluación: \_\_\_\_\_

Acta Parcial N° \_\_\_\_\_      Acta Final  \_\_\_\_\_

**INFORMACION DEL CONTRATO**

NUMERO Y FECHA: 054 del 28 de Abril de 2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: LUZ KARLA VARGAS BURITICA NIT: C.C. 1.110.519.242

FECHA DE INICIO: 06 de Mayo de 2021      FECHA DE TERMINACION: 06 de Noviembre de 2021

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL PROCESO DE GESTIÓN COMERCIAL, ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y PQR DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	x
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	

**ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA**

PUNTAJE      2= MALO      3= REGULAR      4= BUENO      5= EXCELENTE

1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION			
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	4	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	4
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	4	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	4
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	4	PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4.00</b>	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	4
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	4
		CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4.00</b>
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	4		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4.00</b>	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>4.00</b>

**ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION** \_\_\_\_\_ **REEVALUACION** \_\_\_\_\_ **POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:**  
 (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):

**OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION** \_\_\_\_\_ **REEVALUACION** \_\_\_\_\_ **POR PARTE DEL CONTRATISTA:**

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION      SI       NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION      SI       NO

