




13-10-2021 Clima: Soleado
 Maquinaria: Herramienta Menor
 personal: Sin novedad
 Descripción: Durante toda la jornada laboral, se continúa realizando la excavación manual para domiciliarias.


 RESIDENTE OBRA



 RESIDENTE INTERVENTORIA.

02-11-2021 Clima: Soleado
 Maquinaria: Herramienta Menor
 personal: Sin novedad
 Descripción: Se inicia la jornada laboral, ejecutando actividades de excavación de domiciliaria y se hace lleno de zanja con recebo en la red principal de 10 pulgadas, se termina la jornada laboral.


 RESIDENTE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA.

03-11-2021 Clima: Soleado. Mañana - lluvioso tarde
 Maquinaria: Herramienta Menor
 personal: Sin novedad
 Descripción: Se da inicio a la jornada laboral, continuando con las labores de excavación para domiciliarias, se instala tubería de 6" y se formaletea, dejando listo para realizar revestimiento en concreto. Se da por terminada la jornada laboral.


 RESIDENTE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA.



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 05

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 31/10/2021
PERIODO: 01/10/2021 – 31/10/2021

DE 01-10-2021 A 31-10-2021

INFORME DE INTERVENTORIA No.5

CONTRATO No. 063 DE 06 DE
MAYO DE 2021

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA EJECUCION
DE OBRAS DE REHABILITACION
Y/O RECUPERACION Y/O
REPOSICION DE LAS REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
PARA GARANTIZARLA
CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN
LOS DISTRITOS HIDRAULICOS DEL
PERIMETRO HIDROSANITARIO
DEL IBALS.A. E.S.P OFICIAL EN LA
CIUDAD DE IBAGUE.

CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL

R.L. LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 05

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 31/10/2021
PERIODO: 01/10/2021 – 31/10/2021

Contenido

1.	INFORMACION GENERAL	5
1.1.	SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y AMBIENTAL	5
2.	CONTROL Y SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y AMBIENTAL A CONTRATOS DE OBRA EJECUTADOS POR IBAL S.A E.S.P OFICIAL	7
2.1.	DISTRITO HIDRÁULICO No. 1 y 2 CONTRATO DE OBRA No. 092 DEL 29 DE JUNIO DE 2021. 7	
2.1.1.	Información general del contrato.	7
2.1.2.	Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes.	8
2.1.3.	Seguimiento a garantías contractuales	16
2.1.4.	Avance Físico	16
2.1.5.	Avance financiero	17
2.1.6.	Balance del contrato	17
2.1.7.	Gestión de las comunicaciones	17
2.1.8.	Información relacionada con los ensayos de laboratorio	17
2.1.9.	Dificultades en la ejecución de los proyectos	18
2.2.	DISTRITO HIDRÁULICO No. 3. CONTRATO DE OBRA No. 041 DEL 07 DE ABRIL DE 2021	19
2.2.1.	Información general del contrato.	19
2.2.2.	Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes	20
2.2.3.	Seguimiento a garantías contractuales	39
2.2.4.	Avance físico	39
2.2.5.	Avance financiero	40
2.2.6.	Balance del contrato	[Error! Marcador no definido.
2.2.7.	Gestión de las comunicaciones	41
2.2.8.	Información relacionada con los ensayos de laboratorio	41
2.2.9.	Dificultades en la ejecución de los proyectos	41
2.3.	DISTRITO HIDRÁULICO No. 4. CONTRATO DE OBRA No. 069 DEL 14 DE MAYO DE 2021 ...	42
2.3.1.	Información general del contrato.	42
2.3.2.	Estado de Frentes de obra	43
2.3.3.	Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes	44
2.3.4.	Seguimiento de garantías contractuales	68

Dirección: Centro Comercial Arroyuelos, Local 6, Ibagué, Tolima.

Teléfono: 300 556 1508 - Correo electrónico: interventoriaexterna2021@gmail.com



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 05
CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 31/10/2021
PERIODO: 01/10/2021 – 31/10/2021

2.3.5. Avance Físico	68
2.3.6. Avance Financiero	69
2.3.7. Balance del Contrato	69
2.3.8. Gestión de las comunicaciones	69
2.3.9. Información relacionada con los ensayos de Laboratorio	69
2.4. DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 CONTRATO DE OBRA No. 089 DEL 18 DE JUNIO DE 2021, ...	81
2.4.1. Información general del contrato.	81
2.4.2. Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes.....	82
2.4.3. Seguimiento a garantías contractuales	96
2.4.4. Avance Físico	97
2.4.5. Avance Financiero	97
2.4.6. Balance del Contrato	98
2.4.7. Gestión de las comunicaciones	98
2.4.8. Información relacionada con los ensayos de Laboratorio.	98
2.4.9. Dificultades en la ejecución de los proyectos	98
2.5. DISTRITO HIDRÁULICO No. 7 CONTRATO DE OBRA No. 062 DEL 06 DE MAYO DE 2021.....	99
2.5.1. Información general del contrato.	99
2.5.2. Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes.....	100
2.5.3. Seguimiento a garantías contractuales	156
2.5.4. Avance Físico	172
2.5.5. Avance Financiero	173
2.5.6. Balance del Contrato.....	173
2.5.7. Gestión de las comunicaciones	173
2.5.8. Información relacionada con los ensayos de Laboratorio.	173
2.5.9. Dificultades en la ejecución de los proyectos	174
2.6. DISTRITO HIDRÁULICO No. 9 y 10 CONTRATO DE OBRA No. 093 DEL 29 DE JULIO DE 2021 175	
2.6.1. Información general del contrato.	175
2.6.2. Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes.....	176
2.6.3. Seguimiento a garantías contractuales	193
2.6.4. Avance Físico	193



**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 05**

**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**

**FECHA INFORME: 31/10/2021
PERIODO: 01/10/2021 – 31/10/2021**

2.6.5. Avance Financiero.....	194
2.6.6. Balance del Contrato.....	194
2.6.7. Gestión de las comunicaciones.....	194
2.6.8. Información relacionada con los ensayos de Laboratorio.....	194
2.6.9. Dificultades en la ejecución del proyecto.....	195
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	196
3.1. Información general del contrato.....	196
3.2. Control del equipo de la Interventoría.....	196
3.3. Control del personal de Interventoría.....	197
3.4. Trabajo de campo y actividades realizadas.....	197
3.5. Informes técnicos mensuales.....	198
3.6. Estado contrato interventoría.....	198
3.7. Información financiera del Interventor.....	199
3.8. Balance del Contrato de Interventoría.....	200
3.9. Información financiera contrato de interventoría.....	201
3.10. Informe de Inversión y buen manejo del anticipo.....	201
3.11. Seguimiento a garantías contractuales.....	202



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 05

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 31/10/2021
PERIODO: 01/10/2021 - 31/10/2021

1. INFORMACION GENERAL

INFORME	PERIÓDICO: __x__ UNICO :	No. 05
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	Desde 01/010/2021 hasta 31/010/2021	
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		
TIPO CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO No. Y FECHA:	063 DE 06 DE MAYO DE 2021	
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL Rep. Leg. LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ	
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS DISTRITOS HIDRAULICOS DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S.A. E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE.	
VALOR DEL CONTRATO:	MIL TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE (\$1.038.941.400,00).	
PLAZO:	DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS	
ACTA DE INICIO	01 DE JUNIO DE 2021	
PRORROGAS-SI APLICA (No. DE DIAS/MESES)	N/A	
ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	N/A	
SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	N/A	
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	28 DE DICIEMBRE DE 2021	

1.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y AMBIENTAL

Como contratista del contrato de Interventoría No. 063 de 06 de Mayo de 2021, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS DISTRITOS HIDRAULICOS DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S.A. E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE, presento el siguiente informe de interventoría No. 05.

Que el presente informe de interventoría No. 5, donde se describe las actividades llevadas a cabo por los contratistas de obra de los distintos distritos hidráulicos el perímetro urbano de la Ciudad de

Dirección: Centro Comercial Arroyuelos, Local 6, Ibagué, Tolima.

Teléfono: 300 556 1508 - Correo electrónico: interventoriaexterna2021@gmail.com



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 05

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 31/10/2021
PERIODO: 01/10/2021 – 31/10/2021

Ibagué y la interventoría en los ámbitos técnicos, administrativos, financieros y ambientales durante el periodo comprendido entre el 01 de Octubre de 2021 y el 31 de Octubre 2021.

DISTRITO HIDRAULICO/CONTRATO	PORCENTAJE DE AVANCE	ESTADO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
DISTRITO No. 1 y 2/CTO 092 de 29 de Junio de 2021.	91 %	EN EJECUCION	
DISTRITO No. 3/CTO 041 de 07 de Abril de 2021.	60 %	EN EJECUCION	
DISTRITO No. 4/CTO 069 de 14 de Mayo de 2021.	70 %	EN EJECUCION	
DISTRITO No. 5, 5A Y 8/ SIN NUMERO.	17 %	EN EJECUCION	
DISTRITO No. 6/ CTO 089 de 18 de Junio de 2021.	37 %	EN EJECUCION	
DISTRITO No. 7/CTO 062 de 06 de Mayo de 2021.	52.3%	EN EJECUCION	
DISTRITO No. 9 Y 10 CTO 093 de 29 de Junio de 2021.	90.3 %	EN EJECUCION	



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 05

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 31/10/2021
PERIODO: 01/10/2021 - 31/10/2021

2.2. DISTRITO HIDRÁULICO No. 3. CONTRATO DE OBRA No. 041 DEL 07 DE ABRIL DE 2021



2.2.1. Información general del contrato.

CONTRATO No	041
FECHA	07 DE ABRIL DE 2021
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL AGUAS 2021 R.L. ANDRES EDUARDO TRUJILLO ARANGO
CLASE	OBRA
VALOR	TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SIETE PESOS MCTE (\$3.528.154.037)
PLAZO	CIENTO OCHENTA (180) DIAS
FECHA DE INICIO	02 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TERMINACION	28 DE NOVIEMBRE DE 2021
OBJETO	REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 3 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE.



INFORME DE INTERVENTORIA No. 05
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 31/10/2021
PERIODO: 01/10/2021 – 31/10/2021

2.2.2. Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes

CALLE/TRAMO	ESTADO INICIAL	
CARRERA 10 SUR ENTRE CALLES 24 Y 27 BARRIO VILLA CLAUDIA	VIA CON PAVIMENTO EN MAL ESTADO. RED DE ALCANTARILLADO EN AVANZADO ESTADO DE DETERIORO, COLAPSADA EN ALGUNOS TRAMOS, CON HUNDIMIENTOS Y CARCAVAS SOBRE LA VIA	
LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR	
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reposición de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial con sus correspondientes acometidas domiciliarias. ➤ Excavaciones con medio mecánico y entibado en los tramos donde la altura y condición del terreno lo requieran. ➤ Protección de los tramos a construir con revestimiento de la tubería en tramos donde el sistema no cuenta con la profundidad necesaria para estar acorde con la normativa vigente. ➤ Transporte interno de materiales y tuberías. ➤ Rellenos en recebo compactado sobre las líneas del alcantarillado y acueducto. 	
REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL		
		



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 05

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 31/10/2021
PERIODO: 01/10/2021 - 31/10/2021

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE OCTUBRE

ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES

- Se llevó a cabo la reposición de la red de alcantarillado de aguas residuales en los siguientes tramos: PZ 8A A PZ 5
- Se llevó a cabo la rotura del pavimento asfáltico tanto de la red principal como de las acometidas domiciliarias.
- Se llevaron a cabo las excavaciones a máquina a lo largo del tramo antes mencionado.
- Se realizó entibado en madera a lo largo del tramo intervenido, dada la profundidad de la excavación y la inestabilidad del terreno.
- Se realizó la instalación de la cama de grava para la tubería a lo largo de la línea de la red
- Se instaló tubería plástica de 20" en el tramo ya mencionado.
- Se llevaron a cabo los llenos en recebo compactado a lo largo del tramo intervenido.
- Se realizaron las acometidas domiciliarias del alcantarillado a lo largo del tramo citado.
- Se llevó a cabo el cargue y retiro de sobrantes producto de las excavaciones.

ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS

- En el presente período se llevaron a cabo trabajos sobre la red de aguas lluvias en los siguientes tramos: PZ11a A PZ6.
- Se llevó a cabo la rotura del pavimento asfáltico a lo largo de la red.
- Se llevaron a cabo las excavaciones a máquina a lo largo del tramo antes mencionado.
- Se realizó entibado en madera a lo largo del tramo intervenido, dada la profundidad de la excavación y la inestabilidad del terreno.
- Se realizó la instalación de la cama de grava para la tubería a lo largo de la línea de la red
- Se instaló tubería plástica de 16" en el tramo intervenido.
- Se llevaron a cabo los llenos en recebo compactado a lo largo del citado tramo.
- Se llevó a cabo el cargue y retiro de sobrantes producto de las excavaciones.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE

- EXCAVACIONES TRAMOS DE RED RESIDUAL 20" Y RED LLUVIAS 16"



Dirección: Centro Comercial Arroyuelos, Local 6, Ibagué, Tolima.

Teléfono: 300 556 1508 - Correo electrónico: interventoriaexterna2021@gmail.com



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 05

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 31/10/2021
PERIODO: 01/10/2021 – 31/10/2021

➤ CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION



DERRUMBES SOBRE LA RED



➤ INSTALACION DE TUBERIA



RELLENO CON RECEBO





INFORME DE
INTERVENTORIA No. 05

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 31/10/2021
PERIODO: 01/10/2021 - 31/10/2021

<p>CALLE 24 ENTRE KRA 1 Y 2 SUR BARRIO LAS FERIAS</p>	<p>VIA PAVIMENTADA EN MAL ESTADO CON POZOS TOTALMENTE COLMATADOS AL IGUAL QUE UNOS TRAMOS DE TUBERIA, SOCAVACION DE GRAN TAMAÑO. TRAMO EN TUBERIA DE 20" EN CONCRETO DE DETERIORO, TRAMOS COLAPSADA O TAPONADA O DESENCAJADA O ETC.</p> <p>VIA PAVIMENTADA EN MAL ESTADO CON BACHES, POZOS SIN TAPAS, TUBERIA DE ALCANTARILLADO APLASTADAS, QUE COLAPSAN CUANDO LLUEVE, TUBERIA DE 24 Y 30 EN CONCRETO QUE ENTREGAN AL BOX COULVER DE LA KRA 2 SUR, SE ESTA PENDIENTE DE INSPECCION CON EL ROBOT EN UN RAMAL.</p>
<p>LOCALIZACIÓN</p>	<p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR</p>
	<ul style="list-style-type: none">➤ Instalación de tubería novafort en dos ramales uno de aguas servidas de 24 pulgadas y el otro en 33 pul de aguas lluvias que entregan al Box coulvert➤ Protección de los tramos a construir con revestimiento de la tubería en tramos donde el sistema no cuenta con la profundidad necesaria para estar acorde con la normativa vigente.
<p>REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL</p>	
	<ul style="list-style-type: none">➤ Transporte interno de materiales y tuberías.➤ Retiro de material de excavación y llevado a la escombrera



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 05

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 31/10/2021
PERIODO: 01/10/2021 – 31/10/2021

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE OCTUBRE

RED NO.3 – AGUAS RESIDUALES

- No se realizaron trabajos sobre esta red, porque ya se cambiaron todos los tramos a intervenir.

RED NO.2 – AGUAS LLUVIAS

- Se llevó a cabo la reposición de la red de alcantarillado de aguas lluvias en el tramo PASACALLE al POZO 1 en diámetro de 24"
- Se llevó a cabo la rotura del pavimento asfáltico en la red principal.
- Se llevaron a cabo las excavaciones manuales a lo largo del tramo antes mencionado.
- Se instaló tubería plástica de 24" en el tramo ya mencionado
- Se realizó la adecuación sobre el pasacalle a la tubería.
- Se llevaron a cabo los llenos en recebo compactado.
- Se llevó a cabo el cargue y retiro de sobrantes producto de las excavaciones.

RED NO.1 – AGUAS RESIDUALES

- Se llevó a cabo la reposición de la red de alcantarillado de aguas residuales del PZ 7 al PZ 5 y del PZ 5 al PZ 5ª Y del PZ 5A al PZ AUX. terminando la reposición de las redes.
- Se llevó a cabo la rotura del pavimento asfáltico tanto de la red principal como de sus acometidas domiciliarias.
- Se llevaron a cabo las excavaciones a máquina a lo largo de los tramos antes mencionados.
- Se instaló tubería plástica de 24" en los tramos ya mencionados
- Se llevaron a cabo los llenos en recebo compactado.
- Se llevó a cabo el cargue y retiro de sobrantes producto de las excavaciones
- Se efectuó la reposición de la tubería de 6" en las acometidas domiciliarias encontradas en el tramo, las cuales fueron revestidas dada la profundidad de las mismas.

RED DE ACUEDUCTO

- Se iniciaron las excavaciones para la instalación e tubería en la red principal
- Se instaló cama de arena para protección de tubería
- Se instalaron tuberías de acueducto pvc 3" y 2" RDE 21 sobre la red principal
- Se realizaron pruebas hidrostáticas a la tubería instalada
- Se llevaron a cabo los llenos en recebo compactado sobre la red principal
- Se inició la instalación de accesorios para acometidas domiciliarias en los tramos intervenidos.

Dirección: Centro Comercial Arroyuelos, Local 6, Ibagué, Tolima.

Teléfono: 300 556 1508 - Correo electrónico: interventoriaexterna2021@gmail.com



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 05

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 31/10/2021
PERIODO: 01/10/2021 - 31/10/2021

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE

➤ RUTURA DE PAVIMENTO



REVESTIMIENTO EN CONCRETO.



➤ INSTALACION TUBERIA DE 24"



RELLENO CON RECEBO





INFORME DE
INTERVENTORIA No. 05

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 31/10/2021
PERIODO: 01/10/2021 - 31/10/2021

➤ RECUPERACION DE SUMIEROS



CAMBIO TAPAS DE POZOS DE INSPECCION



➤ INSTALACION CAMA DE ARENA Y TUBERÍA ACUEDUCTO PVC 3"







INFORME DE
INTERVENTORIA No. 05

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 31/10/2021
PERIODO: 01/10/2021 - 31/10/2021

CALLE/TRAMO	ESTADO INICIAL
CARRERA 12SUR ENTRE CALLES 20A - 21 Y CARRERA 11C ENTRE 20A -20B BARRIO RICAURTE	VIA CON PAVIMENTO EN MAL ESTADO. RED DE ALCANTARILLADO EN MORTERO POZOS DE INSPECCION TAPADOS BAJO LA RAZANTE DE LA VIA
LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR
	<ul style="list-style-type: none">➤ Reposición de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario con sus correspondientes acometidas domiciliarias.➤ Excavaciones con medio mecánico y entibado en donde la altura y condición del terreno lo requieran.➤ Transporte interno de materiales y tuberías.➤ Rellenos en recebo compactado sobre las líneas del alcantarillado y acueducto.
REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL	
	

Dirección: Centro Comercial Arroyuelos, Local 6, Ibagué, Tolima.

Teléfono: 300 556 1508 - Correo electrónico: interventoriaexterna2021@gmail.com



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 05

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 31/10/2021
PERIODO: 01/10/2021 – 31/10/2021

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE OCTUBRE

ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES

- Se llevó a cabo la construcción de acometidas domiciliarias con sus correspondientes cajas de inspección en los tramos PZ1 – PZ4, PZ1 – PZ3, PZ1 – PZ5

RED – ACUEDUCTO

- Se llevaron a cabo excavaciones para la red de acueducto en los siguientes tramos:
- Tramo 1: Carrera 11 C entre calles 20 y 20 A – Callejón Cra 11 C con calle 20 Bis
- Tramo 2: Calle 20 A entre carreras 11 B y 11 C
- Tramo 3: Carrera 11 C entre calles 20 A y 20 B
- Se instaló cama de arena para apoyo y recubrimiento de la tubería a lo largo de los tramos antes mencionados.
- Se llevó a cabo la instalación de Tubería PVC 3" RDE 21 en los tramos citados.
- Se efectuó la demolición de la estructura de pavimento en cada uno de los tramos intervenidos.
- Se realizó el retiro de sobrantes correspondiente.
- Se efectuó la prueba hidrostática de la tubería instalada.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE

- EXCAVACIONES PARA ACOMETIDAS Y CAJAS DOMICILIARIAS



Dirección: Centro Comercial Arroyuelos, Local 6, Ibagué, Tolima.

Teléfono: 300 556 1508 - Correo electrónico: interventoriaexterna2021@gmail.com




INFORME DE
INTERVENTORIA No. 05

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 31/10/2021
PERIODO: 01/10/2021 – 31/10/2021

➤ DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO

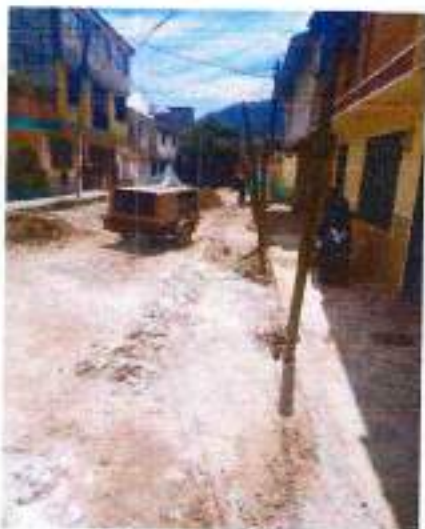

EXCAVACIONES RED DE ACUEDUCTO



➤ EXCAVACIONES RED PRINCIPAL, CAMA DE ARENA E INSTALACION TUBERÍA PVC 3"





INFORME DE
INTERVENTORIA No. 05

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 31/10/2021
PERIODO: 01/10/2021 - 31/10/2021

CALLE/TRAMO	ESTADO INICIAL
CALLE 21A ENTRE CARRERAS 13SUR -14 SUR CALLE 23 ENTRE CARRERAS 11SUR Y 12SUR BARRIO RICAURTE	VIA CON PAVIMENTO EN CONCRETO EN MAL ESTADO. RED DE ALCANTARILLADO EN MORTERO
LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR
	<ul style="list-style-type: none">➤ Reposición de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario con sus correspondientes acometidas domicillarias.➤ Excavaciones con medio mecánico y entibado en donde la altura y condición del terreno lo requieran.➤ Transporte interno de materiales y tuberías.➤ Rellenos en recebo compactado sobre las líneas del alcantarillado y acueducto.
<p>REGISTRÓ FOTOGRAFICO INICIAL</p> 	



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 05

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 31/10/2021
PERIODO: 01/10/2021 - 31/10/2021

➤ CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REVESTIMIENTO DE TUBERÍA PVC 6"



➤ CONSTRUCCION ACOMETIDAS DOMICILIARIAS



➤ CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION






INFORME DE
INTERVENTORIA No. 05

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 31/10/2021
PERIODO: 01/10/2021 – 31/10/2021

CALLE/TRAMO	ESTADO INICIAL
CALLE 23 B CON CARRERAS 12 SUR – 12 A – 13 Y CARRERA 12 A ENTRE 23B Y 23C BARRIO VILLA LUCES	VIA CON PAVIMENTO EN CONCRETO EN MAL ESTADO. RED DE ALCANTARILLADO EN MORTERO
LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR
	<ul style="list-style-type: none">➤ Reposición de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario con sus correspondientes acometidas domiciliarias.➤ Excavaciones con medio mecánico y entibado en donde la altura y condición del terreno lo requieran.➤ Transporte interno de materiales y tuberías.➤ Rellenos en recebo compactado sobre las líneas del alcantarillado y acueducto.
REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL	
	



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 05

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 31/10/2021
PERIODO: 01/10/2021 - 31/10/2021

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE OCTUBRE

ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES

- Se llevó a cabo la construcción del cerramiento perimetral en lona en los tramos a intervenir.
- Se realizó la demolición del pavimento para las acometidas tramo PZ 2 A PZ 3
- Se llevaron a cabo las excavaciones sobre acometidas domiciliarias a lo largo de los tramos mencionados.
- Se instaló tubería pvc 12" entre los pozos PZ 1 al PZ 2 y PZ 2 AL PZ 3
- Se realizó revestimiento en concreto sobre la red entre pozos PZ 1 y PZ 2
- Se llevó a cabo el lleno en recebo compactado en los tramos PZ 1 al PZ 2 y PZ 2 al PZ 3.
- Se instaló tubería pvc de 6" en acometidas domiciliarias del tramo PZ6 al PZ 6 A Y PZ 2 al PZ 3
- Se realizó cargue y retiro de sobrantes producto de las demoliciones y excavaciones realizadas.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES OCTUBRE

- **INSTALACION Y REVESTIMIENTO EN CONCRETO TUBERÍA PVC 12"**



- **RELLENOS EN RECEBO COMPACTADO Y CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION**



Dirección: Centro Comercial Arroyuelos, Local 6, Ibagué, Tolima.

Teléfono: 300 556 1508 - Correo electrónico: interventoriaexterna2021@gmail.com





INFORME DE
INTERVENTORIA No. 05

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 31/10/2021
PERIODO: 01/10/2021 – 31/10/2021

CALLE/TRAMO	ESTADO INICIAL
CALLE 17B ENTRE CARRERAS 8 Y 9 SUR BARRIO GALAN	VIA CON PAVIMENTO EN CONCRETO EN MAL ESTADO. RED DE ALCANTARILLADO EN MORTERO
LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR
	<ul style="list-style-type: none">➤ Reposición de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario con sus correspondientes acometidas domiciliarias.➤ Excavaciones con medio mecánico y entibado en donde la altura y condición del terreno lo requieran.➤ Transporte interno de materiales y tuberías.➤ Rellenos en recebo compactado sobre las líneas del alcantarillado y acueducto.
REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL	
	



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 05

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 31/10/2021
PERIODO: 01/10/2021 – 31/10/2021

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE OCTUBRE

ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES


- Se llevó a cabo la construcción del cerramiento perimetral en lona.
- Se realizó la demolición del pavimento rígido en los tramos comprendidos entre los pozos PZ 1 al PZ 2, PZ 2 al PZ 3.
- Se llevaron a cabo las excavaciones sobre la red principal a lo largo de los tramos mencionados y se iniciaron las excavaciones para las acometidas domiciliarias en el tramo comprendido entre los pozos PZ 1 al PZ 2.
- Se instaló tubería pvc 10" entre los pozos PZ 1 al PZ 2 y de PZ 2 al PZ 3.
- Se revistió en concreto la tubería de la red principal en la totalidad del tramo PZ 1 al PZ 2 y de manera parcial el tramo PZ 2 a PZ 3, dada la poca profundidad de la red.
- Se llevó a cabo el lleno en recebo compactado en los tramos PZ 1 al PZ 2 y PZ 2 al PZ 3.
- Se instaló tubería pvc de 6" en acometidas domiciliarias del tramo PZ 1 al PZ 2.
- Se realizó cargue y retiro de sobrantes producto de las demoliciones y excavaciones realizadas.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES OCTUBRE

- Entibado e instalación de Tubería Red Principal



- Revestida y Llenos con recebo compactados sobre la red ppal.

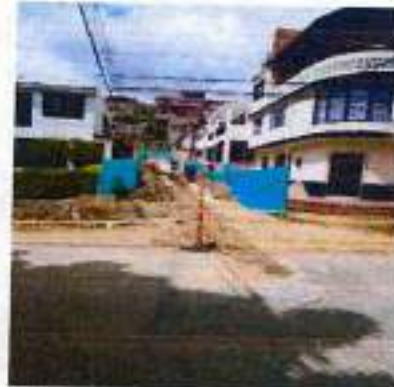
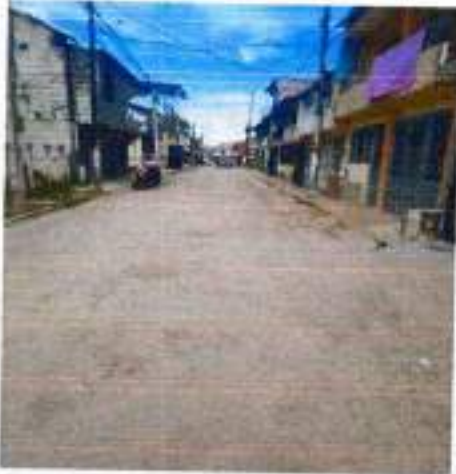




INFORME DE
INTERVENTORIA No. 05

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 31/10/2021
PERIODO: 01/10/2021 - 31/10/2021

CALLE/TRAMO	ESTADO INICIAL
CARRERA 10B SUR ENTRE CALLE 11C Y 12 , CALLE 12 ENTRE CARRERAS 10A Y 10B BARRIO PRIMAVERA SUR	VIA CON PAVIMENTO EN CONCRETO EN MAL ESTADO.
LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR
	<ul style="list-style-type: none">➤ Reposición de las redes de acueducto con sus correspondientes acometidas domiciliarias.➤ Excavaciones mecánicas y manuales donde la altura y condición del terreno lo requieran.➤ Transporte interno de materiales y tuberías.➤ Rellenos en recebo compactado sobre las líneas de acueducto.
REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL	
	



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 05

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 31/10/2021
PERIODO: 01/10/2021 - 31/10/2021

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE OCTUBRE

RED DE ACUEDUCTO

- Se llevó a cabo la construcción del cerramiento perimetral en lona en los tramos a intervenir.
- Se realizó la demolición del pavimento rígido en los tramos a intervenir: Calle 12 entre carreras 10 A y 10 B sur; Carrera 10 B sur entre calles 11 C y 12.
- Se llevaron a cabo las excavaciones sobre la red principal a lo largo de los tramos mencionados.
- Se instaló tubería pvc 3" RDE 21 en los tramos intervenidos.
- Se instaló cama en arena y protección de la tubería instalada.
- Se llevó a cabo el lleno en recebo compactado en los tramos.
- Se realiza demolición para domiciliarias.
- Se realizó cargue y retiro de sobrantes producto de las demoliciones y excavaciones realizadas.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE

➤ CERRAMIENTO EN POLISOMBRA



DEMOLICION DE CONCRETO



➤ EXCAVACIONES RED PRINCIPAL



INSTALACION TUBERIA PVC 3"





**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 05**

**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**
FECHA INFORME: 31/10/2021
PERIODO: 01/10/2021 - 31/10/2021

➤ PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIA 3"



INSTALACION ACOMETIDAS DOMICILIARIAS



2.2.3. Seguimiento a garantías contractuales

Contrato de Obra No. 041 de 2021				
No.	Aseguradora	Amparo	Vigencia	Observaciones
I-100004333	SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	07/04/2021 04/04/2022	
I-100004333	SEGUROS MUNDIAL	SALARIOS Y PRESTACIONES	07/04/2021 04/10/2024	
I-100004333	SEGUROS MUNDIAL	CALIDAD DEL SERVICIO	07/04/2021 04/10/2022	
I-100004333	SEGUROS MUNDIAL	ESTABILIDAD	04/10/2021 04/10/2026	
I-100001109	SEGUROS MUNDIAL	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC.	07/04/2021 04/10/2022	

2.2.4. Avance físico

A la fecha del presente informe se evidencia el siguiente avance.

CUADRO COMPARATIVO DE ACTIVIDADES						
MESES	1	2	3	4	5	6
PROGRAMADO	12%	15%	23%	20%	15%	15%
EJECUTADO	7.21%	12.39%	12.4%	13%	0%	0%
EJECUTADO ACUMULADO	7.21%	19.6%	32%	45%		



INFORME DE INTERVENTORIA No. 05
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 31/10/2021
PERIODO: 01/10/2021 - 31/10/2021



2.2.5. Avance financiero

Durante la ejecución del contrato se han suscrito cuatro actas parciales que muestran un valor acumulado al mes de septiembre de \$ 1.756.976.944,54 equivalente al 49.8% del valor del contrato que corresponde a la suma de \$3.528.154.036,84. Sin embargo, a la fecha de realización del presente informe el contratista se encuentra elaborando el acta No.5 que corresponde a las actividades ejecutadas durante el mes de octubre de 2021 en el cual se alcanza un avance físico de las obras de aproximadamente el 60%.

VALOR CONTRATADO	\$3.528.154.036,84	
VALOR EJECUTADO		\$1.100.227.611,38
VALOR POR EJECUTAR		\$2.427.926.425,46
SUMAS IGUALES	\$3.528.154.036,84	\$3.528.154.036,84





INFORME DE
INTERVENTORIA No. 05

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 31/10/2021
PERIODO: 01/10/2021 – 31/10/2021

2.2.6. Gestión de las comunicaciones

Se anexa correspondencia relacionada al distrito 3.

2.2.7. Información relacionada con los ensayos de laboratorio.

Se anexan resultados de ensayos de laboratorio practicados durante el periodo del presente informe.

2.2.8. Dificultades en la ejecución de los proyectos

INCONVENIENTE	SOLUCIÓN	PROCESO / AVANCE A FECHA DE CORTE DE ESTE INFORME
<p>Durante el periodo del presente informe continuaron las fuertes lluvias sobre la zona de intervención en los diferentes frentes de obra generando la suspensión de la ejecución de los trabajos durante largos periodos de tiempo, así como la pérdida de trabajos realizados y el retraso para el inicio de otras actividades dada la saturación de los materiales.</p> <p>El mal estado de las redes de alcantarillado existentes, donde en sectores como Villa Claudia se encontraron tramos en los que el alcantarillado se perdió totalmente y el agua fluye a través del terreno, ha generado condiciones de inestabilidad del terreno que hacen mucho más difícil y lento el proceso de las excavaciones e instalación de tuberías. Se presentan grandes sobre anchos que dificultan a su vez el ingreso de volquetas para el retiro de materiales.</p> <p>Algunos contratistas han manifestado la dificultad para conseguir de manera oportuna las tuberías y accesorios. Al parecer ha aumentado el valor de la materia prima y se presenta cierta escasez en dichos elementos, lo cual influye en la ejecución rápida de los trabajos.</p>	<p>Esperar que cesen las lluvias y disminuya la saturación de materiales para poder ejecutar los trabajos.</p> <p>Se realizan las excavaciones con mucho cuidado, entibando los taludes para protección del personal que instalará la tubería. Se realiza el sobre acarreo de materiales a sitios donde se permita el ingreso de volquetas para su retiro a los lugares de disposición final.</p> <p>Hacer trámites de consecución de materiales con proveedores a nivel local y nacional.</p>	<p>Trabajos en ejecución.</p> <p>Trabajos en ejecución</p> <p>Trabajos en ejecución.</p> <p>Trabajos en ejecución.</p>

**CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
NIT. 901.479.007-6**

INFORME	PERIÓDICO: <input checked="" type="checkbox"/> ÚNICO: <input type="checkbox"/>	No: 02
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	\$607.718.110,29	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
NUMERO:	0041 DEL 7 DE ABRIL DE 2021
CONTRATANTE:	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL AGUAS – RL ANDRÉS EDUARDO TRUJILLO ARANGO
OBJETO	REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 3 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE
VALOR:	\$3.528.154.037
PLAZO (En días calendario)	CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO
SUPERVISOR:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO III GESTIÓN ACUEDUCTO Y PROFESIONAL ESPECIALIZADO III GESTIÓN ALCANTARILLADO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA EXTERNA IBAL
FECHA DE INICIO: (Día/mes/año)	02 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN (Día/mes/año)	28 DE NOVIEMBRE DE 2021

Dirección: Av. Ambalá No. 90 – 04, Centro Comercial Arroyuelos, Local 6,
Ibagué, Tolima.

Teléfono: 300 556 1508 - Correo electrónico: interventoriaexterna2021@gmail.com

CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
NIT. 901.479.007-6

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

Como interventor, certifico que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato.

Así mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió a cabalidad el objeto del contrato y aportó el informe de las actividades desarrolladas, las copias de planillas y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme a la ley, así como del personal involucrado en la ejecución del contrato

Que toda la información hace parte integral del presente informe el cual se remitirá a la dirección de contratación a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.

Por lo cual esta interventoría avala el pago de la presente cuenta correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2021.

Por lo anterior se firma a los 1 días del mes de noviembre de 2021.



LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMÍREZ

Representante legal

CONSORCIO INTERVENTORÍA EXTERNA IBAL

Contrato No 063 de 2021

Dirección: Av. Ambalá No. 90 – 04, Centro Comercial Arroyuelos, Local 6,
Ibagué, Tolima.

Teléfono: 300 556 1508 - Correo electrónico: interventoriaexterna2021@gmail.com



**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES
AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES PARA
CONTRATOS DE OBRA**

CÓDIGO: GJ-R-061

FECHA VIGENCIA:
2019-09-19

VERSIÓN: 01

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Página 1 de 2

CONTRATO DE OBRA N° 041 DEL 07 DE ABRIL DE 2021

CONTRATANTE EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
S.A E.S.P OFICIAL - IBAL S.A. E.S.P OFICIAL

CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021

OBJETO	REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 3 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SAESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE
PLAZO INICIAL	CIENTO OCHENTA (180) DÍAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO	02 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE NOVIEMBRE DE 2021
VALOR INICIAL	TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$3'528.154.037,00).
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORÍA EXTERNA DEL IBAL

El suscrito LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMÍREZ representante legal del CONSORCIO INTERVENTORÍA EXTERNA IBAL, en su calidad de INTERVENTOR del contrato en mención:

CERTIFICA:

Contratista persona natural <input type="checkbox"/>	Contratista persona jurídica <input checked="" type="checkbox"/>
2. El contratista presentó la planilla número _____ de fecha _____ en la que consta que ha efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión, y riesgos	2. El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social



**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES
AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES PARA
CONTRATOS DE OBRA**

CÓDIGO: GJ-R-061

FECHA VIGENCIA:
2019-09-19

VERSIÓN: 01

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Página 2 de 2

laborales, de él y del personal a cargo
(Cuando a ello hubiere lugar), para el
periodo de _____.
Verificado el monto de cada uno de los
aportes en la planilla, se constató que se
ajusta a la base de liquidación que aplica
para este tipo de contratos.

Integral y pagos de parafiscales a que
hubiere lugar.

Se expide la presente constancia para efectos del respectivo pago en la ciudad de Ibagué,
a los 1 días del mes de noviembre del año 2021.

LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMÍREZ
Representante legal
Consortio interventoría externa IBAL



UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021

**EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL AGUAS 2021
NIT 901.471.171-1**

CERTIFICA

Qué la UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021 NIT 901.471.171-1, como los miembros que lo conforman, ASFALTEMOS S.A.S con NIT 900.278.276-4 - GRUPO EMPRESARIAL INGECOL S.A.S con NIT 900.379.869-5, el personal utilizado y vinculado para la ejecución del contrato No 0041 del 07 de abril de 2021, suscrito con la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL, cuyo objeto es, "REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 3 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE", han cumplido con la afiliación y pago de los aportes al sistema de seguridad social integral del periodo comprendido entre el 01 y 31 de octubre de 2021.

De igual forma manifiesto que asumimos cualquier clase de responsabilidad derivada de los pagos del sistema de seguridad social del personal utilizado y vinculado para la ejecución del contrato No 0041 del 07 de abril de 2021.

La presente certificación se expide para que haga parte de los documentos de cobro del acta parcial No 05.

Cordialmente,

ANDRES EDUARDO TRUJILLO ARANGO

Representante Legal

UNION TEMPORAL AGUAS 2021



UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO
50
LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)**

Yo, **ANDRÉS EDUARDO TRUJILLO ARANGO**, identificada con C.C Nro. 79.689.814 de Bogotá, en mi condición de representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021**, identificada con Nit 901.471.171-1, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Ibagué, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, CERTIFICO que la **UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021** se encuentra al día en el pago de los aportes de salud, Pensión, Riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje (1), por los aportes pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, incluido el mes de octubre.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002

La presente se expide a los 1 días del mes de noviembre del año 2021

ANDRÉS EDUARDO TRUJILLO ARANGO
CC. 79.689.814 de Bogotá
Representante legal

(1) La empresa aplica a la exoneración de aportes consagrada en el artículo 114 E.T.



**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50
LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)**

Yo, **YENNY MILENA AGUIAR OVIEDO**, identificada con C.C Nro. 28.548.551 de Ibagué, y con tarjeta profesional No. 95111-T de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de la empresa **ASFALTEMOS S.A.S**, identificada con Nit 900.278.276-4, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Ibagué, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, CERTIFICO que la empresa **ASFALTEMOS S.A.S** se encuentra al día en el pago de los aportes de salud, Pensión, Riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje (1), por los aportes pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, incluido el mes de OCTUBRE

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

La presente se expide a los 1 días del mes de noviembre del año 2021



YENNY MILENA AGUIAR OVIEDO
C. de C. N° 28.548.551 de Ibagué
T.P 95111 - T
Revisor fiscal

(1) La empresa aplica a la exoneración de aportes consagrada en el artículo 114 E.T.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E 8 A 2 0 B 6 6 A 9 A 4 7 B A 6

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YENNY MILENA AGUIAR OVIEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 28548551 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 95111-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Noviembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
 NUMERO 28.548.551
 AGUIAR OSORDO
 YENNY AILEEN



FECHA DE NACIMIENTO 24-SEP-1979
 SAN ANTONIO
 (TOLIMA)
 LUGAR DE NACIMIENTO
 1.59 O+ F
 ESTATURA G.S. P.M. SEXO
 28-OCT-1987 ISAGUE
 FECHA Y LUGAR DE EMISION




MINISTERIO NACIONAL
 DE DEFENSA

A-300110-01-17120 P-02226-0201-0206024 00775011224 02 00000213

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES




95111-T



YENNY MILENA
AGUIAR OVIEDO
C.C. 28548551

RES. INSCRIPCIÓN 173 DEL 26/09/2003
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

260751


OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

98451

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.



FIRMA

78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
78	CC	VALBUENA	VALBUENA	CC	COPIA	26	14-11	30	19	19												
79	CC	VALBUENA	VALBUENA	CC	COPIA	26	14-11	15	15	15												
80	CC	VALBUENA	VALBUENA	CC	COPIA	26	14-11	15	15	15												
81	CC	VALBUENA	VALBUENA	CC	COPIA	26	14-11	15	15	15												
82	CC	VALBUENA	VALBUENA	CC	COPIA	26	14-11	15	15	15												
83	CC	VALBUENA	VALBUENA	CC	COPIA	26	14-11	15	15	15												
84	CC	VALBUENA	VALBUENA	CC	COPIA	26	14-11	15	15	15												
85	CC	VALBUENA	VALBUENA	CC	COPIA	26	14-11	15	15	15												
86	CC	VALBUENA	VALBUENA	CC	COPIA	26	14-11	15	15	15												
87	CC	VALBUENA	VALBUENA	CC	COPIA	26	14-11	15	15	15												
88	CC	VALBUENA	VALBUENA	CC	COPIA	26	14-11	15	15	15												
89	CC	VALBUENA	VALBUENA	CC	COPIA	26	14-11	15	15	15												
90	CC	VALBUENA	VALBUENA	CC	COPIA	26	14-11	15	15	15												
91	CC	VALBUENA	VALBUENA	CC	COPIA	26	14-11	15	15	15												
92	CC	VALBUENA	VALBUENA	CC	COPIA	26	14-11	15	15	15												
93	CC	VALBUENA	VALBUENA	CC	COPIA	26	14-11	15	15	15												
94	CC	VALBUENA	VALBUENA	CC	COPIA	26	14-11	15	15	15												
95	CC	VALBUENA	VALBUENA	CC	COPIA	26	14-11	15	15	15												
96	CC	VALBUENA	VALBUENA	CC	COPIA	26	14-11	15	15	15												
97	CC	VALBUENA	VALBUENA	CC	COPIA	26	14-11	15	15	15												
98	CC	VALBUENA	VALBUENA	CC	COPIA	26	14-11	15	15	15												
99	CC	VALBUENA	VALBUENA	CC	COPIA	26	14-11	15	15	15												
100	CC	VALBUENA	VALBUENA	CC	COPIA	26	14-11	15	15	15												

RESUMEN DE PAGO					
HEMERA	CODIGO	MIT	EV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
APP (ADMINISTRADORAS): 4					\$17,489,200
COLPENSOS	23001	860,227,148	6	2	5688,700
COLPENSOS	25-14	905,336,004	7	15	54,514,000
NORFINER	23001	860,224,808	8	11	59,425,400
PRUTECIDA	23001	860,223,729	0	29	\$11,659,100
ARL (ADMINISTRADORAS): 1					\$10,870,800
ARL 308A	14-11	890,903,190	5	78	\$10,870,800
CCF (ADMINISTRADORAS): 2					56,701,800
COMPAGNY	CFPT9	891,800,213	8	1	5131,500
COMPTALCO TOLIMA	CFPT9	890,700,348	4	77	56,569,900
EPS (ADMINISTRADORAS): 18					\$9,624,900
ADMCT SALUD EPS SAS	ESCL02	900,915,126	7	1	573,400
COOMEVA	EPSE16	800,000,407	1	2	1164,500
PAISURARA	EPSE17	800,003,564	7	4	1194,000
FOTYCA	MA001	901,037,916	1	2	595,800
MEDIMAS EPS	EPSE44	901,097,473	3	7	\$2,315,700
NUENA E.P.S.	EPSE17	900,156,264	2	14	8842,500
NUENA EPS ADELINDA	EPSE41	900,156,264	2	5	1194,500
PLADALLID	EPSE04	809,008,202	2	1	544,000
SALUD TOTAL	EPSE02	800,130,407	4	26	\$1,278,000
SARITAS	EPSE85	800,231,448	5	24	\$2,891,200
ICBF (ADMINISTRADORAS): 1					5979,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	895,999,238	2	2	5979,600
SONA (ADMINISTRADORAS): 1					5653,000
SONA	PAEONA	895,999,034	1	2	5653,000
TOTAL				83	\$57,013,300


Bogotá D.C., 1 de diciembre de 2021

CERTIFICACIÓN

El Revisor Fiscal, **MÓNICA ANDREA MARTÍNEZ IDÁRRAGA** identificada con la C.C. 1.110.470.422 de Ibagué, certifica que la empresa **GRUPO EMPRESARIAL INGECOL SAS**, identificada con Nit. No. 900.379.869-5, se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, correspondiente a los seis (6) meses anteriores. Así mismo, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 1828 de 2013 y el artículo 65 de la Ley 1819 del 2016 la compañía **GRUPO EMPRESARIAL INGECOL SAS**, identificada con Nit. No. 900.379.869-5, se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente:



MÓNICA ANDREA MARTÍNEZ IDÁRRAGA

C.C. No. 1.110.470.422 de Ibagué

T.P: 172.198-T

Revisora Fiscal Designada por la firma Audi-Gestión Ltda.

GRUPO EMPRESARIAL INGECOL SAS

NIT. 900.379.869-5

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 F A 3 F A C 6 3 6 0 1 F 3 4 8

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MONICA ANDREA MARTINEZ IDARRAGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1110470422 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 172198-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 21 días del mes de Octubre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 8 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.110.470.422**

MARTINEZ IDARRAGA

APELLIDOS
MONICA ANDREA

NOMBRES
Monica Andrea Martinez



FECHA DE NACIMIENTO **04-MAR-1988**

LUGAR DE NACIMIENTO
IBAGUE (TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 **O+** **F**

ESTATURA **6 5. AN** SEXO

FECHA Y LUGAR DE EMISION
27-ABR-2008 IBAGUE

REGISTRACION NACIONAL
Cedula de Ciudadania



A-2008150-00002801 F-1110470422-20101905 00113140100 1 000047402

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



172198-T

**MONICA ANDREA
MARTINEZ DARRAGA**
C.C. 1110470422

RESOLUCION INSCRIPCION 355 FECHA 25/10/2012
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

183571

MONICA ANDREA MARTINEZ

FIRMA DEL TITULAR

100050

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.





FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSION: 01

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación: Fecha evaluación: _____ Reevaluación: Fecha reevaluación: _____
 Acta Parcial N° _____ Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 07 DE ABRIL DE 2021
 NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AGUAS 2021 NIT: 901 471 171-1
 FECHA DE INICIO: 2 JUNIO DE 2021 FECHA DE TERMINACION: 28 DE NOVIEMBRE DE 2021
 OBJETO DEL CONTRATO: "REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 3 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SAESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE"

CLASE DE CONTRATO

- 1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION
- 2. SUMINISTRO Y ADQUISICION
- 3. ARRENDAMIENTO
- 4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA
- 5. SERVICIO
- 6. SEGUROS
- 7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS
- 8. OBRA PUBLICA

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

1. OBRA PUBLICA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	4	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	4
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	4	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL CONTRATADO	4
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.	4	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	4
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	4	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	4
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	4
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	4	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	4
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA OPORTUNA DEL PEGMA	4	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	4
		PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4
		ATENCION DE REQUERIMIENTOS	4
TOTAL PROMEDIO	4	TOTAL PROMEDIO	4

CRITERIOS DE CALIDAD

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	EVALUACION TOTAL
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	4	
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	4	
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	4	
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	4	
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	4	
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	4	
TOTAL PROMEDIO	4	4

A



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ____ REEVALUACIÓN ____ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuenta con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ____ REEVALUACIÓN ____ POR PARTE DEL CONTRATISTA:

INTERPONE RECURSO DE REPOSICIÓN

SI

NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION

SI

NO

NOTA INFORMATIVA: (Aplica únicamente para la reevaluación) De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual término a cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluación de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripción.

SI

NO

NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuenta con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades):


MATEO CASAS MIRANDA

NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

ANDRES EDUARDO TRUJILLO ABANGÓ

Espacio para
Logo Corporativo

UNION TEMPORAL AGUAS 2021
NIT 901.471.171-
AV AMBALA No. 69-80 CENTRO COMERCIAL
PLAZAS DEL BOSQUE LOCAL 305
Tel: (038) 2755412)
Ibagué - Colombia
contador@estabemos.co

Factura electrónica de venta
No. UTAG-7

Señoras EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.
OFICIAL
NIT 800.069.809-6 Teléfono (038) 2756000
Dirección Carrera 3 No. 1 - 04 B/La Pola Ciudad Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 14/12/2021, 15:22
Expedición 14/12/2021, 15:23
Vencimiento 14/12/2021

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE OBRA	1.00	607,718,110.29

Total Items: 1

Valor en Letras:

Seiscientos siete millones setecientos dieciocho mil ciento diez pesos m/cte con veintinueve cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 607,718,110.29

Total Bruto	607,718,110.29
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	607,718,110.29

Observaciones:

ACTA PARCIAL DE COBRO No. 5
OBJETO: REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL
SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO
No. 3 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP
OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 6 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en esta factura - Valor. Número Autorización 18764014833628 aprobado en 20210624 prefijo UTAG desde el número 1 al 500
Vigencia: 12 Meses Meses

- Actividad Económica 4200 Construcción de otras obras de ingeniería civil Terfs
CUPE: f4bce03cc38ba90c940163f00ca3122d2129944e281808cbace9d064ed27123359c9001b440424d4cb2373e7e910e
