




instalacion de tuberias de la red de acueducto linea 1
continuando se instala 5 tubos con su respectivo
arena y lleno en tierra con su compactacion.
Durante la excavacion se percibe un dora en la tuberia
existente dora que estaba presente antes de
ejecutar actividades procedemos con su arreglo
y continua las actividades se senaliza el frente de
obra. Se instala la linea 1 a su totalidad



Residente de Obra


Residente Intercomunal

02/01/22
Clima = Soleado
Magenencia =
Personal = Ing Residente
Ing Aux
Inspector
Cadenero
Siso
Maestro
Ayudantes

Descripcion: Se da inicio a la jornada laboral realizando
la excavacion manual del cruce de la calle 25 con era 10
Se labora hasta medio dia se realiza senalización de
frente de obra.


Residente de Obra


Residente Intercomunal

02/01/22
Clima = soleado
Magenencia = Retroexcavadora
Personal = Ing Residente
Ing Aux
Inspector
Cadenero


Siso

Maestro

Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando excavación a máquina para red de alcantarilla línea 2 excavando 25 m² e instalando 6 tuberías con su respectiva cuneta y lleno en recebo con su compactación. Se realiza señalización y limpieza del frente de obra.


Residente de Obra


Residente Interventoria

03/05/2022 Clima = Soleado

Máquina = Retroexcavadora

Personal = Ing Residente

Ing Aux

Inspector

Cadenero

Siso


Maestro

Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando marcación del eje para realizar excavación para red de alcantarilla línea 2 se excavan 18 m² y se instalan 3 tuberías con su respectiva cuneta y lleno en recebo con su compactación.


Se realiza espigote para búsqueda de tubería en el cruce de la calle 28 con vía 10.

Se realiza retiro material excavación y señalización del frente de obra.


Residente de Obra


Residente Interventoria


04/05/2022: SE REITERA LA NECESIDAD DE HACER EL RETIRO DE MATERIAL SOBRESORTE DE LAS EXCAVACIONES EL CUAL SE ENCONTRARA SOBRE LA VIA CAUSANDO INCORMODIDAD A LA COMUNIDAD. YA SE ENCONTRARA EN SERVICIO EL BOMBERO, POR TANTO NO DEBE HABER INCONVENIENTES PARA EFECTUAR EL RETIRO Y DISPOSICION DEL MATERIAL.


RESIDENTE INTERVENTOR

05/05/22
Clima = lluvioso
Maquinaria = Retroexcavadora
Personal = Ing Residente
Ing Aux
Ing Residente
Inspector
Cadenero
SISO
Maestro
Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral se presentan lluvias durante la jornada. Se continua con la excavación para la red de acueducto línea 2 se realiza la instalación de 3 tubos con su debida crena y lleno en recebo con su compactación


Residente de Obra


Residente Interventor


06/05/22
Clima = lluvioso
Maquinaria = Retroexcavadora
Personal = Ing Residente
Ing Aux
Inspector
Cadenero
SISO


Mochino
Ayudante

Descripcion = Se da inicio a la jornada laboral continuando la excavacion y instalacion de tuberia para la red de coleccion linea 2.

Por parte de la interventoria se toma la decision de realizar un sumidero en la c/a 10 sur con calle 29 que recogerá las aguas lluvias provenientes del parque situada en la direccion mencionada.

Se realiza la instalacion de 4 tubos con su respectivos arena y lleno en recibo con su compactacion.


Residente de obra



Residente Interventoria


07/05/2022 Clima = lluvias durante la jornada laboral

Maquinaria = Retroexcavadora

- Personal = Ing Residente
- Ing Aux
- Inspector
- Cudenero
- Siso
- Mochino
- Ayudante

Descripcion = Se presentan lluvias fuertes durante la jornada laboral retrasando las actividades programadas para el dia se labora hasta medio dia se sana el frente de obra.


Residente de obra


Residente Interventoria

09/09/22 Clima = Soleado

Maquneria =

Personal = Ing Residente
 Ing Aux
 Inspector
 Cadenero
 Siso
 Maestro
 Ayudante

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando excavación manual para la realización del cruce de la calle 25 con cruce la Sur se realiza la instalación del tubo con su respectiva arena.

Residente de Obra


 Residente Interventoria


10/09/22 Clima = Nublado

Maquneria =

Personal = Ing Residente
 Ing Aux
 Inspector
 Cadenero
 Siso
 Maestro
 Ayudante

Descripción = Se continúa con la excavación manual para la red de caudales línea 2. Se presentan fuertes lluvias durante la tarde retrasando la actividades programadas para la jornada.

Residente de Obra


 Residente Interventoria

11/05/2022

Clima :

Maquinaria :

Personal :

- Ing Residente
- Ing Aux
- Inspector
- Codeneio
- Siso
- Maestro
- Ayudante


De acuerdo a las instrucciones dadas
 Esta mañana respecto a la instalación
 de la cama de arena previa a la instalación
 de tubería de 3" no se dio cumplimiento
 y se instaló la tubería sin haber aplicado
 la cama de arena por tal razón no
 se autoriza ni se autoriza seguir
 instalando tubería hasta tanto no se
 aplique la arena correspondiente.
 A sí mismo debe garantizarse la
 aplicación de la arena en el tramo
 de tubería instalado en el día de hoy.


Francelyn Goyari
 Intermediaria

Se toman las directrices dadas por la interentaria
 se desinstala el tubo de 3" de red de acueducto de
 la línea 2 para corregir la instalación. Se
 instala adecuadamente teniendo en cuenta lo dicho
 por la interentaria.

Se realiza prueba de presión en la línea 1 de
 la red de acueducto principal dando como
 resultado positivo. Se continúan excavaciones
 para la instalación de red línea 2.

Se realizan llenos en recebo en la zona
 de excavación con su debida compactación.


Residente de Obra


Residente Interventor


12/05/22 Clima =

Maquinaria =

Personal = Ing Residente
Ing Aux
Inspector
Cadenero
S.So
Maestro
Ayudante

Descripción = Se continúa con las actividades de excavación para la red de acueducto línea 2 se realiza la excavación del cruce de la calle 24 con crallo y se instala GML de tubería con su respectiva arena y lleno en recebo para continuar con la compactación. Paralelo se realiza la instalación de un tubo en la línea 2 con su respectivos llenos y compactación.


Residente de Obra


Residente Interventor

13/05/22 Clima =


Maquinaria =

Personal = Ing Residente
Ing Aux
Inspector
Cadenero
S.So
Maestro
Ayudante

Descripción = Se da inicio a la prueba laboral

Continuando con la excavación manual para el cruce de la cuneta con calle 245. Se instala un tubo con lee guioneta para darle continuidad a la red.

Se realiza apique para búsqueda de tuberías existentes y accesos en el cruce mencionado. Se presentan lluvias durante la tarde retrasando las actividades programadas.


Residente de Obra


Residente Interventoria

14/05/2022 Clima =

Máximas =

Personal = Ing Residente

Ing Aux

Inspector


Cadenero

SSO

Maestro

Asistente

Descripción = Se presentan lluvias desde las 7:00 hasta las 12:00 retrasando las actividades programadas para la jornada laboral. Se realiza señalización y limpieza del frente de obra.


Residente de Obra


Residente Interventoria

16/05/2022 Clima =

Máximas =

Personal = Ing Residente

Ing Aux

Inspector


Cadenero


S.S.O

Maestro

Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral
 Se presentan lluvias desde 7:00 am hasta 9:00 am
 Se retoman actividades de excavación para la
 instalación de tee en PVC en las cruces portantes.
 Se instala 2 ml de tubería en el cruce
 con su respectiva arena y lleno en recebo con su
 compactación.


 Residente de Obra



 Residente Interventor


Mismo Ojima =

Materiales =

Personal = Inq Residente
 Inq As
 Inspector
 Cudencia
 S.S.O
 Maestro
 Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral
 continuando la excavación manual para la instalación
 de tee PVC 3" en el cruce e instalando
 2 ml de tubería con su respectiva arena y lleno en
 recebo con su compactación. Se presentan lluvias
 durante la tarde retrasando las actividades programadas
 para el día.


 Residente de Obra


 Residente Interventor

18/05/2022


Clima

Máquina =

Personal = Ing Residente
 Ing Aux
 Inspector
 Cadenero
 Siso
 Maestro
 Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral iniciando con las actividades de excavación manual para instalación de acometidas en la red de caueducto de la línea 1.


 Residente de Obra


 Residente Intercentro

19/05/2022

Clima =

Máquina =

Personal = Ing Residente
 Ing Aux
 Inspector
 Cadenero
 Siso
 Maestro
 Ayudantes

Descripción = Se continúa con las excavaciones manuales para la instalación de accesos de las acometidas de la línea 1. Se realiza la instalación para 4 acometidas. Se realiza instalación de arena y lleno en recebo con su compactación. En horas de la tarde se realiza prueba presión para la línea 2 de caueducto corrigiendo portada. Se realiza señalización y limpieza del frente de Obra.

Residente de Obra

Residente Interventoria

20/05/22 Clima =
 Margenencia =
 Personal = Ing Residente
 Ing Aux
 Inspector
 Cadenero
 Siso
 Maestro
 Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral continuando con las excavaciones manuales para la instalación de acometidas en la línea 1 de acueducto se realiza la instalación de accesiones para 6 acometidas realizando la instalación de arena y leño en recebo con su compactación.


Residente de Obra


Residente Interventoria

21/05/22 Clima =
 Margenencia =
 Personal = Ing Residente
 Ing Aux
 Inspector
 Cadenero
 Siso
 Maestro
 Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral. Se presentan lluvias desde 7:00 am hasta 10:00 am. Se retomaron actividades de excavación manual para

acometidas de la línea 1 de red de acueducto
 Se realiza Señalización y limpieza del frente
 de obra. Se labora hasta 12:00 del medio día


 Residente de Obra


 Residente de Intervención

23/05/2022 Clima: Soleado

Maquinaria =

Personal = Ing Residente

Ing Aux

Inspector


Cadenero

Siso

Maestro

Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral
 continuando con las excavaciones manuales,
 cortes de andén con palidera e instalación de
 accesorios para acometidas de acueducto en
 la red Principal línea 1.


 Residente de Obra


 Residente de Intervención

24/05/2022 Clima =

Maquinaria =

Personal = Ing Residente

Ing Aux

Inspector

Cadenero


Siso


Maestro

Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada

laboral realizando excavaciones manuales para acometidas de acueducto en la red principal línea 1. Se realizan 4 acometidas a su totalidad instalando adecuadamente los accesorios y sus llenos con su compactación.


Residente de Obra


Residente Interventor

25/05/22 Clima =

Maquinaria =

Personal = Ing Residente

Ing Aux

Inspector


Cudenero


SISO

Maestro

Ayudantes

Descripción: Continúa la actividad de excavación manual e instalación de accesorios para acometidas de acueducto en la línea 1 dejando a cargo debidamente instalados los accesorios y llenos con su compactación.


Residente de Obra


Residente Interventor

26/05/22 Clima =

Maquinaria =

Personal = Ing Residente

Ing Aux

Inspector

Cudenero


SISO

Maestro

Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando excavaciones para instalación de válvula de lavado la cual se le instala tubería para llegar al pozo 31 de aguas lluvias con 2 uniones universales de 2 pulgadas y un 80 micado. Se continúa con las excavaciones para acometidas de acueducto en la línea 2 de la red principal.


 Residente de Obra


 Residente Interventor

27/05/2022

Clima =

Maquinaria =

Personal = Iny Residente

Iny Aux

Inspector


Cedenero

Siso

Maucho

Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando excavaciones manuales para instalación de accesorios a las acometidas de la línea 2 de la red principal dejando 4 acometidas reditradas a su totalidad.


 Residente de Obra


 Residente Interventor

28/05/2022

Clima =


Maquinaria =


Personal = Iny Residente

Iny Aux

Inspector
Caidenaro
S.S.O
Maestro
Ayudantes

Descripción = Se Continuan las actividades de excavación manual, corte andenes e instalacion de accesorios para acometidas de acueducto en la red principal de la linea 2. Se labara hasta medio dia. Se realiza señalización del frente de obra.


Residente de Obra


Residente Interventor

31/05/12 Clima :

Margenaria :

Personal = Ing Residente
Ing Aux
Inspector
Caidenaro
S.S.O
Maestro
Ayudantes

Descripción = Se Continuan las actividades de excavación manual para acometidas de acueducto en la red principal de la linea 2. Se instalan accesorios para 5 acometidas con sus respectivos codos y recibos con su compostacion.


Residente de Obra

Residente Interventor



**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 12**

**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**

**FECHA INFORME: 01/07/2022
PERIODO: 01/06/2022 - 30/06/2022**

DE 01-06-2022 A 30-06-2022

INFORME DE INTERVENTORIA No.12

**CONTRATO No. 063 DE 06 DE
MAYO DE 2021**


**INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA EJECUCION
DE OBRAS DE REHABILITACION
Y/O RECUPERACION Y/O
REPOSICION DE LAS REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
PARA GARANTIZARLA
CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN
LOS DISTRITOS HIDRAULICOS DEL
PERIMETRO HIDROSANITARIO
DEL IBALS.A. E.S.P OFICIAL EN LA
CIUDAD DE IBAGUE.**

CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL

R.L. LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ

Dirección: Centro Comercial Arroyuelos, Local 6, Ibagué, Tolima.

Teléfono: 300 556 1508 - Correo electrónico: interventoriaexterna2021@gmail.com

	<p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORIA No. 12</p> <p style="text-align: center;">CONTRATO No. 063 DE 2021</p>	<p style="text-align: center;">CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p style="text-align: center;">FECHA INFORME: 01/07/2022 PERIODO: 01/06/2022 – 30/06/2022</p>
---	--	--

Contenido

1.	INFORMACION GENERAL	6
1.1.	SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y AMBIENTAL	7
2.	CONTROL Y SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y AMBIENTAL A CONTRATOS DE OBRA EJECUTADOS POR IBAL S.A E.S.P OFICIAL	8
2.1.	DISTRITO HIDRÁULICO No. 1 y 2 CONTRATO DE OBRA No. 092 DEL 29 DE JUNIO DE 2021. 8	
2.1.1.	Información general del contrato.	8
2.1.2.	Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes.....	9
	Durante el período del presente informe no se llevaron a cabo actividades de obra por encontrarse el contrato suspendido.	9
	Actualmente se espera la posibilidad de adición de recursos por parte de la empresa para lleva a cabo las siguientes actividades:	9
➤	Reposición manija de alcantarillado y red de acueducto en el barrio San diego	9
➤	Reposición acueducto Calle 1B entre carreras 11A BIS Y 12 Barrio Alaska.....	9
➤	Reposición acueducto Carrera 12 entre calles 1 y 1A Barrio Alaska	9
2.1.3.	Seguimiento a garantías contractuales.....	9
2.1.4.	Avance Físico	10
2.1.5.	Avance financiero.....	10
	Durante la ejecución del contrato se han suscrito dos actas parciales, en las cuales se muestra un valor facturado acumulado de \$613.458.946, que corresponde al 86,33% del valor total del contrato.....	10
	No obstante, el avance físico del contrato a la fecha es del 100%.....	11
2.1.6.	Balance del contrato	11
2.1.7.	Gestión de las comunicaciones	11
2.1.8.	Información relacionada con los ensayos de laboratorio	11
2.1.9.	Dificultades en la ejecución de los proyectos	11
2.2.	DISTRITO HIDRÁULICO No. 3. CONTRATO DE OBRA No. 041 DEL 07 DE ABRIL DE 2021	12
2.2.1.	Información general del contrato.	12
2.2.2.	Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes.....	13
2.2.3.	Seguimiento a garantías contractuales.....	21
2.2.4.	Avance físico.....	21



**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 12**

**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**

FECHA INFORME: 01/07/2022
PERIODO: 01/06/2022 – 30/06/2022

2.2.5. Avance financiero	22
2.2.6. Gestión de las comunicaciones	22
2.2.7. Información relacionada con los ensayos de laboratorio	22
2.2.8. Dificultades en la ejecución de los proyectos	22
Durante el período del presente informe se presentaron lluvias constantes sobre los sectores intervenidos y en general en toda la ciudad, situación que generó el cierre de la escombrera durante gran parte del mes y en consecuencia la imposibilidad de hacer el retiro de sobrantes en forma oportuna en los diferentes frentes de obra. ¡Error! Marcador no definido.	
En ejecución	22
2.3. DISTRITO HIDRÁULICO No. 4. CONTRATO DE OBRA No. 069 DEL 14 DE MAYO DE 2021. ...	23
2.3.1. Información general del contrato.	23
2.3.2. Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes.	24
En este momento el distrito tiene el contrato suspendido. ¡Error! Marcador no definido.	
2.3.3. Seguimiento de garantías contractuales.....	34
2.3.4. Avance Físico	35
¡Error! Marcador no definido.	
2.3.5. Avance Financiero	36
2.3.6. Balance del Contrato	36
2.3.7. Gestión de las comunicaciones	36
2.3.8. Información relacionada con los ensayos de Laboratorio	36
2.4. DISTRITOS HIDRÁULICOS No. 5 – 5ª Y 8 CONTRATO DE OBRA No. 113 DEL 11 DE AGOSTO DE 2021.	38
2.4.1. Información general del contrato.	38
2.4.2. Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes.	39
2.4.3. Seguimiento a garantías contractuales	39
2.4.4. Avance Físico	39
2.4.5. Avance Financiero	40
2.4.6. Balance del Contrato	40
2.4.7. Gestión de las comunicaciones	40
2.4.8. Información relacionada con los ensayos de Laboratorio.	41
2.4.9. Dificultades en la ejecución de los proyectos	41
2.5. DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 CONTRATO DE OBRA No. 089 DEL 18 DE JUNIO DE 2021. ...	42

	<p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORIA No. 12</p> <p style="text-align: center;">CONTRATO No. 063 DE 2021</p>	<p style="text-align: center;">CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p style="text-align: center;">FECHA INFORME: 01/07/2022 PERIODO: 01/06/2022 – 30/06/2022</p>
---	--	--

2.5.1. Información general del contrato.....	42
2.5.2. Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes.....	43
2.5.3. Seguimiento a garantías contractuales.....	76
2.5.4. Avance Físico.....	76
2.5.5. Avance Financiero.....	77
2.5.6. Balance del Contrato.....	77
2.5.7. Gestión de las comunicaciones.....	78
2.5.8. Información relacionada con los ensayos de Laboratorio.....	78
2.5.9. Dificultades en la ejecución de los proyectos.....	78
2.6. DISTRITO HIDRÁULICO No. 7 CONTRATO DE OBRA No. 062 DEL 06 DE MAYO DE 2021.....	79
2.6.1. Información general del contrato.....	79
2.6.2. Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes.....	80
Finaliza actividad de instalación de red principal de acueducto quedando pendiente programar prueba hidrostática e intercepción con válvula para posterior empalme de red.....	¡Error! Marcador no definido.
2.6.3. Avance Físico.....	145
2.6.4. Avance Financiero.....	145
2.6.5. Balance del Contrato.....	145
2.6.6. Gestión de las comunicaciones.....	146
2.6.7. Información relacionada con los ensayos de Laboratorio.....	146
2.6.8. Dificultades en la ejecución de los proyectos.....	146
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	147
3.1. Información general del contrato.....	147
3.2. Control del equipo de la Interventoría.....	147
3.3. Control del personal de Interventoría.....	148
3.4. Trabajo de campo y actividades realizadas.....	148
3.5. Informes técnicos mensuales.....	149
3.6. Estado contrato interventoría.....	150
3.7. Información financiera del Interventor.....	150
3.8. Balance del Contrato de Interventoría.....	151
3.9. Información financiera contrato de interventoría.....	152

	<p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORIA No. 12</p> <p style="text-align: center;">CONTRATO No. 063 DE 2021</p>	<p style="text-align: center;">CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p style="text-align: center;">FECHA INFORME: 01/07/2022 PERIODO: 01/06/2022 – 30/06/2022</p>
---	--	--

3.10. Informe de Inversión y buen manejo del anticipo.....	153
3.11. Seguimiento a garantías contractuales.....	154



**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 12**


**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**

FECHA INFORME: 01/07/2022
PERIODO: 01/06/2022 – 30/06/2022

1. INFORMACION GENERAL

INFORME	PERIÓDICO: __x__ UNICO :	No. 12
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	Desde 01/06/2022 hasta 30/06/2022	
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		
TIPO CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO No. Y FECHA:	063 DE 06 DE MAYO DE 2021	
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL Rep. Leg. LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ	
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DEACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS DISTRITOS HIDRAULICOS DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S.A. E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	MIL TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE (\$1.038.941.400,00).	
ADICION No. 1	CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS MCTE (\$460.565.700,00) – FECHA 28/01/2022	
ADICION No. 2	TRECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE (\$329.838.250) – FECHA 29/04/2022	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE (\$1.829.345.350)	
PLAZO INICIAL:	DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS	
PRORROGA No. 1	NOVENTA (90) DIAS – FECHA 28/01/2022	
PRORROGA No. 2	SETENTA Y CINCO (75) DIAS – FECHA 29/04/2022	
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	TRECIENTOS SETENTA Y CINCO (375) DIAS	
ACTA DE INICIO	01 DE JUNIO DE 2021	
SUSPENSION No. 1	23 DE DICIEMBRE DE 2021	
REINICIO No. 1	24 DE ENERO DE 2022	
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN	12 DE JULIO DE 2022	


	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORIA No. 12</p> <p align="center">CONTRATO No. 063 DE 2021</p>	<p align="center">CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p align="center">FECHA INFORME: 01/07/2022 PERIODO: 01/06/2022 – 30/06/2022</p>
---	--	--

1.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y AMBIENTAL

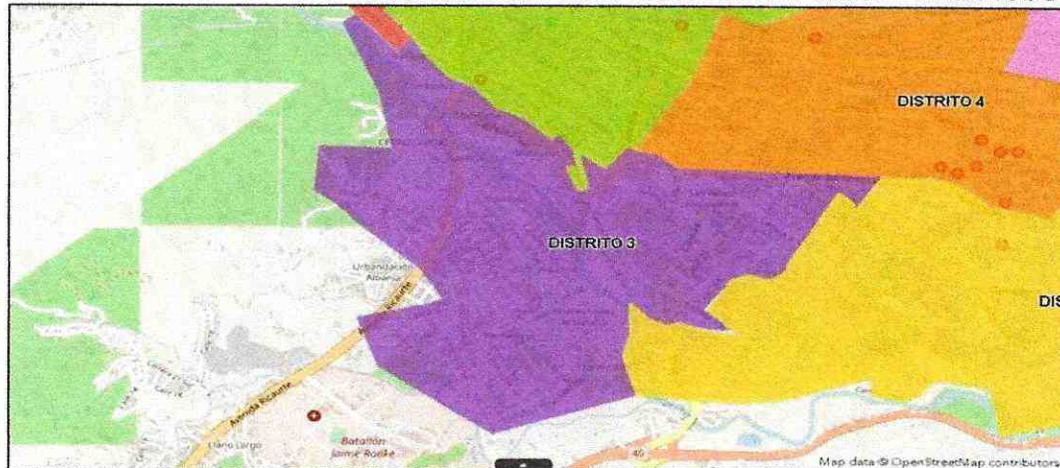
Como contratista del contrato de interventoría No. 063 de 06 de Mayo de 2021, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS DISTRITOS HIDRAULICOS DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S.A. E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE, presento el siguiente informe de interventoría No. 12.

Que el presente informe de interventoría No. 12, donde se describe las actividades llevadas a cabo por los contratistas de obra de los distintos distritos hidráulicos el perímetro urbano de la Ciudad de Ibagué y la interventoría en los ámbitos técnicos, administrativos, financieros y ambientales durante el periodo comprendido entre el 01 de Junio de 2022 y el 30 de Junio 2022.

DISTRITO HIDRAULICO/CONTRATO	PORCENTAJE DE FACTURACION	ESTADO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
DISTRITO No. 1 y 2/CTO 092 de 29 de Junio de 2021.	68,63%	ENEJECUCION	
DISTRITO No. 3/CTO 041 de 07 de Abril de 2021.	89,99%	EN EJECUCION	
DISTRITO No. 4/CTO 069 de 14 de Mayo de 2021.	47,09%	EN EJECUCION	
DISTRITO No. 5, 5A Y 8/ SIN NUMERO.	44,6%	SUSPENDIDO	
DISTRITO No. 6/ CTO 089 de 18 de Junio de 2021.	86,754%	SUSPENDIDO	
DISTRITO No. 7/CTO 062 de 06 de Mayo de 2021.	82,71%	EN EJECUCION	
DISTRITO No. 9 Y 10 CTO 093 de 29 de Junio de 2021.	100,00%	TERMINADO	


	INFORME DE INTERVENTORIA No. 12	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
	CONTRATO No. 063 DE 2021	FECHA INFORME: 01/07/2022 PERIODO: 01/06/2022 – 30/06/2022

2.2. DISTRITO HIDRÁULICO No. 3. CONTRATO DE OBRA No. 041 DEL 07 DE ABRIL DE 2021



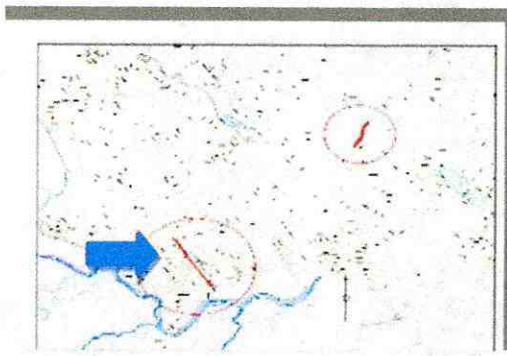

2.2.1. Información general del contrato.

CONTRATO No	041
FECHA	07 DE ABRIL DE 2021
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL AGUAS 2021 R.L. ANDRES EDUARDO TRUJILLO ARANGO
CLASE	OBRA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SIETE PESOS MCTE (\$3.528.154.037)
ADICIONAL No. 1	CIENTO CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON ONCE CENTAVOS MCTE (\$ 150.822.679,11)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS CON ONCE CENTAVOS MCTE (\$3.678.976.716,11)
PLAZO INICIAL	CIENTO OCHENTA (180) DIAS
FECHA DE INICIO	02 DE JUNIO DE 2021
PRORROGA 1	NOVENTA DIAS (90)
PRORROGA 2	TREINTA DIAS (30)
PRORROGA 3	SESENTA DIAS (60)
PRORROGA 4	TREINTA DIAS (30)
PLAZO TOTAL	TRESCIENTOS NOVENTA (360) DIAS
SUSPENSIÓN 1	23 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA 1 SUSPENSIÓN 1	11 DE ENERO DE 2022

	INFORME DE INTERVENTORIA No. 12	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
	CONTRATO No. 063 DE 2021	FECHA INFORME: 01/07/2022 PERIODO: 01/06/2022 – 30/06/2022

REINICIACION 1	24 DE ENERO DE 2022
FECHA DE TERMINACION	30 DE JUNIO DE 2022
OBJETO	REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 3 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE.

2.2.2. Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes

CALLE/TRAMO	ESTADO INICIAL
CARRERA 10 SUR ENTRE CALLES 24 Y 27 BARRIO VILLA CLAUDIA	VIA CON PAVIMENTO EN MAL ESTADO. RED DE ALCANTARILLADO EN AVANZADO ESTADO DE DETERIORO, COLAPSADA EN ALGUNOS TRAMOS, CON HUNDIMIENTOS Y CARCAVAS SOBRE LA VIA
LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reposición de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial con sus correspondientes acometidas domiciliarias. ➤ Excavaciones con medio mecánico y entibado en los tramos donde la altura y condición del terreno lo requieran. ➤ Protección de los tramos a construir con revestimiento de la tubería en tramos donde el sistema no cuenta con la profundidad necesaria para estar acorde con la normativa vigente. ➤ Transporte interno de materiales y tuberías. ➤ Rellenos en recebo compactado sobre las líneas del alcantarillado y acueducto.
<p>REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL</p> 	

Dirección: Centro Comercial Arroyuelos, Local 6, Ibagué, Tolima.

Teléfono: 300 556 1508 - Correo electrónico: interventoriaexterna2021@gmail.com



**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 12**

**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**
FECHA INFORME: 01/07/2022
PERIODO: 01/06/2022 – 30/06/2022

**DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE JUNIO RED DE
ACUEDUCTO**

- Se terminaron las excavaciones e instalación de tubería PVC 3" para red principal entre las calles 25 y 24 costado izquierdo.
- Se terminó la instalación de acometidas domiciliarias a lo largo de la red entre las calles 26 y 24
- Se instaló cama y recubrimiento con arena para protección de la tubería.
- Se llevó a cabo el lleno con recebo compactado en la red.
- Se realizó cargue y retiro de sobrantes producto de las demoliciones y excavaciones realizadas.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO

- EXCAVACION REPOSICIÓN RED DE ACUEDUCTO PVC 3"




➤ **INSTALACION MANGUERA 1/2 " PARA ACOMETIDAS**





**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 12**
**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**
FECHA INFORME: 01/07/2022
PERIODO: 01/06/2022 – 30/06/2022

CALLE/TRAMO	ESTADO INICIAL
CALLE 23 ENTRE CARRERAS 11SUR Y 12SUR BARRIO RICAURTE	VIA CON PAVIMENTO EN CONCRETO EN MAL ESTADO. RED DE ALCANTARILLADO EN MORTERO
LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR
	<ul style="list-style-type: none">➤ Reposición de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario con sus correspondientes acometidas domiciliarias.➤ Excavaciones con medio mecánico y entibado en donde la altura y condición del terreno lo requieran.➤ Transporte interno de materiales y tuberías.➤ Rellenos en recebo compactado sobre las líneas del alcantarillado y acueducto.
REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL	
	



**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 12**

**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**

FECHA INFORME: 01/07/2022
PERIODO: 01/06/2022 – 30/06/2022

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE JUNIO

Red – Acueducto

- Se terminaron actividades en el presente período con la realización de los empalmes a la red principal sobre la calle 23 entre carreras 11 Sur y 12 Sur.



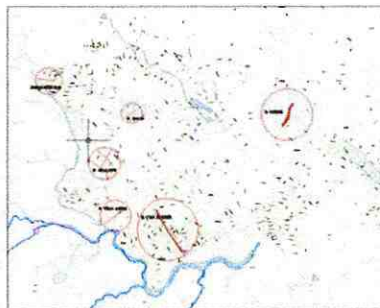
CALLE/TRAMO

**CALLE 23 B ENTRE CARRERAS 12 Y 14 SUR
CARRERA 12 A ENTRE 23B Y 23C - BARRIO
VILLA LUCES**

ESTADO INICIAL

VIA CON PAVIMENTO EN CONCRETO EN MAL ESTADO. RED DE ALCANTARILLADO EN MORTERO

LOCALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR

- Reposición de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario con sus correspondientes acometidas domiciliarias.
- Excavaciones con medio mecánico y entibado en donde la altura y condición del terreno lo requieran.
- Transporte interno de materiales y tuberías.
- Rellenos en recebo compactado sobre las líneas del alcantarillado y acueducto.

REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL



Dirección: Centro Comercial Arroyuelos, Local 6, Ibagué, Tolima.

Teléfono: 300 556 1508 - Correo electrónico: interventoriaexterna2021@gmail.com



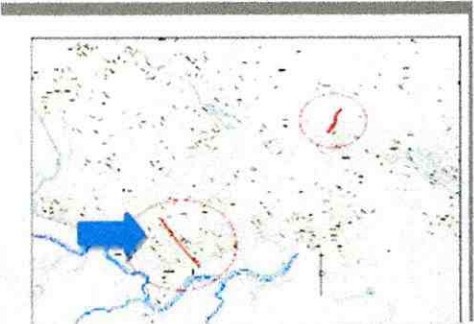

**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 12**

**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**

FECHA INFORME: 01/07/2022
PERIODO: 01/06/2022 – 30/06/2022

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE JUNIO
<p>Alcantarillado Aguas Residual</p> <p>➤ No se realizaron actividades en el presente período, la ejecución en este frente de obra es del 100%.</p>

CALLE/TRAMO	ESTADO INICIAL
CALLE 27 ENTRE CARRERAS 5A Y 6. MANZANAS I – J BARRIO PRADERAS DEL SUR	VIA CON CONCRETO EN MAL ESTADO. RED DE ALCANTARILLADO EN AVANZADO ESTADO DE DETERIORADA Y SEDIMENTADA
LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reposición de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario con sus correspondientes acometidas domiciliarias. ➤ Excavaciones con medio mecánico y entibado en los tramos donde la altura y condición del terreno lo requieran. ➤ Protección de los tramos a construir con revestimiento de la tubería en tramos donde el sistema no cuenta con la profundidad necesaria para estar acorde con la normativa vigente. ➤ Transporte interno de materiales y tuberías. ➤ Rellenos en recebo compactado sobre las líneas del alcantarillado y acueducto.
REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL	
	

Dirección: Centro Comercial Arroyuelos, Local 6, Ibagué, Tolima.

Teléfono: 300 556 1508 - Correo electrónico: interventoriaexterna2021@gmail.com



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 12

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/07/2022
PERIODO: 01/06/2022 – 30/06/2022

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE JUNIO

Red de Acueducto

- Se continuó excavación, fundida de piso donde lo requiere, instalación de tubería PVC 16" para red principal entre los pozos N°7,6,5 y 4 con una longitud aproximada de 58 ml
- Se realizó revestimiento en concreto a la tubería de 16" entre pozos 5 y 4
- Se realizó construcción de pozo 6 y 5
- Se terminó concreto para protección de la tubería en tramo pozo N°6 A 7
- Se realizó cargue y retiro de sobrantes producto de las demoliciones y excavaciones realizadas.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO

- EXCAVACIONES ENTRE POZOS 5 Y 4



Dirección: Centro Comercial Arroyuelos, Local 6, Ibagué, Tolima.

Teléfono: 300 556 1508 - Correo electrónico: interventoriaexterna2021@gmail.com

➤ **INSTALACION DE TUBERIA 16" PVC**



➤ **REVESTIMIENTO TUBERIA**



➤ **Construcción de pozo 6 y 5**





**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 12**

**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**
FECHA INFORME: 01/07/2022
PERIODO: 01/06/2022 – 30/06/2022

2.2.3. Seguimiento a garantías contractuales

Contrato de Obra No. 041 de 2021				
No.	Aseguradora	Amparo	Vigencia	Observaciones
I-100004333	SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	07/04/2021 04/04/2022	
I-100004333	SEGUROS MUNDIAL	SALARIOS Y PRESTACIONES	07/04/2021 04/10/2024	
I-100004333	SEGUROS MUNDIAL	CALIDAD DEL SERVICIO	07/04/2021 04/10/2022	
I-100004333	SEGUROS MUNDIAL	ESTABILIDAD	04/10/2021 04/10/2026	
I-100001109	SEGUROS MUNDIAL	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC.	07/04/2021 04/10/2022	

2.2.4. Avance físico

A la fecha del presente informe se evidencia el siguiente avance.

CUADRO COMPARATIVO DE ACTIVIDADES										
MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAMADO	12%	15%	23%	20%	15%	8%	5%	2%	1%	4%
EJECUTADO	7.21%	12.39%	12.4%	13.0%	19%	17%	2%	1%	1%	2%
ACUMULADO	7.21%	19.6%	32%	45%	74%	89%	91%	92%	94%	96%





**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 12**

**CONTRATO No. 063 DE
2021**

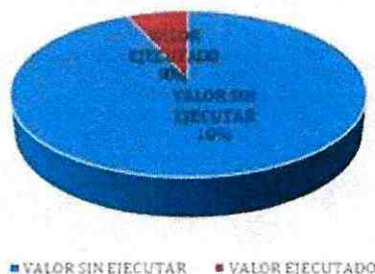
**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**
FECHA INFORME: 01/07/2022
PERIODO: 01/06/2022 – 30/06/2022

2.2.5. Avance financiero

Durante la ejecución del contrato se han suscrito ocho actas parciales que muestran un valor acumulado al mes de junio de 2022 de \$ 3.310.7224.19,91 equivalente al 89.99% de acuerdo al valor actual del contrato que corresponde a la suma de \$3.678.976.716,11.

VALOR CONTRATADO	\$3.528.154.037,00	
VALOR ADICIONAL	\$ 150.822.679,11	
VALOR EJECUTADO		\$3.310.722.419,91
VALOR POR EJECUTAR		\$ 368.254.296,20
SUMAS IGUALES	\$3.678.976.716,11	\$3.678.976.716,11

PORCENTAJE DE EJECUCION



2.2.6. Gestión de las comunicaciones

Se anexa correspondencia relacionada al distrito 3.

2.2.7. Información relacionada con los ensayos de laboratorio.

Se anexan resultados de ensayos de laboratorio practicados durante el periodo del presente informe.

2.2.8. Dificultades en la ejecución de los proyectos

Inconveniente	Solución	Proceso / Avance a fecha de corte de este informe
		En ejecución



**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES
AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES PARA
CONTRATOS DE OBRA**

CÓDIGO: GJ-R-061

FECHA VIGENCIA:
2019-09-19

VERSIÓN: 01

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Página 1 de 2

CONTRATO DE OBRA N° 041 DEL 07 DE ABRIL DE 2021	
CONTRATANTE	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021

OBJETO	REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 3 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SAESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE
PLAZO INICIAL	CIENTO OCHENTA (180) DÍAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO	02 DE JUNIO DE 2021
PRORROGA N°1	NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO
PRORROGA N°2	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
PRORROGA N°3	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO
PRORROGA N°4	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
SUSPENSIÓN N° 1	23 DE DICIEMBRE DE 2021
REINICIO N° 1	26 DE ENERO DE 2022
VALOR INICIAL	TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$3'528.154.037,00).
ADICIÓN	\$150.822.679,11
VALOR ACTUALIZADO	\$3.678.976.716,11
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORÍA EXTERNA DEL IBAL

El suscrito LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMÍREZ representante legal del CONSORCIO INTERVENTORÍA EXTERNA IBAL, en su calidad de INTERVENTOR del contrato en mención:



**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES
AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES PARA
CONTRATOS DE OBRA**

CÓDIGO: GJ-R-061

FECHA VIGENCIA:
2019-09-19

VERSIÓN: 01

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN


Página 2 de 2

CERTIFICA:

Contratista persona natural <input type="checkbox"/>	Contratista persona jurídica <input checked="" type="checkbox"/>
2. El contratista presentó la planilla número _____ de fecha _____ en la que consta que ha efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión, y riesgos laborales, de él y del personal a cargo (Cuando a ello hubiere lugar), para el período de _____. Verificado el monto de cada uno de los aportes en la planilla, se constató que se ajusta a la base de liquidación que aplica para este tipo de contratos.	2. El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

Se expide la presente constancia para efectos del respectivo pago en la ciudad de Ibagué, a los 30 días del mes de JUNIO del año 2022.

LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMÍREZ
Representante legal
Consorcio interventoría externa IBAL



UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021

**EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL AGUAS 2021
NIT 901.471.171-1**

CERTIFICA

Qué la UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021 NIT 901.471.171-1, como los miembros que lo conforman, ASFALTEMOS S.A.S con NIT 900.278.276-4 - GRUPO EMPRESARIAL INGECOL S.A.S con NIT 900.379.869-5, el personal utilizado y vinculado para la ejecución del contrato No 0041 del 07 de abril de 2021, suscrito con la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL, cuyo objeto es, "REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 3 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE", han cumplido con la afiliación y pago de los aportes al sistema de seguridad social integral del periodo comprendido entre el 01 de marzo y el 30 de junio de 2022.

De igual forma manifiesto que asumimos cualquier clase de responsabilidad derivada de los pagos del sistema de seguridad social del personal utilizado y vinculado para la ejecución del contrato No 0041 del 07 de abril de 2021.

La presente certificación se expide para que haga parte de los documentos de cobro del acta parcial No 09.

Cordialmente,

ANDRES EDUARDO TRUJILLO ARANGO

Representante Legal

UNION TEMPORAL AGUAS 2021



UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO
50
LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)**

Yo, **ANDRÉS EDUARDO TRUJILLO ARANGO**, identificada con C.C Nro. 79.689.814 de Bogotá, en mi condición de representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021**, identificada con Nit 901.471.171-1, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Ibagué, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, CERTIFICO que la **UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021** se encuentra al día en el pago de los aportes de salud, Pensión, Riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje (1), por los aportes pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, incluido el mes de junio.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002

La presente se expide a los 1 días del mes de julio del año 2022.

ANDRÉS EDUARDO TRUJILLO ARANGO
CC. 79.689.814 de Bogotá
Representante legal

(1) La empresa aplica a la exoneración de aportes consagrada en el artículo 114 E.T.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 901471171	1	UNION TEMPORAL AGUAS 2021	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Sucursal Principal	Direccion
2022-05		PRINCIPAL	AV AMBALA N° 69-80
2022-06			IBAGUE-TOLIMA
2022-06/16			Banco
2022/06/16			BANCOLOMBIA

Período		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Dias Mora	Dias Mora	Dias Mora	Valor
2022-05	1508668210	9436178162	E	2022/06/16	2022/06/16				\$3,265,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES											
EMPLEADO						NOVEDADES				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	Ingre	re	to	de	o	b	e	o	o
1	CC 1110518039	CANEDO JOHAN									
2	CC 1110555562	ESCORBAR JUAN									
3	CC 1110311413	HERRANDEZ JORGE	X								
4	CC 1110449224	RODRIGUEZ CESAR									
5	CC 1110540188	SILVA RICHARD		X							
6	CC 1022923252	SUAREZ BETH									
Total Afiliados (6)											

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					
COMPENSIIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$1,679,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$245,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$1,312,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$122,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	6	\$731,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$434,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	\$434,600
SAUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$420,100
TOTAL				6	\$3,265,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF			
NIT 90147171	1	UNION TEMPORAL AGUAS 2021	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV AMBALA N° 69-80	IBAGUE-TOLIMA	2755410	SI			

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION												
Periodo	Clave				Fecha				Pago			
	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor			
2022-05	2022-06	1508668210	9436178162	E	2022/06/16	2022/06/16	BANCOLOMBIA		\$3,265,600			

EMPLEADO		NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Ingre	Ret	De	bae	Cap	tae	Vsp	tor	ost	Jun	Ige	Una	Vec	Av	pec	rit	Tip	Codig	Dias	Codig	Dias	Codig	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF							
1	CC 1110514039	CACEDO JOHAN																		23030	30	EP5002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI					
2	CC 1110555562	ESCOBAR JUAN																		23030	30	EP5002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI					
3	CC 1110511413	HERNANDEZ JORGE																		23030	10	EP5037	10	CCF50	10	14-11	10	6.960%	10	SI					
4	CC 1110449224	RODRIGUEZ CESAR																		23030	30	EP5002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI					
5	CC 1110560189	SILVA RICHARD																		25-14	30	EP5041	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI					
6	CC 1022925252	SUAREZ BETH																		23030	30	EP5002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI					
Total Afiliados (6)																																			

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$1,679,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$245,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$1,312,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$122,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	6	\$731,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	6	\$434,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	6	\$434,600
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	6	\$420,100
TOTAL				6	\$3,265,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dV	UNION TEMPORAL AGUAS 2021		B - MENOS DE 100 COTIZANTES		PRINCIPAL		AV AMBALA N° 69-80		IBAGUE-TOLIMA		2753410		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	2022/05/17	2022/05/18	BANCOLOMBIA					\$4,429,200
2022-04	2022-05	1463256104	9434013982	E											

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES				
			registrado	bañador	vac	vac	vac	vac	vac	vac	vac	vac	vac	vac	vac	vac	vac	vac	vac	vac	vac	vac	vac	vac	vac
1	CC	1110537206	BONREGO JUAN																						
2	CC	1110516039	CAICEDO JOHAN							X															
3	CC	1110595562	ESCOBAR JUAN																						
4	CC	1110511413	HERNANDEZ JORGE																						
5	CC	1110449224	RODRIGUEZ CESAR																						
6	CC	1110560189	SILVA RICHARD							X															
7	CC	1072923252	SUAREZ IBETH																						
8	CC	1110534157	TOBAR MIGUEL																						
total		Afiliados (8)																							

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	\$2,270,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$301,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$1,317,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
ARL SUISA	14-11	890,903,790	5	2	\$651,600
CONFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	8	\$987,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	8	\$987,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	8	\$603,600
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	8	\$603,600
SANTITAS	EP5005	800,251,440	6	8	\$567,600
TOTAL				8	\$4,429,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv: Razon Social: Clase Aportante: Sucursal Principal: Dirección: Exonerado SEMA e ICBF:
 NIT 901471171 1 UNION TEMPORAL AGUAS 2021 B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL AV. AMBALA N° 69-80 IBAGUÉ-TOLIMA 2755410 SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período: Tipo: Clave: Planilla: Planilla: Fecha: Pago: Banco: Valor:
 2022-03 Salud PAGO PLANILLA PLANILLA 2022/04/20 2022/04/20 BANCOLOMBIA \$5.355.300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	INGR	RENT	DEB	BOE	LIP	P	C	S	M	NOVEDADES			PENSIÓN	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES					
												Codeig	Días	Codeig					Días	Codeig	Días	Tarifa	Días	Exonerado
1	CC 1110557206	BORRERO JUAN											23030	30	EPS005	30	14-11	30	6.960%	30	SI			
2	CC 1110516039	CAicedo JOHAN											23030	30	EPS002	30	14-11	30	6.960%	30	SI			
3	CC 1110555562	ESCOBAR JUAN										X	23030	1	EPS002	1	14-11	1	0.000%	1	SI			
4	CC 1110555562	ESCOBAR JUAN											23030	29	EPS002	29	14-11	29	6.960%	29	SI			
5	CC 1110511413	HERNANDEZ JORGE											23030	30	EPS007	30	14-11	30	6.960%	30	SI			
6	CC 1110545964	LOPERA DANIEL										X	23030	15	EPS037	15	14-11	15	6.960%	15	SI			
7	CC 1110449224	RODRIGUEZ CESAR											23030	30	EPS002	30	14-11	30	6.960%	30	SI			
8	CC 1110560189	SILVA RICHARD									X		25-14	30	EPS041	30	14-11	30	6.960%	30	SI			
9	CC 1022932552	SUAREZ IRETH											23030	30	EPS002	30	14-11	30	6.960%	30	SI			
10	CC 1110534157	TORAR ANGELO									X		25-14	2	EPS002	2	14-11	2	0.000%	2	SI			
11	CC 1110534157	TORAR ANGELO											25-14	28	EPS002	28	14-11	28	6.960%	28	SI			
Total	Afiliados(9)																							

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
APP (ADMINISTRADORAS: 3)					\$2,759,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	\$530,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$1,455,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$773,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					\$1,190,700
ARL SUJA	14-11	890,903,790	5	9	\$1,190,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					\$714,600
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	9	\$714,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					\$690,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$128,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$62,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$398,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$101,300
TOTAL				9	\$5,355,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENIA e ICBF	
Identificación	dV	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		GASTOS ADMINISTRACION		AVENIDA AMBALA #69-80		IBAGUE-TOLIMA		2755472		SI			
9436380797						2022/06/17		BANCOLOMBIA						578.283.600	

No.	Identificación	Nombre	Ingresos	No. Cuentas	Vivienda	Bienes	Deudas	Otras Fuentes	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	NOVEDADES		PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES						
													Planilla	Planilla											
Período	Salud	Clave		Tipo		Fecha		Limite		Pago		Banco		Valor											
2022-05	2022-06	1517401139	9436380797	E	E	2022/06/17	2022/06/17	2022/06/17	BANCOLOMBIA	578.283.600															
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																									
No.	Identificación	Nombre	ingresos	No. Cuentas	Vivienda	Bienes	Deudas	Otras Fuentes	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones						
1	CC 11313161	AGUIRRE LUIS		X										23020	30	EP5037	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI	
2	CC 100617824	AGUIRRE YEFERSON												X	23020	7	EP5002	7	CCF50	7	14-11	7	0.000%	7	SI
3	CC 100617834	AGUIRRE YEFERSON													23020	23	EP5002	23	CCF50	23	14-11	23	6.960%	23	SI
4	CC 14219959	ALEMAN LUIS													0	EP5037	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI	
5	CC 80283592	ALEMAN LUIS													23030	30	EP5017	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
6	CC 1110568507	BEDOYA JHON													23030	2	EP5002	2	CCF50	2	14-11	2	6.960%	2	SI
7	CC 5948850	BELTRAN ALEXANDER													25-14	30	EP5005	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
8	CC 102626885	BETANCUR SUSANNA													23020	30	EP5005	30	CCF50	30	14-11	30	0.522%	30	SI
9	CC 5884170	BONILLA TITO													23020	30	EP5005	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
10	CC 37332338	BORNACELIS WADLLES													23020	30	EP5002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
11	CC 1110557505	BORRERO JUAN													23020	30	EP5005	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
12	CC 111049456	CAMELO CRISTIAN													23030	21	EP5002	21	CCF50	21	14-11	21	6.960%	21	SI
13	CC 93131893	CANZALES JORGE													23020	30	EP5002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
14	CC 93357865	CARRENAS RUBEN	X												25-14	13	EP5002	13	CCF50	13	14-11	13	6.960%	13	SI
15	CC 13991879	CARDONA JOSE	X												25-14	17	EP5002	17	CCF50	17	14-11	17	6.960%	17	SI
16	CC 1032470471	CARD SEBASTIAN													23030	30	EP5017	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
17	CC 1110496619	CARRERO ESTEBAN													23030	30	EP5041	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
18	CC 1110533561	SARVAJAL CHRISTINA													23030	30	EP5005	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
19	CC 1105616215	CASTAÑEDA OBENMAR	X												23030	7	EP5041	7	CCF50	7	14-11	7	6.960%	7	SI
20	CC 93238797	CESPEDES KRISTIAN													23030	30	EP5005	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
21	CC 119320347	CHINCHILLA JHON													23020	30	EP5002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
22	CC 1110479976	CRUZ DAVID													23100	30	EP5005	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
23	CC 1110540100	CUBILLOS REVIN													23020	30	EP5002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
24	CC 93123567	CUPITRA WILLIAM													23020	5	EP5002	5	CCF50	5	14-11	5	0.000%	5	SI
25	CC 93123567	CUPITRA WILLIAM													23020	25	EP5002	25	CCF50	25	14-11	25	6.960%	25	SI
26	CC 1116209232	DELGADO EDUAR													23020	30	EP5002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
27	CC 71184477	DELGADO LINTON													23030	30	EP5037	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
28	CC 28553825	DIAZ ANALUZ													23020	30	EP5005	30	CCF50	30	14-11	30	0.522%	30	SI
29	CC 93144476	DIAZ ANDRES													25-14	30	EP5002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
30	CC 1110521208	DIAZ ERIKA													23030	30	EP5005	30	CCF50	30	14-11	30	0.522%	30	SI

No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Retenciones	Exenciones	Exoneraciones	Código	Días	Código	Días	Código	Días	Tarifa	Días	Exonerado SEMA e ICB		
31	CC 91376272	FERNANDEZ DAVID					25-14	30	EP5005	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
32	CC 100735247	FLOREZ JUAN					23030	30	ESSC62	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
33	CC 1110578542	FLOREZ NESTOR					23030	14	EP5002	14	CCF50	14	14-11	14	0.000%	14	SI
34	CC 1110578542	FLOREZ NESTOR					23030	16	EP5002	16	CCF50	16	14-11	16	6.960%	16	SI
35	CC 91411688	FLOREZ OSCAR					23030	30	EP5017	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
36	CC 111851588	GATTAN EDWIN					23020	27	EP5037	27	CCF50	27	14-11	27	6.960%	27	SI
37	CC 1110544216	GARCES OSCAR					23030	30	EP5037	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
38	CC 1110175129	GOMEZ CRISTIAN					23100	30	MIN601	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
39	CC 1110487772	GONZALEZ JUAN					23020	30	EP5002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
40	CC 10234997	QUALTERO FRANCISCO						0	EP5037	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
41	CC 1110466266	GUERRERO CHRISTIAN					23020	30	EP5002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
42	CC 91390888	GUIZA GERMAH					25-14	30	EP5005	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
43	CC 1110486525	GUTIERREZ ANDRES					23020	30	EP5002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
44	CC 1045480139	GUTIERREZ JUSTIN					23030	30	EP5002	30	CCF16	30	14-11	30	6.960%	30	SI
45	CC 913556096	HERNANDEZ ANDRES					23030	29	EP5005	29	CCF50	29	14-11	29	6.960%	29	SI
46	CC 14281769	HERBERA JIJUD					23030	30	EP5037	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
47	CC 1006645211	IBARRA ALDAR					23030	30	EP5037	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
48	CC 50887796	JAMES MARIA					23020	30	EP5037	30	CCF16	30	14-11	30	6.960%	30	SI
49	CC 1018457384	LEON CHRISTIAN					23030	8	EP5005	8	CCF50	8	14-11	8	0.000%	8	SI
50	CC 1018457384	LEON CHRISTIAN					23030	22	EP5005	22	CCF50	22	14-11	22	6.960%	22	SI
51	CC 1110545961	LOPERA DANIEL					23030	30	EP5037	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
52	CC 91338658	LOPEZ GILDER					23030	30	EP5002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
53	CC 1110494930	LUJADA DAMIANA					23020	30	EP5005	30	CCF50	30	14-11	30	0.522%	30	SI
54	CC 1003026562	MARQUEZ HERNANDO					23030	30	EP5037	30	CCF16	30	14-11	30	6.960%	30	SI
55	CC 1102817020	MARQUEZ MAURICIO					23030	30	EP5037	30	CCF16	30	14-11	30	6.960%	30	SI
56	CC 1110527967	MARTINEZ YESBY					23030	30	EP5017	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
57	CC 37391726	MEDINA MARTHA					23030	30	EP5005	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
58	CC 91357684	MENDEZ CESAR					23020	30	EP5002	30	CCF50	30	14-11	30	0.522%	30	SI
59	CC 80110611	MENDOZA JUAN					25-14	30	EP5005	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
60	CC 1111748256	MESA OLIVER					23030	30	MIN601	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
61	CC 1110395985	MEZA LUIS					23030	30	EP5002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
62	CC 1110578873	MORA JENNIFER					23030	30	EP5002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
63	CC 1110542658	MORA OLGA					23020	1	EP5005	1	CCF50	1	14-11	1	0.000%	1	SI
64	CC 1110562658	MORA OLGA					23020	29	EP5005	29	CCF50	29	14-11	29	6.960%	29	SI
65	CC 93292007	MORALES HECTOR					25-14	30	EP5002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	No
66	CC 14139789	MORALES ROBINSON					23020	30	EP5002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
67	CC 80654304	MOSQUERA EDWIN					25-14	30	EP5008	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
68	CC 1037573600	ORDUÑA ANGEL					25-14	30	EP5041	30	CCF10	30	14-11	30	0.000%	30	SI

No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Desarrollo	Proyectos	Invest.	Fin.	Leg.	Financ.	Apoyos	Fin. Vp	Código Dias	Código Dias	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF		
67	CC 1117486205	ORTIZ ERSON										23020 30	EP5005 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
70	CC 93386513	ORTIZ JUAN			X							25-14 30	EP5002 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
71	CC 1110530206	OSORNO VICTOR										23030 30	EP5005 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
72	CC 93358059	OSPINA CESAR			X							23020 30	EP5002 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
73	CC 35502334	OSPINA ROSA										25-14 30	EP5005 30	CCF50 30	14-11 30	1.044%	30	SI
74	CC 14104081	OVIEDO NELSON			X							23020 30	EP5005 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
75	CC 1110492370	PARDO LEONARDO										23020 30	EP5017 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
76	CC 93398294	PEREZ HERIBERTO			X							23020 30	EP5002 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
77	CC 4580145	PEREZ IVAN					X					23020 1	EP5005 1	CCF50 1	14-11 1	0.000%	1	SI
78	CC 4580145	PEREZ IVAN										23030 29	EP5005 29	CCF50 29	14-11 29	6.960%	29	SI
79	CC 1110488404	PINEDA CARLOS										23030 30	EP5005 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
80	CC 1110583449	PINEDA DIEGO										23030 30	EP5037 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
81	CC 93384471	PIRAZAN MARIO			X							0	MIND01 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
82	CC 12109732	PUENTES ALBERTO			X							0	EP5005 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
83	CC 1110516800	QUIKENDO JONATAN										23020 30	EP5002 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
84	CC 1110513558	RAMIREZ DIEGO										23030 30	EP5005 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
85	CC 2231540	RAMIREZ HUMBERTO			X							23020 30	EP5037 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
86	CC 15034713	REYES EISNER					X					23100 17	EP5002 17	CCF16 17	14-11 17	6.960%	17	SI
87	CC 1110582812	REYES LUIS										23020 30	EP5002 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
88	CC 5989740	RIOS RUBEN					X					23030 1	EP5002 1	CCF50 1	14-11 1	0.000%	1	SI
89	CC 5989740	RIOS RUBEN			X							23020 29	EP5002 29	CCF50 29	14-11 29	6.960%	29	SI
90	CC 93393846	RIVERA JOHN								X		25-14 30	EP5002 30	CCF50 30	14-11 30	0.000%	30	SI
91	CC 30051692	RODRIGUEZ DANY			X							23020 30	EP5017 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
92	CC 1110503158	RODRIGUEZ DIANA					X					23030 30	EP5002 30	CCF50 30	14-11 30	0.000%	30	SI
93	CC 93391124	RODRIGUEZ ISIDRO					X					23020 30	EP5002 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
94	CC 14241217	RODRIGUEZ JOSE			X							23030 30	EP5037 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
95	PE 80615652311 1992	ROJAS CARLOS					X					23030 1	EP5037 1	CCF50 1	14-11 1	0.000%	1	SI
96	PE 80615652311 1992	ROJAS CARLOS			X							23030 29	EP5037 29	CCF50 29	14-11 29	6.960%	29	SI
97	CC 93392716	RUIZ RAMIRO			X							23020 30	EP5041 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
98	CC 1110538864	SANCHEZ CARLOS					X					23030 30	EP5002 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
99	CC 10693861	SANCHEZ JAMEN						X				25-14 30	EP5005 30	CCF50 30	14-11 30	0.000%	30	SI
100	CC 1015995113	SANDOVAL DIBIER			X							23020 30	EP5002 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
101	CC 14238038	SANTOFIMIO CESAR					X					25-14 30	EP5005 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
102	CC 93401980	TRIANA CARLOS										23020 30	EP5005 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
103	CC 79189314	TRUJILLO ANIBES										23020 30	EP5005 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	No
104	CC 94279889	TUBERQUIA LUIS			X							25-14 30	MIND01 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
105	CC 14235522	VALBUENA HECTOR			X							25-14 30	EP5002 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
106	CC 93413824	VALBUENA JUAN			X							23020 30	EP5002 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI



Planilla Resumen

07	EC	91393467	VANEAS FREDY																			
08	CC	110469868	VELASQUEZ FABIO																			
09	CC	110442850	HIEDA LEBDY	X																		
10	CC	1110062692	VILLALOBOS DIANA					X														
11	CC	14218381	VILLAMIL LUIS																			
12	CC	1110519884	VILORIA GEDGE																			
13	CC	91452984	ZAPATA PAVO																			
total Afiliados(105)																						

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
LFP (ADMINISTRADORAS: 4)				100	\$38,529,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$1,102,000
COMPENSIIONES	25-14	900,336,004	7	17	\$8,238,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	43	\$14,618,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	36	\$14,569,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				101	\$15,771,900
ARL SUJA	14-11	890,903,790	5	101	\$15,771,900
.CF (ADMINISTRADORAS: 2)				101	\$9,650,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	5	\$585,900
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	96	\$9,064,200
:PS (ADMINISTRADORAS: 8)				105	\$12,675,200
ASINET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$75,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$200,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$543,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	\$241,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	19	\$1,638,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$157,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	38	\$4,850,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	32	\$4,968,700
CBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$994,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$994,300
.ENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$662,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$662,900
TOTAL				105	\$78,283,600

ANILLA PAGADA PLANILLA
 ANILLA PAGADA PLANILLA
 ANILLA PAGADA PLANILLA
 ANILLA PAGADA PLANILLA
 ANILLA PAGADA PLANILLA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
VIT 900278276	4	ASFALTAMOS S.A.S	B - MIEROS DE 200 COTIZANTES	GASTOS ADMINISTRACION	AVENIDA AMBALA #69-80	IBAGUE-TOULIMA	2755412	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	9433802966	E	2022/04/21	2022/04/21	BANCOLOMBIA		\$73.335,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAMISCALES		
									Codigo	Dias
1	CC 11313161	AGUIRRE LUIS	X	23020 30	EP5037 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
2	CC 1006117834	AGUIRRE YEREBSON	X	23020 30	EP5002 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
3	CC 14219959	ALEMANA LUIS	X	0	EP5037 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
4	CC 80283592	ALEMANA LUIS	X	23030 30	EP5017 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
5	CC 93417875	BARRAGAN ALBERT	X	23100 27	EP5002 27	CCF50 27	14-11 27	6.960%	27	SI
6	CC 1110964807	BEDOYA JHON	X	23030 30	EP5002 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
7	CC 9988850	BELTRAN ALEXANDER	X	25-14 6	EP5005 6	CCF50 6	14-11 6	0.000%	6	SI
8	CC 9988850	BELTRAN ALEXANDER	X	25-14 24	EP5005 24	CCF50 24	14-11 24	6.960%	24	SI
9	CC 1026260865	BETANCUR SUSANA	X	23020 30	EP5005 30	CCF50 30	14-11 30	0.522%	30	SI
10	CC 5884170	BONILLA TITO	X	23020 30	EP5005 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
11	CC 173232338	BORNACEUS ANDRELES	X	23030 30	EP5002 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
12	CC 1110494956	CAMELO CRISTIAN	X	23030 30	EP5002 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
13	CC 93131893	CANZALEZ JORGE	X	23020 30	EP5002 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
14	CC 103270271	CAJO SEBASTIAN	X	23030 30	EP5017 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
15	CC 1110496419	CARRERO ESTEBAN	X	23030 30	EP5041 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
16	CC 111053364	CARVAJAL CHRISTIAN	X	23030 30	EP5005 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
17	CC 1105616215	CASTAÑEDA SEBASTIAN	X	23030 30	EP5041 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
18	CC 1019049807	CASTRO RONAL	X	23030 12	EP5041 12	CCF50 12	14-11 12	6.960%	12	SI
19	CC 93238797	CESPEDES KRISTIAN	X	23030 30	EP5005 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
20	CC 119320347	CHICHILLA JHON	X	23020 30	EP5002 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
21	CC 111049976	GRUZ DAVID	X	23100 8	EP5005 8	CCF50 8	14-11 8	6.960%	8	SI
22	CC 1110540100	CUBILLOS KEVIN	X	23020 8	EP5002 8	CCF50 8	14-11 8	6.960%	8	SI
23	CC 1116205232	DELGADO EDUAR	X	23020 30	EP5002 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
24	CC 71188477	DELGADO LINTON	X	23030 30	EP5037 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
25	CC 28553825	DIAZ ANA LUZ	X	23020 30	EP5005 30	CCF50 30	14-11 30	0.522%	30	SI
26	CC 931344976	DIAZ ANDRES	X	25-14 30	EP5002 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
27	CC 1110521208	DIAZ ERIKA	X	23030 30	EP5005 30	CCF50 30	14-11 30	0.522%	30	SI
28	CC 93376272	FERNANDEZ DAVID	X	25-14 6	EP5005 6	CCF50 6	14-11 6	0.000%	6	SI
29	CC 93376272	FERNANDEZ DAVID	X	25-14 24	EP5005 24	CCF50 24	14-11 24	6.960%	24	SI
30	CC 1007335247	FLOREZ JUAN	X	23030 30	ESS642 30	CCF50 30	14-11 30	6.960%	30	SI
