



INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

Actividades

- Se hace limpieza mecánica de material procedente de excavación
- Se funde muro divisorio entre cajas de inspección
- Se hace lleno y compactación de recebo en zanjas domiciliarias

Sábado 28 Mayo

Actividades

- Continúan actividades de lleno y compactación de recebo
- Se hace resane de andenes de cajas de inspección

SEMANA 05 (30 MAYO – 31 MAYO)

- Se hace limpieza mecánica de material procedente de la excavación
- Continua excavación para cajas de inspección
- Se instala tubería de 8" para red principal
- Continua excavación para red domiciliaria



INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

**REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES
02 DE MAYO – 31 DE MAYO**

SEMANA 01 (02 MAYO - 07 MAYO)

Actividades:

- Se inicia excavación para guaduas de cerramiento
- Se instala poli sombra para cerramiento entre pozos 3 y 7



- Se hace cimbrado de eje para posterior excavación
- Se inicia excavación mecánica de zanja principal entre pozos 3 y 7



- Se tiende hilo para eje de tubería
- Se tiende lecho en grava para base de tubería



INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022



- Se inicia demolición de asfalto para posterior excavación de red domiciliaria



- Se instala tubería con silla Yee correspondiente y su respectivo atraque



- Se verifican niveles con topógrafo de interventoría



INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022




- Se funde revestimiento de tubería según cartera topográfica



- Continua demolición de asfalto
- Se inicia excavación manual para redes domiciliarias de 6"



	INFORME DE INTERVENTORIA No. 11	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
	CONTRATO No. 063 DE 2021	FECHA INFORME: 01/06/2022
		PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

SEMANA 02 (09 MAYO - 14 MAYO)

Actividades:

- Se empalma tubería existente lisa de vivienda a la red principal



- Continúa excavación manual de red domiciliaria





INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

- Se inician llenos con recebo en zanja principal de 8"



Observación

- En el proceso de limpieza mecánica se despica anden con la retroexcavadora, residente de la vivienda manifiesta la inconformidad y solicita la reparación.



- Se hace demolición de caja de inspección existente
- Continua excavación de zanja domiciliaria
- Se hace excavación mecánica de red principal entre pozos 7 y 8



INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022



Observación

- En el proceso de la excavación mecánica se parte tubería de 3", se hace la correspondiente reparación en caliente



- Se instala lecho en grava
- Se instala tubería de 8" en red principal entre pozo 7 y 8 con su respectivo atraque



- Se funden dados para asegurar tubería



INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022




- Se funde revestimiento restante para tubería de 8" entre pozos 7 Y 8



- Se encofra y se funde caja de inspección de vivienda



- Se hacen actividades de excavación


	INFORME DE INTERVENTORIA No. 11	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
	CONTRATO No. 063 DE 2021	FECHA INFORME: 01/06/2022
		PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022



Observación:

Lluve en horas de la mañana interrumpiendo actividades



	INFORME DE INTERVENTORIA No. 11	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
	CONTRATO No. 063 DE 2021	FECHA INFORME: 01/06/2022
		PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

Actividades:

- Continúan actividades de excavación



Observación:


- No se pueden ejecutar actividades de lleno por lluvias intermitentes
- Se hace limpieza mecánica de parte de material

Observación:

- Al ejecutar la actividad de limpieza mecánica de material húmedo la vía queda en un estado irregular



- No se pueden ejecutar actividades de lleno por inundación en las excavaciones

	INFORME DE INTERVENTORIA No. 11	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
	CONTRATO No. 063 DE 2021	FECHA INFORME: 01/06/2022 PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022



- Continúan actividades de excavación de red domiciliaria
- Se inicia excavación para guaduas de cerramiento entre pozo 8 y 9
- Se instala poli sombra para cerramiento



- Se hace excavación mecánica de red principal entre pozo 8 y 9



- Se hace excavación mecánica para retirar recebo entrapado en excavación de red principal



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 11
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022



- Se encofra y se funden cajas de inspección



- Se tiende hilo para nivel de lecho en grava
- Se desencofra caja de inspección



Observación:



INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

- Las lluvias inundan las excavaciones impidiendo el correcto desarrollo de las actividades



SEMANA 04 (23 MAYO – 28 MAYO)

Actividades:

- Se tiende lecho en grava
- Se instala 2 tubos de 8" en red principal con su respectivo atraque



- Se instalan sillas Yee para redes domiciliarias
- Se funde revestimiento en tubería principal según cartera topográfica



- Continúan actividades de excavación para cajas de inspección



INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022



- Se instalan sillas Yee en tubería de 8"
- Se instala tubería de 8" en red principal entre pozo 8 y 9



- Se hace corte de andén para marcar caja de inspección



- Se hace excavación manual de zanja domiciliaria



INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

- Se instala tuberías de 6"
- Se encofra y se funde cajas de inspección



- Se resanan andenes



- Se inician llenos y compactación de recebo en zanja principal



- Se hace limpieza mecánica de material procedente de excavación



INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

- Se funde muro divisorio entre cajas de inspección
- Se hace lleno y compactación de recebo en zanjas domiciliarias



- Se hace resane de andenes de cajas de inspección



SEMANA 05 (30 MAYO – 31 MAYO)

- Se hace limpieza mecánica de material procedente de la excavación





INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

- Continua excavación para cajas de inspección



- Se instala tubería de 8" para red principal



- Continua excavación para red domiciliaria



	INFORME DE INTERVENTORIA No. 11	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
	CONTRATO No. 063 DE 2021	FECHA INFORME: 01/06/2022
		PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

1.1.1 Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes.

CALLE/TRAMO	ESTADO INICIAL
CALLE 139 ENTRE CRA 8 Y CRA 8B BARIO CEIBA NORTE	VIA SIN ESTRUCTURA. TRAMO EN TUBERIA DE 3"
LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR
	<p>Demolición de asfalto para zanja de red principal</p>
REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL	<p>Zanja para tubería de 3" de 0,50m de ancho</p> <p>Instalación de collarines y registro de incorporación por registro domiciliario</p> <p>Instalación de manguera por registro domiciliario</p> <p>Llenos en recebo compactado hasta rasante de vía.</p>
	



INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

**DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES
02 MAYO – 31 MAYO**

SEMANA 15 (16 MAYO)


- 16.05.2022 se realizó prueba hidrostática, obteniendo buenos resultados, se esperan las fechas de programación para empalme
- Se instan las mangueras de agua para acometidas en los collarines instalados en la tubería de acueducto

**REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.
02 MAYO – 31 MAYO**

SEMANA 15 (16 MAYO)

- 16.05.2022 se realizó prueba hidrostática, obteniendo buenos resultados, se esperan las fechas de programación para empalme
- Se instan las mangueras de agua para acometidas en los collarines instalados en la tubería de acueducto



	INFORME DE INTERVENTORIA No. 11	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
	CONTRATO No. 063 DE 2021	FECHA INFORME: 01/06/2022
		PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

**DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES
02 MAYO – 31 MAYO**


SEMANA 21 (02 MAYO - 07 MAYO)

- Se realiza lleno y compactación con recebo en zanja principal de red de acueducto
- Continua excavación de zanja para red de acueducto aprox 50 metros
- Se instala cama de arena sobre tubería para red de acueducto
- Continua excavación de zanja para red de acueducto aprox 57 metros
- Se realiza excavación de zanjas para mangueras de aguas de acometidas
- Continua instalación de tubería de red de acueducto
- Continua instalación de cama de arena sobre tubería principal de acueducto
- Continua excavación de zanjas para mangueras de agua de acometidas
- Se instalan las mangueras de agua de acometidas
- Continua excavación de zanjas para mangueras de agua de acometidas
- Se instalan las mangueras de agua de acometidas
- Se realiza lleno y compactación en zanja principal de acueducto
- Se instalan las mangueras de agua de acometidas
- Continua instalación de zanja principal para red de acueducto

Observación: 07.05.2022 Las lluvias no permiten realizar actividades

SEMANA 22 (09 MAYO - 14 MAYO)

- Continua excavación de zanja principal para red de acueducto
- Se realiza instalación de tubería de 3" para red principal de acueducto
- Continua excavación de zanja para manguera de agua de acometidas
- Se realiza lleno y compactación con recebo en zanja principal para red de acueducto y en zanjas de mangueras de agua para acometidas

	INFORME DE INTERVENTORIA No. 11	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
	CONTRATO No. 063 DE 2021	FECHA INFORME: 01/06/2022
		PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

- Continua lleno y compactación con recebo en zanja principal para red de acueducto y en zanjas de mangueras de agua para acometidas

Observación: Se recomienda la limpieza del tramo

- Se realiza demolición de andén para continuar con las zanjas en donde se conectan las mangueras de agua de acometidas
- Se realiza instalación de mangueras de agua de acometidas

Observación: Se realizó limpieza mecánica del tramo, sin embargo, se recomienda mejorar el estado de la vía.

- Continua excavación de zanjas para conectar mangueras de agua de acometidas
- Continua excavación de zanjas para conectar mangueras de agua de acometidas

SEMANA 23 (16 MAYO – 21 MAYO))

- Continua excavación de zanjas para conectar mangueras de agua de acometidas
- Continua instalación de mangueras de agua de acometidas
- No se realizaron actividades en el tramo
- Inicia excavación de zanja principal para red de acueducto desde la calle 138 en dirección a la transversal 8
- Continua excavación de zanja principal para red de acueducto
- Continua excavación de zanja principal para red de acueducto
- Continua excavación de zanja principal para red de acueducto avanzando aprox 8 metros

SEMANA 24 (23 MAYO – 28 MAYO)

- Continua excavación de zanja principal para red de acueducto avanzando
- Se realiza instalación de tubería de 3" para red de acueducto
- Se instala cama de arena sobre tubería de acueducto
- Se realiza limpieza mecánica del tramo

SEMANA 25 (31 MAYO)



INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

- No se realizan actividades, es está a la espera de definir la localización de tubería para el empalme

**REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES
02 MAYO – 31 MAYO**

SEMANA 21 (02 MAYO - 07 MAYO)

- Se realiza lleno y compactación con recebo en zanja principal de red de acueducto



- Continua excavación de zanja para red de acueducto aprox 50 metros



- Se instala cama de arena sobre tubería para red de acueducto



INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022




- Continua excavación de zanja para red de acueducto aprox 57 metros



- Se realiza excavación de zanjas para mangueras de aguas de acometidas



- Continua instalación de tubería de red de acueducto

	INFORME DE INTERVENTORIA No. 11	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
	CONTRATO No. 063 DE 2021	FECHA INFORME: 01/06/2022
		PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022




- Continua instalación de cama de arena sobre tubería principal de acueducto



- Continua excavación de zanjas para mangueras de agua de acometidas



- Se instalan las mangueras de agua de acometidas

	INFORME DE INTERVENTORIA No. 11	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
	CONTRATO No. 063 DE 2021	FECHA INFORME: 01/06/2022
		PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022



- Continua excavación de zanja principal para red de acueducto



Observación: 07.05.2022 Las lluvias no permiten realizar actividades

SEMANA 22 (09 MAYO - 14 MAYO)

- Se realiza instalación de tubería de 3" para red principal de acueducto



INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**

CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022


PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022




- Continua excavación de zanja para manguera de agua de acometidas



- Se realiza lleno y compactación con recebo en zanja principal para red de acueducto y en zanjas de mangueras de agua para acometidas

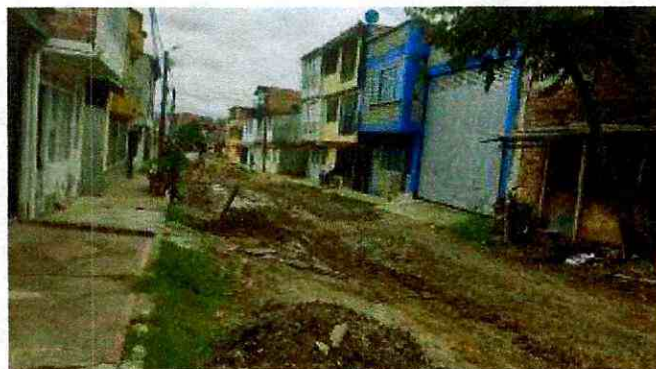

- Continua lleno y compactación con recebo en zanja principal para red de acueducto y en zanjas de mangueras de agua para acometidas

	INFORME DE INTERVENTORIA No. 11	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
	CONTRATO No. 063 DE 2021	FECHA INFORME: 01/06/2022
		PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022



Observación: Se recomienda la limpieza del tramo

- Se realiza demolición de andén para continuar con las zanjas en donde se conectan las mangueras de agua de acometidas



- Se realiza instalación de mangueras de agua de acometidas



Observación: Se realizó limpieza mecánica del tramo, sin embargo, se recomienda mejorar el estado de la vía.

- Continúa excavación de zanjas para conectar mangueras de agua de acometidas



INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022



SEMANA 23 (16 MAYO – 21 MAYO)


- Continua excavación de zanjas para conectar mangueras de agua de acometidas



- Inicia excavación de zanja principal para red de acueducto desde la calle 138 en dirección a la transversal 8



- Continua excavación de zanja principal para red de acueducto

	INFORME DE INTERVENTORIA No. 11	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
	CONTRATO No. 063 DE 2021	FECHA INFORME: 01/06/2022
		PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022



- Continua excavación de zanja principal para red de acueducto avanzando aprox 8 metros




SEMANA 24 (23 MAYO – 28 MAYO)

- Continua excavación de zanja principal para red de acueducto



- Se realiza instalación de tubería de 3" para red de acueducto

	INFORME DE INTERVENTORIA No. 11	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
	CONTRATO No. 063 DE 2021	FECHA INFORME: 01/06/2022
		PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022



- Se realiza limpieza mecánica del tramo




- Se excava en la esquina de la transversal 8 buscando la tubería antigua para realizar el empalme nuevo



Observación: Se ha excavado aprox 1.20 m de profundidad y aun no se encuentra la tubería.

SEMANA 25 (31 MAYO)

	INFORME DE INTERVENTORIA No. 11	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
	CONTRATO No. 063 DE 2021	FECHA INFORME: 01/06/2022
		PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

- No se realizan actividades, es esta a la espera de definir la localización de tubería para el empalme

1.1.7

Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes.

CALLE/TRAMO	ESTADO INICIAL
CARRERA 8A ENTRE CALLE 140 Y 141. BARIO CEIBA NORTE	VIA SIN ESTRUCTURA. TRAMO EN TUBERIA DE 3"
LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR



INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022



REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL



Zanja para tubería de 3" de 0,50m de ancho

Instalación de collarines y registro de incorporación por registro domiciliario

Instalación de manguera por registro domiciliario

Llenos en recebo compactado hasta rasante de vía.

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 02 MAYO – 31 MAYO

SEMANA 27 (2 MAYO – 7 MAYO)

- Se realiza lleno y compactación con recebo en zanja para mangueras de aguas de acometidas
- Continúa instalación de mangueras de agua para acometidas



INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

- 04.05.2022 No se presenta personal en el tramo, se recomienda al contratista la adecuada instalación del cerramiento y la limpieza y orden del tramo
- Se realiza lleno y compactación del tramo
- Se realiza limpieza del tramo
- Finalizan actividades de instalación de acueducto del tramo

Nota: Se espera la fecha de prueba hidrostática y definir fecha de empalme

SEMANA 29 (31 MAYO)

- Se realiza prueba hidrostática, lo resultados son positivos se espera certificación de la tubería de acueducto y próximamente definir fechas para instalación de empalme

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 02 MAYO – 31 MAYO

SEMANA 27 (2 MAYO – 7 MAYO)

- Se realiza lleno y compactación con recebo en zanja para mangueras de aguas de acometidas



- Continúa instalación de mangueras de agua para acometidas



INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022




- 04.05.2022 No se presenta personal en el tramo, se recomienda al contratista la adecuada instalación del cerramiento y la limpieza y orden del tramo
- Se realiza lleno y compactación del tramo



- Se realiza limpieza del tramo



- Finalizan actividades de instalación de acueducto del tramo
-


	INFORME DE INTERVENTORIA No. 11	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
	CONTRATO No. 063 DE 2021	FECHA INFORME: 01/06/2022
		PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

Nota: Se espera la fecha de prueba hidrostática y definir fecha de empalme

SEMANA 29 (31 MAYO)


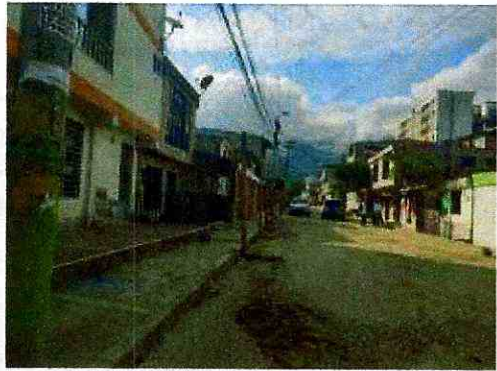
- Se realiza prueba hidrostática, lo resultados son positivos se espera certificación de la tubería de acueducto y próximamente definir fechas para instalación de empalme



	INFORME DE INTERVENTORIA No. 11	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
	CONTRATO No. 063 DE 2021	FECHA INFORME: 01/06/2022
		PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

1.1.8

Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes.

CALLE/TRAMO	ESTADO INICIAL
CALLE 141 ENTRE CARRERA 8 C BIS Y TRANSVERSAL 8 BARRIO OVIEDO	VIA CON ESTRUCTURA. TRAMO EN TUBERIA DE 10"
LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR
	<p>Zanja para tubería de 10" con anchos 0,60m</p> <p>Zanja para tubería de 6" de 0,50m respectivamente</p> <p>Instalación de silla Yee para red domiciliaria</p> <p>Construcción de cajas de inspección para cada vivienda</p>
REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL	<p>Llenos en recebo compactado hasta rasante de vía.</p> <p>Excavaciones para cajas de inspección 0,80m x 0,80m</p> <p>Construcción de pozos #5 y #6</p>
	



INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

**DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES
02 MAYO – 31 MAYO**

SEMANA 5 (2 MAYO – 7 MAYO)

- Se realiza fundida de revestimiento en tubería de alcantarillado
- Se llena y compacta con recebo zanja principal de alcantarillado
- Se excava zanja para red domiciliaria
- Se funden tapas para cajas de inspección
- Continúa lleno y compactación de zanja principal de alcantarillado
- Se realiza limpieza mecánica del tramo
- Se revisan de cajas de inspección anteriores para verificar su estado
- Se realiza demolición de cajas de inspección que no cumple con las condiciones requeridas
- Se realiza excavación mecánica en zanja principal de alcantarillado
- Continúa demolición de cajas de inspección que no cumple con las condiciones requeridas
- Se realiza excavación para instalación de tubería que conecta el pozo #5 a caja del colector con el fin de generar un aliviadero que funciona cuando el pozo eleve su capacidad de agua normal.
- Se realiza fundida de cajas de inspección
- Se instala tubería de 8" en zanja principal para alcantarillado
- Se funde revestimiento sobre tubería de alcantarillado principal
- Se instalan tapas sobre cajas de inspección
- **Observación:** Las lluvias no permiten realizar actividades

SEMANA 6 (9 MAYO – 14 MAYO)

- Se realiza instalación de tubería para red de alcantarillado principal
- Se atraca tubería con bultos relleno de arena



INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL


FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

- Se funde revestimiento en tubería de alcantarillado
- Se realiza lleno y compactación con recebo en zanja de alcantarillado principal
- Continua excavación para tubería que funciona como aliviadero de pozo # 5
- Se realiza demolición de caja de inspección que no cumple los parámetros
- Continua compactación de recebo en zanja principal de alcantarillado
- Se realiza demolición de asfalto para realizar zanja de red domiciliaria
- Continúa fundida de revestimiento de tubería de red de alcantarillado principal
- Se realiza fundida de caja de inspección
- Se excava zanja para red domiciliaria de alcantarillado
- Se excava zanja para caja de inspección
- Se realiza fundida de caja de inspección
- Se instala tubería para red domiciliaria.
- Se funde caja de inspección
- Se realiza revestimiento en tubería de red domiciliaria
- Se realiza demolición para zanja de red domiciliaria
- Se funde caja de inspección
- Se realiza excavación de zanja para red domiciliaria

SEMANA 7 (16 MAYO – 21 MAYO)

- Continua excavación de zanjas para red domiciliaria
- Se realiza limpieza del tramo
- Se instala silla YEE en tubería principal de alcantarillado
- **Observaciones:** Debido a las fuertes lluvias se generó inundaciones en algunas residencias del tramo intervenido, se informa y solicita presencia al contratista encargado de la ejecución de la obra
- Se realiza movimiento de punto de recebo dentro del mismo tramo

	INFORME DE INTERVENTORIA No. 11	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
	CONTRATO No. 063 DE 2021	FECHA INFORME: 01/06/2022
		PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

- Se instala tubería de 6" para red domiciliaria
- Se realiza revestimiento de tubería de red domiciliaria
- Se realiza cañuela de caja de inspección
- **Observaciones:** El pozo # 7 se encuentra tapado debido a los escombros y residuos de material que circulan por él, se solicita al contratista la limpieza de este.
- Se realiza perforación en la caja del colector en donde desaguara el aliviadero del pozo #5
- Se realizo lleno con recebo sobre tapas de cajas de inspección en andenes
- Continua perforación en la caja del colector en donde desaguara el aliviadero del pozo #5
- Se realiza excavación mecánica en zanja principal para red de alcantarillado
- Continúan excavaciones de zanja para construcción de cajas de inspección
- Se realiza lleno y compactación en zanja principal de alcantarillado
- En zanja para instalación de aliviadero del pozo #5, se instalan dos tubos de 12 pulgadas que desembocan en la caja del colector
- Continua excavación de zanjas para cajas de inspección
- Se realiza limpieza mecánica del tramo
- Se realiza funde tubería del aliviadero del pozo #5
- Se llena y compacta con recebo zanja en donde se realizó el aliviadero del pozo #5
- Se realiza cañuela en caja de inspección
- Se funden cajas de inspección
- Se realiza toma de niveles por parte de la topografía del contratista para la instalación de la tubería de alcantarillado principal
- Se realiza resane sobre andenes
- Se realiza adecuación de los pozos #5 y #7 con el fin de instalar de aro tapa
- Se realiza limpieza del pozo #7



INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022


- **Observaciones:** Debido a las inundaciones del día 15 de mayo se realiza una visita técnica junto a la profesional social del contratista, con el fin de realizar informe de los hechos y las afectaciones en la vivienda de una de las residentes del tramo intervenido
- Se realiza placa en donde se instala aro tapa del pozo #5 y el #7
- Se realiza fundida de revestimiento en tubería principal de alcantarillado
- Se instala tapa del pozo #5 y el #7
- Debido a las lluvias del durante la mañana no se pudieron realizar actividades

SEMANA 8 (23 MAYO – 28 MAYO)

- Se realiza excavación de zanjas para red domiciliaria
- **Observaciones:** Se realiza relleno de recebo sin compactación
- Continua excavación de zanjas para red domiciliaria
- **Observaciones:** El contratista retira el relleno y realiza la actividad con la compactación correspondiente
- Se realiza excavación de zanja para caja de inspección
- Continua excavación de zanjas para red domiciliaria
- Se realiza demolición de andén y excavación de zanja para caja de inspección
- Se instala revestimiento en tubería para red domiciliaria
- Se realiza lleno y compactación en zanja principal de alcantarillado
- Se construyen y funden tapa para cajas de inspección
- **Observaciones:** en el proceso de excavación de cajas de inspección en una vivienda se localiza tubería de acueducto, el cual interviene a la correcta construcción de la caja de inspección, se solicita al personal contratista indicaciones para proceder con la actividad.

SEMANA 9 (31 MAYO)

- Se finalizan actividades de alcantarillado en el tramo
- Inician actividades de acueducto, se instan guaduas para proceder al cerramiento

	INFORME DE INTERVENTORIA No. 11	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
	CONTRATO No. 063 DE 2021	FECHA INFORME: 01/06/2022
		PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

- Inicia excavación de zanja principal para acueducto

**REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES
02 MAYO – 31 MAYO**

SEMANA 5 (2 MAYO – 7 MAYO)

- Se realiza fundida de revestimiento en tubería de alcantarillado



- Se llena y compacta con recebo zanja principal de alcantarillado





INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

- Se excava zanja para red domiciliaria




- Se funden tapas para cajas de inspección



- Continua lleno y compactación de zanja principal de alcantarillado




	INFORME DE INTERVENTORIA No. 11	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
	CONTRATO No. 063 DE 2021	FECHA INFORME: 01/06/2022
		PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

- Se realiza limpieza mecánica del tramo




- Se revisan de cajas de inspección anteriores para verificar su estado

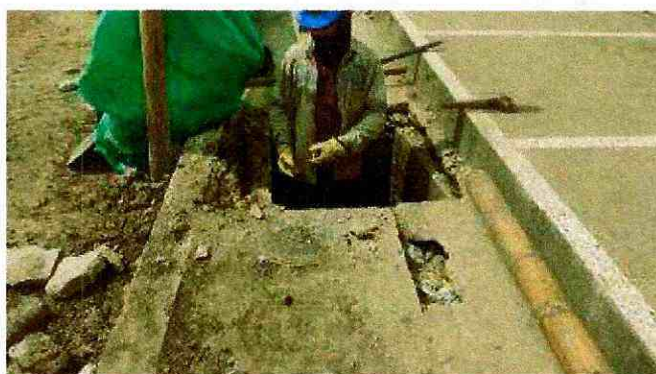

- Se realiza demolición de cajas de inspección que no cumple con las condiciones requeridas



	INFORME DE INTERVENTORIA No. 11	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
	CONTRATO No. 063 DE 2021	FECHA INFORME: 01/06/2022
		PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

- Se realiza excavación mecánica en zanja principal de alcantarillado




- Se realiza excavación para instalación de tubería que conecta el pozo #5 a caja del colector con el fin de generar un aliviadero que funciona cuando el pozo eleve su capacidad de agua normal.



- Se realiza fundida de cajas de inspección



	INFORME DE INTERVENTORIA No. 11	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
	CONTRATO No. 063 DE 2021	FECHA INFORME: 01/06/2022
		PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

- Se instala tubería de 8" en zanja principal para alcantarillado




- Se funde revestimiento sobre tubería de alcantarillado principal



- Se instalan tapas sobre cajas de inspección



	INFORME DE INTERVENTORIA No. 11	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
	CONTRATO No. 063 DE 2021	FECHA INFORME: 01/06/2022
		PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022



Observación: 07.05.2022 Las lluvias no permiten realizar actividades



SEMANA 6 (9 MAYO – 14 MAYO)

- Se realiza instalación de tubería para red de alcantarillado principal





INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL


FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

- Se atraca tubería con bultos relleno de arena



- Se realiza lleno y compactación con recebo en zanja de alcantarillado principal

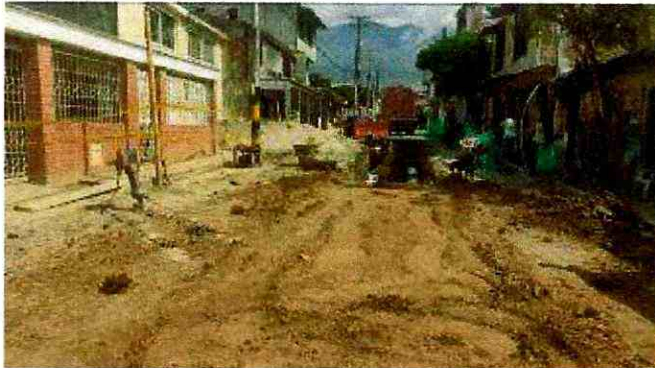

- Continua excavación para tubería que funciona como aliviadero de pozo # 5





INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

- Se realiza demolición de asfalto para realizar zanja de red domiciliaria



- Se realiza fundida de caja de inspección



- Se excava zanja para red domiciliaria de alcantarillado





INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

- Se realiza revestimiento en tubería de red domiciliaria



- Se realiza demolición para zanja de red domiciliaria



SEMANA 7 (16 MAYO – 21 MAYO)

- Continua excavación de zanjas para red domiciliaria





INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

- Se realiza limpieza del tramo



- Se instala silla YEE en tubería principal de alcantarillado



- **Observaciones:** Debido a las fuertes lluvias se generó inundaciones en algunas residencias del tramo intervenido, se informa y solicita presencia al contratista encargado de la ejecución de la obra
- Se realiza movimiento de punto de recebo dentro del mismo tramo
- Se instala tubería de 6" para red domiciliaria

