	INFORME DE INTERVENTORIA No. 11	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
	CONTRATO No. 063 DE 2021	FECHA INFORME: 01/06/2022
		PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

- Se realiza revestimiento de tubería de red domiciliaria



- Se realiza cañuela de caja de inspección
- **Observaciones:** El pozo # 7 se encuentra tapado debido a los escombros y residuos de material que circulan por él, se solicita al contratista la limpieza de este.



- Se realiza perforación en la caja del colector en donde desaguara el aliviadero del pozo #5





INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

- Se realizo lleno con recebo sobre tapas de cajas de inspección en andenes



- Continua perforación en la caja del colector en donde desaguara el aliviadero del pozo #5



- Se realiza excavación mecánica en zanja principal para red de alcantarillado



- Continúan excavaciones de zanja para construcción de cajas de inspección



INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

- Se realiza lleno y compactación en zanja principal de alcantarillado



- En zanja para instalación de aliviadero del pozo #5, se instalan dos tubos de 12 pulgadas que desembocan en la caja del colector





INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

- Continua excavación de zanjas para cajas de inspección



- Se realiza limpieza mecánica del tramo



- Se realiza funde tubería del aliviadero del pozo #5

- Se llena y compacta con recebo zanja en donde se realizo el aliviadero del pozo #5





INFORME DE
INTERVENTORIA No. 11
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

- Se realiza cañuela en caja de inspección



- Se funden cajas de inspección



- Se realiza toma de niveles por parte de la topografía del contratista para la instalación de la tubería de alcantarillado principal





INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

- Se realiza resane sobre andenes




- Se realiza adecuación de los pozos #5 y #7 con el fin de instalar de aro tapa



- Se realiza limpieza del pozo #7




	INFORME DE INTERVENTORIA No. 11	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
	CONTRATO No. 063 DE 2021	FECHA INFORME: 01/06/2022
		PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

Observaciones: Debido a las inundaciones del día 15 de mayo se realiza una visita técnica junto a la profesional social del contratista, con el fin de realizar informe de los hechos y las afectaciones en la vivienda de una de las residentes del tramo intervenido



- Se realiza placa en donde se instala aro tapa del pozo #5 y el #7



	INFORME DE INTERVENTORIA No. 11	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
	CONTRATO No. 063 DE 2021	FECHA INFORME: 01/06/2022
		PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

- Se realiza fundida de revestimiento en tubería principal de alcantarillado



- Se instala tapa del pozo #5 y el #7





INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022



- 21.05.2022 Debido a las lluvias del durante la mañana no se pudieron realizar actividades



SEMANA 8 (23 MAYO – 28 MAYO)

- Se realiza excavación de zanjas para red domiciliaria



Observaciones: Se realiza relleno de recebo sin compactación



INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022


PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022



- Continua excavación de zanjas para red domiciliaria



Observaciones: El contratista retira el relleno y realiza la actividad con la compactación correspondiente

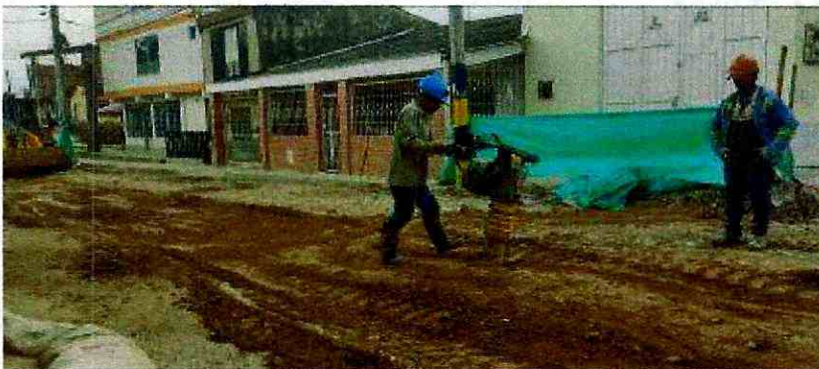

- Se realiza excavación de zanja para caja de inspección



INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022



- Continua excavación de zanjas para red domiciliaria



- Se realiza demolición de andén y excavación de zanja para caja de inspección
- Se instala revestimiento en tubería para red domiciliaria





INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

- Se realiza lleno y compactación en zanja principal de alcantarillado




- Se construyen y funden tapa para cajas de inspección

Observaciones: en el proceso de excavación de cajas de inspección en una vivienda se localiza tubería de acueducto, el cual interviene a la correcta construcción de la caja de inspección, se solicita al personal contratista indicaciones para proceder con la actividad.

SEMANA 9 (31 MAYO)

- Se finalizan actividades de alcantarillado en el tramo



	INFORME DE INTERVENTORIA No. 11	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
	CONTRATO No. 063 DE 2021	FECHA INFORME: 01/06/2022
		PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

- Inician actividades de acueducto, se instalan guaduas para proceder al cerramiento



- Inicia excavación de zanja principal para acueducto





INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

1.1.9

Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes.

CALLE/TRAMO	ESTADO INICIAL
CALLE 141 ENTRE CARRERA 8 C BIS Y TRANSVERSAL 8 BARRIO OVIEDO	VIA CON ESTRUCTURA. TRAMO EN TUBERIA DE 10"
LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR
	<p>Zanja para tubería de 10" con anchos 0,60m</p> <p>Zanja para tubería de 6" de 0,50m respectivamente</p> <p>Instalación de silla Yee para red domiciliaria</p> <p>Construcción de cajas de inspección para cada vivienda</p>
REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL	<p>Llenos en recebo compactado hasta rasante de vía.</p> <p>Excavaciones para cajas de inspección 0,80m x 0,80m</p> <p>Construcción de pozos #5 y #6</p>



INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

**DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES
02 MAYO – 31 MAYO**

SEMANA 1 (16 MAYO)


- El día 16.05.2022 se realizó una reunión junto con la comunidad con presencia de la interventoría y personal del contratista, con el fin de coordinar los tiempos y el proceso de intervención del tramo

SEMANA 2 (23 MAYO – 28 MAYO)

- 24.05.2022 inicia excavación de zanja principal para tubería de 3" de acueducto, avanzan aprox 6 metros
- Se instala tubería de 3" para acueducto principal
- Se instala cama de arena sobre tubería
- Continúa excavación de zanja principal para tubería de 3" de acueducto, avanzan aprox 10 metros
- Se realiza lleno y compactación con recebo en zanja para acueducto

SEMANA 2 (– 31 MAYO)

- Se realiza lleno y compactación con recebo en zanja para acueducto
- Continúa excavación de zanja principal para red de acueducto
- Se instala tubería de 3" para acueducto
- Se realiza limpieza mecánica del tramo intervenido

	INFORME DE INTERVENTORIA No. 11	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
	CONTRATO No. 063 DE 2021	FECHA INFORME: 01/06/2022
		PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

**REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES
02 MAYO – 31 MAYO**

SEMANA 1 (16 MAYO)

- El día 16.05.2022 se realizó una reunión junto con la comunidad con presencia de la interventoría y personal del contratista, con el fin de coordinar los tiempos y el proceso de intervención del tramo



SEMANA 2 (23 MAYO – 28 MAYO)

- 24.05.2022 inicia excavación de zanja principal para tubería de 3" de acueducto, avanzan aprox 6 metros
- Se instala tubería de 3" para acueducto principal
- Se instala cama de arena sobre tubería



- Continúa excavación de zanja principal para tubería de 3" de acueducto, avanzan aprox 10 metros



INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022




- Se realiza lleno y compactación con recebo en zanja para acueducto



SEMANA 2 (31 MAYO)

- Se realiza lleno y compactación con recebo en zanja para acueducto

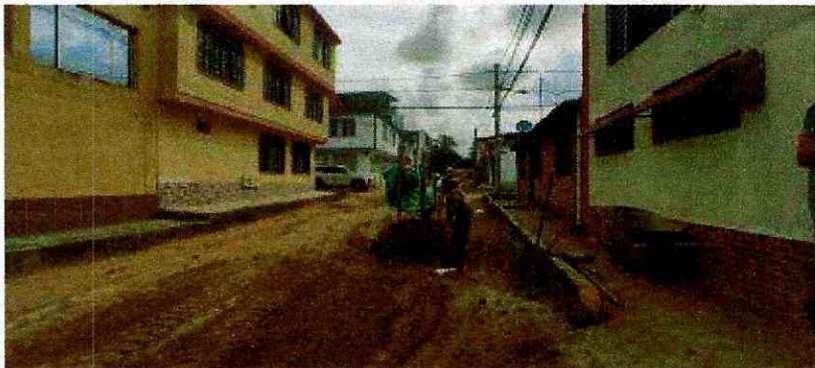



INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

- Continua excavación de zanja principal para red de acueducto



- Se instala tubería de 3" para acueducto
- Se realiza limpieza mecánica del tramo intervenido





**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

1.1.10

Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes.

CALLE/TRAMO	ESTADO INICIAL
<p>CALLE 144 CON CARRERA 18 BARRIO CALUCAIMA</p>	<p>VIA CON ESTRUCTURA EN BALASTRO CONSTRUCCION RED DE AGUAS RESIDUALES DE 8" PLASTICA, CONSTRUCCION POZOS INICIALES CON DOMICILIARIAS DE 6", CAJAS DE INSPECCION</p>
LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR
	<p>Zanja para tubería de 8" con anchos de 0,60 metros</p> <p>Zanja para tubería de 6" de ancho 0,50 metros respectivamente</p> <p>Instalación de silla YEE para red domiciliaria</p> <p>Construcción de cajas de inspección para cada vivienda</p> <p>Llenos en recebo compactado hasta rasante de vía.</p> <p>Excavaciones para cajas de inspección 0,80m x 0,80m X 1:00</p>
	



INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 2 DE MAYO AL 31 MAYO

SEMANA 01 (02 al 07 mayo)

- Levantamiento topográfico en los tramos, instalada de guadua cada 3 metros, poli sombra ca 1.50 metros de alto para cerramiento del mismo, excavación mecánica PP S15. Apiques manuales para ubicar cruce de redes, excavación manual cajas de inspección casa 9 manzana S, Excavación mecánica red central PP S15 a la abscisa 6 metros, retiro del agua con motobomba y sobrantes del sobrancho PP S15 limpieza en tramo con minicargador. Fundida de caja de inspección en concreto rígida casa 9 manzana S, y apique en casa 1 manzana T para ubicar caja de inspección existente.

SEMANA 02 (09 al 14 mayo)

- Retiro manual del sobrancho de red central de la abscisa 2 metros ala abscisa 8 metros tramo PP S15 a PP S14, instalada de tapa caja de inspección casa 9 manzana S, limpieza mecánica en el tramo con mini cargador, nivelación topográfica del terreno, lecho en arena y la instalada de 2 tubos en red central con su silla yee y su respectivo atraque, lleno en recebo media zanja y compactada con pisón manual, lleno en recebo cada .30 metros y compactada con saltarín a la rasante de vía, retiro del agua con motobomba del PP S15 para hechura del piso basa del pozo. Hechura del cilindro y con reductor del PP S15. Instalada de guadua cada 3 metros de ancho y poli sombra 1.50 metros de altura en tramo PP 4-PP 3-PP 2A -PP1A, Excavación manual del PP4 y excavación en zanja del tramo a PP4 a PP3 con retiro manual de roca.

SEMANA 03 (16 al 21 mayo)

- Lecho en arena tramo PP4 a PP3, solado en concreto rígido inicio PP4 para sostener lecho en arena, piso en concreto rígido para base cañuela PP4 y PP3, nivelación del tramo PP4 a PP3 para instalación de red central y cubrimiento en concreto rígido para su protección, excavación manual tramo PP3 a PP 2A y PP 1A. lecho en arena tramo PP3 a PP2A instalación de 3 tubos en red central con nivelación topográfica y lleno en recebo a media zanja y compactación manual con pisón, lleno a la restante con el mismo material (zona verde). Excavación mecánica tramo PP2A a PP1A, Replanteo topográfico, lecho en triturado y la instala de red central con cubrimiento en concreto rígido para su protección.

SEMANA 04 (23 al 28 mayo)

- Lleno en recebo media zanja y ala restante de vía tramo PP2A a PP1A y compactada con saltarín, excavación mecánica para el PP31 y excavación mecánica en el tramo PP 31 a PP1A, y excavación manual de la abscisa .90 del PP1A ala abscisa 10 metros, hechura del piso base PP31 en concreto rígido, limpieza mecánica del tramo con



INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

Minicargador, piso base en concreto rígido para hechura del PP 1A, replanteo del tramo lecho en arena y la instalada de red central tramo PP1A a PP31. Cubrimiento en concreto rígido para su protección abscisa :90 del PP1A a la abscisa 3.40 metros y la abscisa .90 del PP 31 ala abscisa 35.60 del PP31, lleno en recebo media zanja y ala rasante de vía y compactación con saltarín. Excavación mecánica en PP 25 y excavación mecánica en zanja al PP31 con entibado metálico cada 3 metros, instalada aro tapa del PP31, pañetada y la instalada de los pasos de los Pozos 4-3-2A-1A

SEMANA 05 (30 al 31 mayo)

- Hechura cilindro PP S25, nivelación topográfica del tramo PP S31 al PP S25, lecho en triturado e instalación de 3 tubos red central, cubrimiento del mismo en concreto rígido para su protección tramo abscisa .90 metros a la abscisa 10 metros

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 01 MAYO - 31 MAYO

Levantamiento topográfico en los tramos, instalada de guadua cada 3 metros, poli sombra ca 1.50 metros de alto para cerramiento del mismo, excavación mecánica PP S15. Apiques manuales para ubicar cruce de redes, excavación manual cajas de inspección casa 9 manzana S, Excavación mecánica red central PP S15 a la abscisa 6 metros, retiro del agua y sobrantes del sobrancho PP S15 limpieza en tramo con minicargador. Fundida de caja de inspección en concreto rígida casa 9 manzana S, y apique en casa 1 manzana T para ubicar caja de inspección existente.





INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022



Lecho en arena tramo PP4 a PP3, solado en concreto rígido inicio PP4 para sostener lecho en arena, piso en concreto rígido para base cañuela PP4 y PP3, nivelación del tramo PP4 a PP3 para instalación de red central y cubrimiento en concreto rígido para su protección,



INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

excavación manual tramo PP3 a PP 2A y PP 1A. lecho en arena tramo PP3 a PP2A instalación de 3 tubos en red central con nivelación topográfica y lleno en recebo a media zanja y compactación manual con pisón, lleno a la restante con el mismo material (zona verde). Excavación mecánica tramo PP2A a PP1A, Replanteo topográfico, lecho en triturado y la instala de red central con cubrimiento en concreto rígido para su protección.





INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022



Lleno en recebo media zanja y ala restante de vía tramo PP2A a PP1A y compactada con saltarín, excavación mecánica para el PP31 y excavación mecánica en el tramo PP 31 a PP1A, y excavación manual de la abscisa .90 del PP1A ala abscisa 10 metros, hechura del piso base PP31 en concreto rígido, limpieza mecánica del tramo con mini cargador.



INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022





INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022





INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022



- Retiro manual del sobrecancho de red central de la abscisa 2 metros ala abscisa 8 metros tramo PP S15 a PP S14, instalada de tapa caja de inspección casa 9 manzana S, limpieza mecánica en el tramo con mini cargador, nivelación topográfica del terreno, lecho en arena



INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**
CONTRATO No. 063 DE 2021


CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022

y la instalada de 2 tubos en red central con su silla yee y su respectivo atraque, lleno en recebo media zanja y compactada con pisón manual, lleno en recebo cada .30 metros y compactada con saltarín a la rasante de vía, retiro del agua con motobomba del PP S15 para hechura del piso basa del pozo. Hechura del cilindro y con reductor del PP S15. Instalada de guadua cada 3 metros de ancho y poli sombra 1.50 metros de altura en tramo PP 4-PP 3-PP 2A -PP1A, Excavación manual del PP4 y excavación en zanja del tramo a PP4 a PP3 con retiro manual de roca.



	INFORME DE INTERVENTORIA No. 11	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
	CONTRATO No. 063 DE 2021	FECHA INFORME: 01/06/2022
		PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022





INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**

CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022



- Hechura cilindro PP S25, nivelación topográfica del tramo PP S31 al PP S25, lecho en triturado e instalación de 3 tubos red central, cubrimiento del mismo en concreto rígido para su protección tramo abscisa .90 metros a la abscisa 10 metros



INFORME DE
INTERVENTORIA No. **11**

CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 01/06/2022

PERIODO: 02/05/2022 – 31/05/2022



PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL



**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES
AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES PARA
CONTRATOS DE OBRA**

CÓDIGO: GJ-R-061

FECHA VIGENCIA:
2019-09-19

VERSIÓN: 01

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Página 1 de 2

CONTRATO DE OBRA N° 062 DEL 06 DE MAYO DE 2021	
CONTRATANTE:	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021
OBJETO	REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 7 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE.
VALOR:	\$ 3.947.940.553,00
PLAZO:	CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL 01:	CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL 2:	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO
SUPERVISOR:	MATEO CASA MIRANDA – CONTRATISTA IBAL
INTERVENTOR:	CONSOCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
FECHA DE INICIO:	01 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE SUSPENSION 1:	23 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE PRORROGA DE SUSPESION 1:	12 DE ENERO DE 2022
FECHA DE REINICIO:	28 DE ENERO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	02 DE JULIO DE 2022

Los suscritos, a saber: **MATEO CASAS MIRANDA** Contratista y supervisor, designado por el Gerente General para este contrato el Ingeniero **LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ** representante legal del **CONSORCIO INTERVENTORIA ETERNA IBAL**, en su condición de Interventor del Contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, en su calidad de supervisor e interventor del contrato en mención:



**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES
AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES PARA
CONTRATOS DE OBRA**

CÓDIGO: GJ-R-061

FECHA VIGENCIA:
2019-09-19

VERSIÓN: 01

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN


Página 2 de 2

CERTIFICA:

Contratista persona natural <input type="checkbox"/>	Contratista persona jurídica <input checked="" type="checkbox"/>
2. El contratista presentó la planilla número _____ de fecha _____ en la que consta que ha efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión, y riesgos laborales, de él y del personal a cargo (Cuando a ello hubiere lugar), para el período de _____. Verificado el monto de cada uno de los aportes en la planilla, se constató que se ajusta a la base de liquidación que aplica para este tipo de contratos.	2. El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

Se expide la presente constancia para efectos del respectivo pago en la ciudad de Ibagué, a los 27 días del mes de junio del año 2022.


LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
RL CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
Interventor


MATEO CASAS MIRANDA
Contratista
Supervisor

CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ibagué, 27 de Junio de 2022.

Señores
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL S.A E.S.P. Oficial
Ibagué.

REFERENCIA: Contrato de Obra 062 DEL 06 DE MAYO DE 2021

Objeto: "REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULCO No. 7 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ

Yo **JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA**, Identificado con Cedula de Ciudadanía 79.262.433 de Bogotá, Actuando como Representante Legal del **CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021**, Identificado con NIT 901.478.972-4, certifico que se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante la ejecución del Contrato de la referencia..

Lo anterior, para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los Veintisiete (27) días del mes de Junio de Dos Mil Veintidós (2022).

Cordialmente,

FIRMA 

Nombre. JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA
Cargo. Representante Legal
C.C 79.262.433 de Bogotá

CRA 7 N° 60-21 EDIFICIO DISTRITO 60 APTO 509
EMAIL: licitacionesjvh@gmail.com
Celular: 3114847660 – 3138512527
IBAGUE - TOLIMA

CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ibagué, 27 de Junio de 2022.

Señores
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL S.A E.S.P. Oficial
Ibagué.

REFERENCIA: Contrato de Obra 062 DEL 06 DE MAYO DE 2021

Objeto: "REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULCO No. 7 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ

El suscrito Contador Público, **SANDRA PAOLA ARISTIZABAL LOPEZ**, identificada con Cédula de Ciudadanía 38.144.533 expedida en Ibagué, certifica que el **CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS 2021**, Identificado con NIT 901.478.972-4, se encuentra a Paz y Salvo a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante la ejecución del Contrato de la referencia..


Sus consorciados son beneficiarios de exoneración de parafiscales según lo establecido en la ley 1739 de 2014 en su art. 19 que adicionó el inciso 3° al artículo 25 de la Ley 1607 de 2012

Lo anterior, para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los Veintisiete (27) días del mes de Junio de Dos Mil Veintidós (2022).

Cordialmente,

FIRMA



Nombre: SANDRA PAOLA ARISTIZABAL LOPEZ
Cargo: Contador Publico
TP 201831-T
C.C 38.144.533 de Ibagué

CRA 7 N° 60-21 EDIFICIO DISTRITO 60 APTO 509
EMAIL: licitacionesjvh@gmail.com
Celular: 3114847660 – 3138512527
IBAGUE - TOLIMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 6 4 9 0 2 8 1 8 4 0 E F 3 6 A

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SANDRA PAOLA ARISTIZABAL LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 38144533 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 201831-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

201831-T

SANDRA PAOLA
ARISTIZABAL LOPEZ
C.C. 38144883
RESOLUCION INSCRIPCION 254
UNIVERSIDAD CUN



FECHA 19/05/2015

DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUNA GONZALEZ 214771

203906

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.idaqs.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
38.144.533

NUMERO


ARISTIZABAL LOPEZ

APELLIDOS

SANDRA PAOLA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-MAR-1981


IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA O+ G.S. RH F SEXO

12-MAY-1999 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GUINDO VAENA



A-2900100-43159500-F-0038144533-20070615 0158207162N 02 219943511

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7982483		RAMIREZ OSPINA JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 7 N 60-21	IBAGUE-TOLIMA	2717733	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Clave		Tipo	Fecha		Pago		Valor
		Pago	Planilla		Limite	Pago	Banco	Dias Mora	
2022-04	2022-04	1450296883	9433847860	I	2022/05/09	2022/05/09	BANCO DAVIVIENDA	0	\$2.552,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES															PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS					PARAFISCALES										
			ing	ret	ide	bae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lms	vac	avp	vcs	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes						
1	CC	7982483	RAMIREZ OSPINA JUAN CARLOS																25-14	30	\$7,000,000	\$1,190,000					0	\$0						14-11	30	\$7,000,000	\$487,200	0	\$0	50	No	\$2,552,200
Total		Afiliados(1)																			\$7,000,000	\$1,190,000						\$0							\$0	\$0	50	\$0	50	\$0	\$2,552,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 79262433		RAMIREZ OSPINA JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 7 N 60-21	IBAGUE-TOLIMA	2717733		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2022-04		1450290683	I	2022/05/09	2022/05/09	BANCO DAVIVIENDA	0	\$2.552,200	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,190,000	\$0	\$0	\$1,190,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$1,190,000	\$0	\$0	\$1,190,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$487,200	\$0	\$0	\$487,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$487,200	\$0	\$0	\$487,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$875,000	\$0	\$0	\$875,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$875,000	\$0	\$0	\$875,000	
TOTAL				1	\$2,552,200	\$0	\$0	\$2,552,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación:	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 79162433		RAMIREZ OSPINA JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 7 N 60-21	IBAGUE-TOLIMA	2717733		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
Pensión 2022-05	1497061300	9435113902	I	2022/06/08	2022/06/09	BANCO DAVIVIENDA	1	\$2.552,200	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,190,000	\$0	\$0	\$1,190,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$1,190,000	\$0	\$0	\$1,190,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$487,200	\$0	\$0	\$487,200	
ARL SUIRA	14-11	890,903,790	5	1	\$487,200	\$0	\$0	\$487,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$875,000	\$0	\$0	\$875,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$875,000	\$0	\$0	\$875,000	
TOTAL				1	\$2.552,200	\$0	\$0	\$2.552,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e (CBF)	No
CC 5820803		GRON SANABRIA DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA 36 CASA 3 BARRIO IBAGUE-TOLIMA SANTA ANA		772619		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Barco	Dias Mora	Valor
2022-04		943-4201776	1	Planilla	2022/05/03	2022/05/06	IBANCO DAVIENDA	3	\$1,182,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$681,200	\$0	\$0	\$681,200	\$681,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$681,200	\$0	\$0	\$681,200	\$681,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$500,800	\$0	\$0	\$500,800	\$500,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$500,800	\$0	\$0	\$500,800	\$500,800
TOTAL				1	\$1,182,000	\$0	\$0	\$1,182,000	\$1,182,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e (CBF)	No
CC 5820803		GRON SAMABRIA DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA 36 CASA 3 BARRIO SANTA ANA	IBAGUE TOJUMA	2722619		No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Limite	Pago	Valor
2022-05	2022-05	1485809480	9435672335		1	2022/06/02	2022/06/02	2022/06/02	\$1,182,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$681,200	\$0	\$0	\$681,200
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$681,200	\$0	\$0	\$681,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$500,800	\$0	\$0	\$500,800
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,764	2	1	\$500,800	\$0	\$0	\$500,800
TOTAL					1	\$1,182,000	\$0	\$0	\$1,182,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110475263		GIL MALAMBO NATALIA JINETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mtz 13 Casa 2 1ra Etapa del Jordan	IBAGUE-TOLIMA	2717733	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor
	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	
2022-04	1465472556	9434201952	Y		2022/05/13	2022/05/19	BANCO DAVIVIENDA	6	\$354,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000
TOTAL				1	\$354,600	\$0	\$0	\$354,600

