


| | | |
|---|---|--------------------------------------|
|  | SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA | CÓDIGO: GJ-R-050 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2016-10-12 |
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | VERSIÓN: 02 |
| | | Página 1 de 1 |

Ibagué, 12 de Noviembre de 2021

Doctora
OLGA LUCIA LIEVANO RODRIGUEZ
 Secretaria General
 IBAL S.A E.S.P OFICIAL
 Ciudad

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA ACTA PARCIAL No. 3
 DEL CONTRATO N° 063 DEL 6 DE MAYO DE 2021.**

Cordial Saludo:


Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:


DOCUMENTOS ACTA PARCIAL N° 3:

- Acta parcial No. 03.
- Ficha técnica de evaluación y reevaluación.
- Certificado de pagos parafiscales.
- Factura
- Informe de Actividades
- Planilla de pago.

Atentamente,


DILEY VANESA BARRERO OLAYA
 Supervisora


CARLOS ANTONIO BONET CARDONA
 Supervisor

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
|  | SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA | CÓDIGO: GJ-R-050 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2016-10-12 |
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | VERSIÓN: 02 |
| | | Página 1 de 1 |

Ibagué, 12 de Noviembre de 2021

Doctora
OLGA LUCIA LIEVANO RODRIGUEZ
 Secretaria General
 IBAL S.A E.S.P OFICIAL
 Ciudad

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA ACTA PARCIAL No. 3
 DEL CONTRATO N° 063 DEL 6 DE MAYO DE 2021.**


Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:


DOCUMENTOS ACTA PARCIAL N° 3:

- Acta parcial No. 03.
- Ficha técnica de evaluación y reevaluación.
- Certificado de pagos parafiscales.
- Factura
- Informe de Actividades
- Planilla de pago.

Atentamente,


DILEY VANESA BARRERO OLAYA
 Supervisora


CARLOS ANTONIO BONET CARDONA
 Supervisor

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
|  | ACTA PARCIAL No. 03 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: GJ-R-033 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2021-07-15 |
| | | VERSIÓN: 06 |
| | | Página 1 de 4 |

| | |
|-----------------------------|--|
| Contrato No. | 063 de 06 de MAYO DE 2021 |
| Objeto | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS DISTRITOS HIDRAULICOS DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S.A. E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE |
| Valor total | MIL TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE (\$1.038.941.400,00). |
| Contratista | CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL Rep. Leg. LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ |
| Supervisores | ING. DILEY VANESA BARRERO OLAYA ING. CARLOS ANTONIO BONET CARDONA |
| Fecha de Inicio | 01 de Junio de 2021 |
| Fecha de terminación | 28 de Diciembre de 2021 |
| Plazo de Ejecución | DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS. |

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL No. 03 | Año | Mes | Día |
| | 2021 | 10 | 29 |

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 3 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

| | |
|--------------------------|---|
| Periodo informado | 01 de Septiembre de 2021 a 30 de Septiembre de 2021 |
|--------------------------|---|

| | |
|---|--|
| Informe de actividades desarrolladas avaladas por supervisor | <p>En el informe de interventoría No. 4, anexo a la presente acta, se muestran los procedimientos y acciones realizadas por el CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL para asegura, controlar y vigilar el desarrollo adecuado de los contratos de obra adelantados por el IBAL SA ESP OFICIAL dentro de los planes y programas de reposición de redes de acueducto y alcantarillado dentro del perímetro hidráulico de la ciudad de Ibagué.</p> |
| | <p>La interventoría realiza labores de control y seguimiento a factores técnicos, administrativos, financieros y ambientales para asegurar que se ejecuten las obras con altos estándares de calidad. De igual manera, se tiene como objetivo hacer cumplir las normas técnicas ambientales y de seguridad industrial y salud en el trabajo de la entidad y la legislación vigente con el fin de reducir el riesgo y el impacto ambiental al mínimo.</p> |
| | <p>El informe anexo contiene las actividades realizadas por los contratistas de obra durante el periodo comprendido entre el 01 de Septiembre de 2021 al 30 de Septiembre de 2021.</p> <p>Dentro de las actividades realizadas se describen las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dentro de los trabajos realizados por Interventoría está el |

levantamiento topográfico de los proyectos iniciados en este periodo, así como la supervisión y visita de cada uno de los contratos vigentes con el fin de llevar a cabo la correspondiente localización y replanteo.

- Control de calidad de materiales y proceso constructivo.
- Control de seguridad industrial y salud en el trabajo.
- Control de cantidades de obra y ejecución de presupuesto.
- Acompañamiento técnico y administrativo.
- Registro fotográfico.
- Documentación de los eventos y actividades diarias del contratista.
- Seguimiento al impacto social generado por la ejecución de la obra.
- Control de ejecución de Plan de Manejo Ambiental.
- Control de Plan de manejo de Transito
- Control y seguimiento a ensayos de laboratorio

De acuerdo a la CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO del contrato No. 063 de 2021, el avance de la interventoría y el valor a pagar al CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL reflejan el avance financiero de los contratos de obra adelantados por el IBAL SA ESP OFICIAL.

**AVANCE COMPARATIVO ENTRE
DISTRITOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE
2021**










ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033
FECHA VIGENCIA:
2021-07-15
VERSIÓN: 06
Página 3 de 4

| DISTRITO | VALOR DEL CONTRATO | VALOR EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE | VALOR POR EJECUTAR |
|---|--|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| DISTRITO 1 Y 2 | \$ 710.581.102,00 | \$ 568.464.881,60 | 80,00% | \$ 355.290.551,00 |
| DISTRITO 3 | \$3.528.154.037,00 | \$1.587.669.316,65 | 45,00% | \$ 2.399.144.745,1600 |
| DISTRITO 4 | \$1.309.436.775,00 | \$ 654.718.387,50 | 50,00% | \$ 942.794.478,0000 |
| DISTRITO 5, 5A Y 8 | \$1.847.572.826,00 | \$ 129.330.097,82 | 7,00% | \$ 1.847.572.826,0000 |
| DISTRITO 6 | \$2.784.659.942,00 | \$ 835.397.982,60 | 30,00% | \$ 2.199.881.354,18 |
| DISTRITO 7 | \$3.947.940.553,00 | \$1.460.738.004,61 | 37,00% | \$ 2.842.517.198,16 |
| DISTRITO 9 Y 10 | \$ 673.892.040,00 | \$ 505.419.030,00 | 75,00% | \$ 350.423.860,80 |
| TOTAL | \$14.802.237.275 | \$5.741.737.700,78 | | \$ 10.937.625.013,30 |
| PORCENTAJE INFORME ANTERIOR | | | 26.11% | |
| PORCENTAJE DE AVANCE PRESENTE PERIODO | | | 12.68% | |
| PORCENTAJE DE AVANCE GENERAL | | | 38.79% | |
| VALOR CONTRATO | | \$1.038.941.400,00 | | |
| VALOR EJECUTADO SEGÚN PORCENTAJE DE AVANCE GENERAL DE CONTRATOS DE OBRA. | | | | \$ 271.267.599,540 |
| SALDO POR EJECUTAR | | | | \$ 635.939.551 |
| SUMAS IGUALES | | \$1.038.941.400,00 | | \$1.038.941.400,00 |
| Evidencias de la ejecución del contrato | - Informe de Interventoría No. 4. Anexo a la presente acta. | | | |
| ESTADO DE CUENTA | | | | |
| Valor Contrato | MIL TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE (\$1.038.941.400,00). | | | |
| Valor Acta No. 01 | CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$144.828.431) MCTE | | | |
| Valor Acta No. 02 | CIENTO VEINTI SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS (\$126.439.168) MCTE | | | |
| Valor Acta No. 03 | CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$131.734.250) | | | |
| Saldo pendiente para pago) | SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (\$635.939.551) | | | |
| BALANCE DEL ANTICIPO | | | | |
| Valor del anticipo | TRECIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS (\$311.682.420) MCTE | | | |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | ACTA PARCIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: GJ-R-033 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2021-07-15 |
| | | VERSIÓN: 06 |
| | | Página 4 de 4 |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Valor amortizado Acta No. 01 | CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON TREINTA CENTAVOS (\$ 43.448.529,30) MCTE | | |
| Valor amortizado Acta No. 02 | TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CUARENTA CENTAVOS (\$37.931.750) MCTE. | | |
| Valor amortizado Acta No. 03 | TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$39.520.275) | | |
| Valor pendiente para amortizar | CIENTO NOVENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA CENTAVOS (\$ 190.781.865,70) MCTE | | |
| VALOR A CANCELAR EN ACTA PARCIAL N° 03: NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$92.213.975) MCTE | | | |
| APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | | | |
| PERSONA JURIDICA | | | |
| El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar. | | | |
| APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores) | SI | <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| Entidad en donde se realiza el pago. | APORTES EN LINEA | Valor total del aporte | \$ 14.011.900 |
| Planilla No. | | Salud | \$2.995.200 |
| Periodo cotizado | De: | 2021-09 | Pensión |
| | Hasta: | 2021-09 | ARL |
| | | | \$7.925.300 |
| | | | \$3.091.400 |
| ANEXOS: | | | Marque con x |
| Recibo de pago de seguridad social | | | X |
| Copia planillas de aportes SEPTIEMBRE de 2021 | | | X |
| Informe de Interventoría No. 4 | | | X |
| Factura | | | X |
| Certificación de aportes SSS CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL | | | X |
| Firma |  |  |  |
| Nombre | LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ | DILEY VANESA BARRERO OLAYA | CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA |
| | CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL | Supervisor | Supervisor |
| V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL | CLAUDIA COMBITA |  | |

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA

El suscrito representante legal, certifica que el CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL, identificado con NIT. 901.479.007-6, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.


La presente se expide a los 29 días del mes de octubre del año 2021, en Ibagué.



LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
C.C. 93.398.180
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL

CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL CONTRATO 0063 DEL 6 DE MAYO 2021 NIT 901.479.007-6

| INFORMACION PERSONAL | | SEGURIDAD SOCIAL INFORME # 4 | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| NOMBRE | CARGO | 02\08\2021 | 01\09\2021 |
| LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ | DIRECTOR | AGOSTO - 2021 | SEPTIEMBRE - 2021 |
| JAIME ORLANDO VELEZ OSORIO | RESIDENTE 1 | AGOSTO - 2021 | SEPTIEMBRE - 2021 |
| MARTHA CECILIA URQUIZA RIVERA | RESIDENTE 2 | AGOSTO - 2021 | SEPTIEMBRE - 2021 |
| ANDRES FERNANDO VILLANUEVA BARRAGAN | RESIDENTE 3 | AGOSTO - 2021 | SEPTIEMBRE - 2021 |
| JUAN CARLOS SALAZAR LOZANO | RESIDENTE 4 | AGOSTO - 2021 | SEPTIEMBRE - 2021 |
| FRANCISCO JAVIER CARDOZO BERMUDEZ | PROFESIONAL SISOMA | AGOSTO - 2021 | SEPTIEMBRE - 2021 |
| JOSE EDWIN GUTIERREZ TRUJILLO | INSPECTOR 1 | AGOSTO - 2021 | SEPTIEMBRE - 2021 |
| FRANKLYN GONGORA ARIAS | INSPECTOR 2 | AGOSTO - 2021 | SEPTIEMBRE - 2021 |
| KAREN JOHANA MONROY NIÑO | INSPECTOR 3 | AGOSTO - 2021 | SEPTIEMBRE - 2021 |
| JUAN SEBASTIAN SIERRA RAMIREZ | INSPECTOR 4 | AGOSTO - 2021 | SEPTIEMBRE - 2021 |
| CAROL VANESSA CLAROS RAMIREZ | INSPECTOR 5 | AGOSTO - 2021 | SEPTIEMBRE - 2021 |
| JUAN DAVID RIOS | INSPECTOR 6 | AGOSTO - 2021 | SEPTIEMBRE - 2021 |
| JUAN CARLOS SEGOVIA FLOREZ | TOPOGRAFO 1 | AGOSTO - 2021 | SEPTIEMBRE - 2021 |
| WILSON ANDRADE LOZANO | TOPOGRAFO 1 | AGOSTO - 2021 | SEPTIEMBRE - 2021 |
| ROBERTO ALONSO CALDERON | CADENERO 1 | AGOSTO - 2021 | SEPTIEMBRE - 2021 |
| JULIO CESAR GONZALEZ HERNANDEZ | CADENERO 2 | AGOSTO - 2021 | SEPTIEMBRE - 2021 |
| DIANA MARITZA CALDERON ORTEGON | CADENERO 3 | AGOSTO - 2021 | SEPTIEMBRE - 2021 |
| ANDRES FABIAN GARZON CERVANTES | CADENERO 4 | AGOSTO - 2021 | SEPTIEMBRE - 2021 |
| CAROLINA GARCIA GRAJALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AGOSTO - 2021 | SEPTIEMBRE - 2021 |
| GUSTAVO ADOLFO GUZMAN SEGURA | INSPECTOR 7 | AGOSTO - 2021 | SEPTIEMBRE - 2021 |
| INGRID ALEXANDRA VANGAS OTALORA | ASESOR AMBIENTAL | AGOSTO - 2021 | SEPTIEMBRE - 2021 |
| GERMAN MONSALVE SANEZ | ASESOR HIDRAULICO | AGOSTO - 2021 | SEPTIEMBRE - 2021 |



DATOS GENERALES DEL APORTANTE


| | | | | | | | | |
|----------------|----|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dy | Razon social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerada SEMA e ICBF |
| RIT 90479007 | 6 | CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAK | 8 - MENOS DE 200 COLTIZANTES | IBAL OBRA | calle 24 No 5-28 | IBAGUE-TOLIMA | 2645827 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| | | | | | |
|---------|---------|------|------------|------------|--------------|
| Periodo | Clave | Tipo | Fecha | Pago | Valor |
| 2024-09 | 2024-10 | E | 2021/10/04 | 2021/10/13 | \$13,176,200 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| No. | Identificación | Nombre | NOVEDADES | | | PENSIÓN | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------|--------------------|------|-----|---------|--------|-----|-------------|-----------|--------|-----|-------------|-----------|--------------|-----|-------------|--------------|------|-------------|--------------|--|---------------|-------------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | Ingre | Reti | Dep | Code | Días | IBC | Aporte | Code | Días | IBC | Aporte | Code | Días | IBC | Aporte | Code | Días | IBC | Aporte | Exonerada SEMA e ICBF | Total Aportes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUCURSAL: IBAK OBRA (20 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC | 10527405 | GARCIA CAROLINA | | | | 230201 | 30 | \$1,500,000 | \$240,000 | EP5002 | 30 | \$1,500,000 | \$40,000 | CCF50 | 30 | \$1,500,000 | 14-11 | 30 | \$1,500,000 | \$7,900 | SI | \$1,507,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CC | 10218162 | MONSALVE GERMAN | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | EP5005 | 30 | \$1,650,000 | \$46,000 | CCF50 | 30 | \$1,650,000 | 14-11 | 30 | \$1,650,000 | \$8,700 | SI | \$1,658,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Centro de Trabajo: OBRA (18 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (18 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CC | 14270197 | ALONSO ROBERTO | | | | 230301 | 30 | \$1,500,000 | \$240,000 | EP5002 | 30 | \$1,500,000 | \$50,000 | CCF50 | 30 | \$1,500,000 | 14-11 | 30 | \$1,500,000 | \$104,400 | SI | \$1,604,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CC | 93371137 | ANDRADE WILSON | | | | 25-14 | 30 | \$3,500,000 | \$140,000 | EP5002 | 30 | \$3,500,000 | \$140,000 | CCF50 | 30 | \$3,500,000 | 14-11 | 30 | \$3,500,000 | \$243,600 | SI | \$3,743,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CC | 97953687 | CALDERON DIANA | | | | 230201 | 30 | \$1,500,000 | \$240,000 | EP5002 | 30 | \$1,500,000 | \$40,000 | CCF50 | 30 | \$1,500,000 | 14-11 | 30 | \$1,500,000 | \$104,400 | SI | \$1,604,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CC | 2230920 | CARDOSO FRANCISCO | | | | 230301 | 30 | \$2,500,000 | \$400,000 | EP5005 | 30 | \$2,500,000 | \$100,000 | CCF50 | 30 | \$2,500,000 | 14-11 | 30 | \$2,500,000 | \$174,000 | SI | \$2,674,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | CC | 11059298 | CLAROS CAROL | | | | 25-14 | 30 | \$2,000,000 | \$320,000 | EP5037 | 30 | \$2,000,000 | \$80,000 | CCF50 | 30 | \$2,000,000 | 14-11 | 30 | \$2,000,000 | \$139,200 | SI | \$2,139,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | CC | 9374004 | GARZON ANDRES | | | | 25-14 | 30 | \$1,500,000 | \$240,000 | EP5037 | 30 | \$1,500,000 | \$40,000 | CCF50 | 30 | \$1,500,000 | 14-11 | 30 | \$1,500,000 | \$104,400 | SI | \$1,604,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | CC | 9377886 | GONZALEZ FRANCILYN | | | | 25-14 | 30 | \$2,000,000 | \$320,000 | EP5044 | 30 | \$2,000,000 | \$80,000 | CCF50 | 30 | \$2,000,000 | 14-11 | 30 | \$2,000,000 | \$139,200 | SI | \$2,139,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | CC | 2399015 | GONZALEZ RUIO | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | EP5016 | 30 | \$1,500,000 | \$40,000 | CCF50 | 30 | \$1,500,000 | 14-11 | 30 | \$1,500,000 | \$104,400 | SI | \$1,604,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | CC | 9874791 | GUTIERREZ JOSE | | | | 230201 | 30 | \$2,000,000 | \$320,000 | EP5005 | 30 | \$2,000,000 | \$80,000 | CCF50 | 30 | \$2,000,000 | 14-11 | 30 | \$2,000,000 | \$139,200 | SI | \$2,139,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | CC | 9341394 | GUZMAN GUSTAVO | | | | 230201 | 30 | \$2,000,000 | \$320,000 | EP5037 | 30 | \$2,000,000 | \$80,000 | CCF50 | 30 | \$2,000,000 | 14-11 | 30 | \$2,000,000 | \$139,200 | SI | \$2,139,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | CC | 109944154 | MENDEZ JAMEN | | | | 230301 | 30 | \$2,000,000 | \$320,000 | EP5002 | 30 | \$2,000,000 | \$80,000 | CCF50 | 30 | \$2,000,000 | 14-11 | 30 | \$2,000,000 | \$139,200 | SI | \$2,139,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | CC | 110356807 | RUIZ JUAN | | | | 230301 | 30 | \$2,000,000 | \$320,000 | EP5002 | 30 | \$2,000,000 | \$80,000 | CCF50 | 30 | \$2,000,000 | 14-11 | 30 | \$2,000,000 | \$139,200 | SI | \$2,139,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | CC | 93409239 | SALAZAR JUAN | | | | 25-14 | 30 | \$3,500,000 | \$640,000 | EP5005 | 30 | \$3,500,000 | \$140,000 | CCF50 | 30 | \$3,500,000 | 14-11 | 30 | \$3,500,000 | \$243,600 | SI | \$3,743,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | CC | 93365009 | SEGONA JUAN | | | | 25-14 | 30 | \$3,500,000 | \$640,000 | EP5005 | 30 | \$3,500,000 | \$140,000 | CCF50 | 30 | \$3,500,000 | 14-11 | 30 | \$3,500,000 | \$243,600 | SI | \$3,743,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | CC | 110643502 | SERRA JUAN | | | | 230201 | 30 | \$2,000,000 | \$320,000 | EP5002 | 30 | \$2,000,000 | \$80,000 | CCF50 | 30 | \$2,000,000 | 14-11 | 30 | \$2,000,000 | \$139,200 | SI | \$2,139,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | CC | 40282762 | URRUTZA MARTHA | | | | D | 0 | 0 | 0 | EP5037 | 30 | \$3,500,000 | \$140,000 | CCF50 | 30 | \$3,500,000 | 14-11 | 30 | \$3,500,000 | \$243,600 | SI | \$3,743,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | CC | 93367886 | VELEZ JAMEN | | | | 230201 | 30 | \$3,500,000 | \$640,000 | EP5005 | 30 | \$3,500,000 | \$140,000 | CCF50 | 30 | \$3,500,000 | 14-11 | 30 | \$3,500,000 | \$243,600 | SI | \$3,743,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | CC | 93234654 | VILLANUEVA ANDRES | | | | 230301 | 30 | \$3,500,000 | \$640,000 | EP5037 | 30 | \$3,500,000 | \$140,000 | CCF50 | 30 | \$3,500,000 | 14-11 | 30 | \$3,500,000 | \$243,600 | SI | \$3,743,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Afiliados (20) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | \$46,650,000 | | | \$1,866,000 | | | \$46,650,000 | | | \$3,044,200 | | | \$50,694,200 | | | | | | | | | | | | | | | |



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | | | | | | |
|----------------|----|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 901479007 | 6 | CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAI | 8 - RENDOS DE ZOO COTIZANTES | IBAI OBRA | calle 24 No 5-28 | IBAGUE TOULIMA | 2645527 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| | | | | | | |
|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------------|--------------|
| Periodo | Clave | Tipo | Fecha | Pago | Dias Mora | Valor |
| Pension Salud | Planilla | Planilla | Limite | Pago | | |
| 2021-09 | 116496330 | 9425797515 | 2021/10/04 | 2021/10/13 | BANCO DAVIVIENDA | \$13,176,200 |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | | | | | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 17 | \$6,400,000 | \$0 | \$0 | \$6,400,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 6 | \$2,560,000 | \$0 | \$0 | \$2,560,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 5 | \$1,840,000 | \$0 | \$0 | \$1,840,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | | | |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 6 | \$2,000,000 | \$0 | \$0 | \$2,000,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | | | |
| COMFENALCO TOULIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 20 | \$3,044,200 | \$0 | \$0 | \$3,044,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | | | | | |
| COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 20 | \$1,866,000 | \$0 | \$0 | \$1,866,000 |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901,097,473 | 5 | 20 | \$1,866,000 | \$0 | \$0 | \$1,866,000 |
| NUOVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 20 | \$1,866,000 | \$0 | \$0 | \$1,866,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 20 | \$1,866,000 | \$0 | \$0 | \$1,866,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 20 | \$666,000 | \$0 | \$0 | \$666,000 |
| TOTAL | | | | 20 | \$13,176,200 | \$0 | \$0 | \$13,176,200 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|----------|--|
| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | | |
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF | | |
| CC 52996519 | | VAREGAS OTALORA INGRID ALEXANDRA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CARRERA 3 No. 21-153 casa 47 | CHIA-CUNDINAMARCA | 7034168 | No | | |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | | |
| Periodo | Clave | Tipo | Fecha | Pago | | Pago | | Valor | | |
| Pensión | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | | | | |
| 2021-09 | 9424797254 | I | 2021/10/06 | 2021/10/14 | BANCOLOMBIA | 8 | | | 5299,900 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|--------|------|--------|------|--------------|-------|----|---|---|----|
| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMPLEADO | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | lote | lote | top | top | vsp | con | vst | sin | lge | lma | vac | avp | vcc | ir | vip | Codigo | Bias | Codigo | Dias | PARAFISCALES | | | | | |
| 1 | CC 52996519 | VAREGAS OTALORA INGRID ALEXANDRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230321 | 30 | EP5077 | 30 | 0 | 14-11 | 3B | 0 | 0 | NO |
| Total | | Afiados(?) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación: Fecha evaluación 29/10/2021

Reevaluación: Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial No. 03

Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 063 de 06 de Mayo de 2021

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL NIT:901.479.007-6

FECHA DE INICIO: 01 DE JUNIO DE 2021

FECHA DE TERMINACION: 28 DE DICIEMBRE DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LE EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS DISTRITOS HIDRAULICOS DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE

| CLASE DE CONTRATO | 1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION | |
|-------------------|---|---|
| | 2. SUMINISTRO Y ADQUISICION | |
| | 3. ARRENDAMIENTO | |
| | 4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA | X |
| | 5. SERVICIO | |
| | 6. SEGUROS | |
| | 7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS | |
| | 8. OBRA PUBLICA | |

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

4. CONTRATO DE CONSULTORIA E INTERVENTORIA

| CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD | PUNTAJE | CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | PUNTAJE |
|---|----------------|--|-------------|
| OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS | 4,5 | PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE | 4,8 |
| COBERTURA DEL SERVICIO | 5,0 | ATENCION DE REQUERIMIENTOS | 4,7 |
| TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS | 4,8 | PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5 |
| CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO | 4,4 | DISPOSICION DEL SERVICIO | 5 |
| ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS | 5,0 | ASIGNACION DE REEMPLAZOS | 5 |
| CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES | 4,9 | CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | 5 |
| TOTAL PROMEDIO | 4,8 | PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES | 5 |
| | | ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA | 5 |
| | | CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 5 |
| | | TOTAL PROMEDIO | 4,94 |
| CRITERIOS DE CALIDAD | PUNTAJE | EVALUACION TOTAL | 4,90 |
| IDONEIDAD DE LA DIRECCION DEL PROYECTO | 5,0 | | |
| IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO | 5,0 | | |
| LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO | 5,0 | | |
| CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO | 4,9 | | |
| TOTAL PROMEDIO | 4,98 | | |

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION X REEVALUACION _____ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:
A LA FECHA EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESTANDARES GENERADOS POR IBAL SA ESP OFICIAL Y LA NORMATIVA VIGENTE PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS OBRAS SOBRE LAS CUALES SE DESARROLLA EL CONTRATO DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION X REEVALUACION POR PARTE DEL CONTRATISTA:




NINGUNA


| | | | | |
|---------------------------------|----|--------------------------|----|-------------------------------------|
| INTERPDNE RECURSO DE REPOSICION | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| INTERPONE RECURSO DE APELACION | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

| | | | | |
|---|----|--------------------------|----|-------------------------------------|
| Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion. | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
|---|----|--------------------------|----|-------------------------------------|

| | |
|---|---|
|  DILEY VANESA BARRERO OLAYA SUPERVISORA |  CARLOS ANTONIO BONEY CARDONA SUPERVISOR |
|  FIRMA DEL CONTRATISTA CONSORCIO INTERVENTDRIA EXTERNA IBAL R.L. LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ | |



CONSORCIO INTERVENTORIA
 EXTERNA IBAL
 NIT 901.479.007-6
 CRA 20 90 04 CC LOS ARROYUELOS
 LC 6
 Tel: (038) 2643878
 Ibagué - Colombia
 interventoriaexterna2021@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. IEIB-4

Señores EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SA E.S.P OFICIAL
 NIT 800.089.809-6 Teléfono (038) 2756000
 Dirección CRA 3 1 04 BARRIO LA POLA Ciudad Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura
 Generación 12/11/2021, 11:21
 Expedición 12/11/2021, 15:16
 Vencimiento 12/11/2021

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|------|---|----------|----------------|
| 1 | ACTA PARCIAL N°3 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 0063 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA LA RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS DISTRITOS HIDRÁULICOS DEL PERÍMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ. | 1.00 | 131,734,250.00 |

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Ciento treinta y un millones setecientos treinta y cuatro mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto 110,701,050.42
 IVA 19% 21,033,199.58
 Total a Pagar 131,734,250.00

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 131,734,250.00

Observaciones:

AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACTA 3 \$39.520.275
 INTEGRANTES DEL CONSORCIO
 NIT TERCERO PARTICIPACION
 93.398.180 LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ 25%
 901.035.959-7 CONSULTORIA Y CONSTRUCCION OBRAS CIVILES LFER SAS 75%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764017373935 aprobado en 20210901 prefijo IEIB desde el número 1 al 50 Vigencia: 12

Meses
 Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de Ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 4.5*1000
 CUIFE: 51ee6bcd8b0723814f626a52004eb4721b0dd9d5bbffb11d0298b7a5fef3d481ef647b00795733629db93a498cc8547

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A.S NIT 882 048 145 8



**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04**

**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**

**FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021**

INFORME DE INTERVENTORIA No.4

**CONTRATO No. 063 DE 06 DE
MAYO DE 2021**

**INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA EJECUCION
DE OBRAS DE REHABILITACION
Y/O RECUPERACION Y/O
REPOSICION DE LAS REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
PARA GARANTIZARLA
CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN
LOS DISTRITOS HIDRAULICOS DEL
PERIMETRO HIDROSANITARIO
DEL IBALS.A. E.S.P OFICIAL EN LA
CIUDAD DE IBAGUE.**


CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL

R.L. LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ


| | | |
|---|--|--|
|  | <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORIA No. 04</p> <p style="text-align: center;">CONTRATO No. 063 DE 2021</p> | <p style="text-align: center;">CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p style="text-align: center;">FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021</p> |
|---|--|--|

Contenido

| | | |
|--------|---|----|
| 1. | INFORMACION GENERAL | 5 |
| 1.1. | SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y AMBIENTAL | 5 |
| 2. | CONTROL Y SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y AMBIENTAL A CONTRATOS DE OBRA EJECUTADOS POR IBAL S.A E.S.P OFICIAL..... | 7 |
| 2.1. | DISTRITO HIDRÁULICO No. 1 y 2 CONTRATO DE OBRA No. 092 DEL 29 DE JUNIO DE 2021. | 7 |
| 2.1.1. | Información general del contrato. | 7 |
| 2.1.2. | Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes..... | 8 |
| 2.1.3. | Seguimiento a garantías contractuales..... | 16 |
| 2.1.4. | Avance Físico | 16 |
| 2.1.5. | Avance financiero..... | 17 |
| 2.1.6. | Balance del contrato | 17 |
| 2.1.7. | Gestión de las comunicaciones | 17 |
| 2.1.8. | Información relacionada con los ensayos de laboratorio..... | 17 |
| 2.1.9. | Dificultades en la ejecución de los proyectos | 18 |
| 2.2. | DISTRITO HIDRÁULICO No. 3. CONTRATO DE OBRA No. 041 DEL 07 DE ABRIL DE 2021 | 19 |
| 2.2.1. | Información general del contrato. | 19 |
| 2.2.2. | Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes..... | 20 |
| 2.2.3. | Seguimiento a garantías contractuales..... | 31 |
| 2.2.4. | Avance físico..... | 31 |
| 2.2.5. | Avance financiero..... | 32 |
| 2.2.6. | Balance del contrato | 32 |
| 2.2.7. | Gestión de las comunicaciones | 32 |
| 2.2.8. | Información relacionada con los ensayos de laboratorio..... | 32 |
| 2.2.9. | Dificultades en la ejecución de los proyectos | 33 |
| 2.3. | DISTRITO HIDRÁULICO No. 4. CONTRATO DE OBRA No. 069 DEL 14 DE MAYO DE 2021. .. | 34 |
| 2.3.1. | Información general del contrato. | 34 |
| 2.3.2. | Estado de Frentes de obra | 35 |
| 2.3.3. | Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes..... | 36 |
| 2.3.4. | Seguimiento de garantías contractuales..... | 70 |

| | | |
|---|--|--|
|  | <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORIA No. 04</p> <p style="text-align: center;">CONTRATO No. 063 DE 2021</p> | <p style="text-align: center;">CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p style="text-align: center;">FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021</p> |
|---|--|--|

| | |
|---|-----|
| 2.3.5. Avance Físico | 70 |
| 2.3.6. Avance Financiero | 71 |
| 2.3.7. Balance del Contrato..... | 71 |
| 2.3.8. Gestión de las comunicaciones | 72 |
| 2.3.9. Información relacionada con los ensayos de Laboratorio | 72 |
| 2.4. DISTRITOS HIDRÁULICOS No. 5 – 5ª Y 8 CONTRATO DE OBRA No. 113 DEL 11 DE AGOSTO DE 2021. | 74 |
| 2.4.1. Información general del contrato. | 74 |
| 2.4.2. Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes. | 75 |
| 2.5. DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 CONTRATO DE OBRA No. 089 DEL 18 DE JUNIO DE 2021. | 83 |
| 2.5.1. Información general del contrato. | 83 |
| 2.5.2. Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes. | 84 |
| 2.5.3. Seguimiento a garantías contractuales..... | 96 |
| 2.5.4. Avance Físico | 96 |
| 2.5.5. Avance Financiero | 97 |
| 2.5.6. Balance del Contrato..... | 97 |
| 2.5.7. Gestión de las comunicaciones | 97 |
| 2.5.8. Información relacionada con los ensayos de Laboratorio. | 97 |
| 2.5.9. Dificultades en la ejecución de los proyectos | 98 |
| 2.6. DISTRITO HIDRÁULICO No. 7 CONTRATO DE OBRA No. 062 DEL 06 DE MAYO DE 2021. | 99 |
| 2.6.1. Información general del contrato. | 99 |
| 2.6.2. Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes. | 100 |
| 2.6.3. Seguimiento a garantías contractuales..... | 150 |
| 2.6.4. Avance Físico | 150 |
| 2.6.5. Avance Financiero | 151 |
| 2.6.6. Balance del Contrato..... | 151 |
| 2.6.7. Gestión de las comunicaciones | 151 |
| 2.6.8. Información relacionada con los ensayos de Laboratorio. | 151 |
| 2.6.9. Dificultades en la ejecución de los proyectos | 152 |
| 2.7. DISTRITO HIDRÁULICO No. 9 y 10 CONTRATO DE OBRA No. 093 DEL 29 DE JULIO DE 2021 | 153 |

| | | |
|---|--|--|
|  | <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORIA No. 04</p> <p style="text-align: center;">CONTRATO No. 063 DE 2021</p> | <p style="text-align: center;">CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p style="text-align: center;">FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021</p> |
|---|--|--|

| | |
|--|-----|
| 2.7.1. Información general del contrato | 153 |
| 2.7.2. Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes..... | 154 |
| 2.7.3. Avance Financiero | 167 |
| 2.7.4. Balance del Contrato | 167 |
| 2.7.5. Seguimiento a garantías contractuales..... | 178 |
| 2.7.6. Avance Físico | 178 |
| 2.7.7. Avance Financiero | 179 |
| 2.7.8. Balance del Contrato | 179 |
| 2.7.9. Gestión de las comunicaciones | 179 |
| 2.7.10. Información relacionada con los ensayos de Laboratorio. | 179 |
| 2.7.11. Dificultades en la ejecución del proyecto | 179 |
| 3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA..... | 180 |
| 3.1. Información general del contrato. | 180 |
| 3.2. Control del equipo de la Interventoría..... | 180 |
| 3.3. Control del personal de Interventoría..... | 181 |
| 3.4. Trabajo de campo y actividades realizadas..... | 181 |
| 3.5. Informes técnicos mensuales..... | 181 |
| 3.6. Estado contrato interventoría..... | 182 |
| 3.7. Información financiera del Interventor..... | 182 |
| 3.8. Balance del Contrato de Interventoría..... | 183 |
| 3.9. Información financiera contrato de interventoría. | 184 |
| 3.10. Informe de Inversión y buen manejo del anticipo. | 184 |
| 3.11. Seguimiento a garantías contractuales..... | 185 |



**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04**

**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021


1. INFORMACION GENERAL

| | | |
|--|---|---------------|
| INFORME | PERIÓDICO: __x__ UNICO : | No. 04 |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN: | Desde 01/09/2021 hasta 30/09/2021 | |
| INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO | | |
| TIPO CONTRATO: | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
| CONTRATO No. Y FECHA: | 063 DE 06 DE MAYO DE 2021 | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL Rep. Leg. LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS DISTRITOS HIDRAULICOS DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S.A. E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE. | |
| VALOR DEL CONTRATO: | MIL TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE (\$1.038.941.400,00). | |
| PLAZO: | DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS | |
| ACTA DE INICIO | 01 DE JUNIO DE 2021 | |
| PRORROGAS-SI APLICA (No. DE DIAS/MESES) | N/A | |
| ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO) | N/A | |
| SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES) | N/A | |
| FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES) | 28 DE DICIEMBRE DE 2021 | |

1.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y AMBIENTAL

Como contratista del contrato de interventoría No. 063 de 06 de Mayo de 2021, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS DISTRITOS HIDRAULICOS DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S.A. E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE, presento el siguiente informe de interventoría No. 04.

Que el presente informe de interventoría No. 4, donde se describe las actividades llevadas a cabo por los contratistas de obra de los distintos distritos hidráulicos el perímetro urbano de la Ciudad de

| | | |
|---|--|--|
|  | <p align="center">INFORME DE INTERVENTORIA No. 04</p> <p align="center">CONTRATO No. 063 DE 2021</p> | <p align="center">CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p align="center">FECHA INFORME: 30/09/2021</p> <p align="center">PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021</p> |
|---|--|--|

Ibagué y la interventoría en los ámbitos técnicos, administrativos, financieros y ambientales durante el periodo comprendido entre el 01 de Septiembre de 2021 y el 30 de Septiembre 2021.

| DISTRITO HIDRAULICO/CONTRATO | PORCENTAJE DE AVANCE | ESTADO DEL CONTRATO | OBSERVACIONES |
|---|----------------------|---------------------|---------------|
| DISTRITO No. 1 y 2/CTO 092 de 29 de Junio de 2021. | 80 % | EN EJECUCION | |
| DISTRITO No. 3/CTO 041 de 07 de Abril de 2021. | 45 % | EN EJECUCION | |
| DISTRITO No. 4/CTO 069 de 14 de Mayo de 2021. | 50 % | EN EJECUCION | |
| DISTRITO No. 5, 5A Y 8/ SIN NUMERO. | 7 % | EN EJECUCION | |
| DISTRITO No. 6/ CTO 089 de 18 de Junio de 2021. | 30 % | EN EJECUCION | |
| DISTRITO No. 7/CTO 062 de 06 de Mayo de 2021. | 37% | EN EJECUCION | |
| DISTRITO No. 9 Y 10 CTO 093 de 29 de Junio de 2021. | 75 % | EN EJECUCION | |

| | | |
|---|--|---|
|  | INFORME DE INTERVENTORIA No. 04 | CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL |
| | CONTRATO No. 063 DE 2021 | FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021 |

2. CONTROL Y SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y AMBIENTAL A CONTRATOS DE OBRA EJECUTADOS POR IBAL S.A E.S.P OFICIAL

2.1. DISTRITO HIDRÁULICO No. 1 y 2 CONTRATO DE OBRA No. 092 DEL 29 DE JUNIO DE 2021.





2.1.1. Información general del contrato.

| | |
|-----------------------------|--|
| CONTRATO No. | 092 |
| FECHA | 29 DE JUNIO DE 2021 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO IC DISTRITO 1 R.L. EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑUELA |
| CLASE | OBRA |
| VALOR | SETECIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO DOS PESOS MCTE (\$710.581.102) |
| PLAZO | CIENTO OCHENTA (180) DIAS |
| FECHA DE INICIO | 8 DE JULIO DE 2021 |
| FECHA DE TERMINACION | 4 DE ENERO DE 2022 |
| OBJETO | REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 1 y 2 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE. |

| | | |
|---|--|--|
|  | <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORIA No. 04</p> <p style="text-align: center;">CONTRATO No. 063 DE 2021</p> | <p style="text-align: center;">CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p style="text-align: center;">FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021</p> |
|---|--|--|

2.1.2. Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes.

| CALLE/TRAMO | ESTADO INICIAL |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">CALLE 4D ENTRE CARRERAS 11A Y 12 BARRIO SAN DIEGO</p> | <p>VIA CON PAVIMENTO EN CONCRETO EN REGULAR ESTADO. RED DE ALCANTARILLADO EN MORTERO, EN AVANZADO ESTADO DE DETERIORO.</p> |
| LOCALIZACIÓN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Reposición de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario con sus correspondientes acometidas domiciliarias. ➤ Excavaciones con medio mecánico y entibado en los tramos donde la altura y condición del terreno lo requieran. ➤ Transporte interno de materiales y tuberías. ➤ Rellenos en recebo compactado sobre las líneas del alcantarillado y acueducto. |
| REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL | |
|  | |



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04
CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES

- Se llevó a cabo la construcción del cerramiento perimetral en lona en los tramos a intervenir.
- Se realizó la demolición del pavimento rígido en los tramos comprendidos entre los pozos PZ 1 al PZ 2, PZ 2 al PZ 3 y PZ 3 al PZ 4.
- Se llevaron a cabo las excavaciones sobre la red principal a lo largo de los tramos PZ 1 A PZ 2 y PZ 3 AL PZ 4.
- Se iniciaron las excavaciones para las acometidas domiciliarias en el tramo comprendido entre los pozos PZ 3 al PZ 4.
- Se instaló tubería PVC 14" entre los pozos PZ 1 al PZ 2 Y del PZ 3 al PZ 4.
- Se llevó a cabo el lleno en recebo compactado en los tramos PZ 3 al PZ 4 y PZ 1 al PZ 2.
- Se instaló tubería pvc de 6" en acometidas domiciliarias del tramo PZ 3 al PZ 4.
- Se realizó cargue y retiro de sobrantes producto de las demoliciones y excavaciones realizadas.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

- CORTE y DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIO.





**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04**
**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 - 30/09/2021

➤ EXCAVACION DE RED PPAL



RELLENO CON RECEBO



➤ RELLENO SOBRE RED PRINCIPAL



EXCAVACION PARA DOMICILIARIAS





➤ CONSTRUCCION DE CAJAS OMICILIARIAS



RELLENO Y RESANE DE ANDEN



| | | |
|---|--|--|
|  | <p align="center">INFORME DE INTERVENTORIA No. 04</p> <p align="center">CONTRATO No. 063 DE 2021</p> | <p align="center">CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p align="center">FECHA INFORME: 30/09/2021</p> <p align="center">PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021</p> |
|---|--|--|
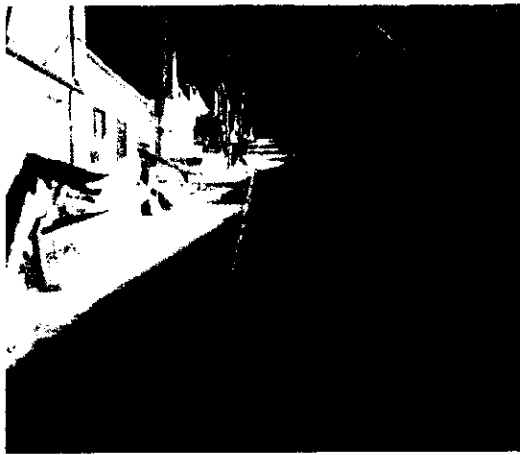
| CALLE/TRAMO | ESTADO INICIAL |
|--|---|
| <p align="center">CALLE 12 ENTRE CARRERAS 13 - 14 – 15 B/ VEINTE DE JULIO</p> | <p>VIA CON PAVIMENTO EN CONCRETO EN REGULAR ESTADO. RED DE ALCANTARILLADO EN MORTERO EN AVANZADO ESTADO DE DETERIORO.</p> |
| LOCALIZACIÓN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Reposición de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario con sus correspondientes acometidas domiciliarias. ➤ Excavaciones con medio mecánico y entibado en los tramos donde la altura y condición del terreno lo requieran. ➤ Transporte interno de materiales y tuberías. ➤ Rellenos en recebo compactado sobre las líneas del alcantarillado y acueducto |
| REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL | |
|  | |



**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04**

**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES SEPTIEMBRE

ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES


- Se llevó a cabo la instalación de la red de alcantarillado de aguas residuales en los siguientes tramos: PZ 6 – PP12, PZ 3-PZ3A, PZ 3 A PZ 4
- Se llevó a cabo la rotura del pavimento tanto de la red principal como de las acometidas domiciliarias.
- Se llevaron a cabo las excavaciones a máquina a lo largo de los tramos antes mencionados.
- Se realizó entibado en madera a lo largo de los tramos mencionados.
- Se realizó la instalación de la cama de grava para la tubería a lo largo de la línea de la red
- Se instaló tubería plástica de 12" en los tramos ya mencionados
- Se llevaron a cabo los llenos en recebo compactado a lo largo de los tramos intervenidos
- Se está trabajando en las acometidas domiciliarias y sus cajas de inspección
- Se llevó a cabo el cargue y retiro de sobrantes producto de las excavaciones y demoliciones.

RED DE ACUEDUCTO:

- Se realizaron excavaciones para la red principal y acometidas en la calle 12 entre carreras 14 y 15.
- Se instaló tubería pvc 3" en el tramo citado
- Se instalaron las acometidas domiciliarias en ½"

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

- EXCAVACIÓN PARA RED Y POZO NUEVO EXCAVACIONES SOBRE LA RED ACUEDUCTO

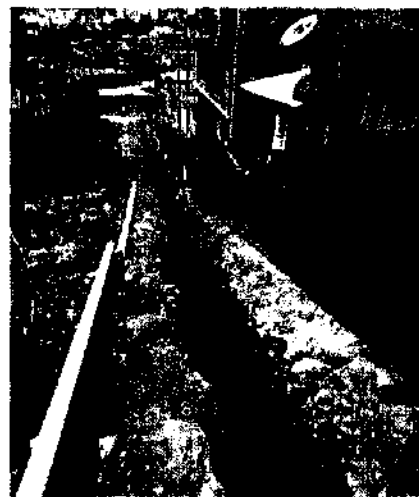



**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04**
**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

➤ **CONSTRUCCIÓN DE POZO**



INSTALACIÓN DE DOMICILIARIAS





➤ **RELLENO CON RECEBO COMPACTADO**





**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04**
**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

| CALLE/TRAMO | ESTADO INICIAL |
|---|---|
| CALLE 9 ENTRE CARRERAS 10 Y 11 B/BELEN | VIA CON PAVIMENTO FLEXIBLE EN REGULAR ESTADO. RED DE ALCANTARILLADO EN MORTERO EN AVANZADO ESTADO DE DETERIORO. |
| LOCALIZACIÓN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR |
|  | <ul style="list-style-type: none">➤ Reposición de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario con sus correspondientes acometidas domiciliarias.➤ Excavaciones con medio mecánico y entibado en los tramos donde la altura y condición del terreno lo requieran. |
| REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL | |
|  | <ul style="list-style-type: none">➤ Transporte interno de materiales y tuberías.➤ Rellenos en recebo compactado sobre las líneas del alcantarillado y acueducto. |



**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04**
**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

Alcantarillado Aguas Residuales

- Se terminó la instalación de las domiciliarias y construcción de cajas.

REPOSICION RED DE ACUEDUCTO


- Se realizaron excavaciones para la red principal y acometidas en la calle 9 entre carreras 10 y 11.
- Se instaló tubería pvc 3" en el tramo citado
- Se instalaron las acometidas domiciliarias en 1/2"
- Se realiza prueba hidrostática de la red principal.
- Queda pendiente la ejecución de los respectivos empalmes a la red existente, los cuales ya fueron solicitados por esta interventoría para programación del IBAL.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

➤ **RELLENOS CON RECEBO**




EXCAVACIÓN SOBRE RED PRINCIPAL

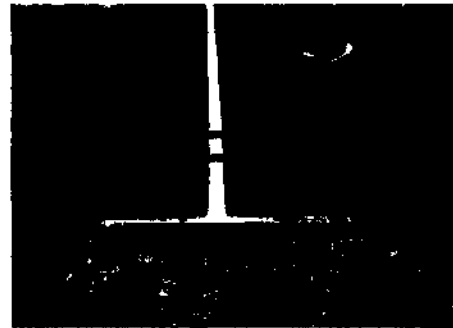

➤ **EXCAVACIONES PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS**



| | | |
|---|--|--|
|  | INFORME DE INTERVENTORIA No. 04 | CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021 |
| | CONTRATO No. 063 DE 2021 | |

2.1.3. Seguimiento a garantías contractuales


| CONTRATO DE OBRA NO. 092 DE 2021 | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| NO. | ASEGURADORA | AMPARO | VIGENCIA | OBSERVACIONES |
| I-100005471 | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS | CUMPLIMIENTO | 29/06/2021 26/06/2022 | |
| I-100005471 | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS | SALARIOS Y PRESTACIONES | 29/06/2021 26/12/2024 | |
| I-100005471 | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS | CALIDAD DEL SERVICIO | 29/06/2021 26/12/2022 | |
| I-100005471 | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS | ESTABILIDAD | 29/06/2021 26/12/2026 | |
| I-100001297 | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC. | 29/06/2021 26/12/2022 | |

2.1.4. Avance Físico

A la fecha del presente informe se evidencia el siguiente avance:

| CUADRO COMPARATIVO DE ACTIVIDADES | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| MESES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PROGRAMADO | 15% | 15% | 20% | 20% | 15% | 15% |
| EJECUTADO | 20% | 30% | 30% | | | |
| EJECUTADO ACUMULADO | 20% | 50% | 80% | | | |

AVANCE DISTRITO 1 Y 2

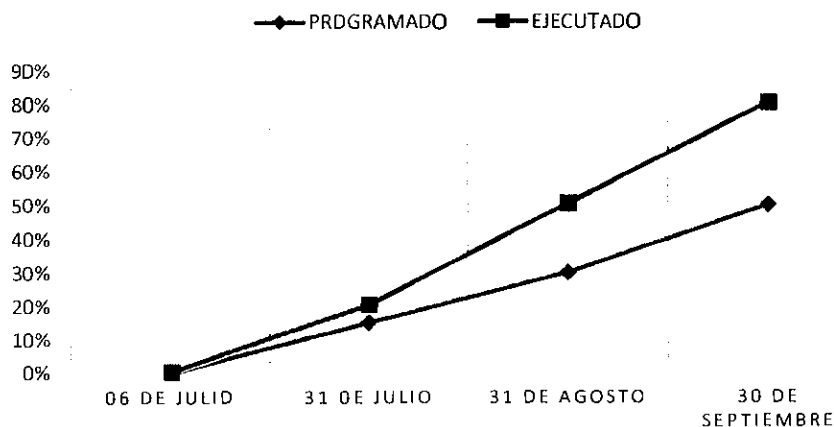

| | | |
|---|--|---|
|  | INFORME OE INTERVENTORIA No. 04 | CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL |
| | CONTRATO No. 063 DE 2021 | FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021 |


2.1.5. Avance financiero

Durante la ejecución del contrato se ha suscrito un acta parcial que muestra un valor acumulado al mes de agosto de \$ 300.667.005 equivalente al 42.31% del valor del contrato que corresponde a la suma de \$710.581.135. Sin embargo, a la fecha de realización del presente informe el contratista se encuentra elaborando el acta No.2 que corresponde a las actividades ejecutadas durante el mes de septiembre de 2021, en el cual el avance físico es de aproximadamente el 80%.

2.1.6. Balance del contrato

| | | |
|---------------------------|---------------|-------------------|
| VALOR CONTRATADO | \$710.581.135 | |
| VALOR EJECUTADO | | \$ 568.464.881,60 |
| VALOR POR EJECUTAR | | \$ 142.116.220,40 |
| SUMAS IGUALES | \$710.581.135 | \$ 710.581.135 |

PORCENTAJE DE EJECUCION

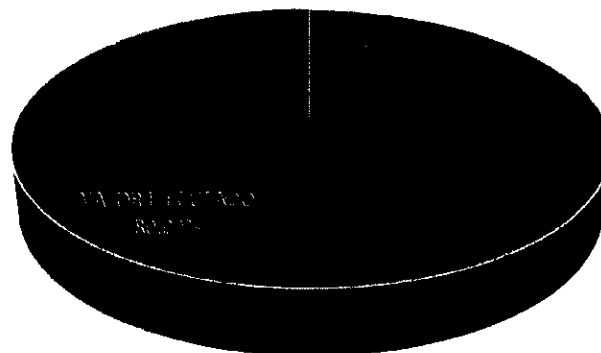

▪ VALOR SIN EJECUTAR ▪ VALOR EJECUTADO

2.1.7. Gestión de las comunicaciones

CORRESPONDENCIA DEL DISTRITO

2.1.8. Información relacionada con los ensayos de laboratorio

No se realizaron ensayos de laboratorio durante este periodo.

| | | |
|---|--|--|
|  | <p align="center">INFORME DE INTERVENTORIA No. 04</p> <p align="center">CONTRATO No. 063 DE 2021</p> | <p align="center">CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p align="center">FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021</p> |
|---|--|--|

2.1.9. Dificultades en la ejecución de los proyectos

| INCONVENIENTE | SOLUCIÓN | PROCESO / AVANCE A FECHA DE CORTE DE ESTE INFORME |
|---|--|---|
| <p>Las fuertes lluvias presentadas en la zona de intervención han generado la suspensión de la ejecución de los trabajos durante largos períodos de tiempo, así como la pérdida de trabajos realizados y el retraso para el inicio de otras actividades dada la saturación de los materiales.</p> | <p>Esperar que cesen las lluvias y disminuya la saturación de materiales para poder ejecutar los trabajos.</p> | <p>Trabajos en ejecución</p> |


| | | |
|---|--|---|
|  | INFORME DE INTERVENTORIA No. 04 | CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL |
| | CONTRATO No. 063 DE 2021 | FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021 |

2.2. DISTRITO HIDRÁULICO No. 3. CONTRATO DE OBRA No. 041 DEL 07 DE ABRIL DE 2021





2.2.1. Información general del contrato.

| | |
|-----------------------------|--|
| CONTRATO No | 041 |
| FECHA | 07 DE ABRIL DE 2021 |
| CONTRATISTA | UNION TEMPORAL AGUAS 2021 R.L. ANDRES EDUARDO TRUJILLO ARANGO |
| CLASE | OBRA |
| VALOR | TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SIETE PESOS MCTE (\$3.528.154.037) |
| PLAZO | CIENTO OCHENTA (180) DIAS |
| FECHA DE INICIO | 02 DE JUNIO DE 2021 |
| FECHA DE TERMINACION | 28 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| OBJETO | REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 3 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE. |

| | | |
|---|--|---|
|  <p>IBAL SA ESP OFICIAL</p> | <p>INFORME DE INTERVENTORIA No. 04</p> <p>CONTRATO No. 063 DE 2021</p> | <p>CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p>FECHA INFORME: 30/09/2021</p> <p>PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021</p> |
|---|--|---|

2.2.2. Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes
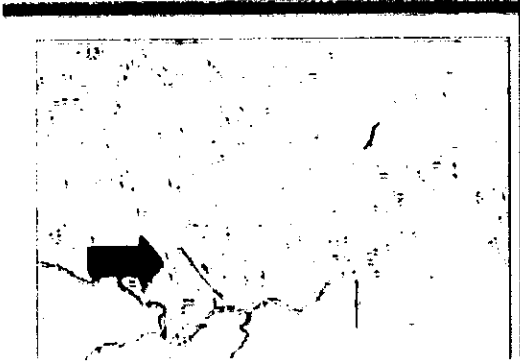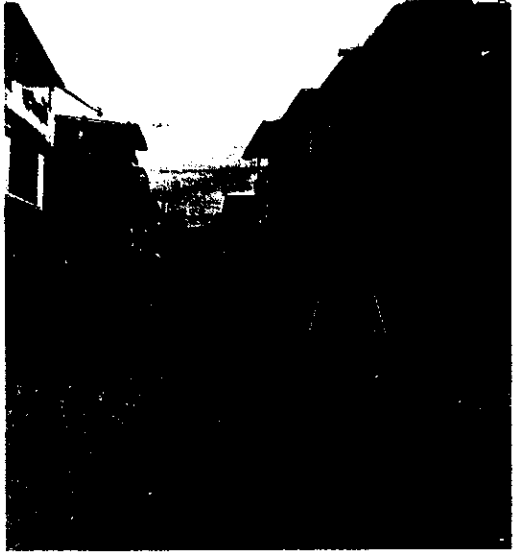
| CALLE/TRAMO | ESTADO INICIAL |
|---|--|
| <p>CARRERA 10 SUR ENTRE CALLES 24 Y 27 BARRIO VILLA CLAUDIA</p> | <p>VIA CON PAVIMENTO EN MAL ESTADO. RED DE ALCANTARILLADO EN AVANZADO ESTADO DE DETERIORO, COLAPSADA EN ALGUNOS TRAMOS, CON HUNDIMIENTOS Y CARCAVAS SOBRE LA VIA</p> |
| <p>LOCALIZACIÓN</p> | <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR</p> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Reposición de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial con sus correspondientes acometidas domiciliarias. ➤ Excavaciones con medio mecánico y entibado en los tramos donde la altura y condición del terreno lo requieran. ➤ Protección de los tramos a construir con revestimiento de la tubería en tramos donde el sistema no cuenta con la profundidad necesaria para estar acorde con la normativa vigente. ➤ Transporte interno de materiales y tuberías. ➤ Rellenos en recebo compactado sobre las líneas del alcantarillado y acueducto. |
| <p>REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL</p> | |
|  | |



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04
CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES

- Se llevó a cabo la reposición de la red de alcantarillado de aguas residuales en los siguientes tramos: PZ 14 A PZ 10A Y PZ 10A A PZ 8A
- Se llevó a cabo la rotura del pavimento asfáltico tanto de la red principal como de las acometidas domiciliarias.
- Se llevaron a cabo las excavaciones a máquina a lo largo de los tramos antes mencionados.
- Se realizó entibado en madera a lo largo de los tramos intervenidos, dada la profundidad de la excavación y la inestabilidad del terreno.
- Se realizó la instalación de la cama de grava para la tubería a lo largo de la línea de la red
- Se instaló tubería plástica de 20" en los tramos ya mencionados
- Se llevaron a cabo los llenos en recebo compactado a lo largo de los tramos intervenidos
- Se realizaron las acometidas domiciliarias del alcantarillado a lo largo de los tramos citados.
- Se llevó a cabo el cargue y retiro de sobrantes producto de las excavaciones.

ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS

- En el presente período se ejecutaron trabajos sobre la red de aguas lluvias en los siguientes tramos: PZ 27 A PZ23, PZ 22 A PZ17, PZ11 A PZ11A.
- Se llevó a cabo la rotura del pavimento asfáltico sobre la red principal.
- Se llevaron a cabo las excavaciones a máquina a lo largo de los tramos antes mencionados.
- Se realizó entibado en madera a lo largo de los tramos intervenidos, dada la profundidad de la excavación y la inestabilidad del terreno.
- Se realizó la instalación de la cama de grava para la tubería a lo largo de la línea de la red
- Se instaló tubería plástica de 16" en los tramos ya mencionados
- Se llevaron a cabo los llenos en recebo compactado a lo largo de los tramos intervenidos
- Se llevó a cabo el cargue y retiro de sobrantes producto de las excavaciones.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

- EXCAVACION DE 2 TRAMOS DE RED RESIDUAL 20"





**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04**

**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**

**FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021**


➤ **CONSTRUCCION DE POZOS NUEVOS**



DERRUMBES SOBRE RED



➤ **CONSTRUCCION DE CAJAS DOMICILIARIAS**

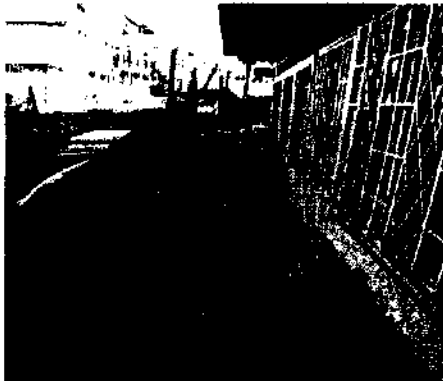

COMPACTACION MECANICA DE RELLENO




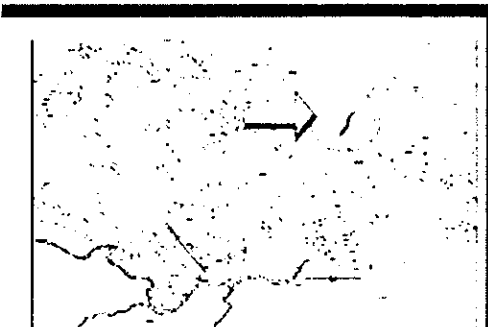

➤ **EXCAVACION PARA DOMICILIARIAS**



ENCOFRADO TUBERIAS DE 6" DOMIC.



| | | |
|---|--|--|
|  | <p align="center">INFORME OE INTERVENTORIA No. 04</p> <p align="center">CONTRATO No. 063 DE 2021</p> | <p align="center">CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p align="center">FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021</p> |
|---|--|--|

| | |
|---|--|
| <p align="center">CALLE 24 ENTRE KRA 1 Y 2 SUR BARRIO LAS FERIAS</p> | <p>VIA PAVIMENTADA EN MAL ESTADO CON POZOS TOTALMENTE COLMATADOS AL IGUAL QUE UNOS TRAMOS DE TUBERIA, SOCAVACION DE GRAN TAMAÑO. TRAMO EN TUBERIA DE 20" EN CONCRETO DE DETERIORO, TRAMOS COLAPSADA O TAPONADA O DESENCAJADA O ETC.</p> <p>VIA PAVIMENTADA EN MAL ESTADO CON BACHES, POZOS SIN TAPAS, TUBERIA DE ALCANTARILLADO APLASTADAS, QUE COLAPSAN CUANDO LLUEVE, TUBERIA DE 24 Y 30 EN CONCRETO QUE ENTREGAN AL BOX COULVERT DE LA KRA 2 SUR, SE ESTA PENDIENTE DE INSPECCION CON EL ROBOT EN UN RAMAL.</p> |
| <p align="center">LOCALIZACIÓN</p> | <p align="center">CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR</p> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Instalación de tubería novafort en dos ramales uno de aguas servidas de 24 pulgadas y el otro en 33 pul de aguas lluvias que entregan al Box coulvert ➤ Protección de los tramos a construir con revestimiento de la tubería en tramos donde el sistema no cuenta con la profundidad necesaria para estar acorde con la normativa vigente. |
| <p align="center">REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL</p> | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Transporte interno de materiales y tuberías. ➤ Retiro de material de excavación y llevado a la escombrera |
|  | |



**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04**
**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

RED NO.1 – AGUAS RESIDUALES

- No se realizaron trabajos sobre esta red.

RED NO.2 – AGUAS LLUVIAS

- Se llevó a cabo la reposición de la red de alcantarillado de aguas lluvias en el tramo PZ 11 – PZ 8 y PZ 8 – PZ 3
- Se llevó a cabo la rotura del pavimento asfáltico en la red principal.
- Se llevaron a cabo las excavaciones a máquina a lo largo de los tramos antes mencionados.
- Se instaló tubería plástica de 24" en los tramos ya mencionados
- Se realizó la protección de la tubería mediante un revestimiento en concreto en una longitud de 12 metros a lo largo del tramo PZ 11 – PZ 8, dado que el relleno sobre la clave de la tubería es inferior a 1.20 metros, de acuerdo a lo especificado en la norma RAS.
- Se llevaron a cabo los llenos en recebo compactado.
- Se llevó a cabo el cargue y retiro de sobrantes producto de las excavaciones.

RED NO.3 – AGUAS RESIDUALES

- Se llevó a cabo la reposición de la red de alcantarillado de aguas residuales del PZ 9 al PZ 6 y del PZ 4 al PZ 0 hasta el pasacalle sobre la avenida 1a
- Se llevó a cabo la rotura del pavimento asfáltico tanto de la red principal como de sus acometidas domiciliarias.
- Se llevaron a cabo las excavaciones a máquina a lo largo de los tramos antes mencionados.
- Se instaló tubería plástica de 18" en los tramos ya mencionados
- Se llevaron a cabo los llenos en recebo compactado.
- Se llevó a cabo el cargue y retiro de sobrantes producto de las excavaciones
- Se efectuó la reposición de la tubería de 6" en las acometidas domiciliarias encontradas en el tramo, las cuales fueron revestidas dada la profundidad de las mismas.



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04
CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 - 30/09/2021

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

➤ RUTURA DE PAVIMENTO




REVESTIMIENTO EN CONCRETO



➤ INSTALACION TUBERIA DE 24"



ENTIBADO CON MADERA

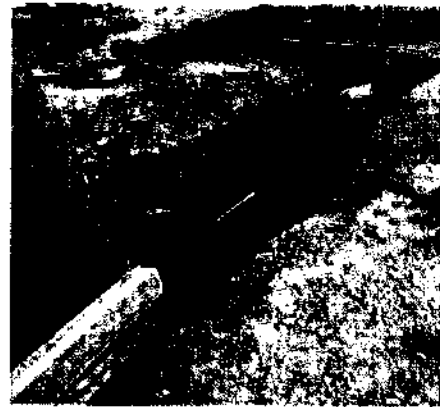





INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021
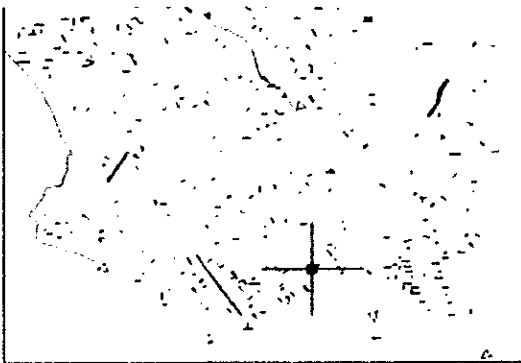
| CALLE/TRAMO | ESTADO INICIAL |
|--|--|
| CARRERA 12SUR ENTRE CALLES 20A – 21 Y CARRERA 11C ENTRE 20A -20B BARRIO RICAURTE | VIA CON PAVIMENTO EN MAL ESTADO. RED DE ALCANTARILLADO EN MORTERO POZOS DE INSPECCION TAPADOS BAJO LA RAZANTE DE LA VIA |
| LOCALIZACIÓN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR |
|  | <ul style="list-style-type: none">➤ Reposición de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario con sus correspondientes acometidas domiciliarias.➤ Excavaciones con medio mecánico y entibado en donde la altura y condición del terreno lo requieran.➤ Transporte interno de materiales y tuberías.➤ Rellenos en recebo compactado sobre las líneas del alcantarillado y acueducto. |
| REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL | |
|  | |



**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04**

**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES

- Se llevó a cabo la reposición de la red de alcantarillado de aguas residuales del PE 8 al PE 6, del PE 6 al PP1, PP1 A PE3 y PE1 A PE5
- Se llevó a cabo la rotura del pavimento asfáltico tanto de la red principal como de sus acometidas domiciliarias.
- Se llevaron a cabo las excavaciones a máquina a lo largo de los tramos antes mencionados.
- Se instaló tubería plástica de 12" en los tramos ya mencionados
- Se llevaron a cabo los llenos en recebo compactado.
- Se llevó a cabo el cargue y retiro de sobrantes producto de las excavaciones
- Se efectuó la reposición de la tubería de 6" en las acometidas domiciliarias encontradas.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

➤ **EXCAVACIONES PARA LA RED**



INSTALACION DE TUBERIA



➤ **ENTIBADO EN MADERA**





EXCAVACIONES DOMICILIARIAS





INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04
CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021
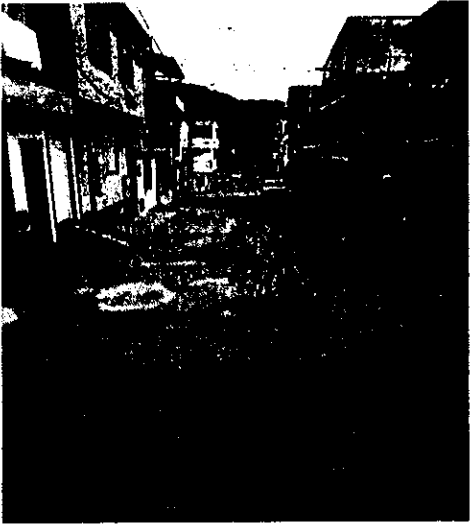
| CALLE/TRAMO | ESTADO INICIAL |
|---|--|
| CALLE 21A ENTRE CARRERAS 13SUR -14 SUR CALLE 23 ENTRE CARRERAS 11SUR Y 12SUR BARRIO RICAURTE | VIA CON PAVIMENTO EN CONCRETO EN MAL ESTADO. RED DE ALCANTARILLADO EN MORTERO |
| LOCALIZACIÓN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR |
|  | <ul style="list-style-type: none">➤ Reposición de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario con sus correspondientes acometidas domiciliarias.➤ Excavaciones con medio mecánico y entibado en donde la altura y condición del terreno lo requieran.➤ Transporte interno de materiales y tuberías.➤ Rellenos en recebo compactado sobre las líneas del alcantarillado y acueducto. |
| <p>REGISTRÓ FOTOGRAFICO INICIAL</p>  | |



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES

- Se realizó la demolición del pavimento rígido $e= 0.18$ m a lo largo de la calle 21 entre carreras 13sur y 14sur, tramo comprendido entre los pozos PZ 1 al PZ 3 .
- Se realizó rotura de pavimento asfáltico sobre la red principal en la calle 23.
- Se llevaron a cabo las excavaciones sobre la red principal a lo largo de los tramos mencionados y se iniciaron las excavaciones para las acometidas domiciliarias.
- Se instaló tubería pvc 10" entre los pozos PZ 1 y PZ 3 de la calle 21.
- Se llevó a cabo el lleno en recebo compactado sobre la red principal en la calle 21.
- Se instaló tubería pvc de 6" en acometidas domiciliarias de los tramos anotados (calle 21).
- Se realizó cargue y retiro de sobrantes producto de las demoliciones y excavaciones realizadas.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

➤ **DEMOLICION PLACA CALLE 21**

HUNDIMIENTO DE PLACA SOBRE CARCAVA CLL.21



➤ **INSTALACION TUBERÍA CALLE 21**

DEMOLICION PAVIMENTO CLL.23





**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04**
**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

➤ **EXCAVACIONES CALLE 23**



INSTALACION TUBERIA CLL.23



➤ **CONSTRUCCION ACOMETIDAS DOMICILIARIAS**



| | | |
|---|--|--|
|  | INFORME DE INTERVENTORIA No. 04 | CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021 |
| | CONTRATO No. 063 DE 2021 | |

2.2.3. Seguimiento a garantías contractuales


| Contrato de Obra No. 041 de 2021 | | | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| No. | Aseguradora | Amparo | Vigencia | Observaciones |
| I-100004333 | SEGUROS MUNDIAL | CUMPLIMIENTO | 07/04/2021 04/04/2022 | |
| I-100004333 | SEGUROS MUNDIAL | SALARIOS Y PRESTACIONES | 07/04/2021 04/10/2024 | |
| I-100004333 | SEGUROS MUNDIAL | CALIDAD DEL SERVICIO | 07/04/2021 04/10/2022 | |
| I-100004333 | SEGUROS MUNDIAL | ESTABILIDAD | 04/10/2021 04/10/2026 | |
| I-100001109 | SEGUROS MUNDIAL | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC. | 07/04/2021 04/10/2022 | |


2.2.4. Avance físico

A la fecha del presente informe se evidencia el siguiente avance

| CUADRO COMPARATIVO DE ACTIVIDADES | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------|-------|-----|-----|-----|
| MESES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PROGRAMADO | 12% | 15% | 23% | 20% | 15% | 15% |
| EJECUTADO | 7.21% | 12.39% | 12.4% | 13% | 0% | 0% |
| EJECUTADO ACUMULADO | 7.21% | 19.6% | 32% | 45% | | |

AVANCE DISTRITO 3

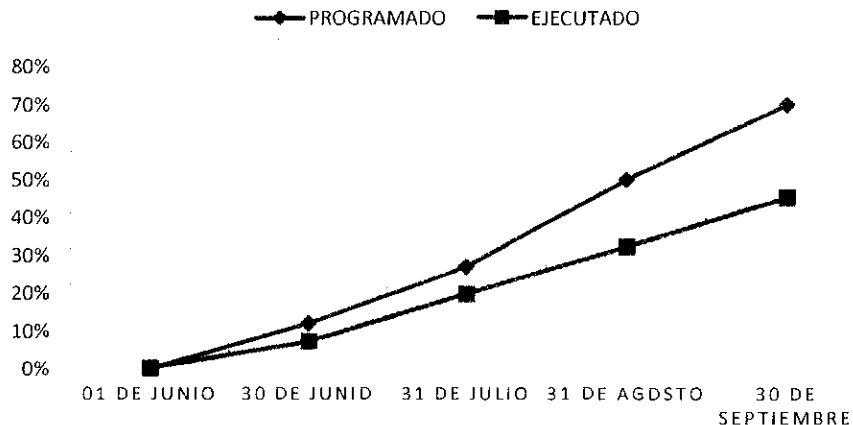

| | | |
|---|--|---|
|  | INFORME DE INTERVENTORIA No. 04 | CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL |
| | CONTRATO No. 063 DE 2021 | FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021 |


2.2.5. Avance financiero

Durante la ejecución del contrato se han suscrito tres actas parciales que muestran un valor acumulado al mes de agosto de \$ 1.100.227.611,38 equivalente al 31.18% del valor del contrato que corresponde a la suma de \$3.528.154.036,84. Sin embargo, a la fecha de realización del presente informe el contratista se encuentra elaborando el acta No.4 que corresponde a las actividades ejecutadas durante el mes de septiembre de 2021 y a un 45% aproximadamente.

2.2.6. Balance del contrato

| | | |
|---------------------------|--------------------|----------------------|
| VALOR CONTRATADO | \$3.528.154.036,84 | |
| VALOR EJECUTADO | | \$1.587.669.316,65 |
| VALOR POR EJECUTAR | | \$1.940.484.720,3500 |
| SUMAS IGUALES | \$3.528.154.036,84 | \$3.528.154.036,84 |

PORCENTAJE DE EJECUCION

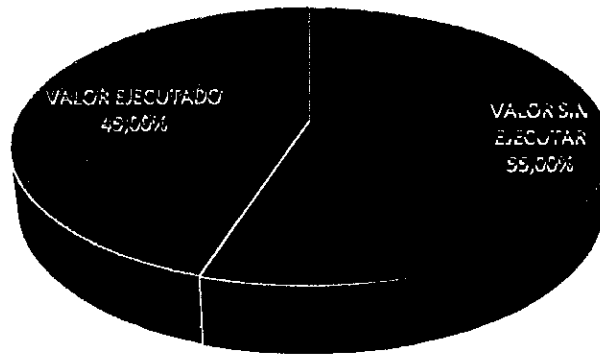


■ VALOR SIN EJECUTAR ■ VALOR EJECUTADO

2.2.7. Gestión de las comunicaciones

Se anexa correspondencia relacionada al distrito 3.

2.2.8. Información relacionada con los ensayos de laboratorio.

Se anexan resultados de ensayos de laboratorio practicados durante el periodo del presente informe.

| | | |
|---|--|---|
|  | <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORIA No. 04</p> <p style="text-align: center;">CONTRATO No. 063 DE 2021</p> | <p style="text-align: center;">CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p style="text-align: center;">FECHA INFORME: 30/09/2021</p> <p style="text-align: center;">PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021</p> |
|---|--|---|

2.2.9. Dificultades en la ejecución de los proyectos

| INCONVENIENTE | SOLUCIÓN | PROCESO/ AVANCE/A FECHA DE CORTE DE ESTE INFORME |
|---|--|--|
| <p>Las fuertes lluvias presentadas en la zona de intervención han generado la suspensión de la ejecución de los trabajos durante largos períodos de tiempo, así como la pérdida de trabajos realizados y el retraso para el inicio de otras actividades dada la saturación de los materiales.</p> <p>En diferentes sectores de intervención las redes de alcantarillado se encuentran totalmente colapsadas y los pozos de inspección colmatados, lo que hace muy difícil el proceso de identificación del diámetro de las tuberías para proceder a su compra, con lo cual se genera también retraso en la ejecución de los trabajos.</p> <p>El mal estado de las redes de alcantarillado existentes, donde en sectores como Villa Claudia se encontraron tramos en los que el alcantarillado se perdió totalmente y el agua fluye a través del terreno, ha generado condiciones de inestabilidad del terreno que hacen mucho más difícil y lento el proceso de las excavaciones e instalación de tuberías. Se presentan grandes sobre anchos que dificultan a su vez el ingreso de volquetas para el retiro de materiales.</p> <p>Algunos contratistas han manifestado la dificultad para conseguir de manera oportuna las tuberías y accesorios. Al parecer ha aumentado el valor de la materia prima y se presenta cierta escasez en dichos elementos, lo cual influye en la ejecución rápida de los trabajos.</p> | <p>Esperar que cesen las lluvias y disminuya la saturación de materiales para poder ejecutar los trabajos.</p> <p>Solicitar el Vactor al IBAL y/o hacer apiques tendientes a evacuar la tubería e identificar su diámetro.</p> <p>Se realizan las excavaciones con mucho cuidado, entibando los taludes para protección del personal que instalará la tubería. Se realiza el sobre acarreo de materiales a sitios donde se permita el ingreso de volquetas para su retiro a los lugares de disposición final.</p> <p>Hacer trámites de consecución de materiales con proveedores a nivel local y nacional.</p> | <p>Trabajos en ejecución.</p> <p>Reposición de redes en ejecución.</p> <p>Trabajos en ejecución.</p> <p>Trabajos en ejecución.</p> |

| | | |
|---|--|---|
|  | INFORME DE INTERVENTORIA No. 04 | CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL |
| | CONTRATO No. 063 DE 2021 | FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021 |

2.3. DISTRITO HIDRÁULICO No. 4. CONTRATO DE OBRA No. 069 DEL 14 DE MAYO DE 2021.




2.3.1. Información general del contrato.

| | |
|-----------------------------|--|
| CONTRATO No. | 069 |
| FECHA | 14 DE MAYO DE 2021 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO DISTRITO 4 2021 R.L. DAVID FERNANDO MARTINEZ GARZON |
| CLASE | OBRA |
| VALOR | MIL TRESCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$1.309.436.775,00) |
| PLAZO | CIENTO OCHENTA (180) DIAS |
| FECHA DE INICIO | 06 DE JULIO DE 2021 |
| FECHA DE TERMINACION | 2 DE ENERO DE 2022 |
| OBJETO | REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 4 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE |



| | | |
|---|--|--|
|  | INFORME DE INTERVENTORIA No. 04 | CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021 |
| | CONTRATO No. 063 DE 2021 | |

2.3.2. Estado de Frentes de obra

| IDENTIFICACION | UBICACION | TIPO DE OBRAS | UNIDAD | CANTIDAD | ESTADO | PROGRESO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | VALOR ESTIMADO | VALOR REALIZADO |
|--|--------------------|---------------|--------|----------|--------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------|-----------------|
| CIL 22 entre Carreras 7 y 8 | El Carmen | AC+ALC | 1 | 3 | TERMINADO | 100% ACUEDUCTO 100% ALCANT | 17/08/2021 | | 41,4 ML ALC 40 ML ACUEDU | 2 |
| CALLE 22 ENTRE CRA 4 TAMANA Y 4 ESTADICO | Estación | AC+ALC | 1 | 1 | TERMINADO | 100% de alcant 100% ACUEDUCTO | 6/07/2021 | | 116,45 ML alc 110 ACUEDUC | 4 |
| CALLE 27 ENTRE AV GUABINAL Y AMBALÁ | Cranja | AC+ALC | 1 | 3 | TERMINADO | 100% ALCANT 100% acueducto | 21/7/2021 | | 79,1 ML ALC 88,600 acuedu | 4 |
| CALLE 28 ENTRE AV GUABINAL Y AMBALÁ | Cranja | AC+ALC | 1 | | TERMINADO | 100% de alcant Y 100% ACUEDUCTO | 21/7/2021 | | 31,6 ML AL 62,2 ML ACUEDU | 5 |
| CARRERA 9A ENTRE CALLES 31 Y 32 | San Simón | AC+ALC | 1 | 3 | | | s/i | ALC. CAMBIADO YA | | |
| CARRERA 12 BIS ENTRE CALLES 32 Y CASA 33_104 | Viveros | AC | 1 | 3 | EN EJECUCION | 90% | 16/09/21 | | 89 ML | 4 |
| Carrera 7 Calles 39 y 40 | Restrepo | AC+ALC | 1 | 4 | | | s/i | ACUE. CAMBIADO | | |
| Cca 68 entre Cll 39 y 398 | Restrepo | AC | 1 | 4 | EN EJECUCION | 50% | 25/09/21 | | 60 ml | |
| CALLE 39 B ENTRE CARRERA 6A Y 7 | Restrepo | AC | 1 | 4 | | | | | | |
| Diagonal 42 entre carrera 8A y calle 44 (Tramo sin pavimentar y con alcantarillado cambiado) | Restrepo | AC | 1 | 4 | EN EJECUCION | 80% | 25/09/21 | | 117 ml | 5 |
| CARRERA 8A ENTRE CALLES 42 Y 44 | Restrepo | AC | 2 | 4 | EN EJECUC | 60% | 10/09/21 | | 116ml | 4 |
| CALLE 28 ENTRE AV 3 Y 4H (PLAZA) | Hippodromo | AC+ALC | 1 | 10 | | | s/i | | | |
| CALLE 30 ENTRE CARRERA 3 Y 4 H | Maorena Parte Alta | AC+ALC | 1 | 10 | TERMINADO | 100% | 7/13/2021 | | 67 ML ALCANT 64 ML ACUEDU | 2 |

| | | |
|---|--|--|
|  | <p align="center">INFORME DE INTERVENTORIA No. 04</p> <p align="center">CONTRATO No. 063 DE 2021</p> | <p align="center">CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p align="center">FECHA INFORME: 30/09/2021</p> <p align="center">PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021</p> |
|---|--|--|

2.3.3. Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes.

| CALLE/TRAMO | ESTADO INICIAL |
|---|--|
| <p align="center">TRAMO CALLE 22 ENTRE 4 TAMANA Y 4 ESTADIO SECTOR LA ESTACIÓN</p> | <p>Vía con pavimento flexible en muy mal estado. Tramo de la red principal en tubería de 20" en mortero, pendiente de 2,6% y una longitud de 116,45 ml, domiciliarias en gres en 6 pul una en pvc que no cumple el diámetro, cajas de inspección.</p> <p>La red de acueducto se encontró en tubería de asbesto cemento de 3 pul</p> |
| <p align="center">LOCALIZACIÓN</p> | |
|  | <p align="center">CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Incluye reposición de red de alcantarillado en tubería de pvc de 20" con las respectivas domiciliarias y cajas de inspección cuando se encuentren en mal estado o su adecuación cuando existan y dejando caja por usuario. ➤ La reposición de la red de acueducto por tubería PVC y sus respectivas domiciliarias ➤ Lleno de zanjas con material recebo compactado con medio mecánico. |
| <p align="center">REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL</p> | |
|  | |



**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04**

**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**

FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

SEMANA 1 (1 -4) de SEPTIEMBRE

- Relleno de recebo compactado capas compactadas medio mecánico (saltarín)
- Retiro del material excavado ya que no sirve para el lleno de la zanja
- Rotura de andenes para la instalación de domiciliarias de acueducto.
- Se excava para la instalación de las domiciliarias de alcantarillado

SEMANA 2 (5-11) DE SEPTIEMBRE

- Se continúa con la excavación manual y retiro de material sobrante para las domiciliarias del alcantarillado
- Se supervisa estado de tubería y medida de zanja para instalación de esta tubería.
- Se realiza la actividad de aplicación cama de arena de 10 cm. para la protección de la tubería
- Es retirada la protección con lona verde por personas ajenas a las obras, es repuesta y vuelven a quitarla
- Instalada la tubería se aplica relleno con material de recebo fino espesor de 20 cm
- Para una primera capa compactada manualmente con pisón. Las siguientes en capas de 20 cm compactadas con saltarín.
- Se demarcan los trazos para la excavación de las domiciliarias de alcantarillado.
- Se realiza retiro de material contaminado, previamente acopiado en un solo sitio

SEMANA 3 (12-18) DE SEPTIEMBRE

- Se continúa con la excavación para las domiciliarias y de las cajas de inspección de alcantarillado
- Por las lluvias de dificultan las labores tanto de excavación como de retiro de material.
- Se le solicita al contratista la correcta señalización de las zonas intervenidas que representan un peligro para los peatones del sector.

SEMANA 4 (19 – 24) DE SEPTIEMBRE


- Instalación de tubería de red domiciliaria de 6 pul
- Se continúa con el lleno de la zanja y la respectiva compactación mecánica.
- Se señaliza con cinta de peligro en las excavaciones para las cajas de inspección en la zona de andenes, también se instala camillas en maderas para tapar los huecos de estas
- Construcción de caja de 60x60x100 y/o adecuación de las cajas ya existentes
- Se llenan los formatos suministrados por el IBAL para la aprobación por parte del propietario para los cambios de domiciliaria de acueducto.



INFORME DE INTERVENTORIA No. 04
CONTRATO No. 063 DE 2021


CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

➤ **INSP. ESTADO EXCAVACION**

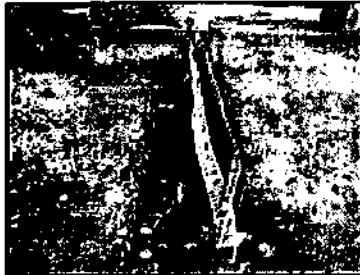

CL 22 06 015, Ibaguá, Tolima, Colombia
 Lugar de: 4 267 271 N Coordenada: 757 157 W
 Localización: Altitud: 1150 m
 Fecha: 30/09/2021 Hora: 07:30 AM
 Nombre: Interventoria Externa IBAL

* **CHEQUEO SEÑALIZACION**

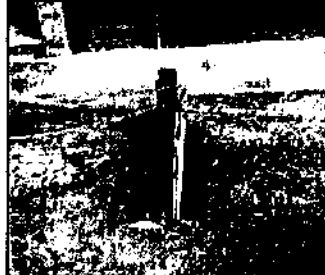

CL 22 06 015, Ibaguá, Tolima, Colombia
 Lugar de: 4 267 271 N Coordenada: 757 157 W
 Localización: Altitud: 1150 m
 Fecha: 30/09/2021 Hora: 07:30 AM
 Nombre: Interventoria Externa IBAL

* **REV RETIRO ESCOMBRO**



CL 22 06 015, Ibaguá, Tolima, Colombia
 Lugar de: 4 267 271 N Coordenada: 757 157 W
 Localización: Altitud: 1150 m
 Fecha: 30/09/2021 Hora: 07:30 AM
 Nombre: Interventoria Externa IBAL


SEMANA 3 (13 Septiembre – 19 Septiembre)

➤ **VISITA CARRP ROBOT**



CL 22 06 015, Ibaguá, Tolima, Colombia
 Lugar de: 4 267 271 N Coordenada: 757 157 W
 Localización: Altitud: 1150 m
 Fecha: 30/09/2021 Hora: 07:30 AM
 Nombre: Interventoria Externa IBAL

* **DIAGRAMA TUBERIA**




CL 22 06 015, Ibaguá, Tolima, Colombia
 Lugar de: 4 267 271 N Coordenada: 757 157 W
 Localización: Altitud: 1150 m
 Fecha: 30/09/2021 Hora: 07:30 AM
 Nombre: Interventoria Externa IBAL

* **REUNION COMUNIDAD**



CL 22 06 015, Ibaguá, Tolima, Colombia
 Lugar de: 4 267 271 N Coordenada: 757 157 W
 Localización: Altitud: 1150 m
 Fecha: 30/09/2021 Hora: 07:30 AM
 Nombre: Interventoria Externa IBAL

➤ **INSP REP ANDEN**

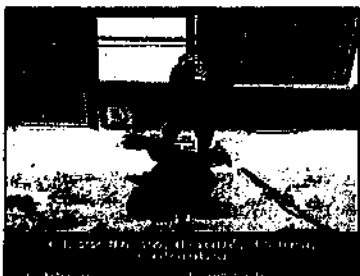

CL 22 06 015, Ibaguá, Tolima, Colombia
 Lugar de: 4 267 271 N Coordenada: 757 157 W
 Localización: Altitud: 1150 m
 Fecha: 30/09/2021 Hora: 07:30 AM
 Nombre: Interventoria Externa IBAL

CHEQUEO DOMICILIARIA



CL 22 06 015, Ibaguá, Tolima, Colombia
 Lugar de: 4 267 271 N Coordenada: 757 157 W
 Localización: Altitud: 1150 m
 Fecha: 30/09/2021 Hora: 07:30 AM
 Nombre: Interventoria Externa IBAL

INSP. COMPACTACION CAPAS



CL 22 06 015, Ibaguá, Tolima, Colombia
 Lugar de: 4 267 271 N Coordenada: 757 157 W
 Localización: Altitud: 1150 m
 Fecha: 30/09/2021 Hora: 07:30 AM
 Nombre: Interventoria Externa IBAL




INFORME DE INTERVENTORIA No. 04
CONTRATO No. 063 DE 2021



CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 - 30/09/2021

SEMANA 4 (20 Septiembre - 26 Septiembre)




➤ **REPOSICION ANDEN**



REPOSICION ANDEN

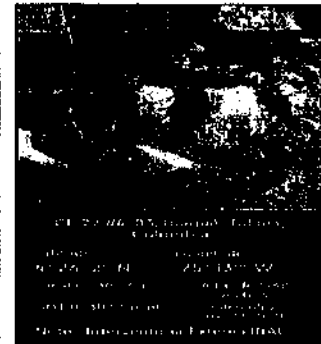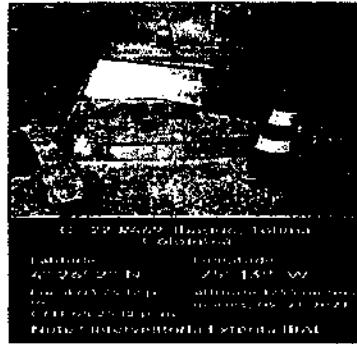


➤ **INSP CDMPACT. ABS K00+10 TOMA DENSIDADES > 97% CHEQUEO CDMPACTACION**

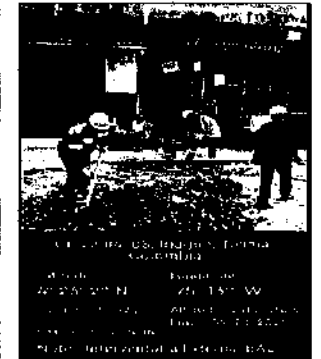

SEMANA 5. 27 SEPTIEMBRE - 30 SEPTIEMBRE



ESTADO FINAL DE LA VIA

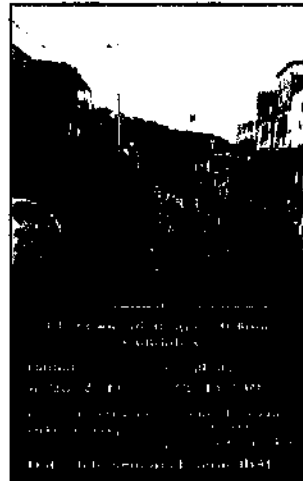





INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 - 30/09/2021

| CALLE/TRAMO | ESTADO INICIAL |
|---|--|
| CALLE 28 ENTRE CARRERA 7 Y 8 BARRIO LA GRANJA | Vía pavimentada un tramo en concreto Rígido y otro tramo en asfalto en regular estado, tubería de alcantarillado de mortero en 10 pul muy superficial llegando a la avenida Guabinal, solo se hará reposición de la red de alcantarillado en medio tramo. La red de acueducto se repondrá toda |
| LOCALIZACION | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR |
|  | <ul style="list-style-type: none">➤ Excavaciones con medio mecánico rotomartillo dado el espesor de la capa de concreto en los tramos y manual en algunos sectores donde el talud es muy alto con riesgo a desplomarse por la vibración de la maquinaria para evitar daños en las tuberías. |
| REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL | <ul style="list-style-type: none">➤ Relleno y compactación con material de rebase, inicialmente 2 capas de 25 cm y compactado a mano con la herramienta el pisón y después capas de 20 cm para que al final de la actividad quede de 15 cm, esta actividad se realiza con el equipo mecánico saltarín.➤ Reposición de tubería de alcantarillado de asbesto cemento a tubería de PVC de 10". |
|  | |



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

SEMANA (1 AL 11) DE SEPTIEMBRE

- Se realiza el corte de pavimento rígido en concreto con compresor
- Se realizó el corte de la zona de andén para la instalación de domiciliarias,
- Se hace retiro de sobrantes

SEMANA 2 (12 AL 18) DE SEPTIEMBRE

- Rotura de pavimento con rotomartillo
- Instalación de tubería de la red de acueducto
- Supervisión topográfica de la tubería instalada.
- Relleno compactado en el tramo.
- Recogida de material proveniente de la excavación.
- Chequeo de niveles para instalación de tubería red principal
- Se cae tramo de sardinel al realizar la excavación para la red principal, el fuerte aguacero que cayo se percola el agua, por la red de teléfono que se encontró instalada debajo del andén.
- Se encuentra sobre la vía el ramal de tubería de agua potable que abastece al condominio
- Se realiza la inspección de la tubería instalada con el video robot.
- Se encontró material granular en una parte de la tubería.

SEMANA 3 (19 AL 24) DE SEPTIEMBRE

- Rotura de andén para la instalación de manguera para las domiciliarias
- Actividad de relleno y compactación en el tramo de la tubería instalada.

SEMANA 4 (25 AL 30) DE SEPTIEMBRE

- Se realiza señalización de las zonas peatonales
- Se hace retiro de material sobrantes
- Se hace demolición de pavimento y apiques para realizar el empalme, se requiere demoler recubrimiento de la domiciliaria de alcantarillado.
- Se demuele esquina del andén sobre la guabinal para la ubicación de los accesorios del empalme
- Los funcionarios del Ibal indican los accesorios requeridos para realizar el empalme.



INFORME DE INTERVENTORIA No. 04
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

Semana 1:(1 al 11) de Septiembre

CHEQUEO EXCAVACION DOMICILIARIAS CON ROTURA DE PAV RIGIDO + ROTURA PAV FLEXIBLE

➤ **SEMANA 1. 01 - 5 Septiembre**





CAIDA ANDEN 12, 70 M

SEMANA 2. 6 Septiembre - 12 Septiembre



INSP. SOBREEXCAVACION

SENDERO PEATONAL

CHEQUEO ROTURAS

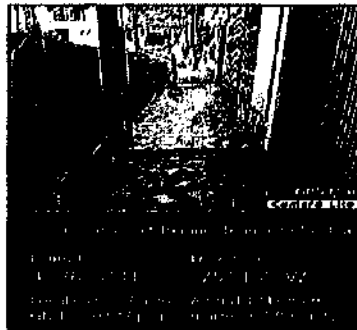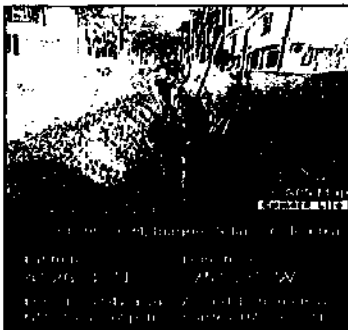

ROTURA CON EQUIPO






INFORME DE INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL

**FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021**

SEMANA 3. 13 SEPTIEMBRE – 19 SEPTIEMBRE



CI. 28.016.03, Ibagué, Tolima, Colombia

Ubicación: Longitud:
4° 26' 57" N 75° 13' 11" W

Coordenadas UTM: Zona: 18QUD
Easting: 681 034 569 m North: 929 31 393 m

Nota: Interventoria Externa IBAL



CI. 28.016.03, Ibagué, Tolima, Colombia

Ubicación: Longitud:
4° 26' 57" N 75° 13' 11" W

Coordenadas UTM: Zona: 18QUD
Easting: 681 034 569 m North: 929 31 393 m

Nota: Interventoria Externa IBAL




CI. 28.016.03, Ibagué, Tolima, Colombia

Ubicación: Longitud:
4° 26' 57" N 75° 13' 11" W

Coordenadas UTM: Zona: 18QUD
Easting: 681 034 569 m North: 929 31 393 m

Nota: Interventoria Externa IBAL




CI. 28.016.03, Ibagué, Tolima, Colombia

Ubicación: Longitud:
4° 26' 57" N 75° 13' 11" W

Coordenadas UTM: Zona: 18QUD
Easting: 681 034 569 m North: 929 31 393 m

Nota: Interventoria Externa IBAL



CI. 28.016.03, Ibagué, Tolima, Colombia

Ubicación: Longitud:
4° 26' 57" N 75° 13' 11" W

Coordenadas UTM: Zona: 18QUD
Easting: 681 034 569 m North: 929 31 393 m

Nota: Interventoria Externa IBAL




CI. 28.016.03, Ibagué, Tolima, Colombia

Ubicación: Longitud:
4° 26' 57" N 75° 13' 11" W

Coordenadas UTM: Zona: 18QUD
Easting: 681 034 569 m North: 929 31 393 m

Nota: Interventoria Externa IBAL

SEMANA 4. 20 Septiembre - 26 Septiembre




CI. 28.016.03, Ibagué, Tolima, Colombia

Ubicación: Longitud:
4° 26' 57" N 75° 13' 11" W

Coordenadas UTM: Zona: 18QUD
Easting: 681 034 569 m North: 929 31 393 m

Nota: Interventoria Externa IBAL



CI. 28.016.03, Ibagué, Tolima, Colombia

Ubicación: Longitud:
4° 26' 57" N 75° 13' 11" W

Coordenadas UTM: Zona: 18QUD
Easting: 681 034 569 m North: 929 31 393 m

Nota: Interventoria Externa IBAL



CI. 28.016.03, Ibagué, Tolima, Colombia

Ubicación: Longitud:
4° 26' 57" N 75° 13' 11" W

Coordenadas UTM: Zona: 18QUD
Easting: 681 034 569 m North: 929 31 393 m

Nota: Interventoria Externa IBAL

ROTURA PAV RÍGIDO SUMIDERO




**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04**

**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**

**FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021**

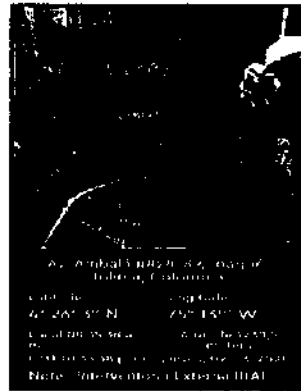


SEMANA 5. 27 Septiembre – 03 Octubre

➤ INSP CLLA 28 ENTRE


REPOSICION ANDEN 13 METROS



INS TUBERIA



SUMIDERO CRIOLLOS


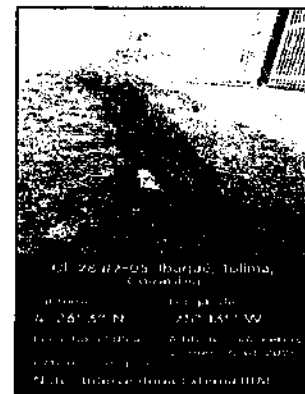




INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021
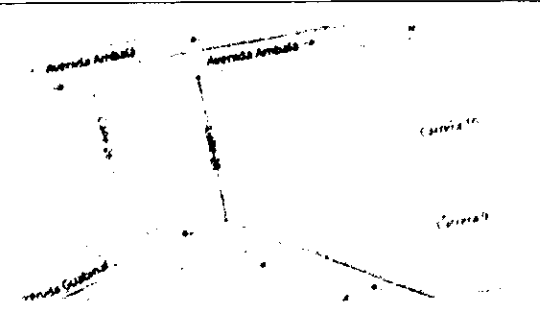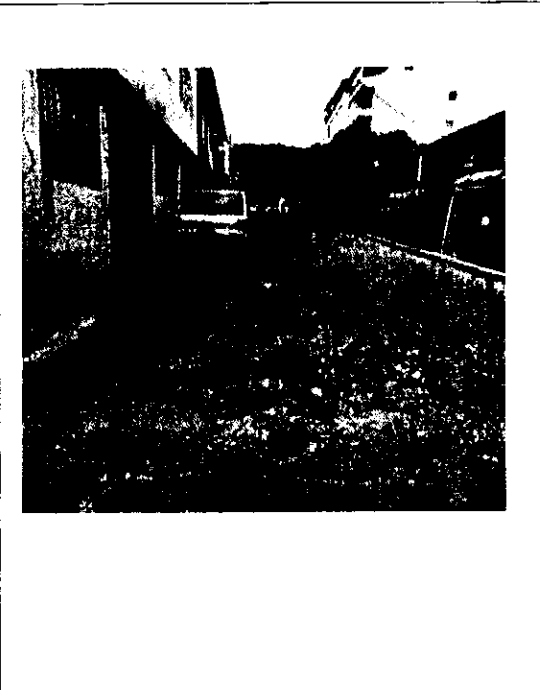
| CALLE/TRAMO | ESTADO INICIAL |
|---|--|
| CALLE 27 ENTRE GUABINAL Y AMBALA | Vía en concreto rígido en un muy mal estado. Red de alcantarillado en gres muy pegada a los frentes de las viviendas, no se encuentra p2 ni p3, Tubería de acueducto encontrada en la zona debajo del andén. Terreno muy inestable y gran profundidad |
| LOCALIZACIÓN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR |
|  | <ul style="list-style-type: none">➤ Reposición de la red de alcantarillado a tubería PVC de 10 pul.➤ Cambio de domiciliarias de alcantarillado con las respectivas cajas de inspección de 60*60*1.➤ Llenos de zanja en recebo con compactación mecánica.➤ Entibado continuo en la excavación.➤ Reposición red de acueducto en tubería pvc de presión.➤ Cambio de domiciliarias. |
| REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL | |
|  | |

| | | |
|---|--|--|
|  | <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORIA No. 04</p> <p style="text-align: center;">CONTRATO No. 063 DE 2021</p> | <p style="text-align: center;">CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p style="text-align: center;">FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021</p> |
|---|--|--|

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

SEMANA 1 (01 al 04) de Septiembre

- Se realiza el lleno del área tramo intervenido y la compactación con medio mecánico, de las domiciliarias de alcantarillado
- Se realiza el retiro del material excavado
- Se encuentra la tubería de la domiciliaria de las casas a mucha profundidad y en el área internas de la casa que quedaron por instalar

SEMANA 2 (05 al 11) de Septiembre

- Se hace la rotura del pavimento con compresor
- la excavación para la instalación de la tubería de la red principal del acueducto, la profundidad y la inestabilidad del terreno dificulta las actividades,
- Se instala tubería pvc de 3 pulgadas por tramos
- Se llena la excavación hecha para el apique realizado para ubicar la tubería existente
- Se excava para ubicar las domiciliarias., mediante compresor
- se refuerza el cerramiento ya que, al no tener suficiente espacio para el anclaje de esta, se cae permanentemente
- se realiza el cono del pozo intermedio.

SEMANA 3 (12 al 18) de Septiembre

- se continua con la excavación para instalar la red principal
- se aplica cada de arena en un espesor de 10 cm
- se instala la tubería
- se realiza el lleno de la zanja con la respectiva compactación
- se continúa buscando la caja de inspección de chao mugre
- los funcionarios de control y perdidas del Ibal revisan conexiones existentes de 3/4

SEMANA 4 (19 al 25) de Septiembre

- se continua con la excavación para instalar la red principal del acueducto
- se instala la tubería
- se realiza el lleno de la zanja con la respectiva compactación
- se encuentran dos domiciliarias la de chao mugre y la casa que se encuentra a un nivel inferior de la vía, con redes que atraviesan un muro en ciclópeo, se trata de romper el muro con rotomartillo y con material expansivo, pero no se puede romper las piedras sin debilitar el muro portante, por lo tanto se opta por hacer una manija al nivel del piso de chao mugre para conectar la vivienda que está en la parte interna del mismo a la caja de inspección de chao mugre.



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04


CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 - 30/09/2021

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE
SEPTIEMBRE

SEMANA 1. 01 - 04 Septiembre

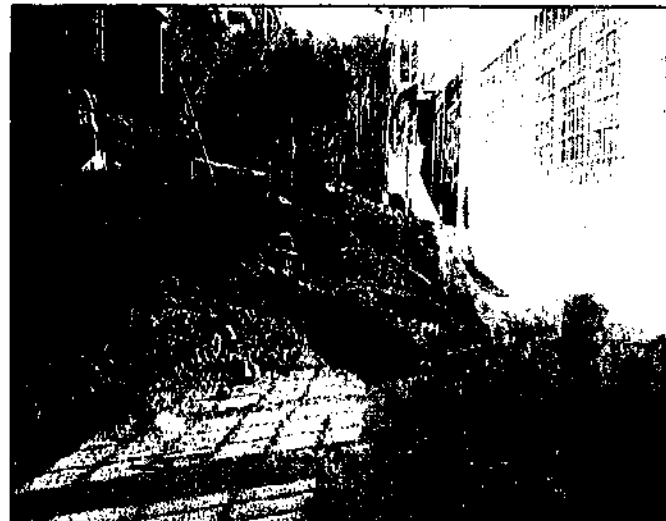



INFORME DE INTERVENTORIA No. 04
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

SEMANA 2. 6 Septiembre - 12 Septiembre



CL 273 #8 - 55, Ibagué, Tolima, Colombia

Ubicación: Longitud: 4° 26' 3" N 75° 13' W

Coord. UTM: 18 QJG 730 000 Altim. (Dinámico): 627.41 m s.n.m. Fecha: 09/09/2021

Note: Interventoria Externa IBAL

CHEQUEO POZO AMBALA



CL 273 #8 - 55, Ibagué, Tolima, Colombia

Ubicación: Longitud: 4° 26' 3" N 75° 13" W

Coord. UTM: 18 QJG 730 000 Altim. (Dinámico): 627.41 m s.n.m. Fecha: 09/09/2021

Note: Interventoria Externa IBAL



CL 273 #8 - 55, Ibagué, Tolima, Colombia

Ubicación: Longitud: 4° 26' 3" N 75° 13" W

Coord. UTM: 18 QJG 730 000 Altim. (Dinámico): 627.41 m s.n.m. Fecha: 09/09/2021

FUNCIONARIOS IBAL INSPECCION



CL 273 #9 - 06, Ibagué, Tolima, Colombia

Ubicación: Longitud: 4° 26' 3" N 75° 13" W

Coord. UTM: 18 QJG 730 000 Altim. (Dinámico): 627.41 m s.n.m. Fecha: 09/09/2021

Note: Interventoria Externa IBAL



CL 273 #8 - 55, Ibagué, Tolima, Colombia

Ubicación: Longitud: 4° 26' 3" N 75° 13" W

Coord. UTM: 18 QJG 730 000 Altim. (Dinámico): 627.41 m s.n.m. Fecha: 09/09/2021



CL 273 #8 - 55, Ibagué, Tolima, Colombia

Ubicación: Longitud: 4° 26' 3" N 75° 13" W

Coord. UTM: 18 QJG 730 000 Altim. (Dinámico): 627.41 m s.n.m. Fecha: 09/09/2021



INFORME DE INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL

**FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 - 30/09/2021**

SEMANA 4. 20 Septiembre - 26 Septiembre



Cl. 27a #8-55, Ibagué, Tolima, Colombia

Latitude: 4° 26' 3" N
Longitude: -75° 13" W

Local: 118410 m. Altitud: 1332 metros
GMT: 06:07:16 p.m. Fecha: 09-27-2021

Note: Interventoria Externa IBAL



Cl. 27a #7-14, Ibagué, Tolima, Colombia

Latitude: 4° 26' 3" N
Longitude: -75° 13" W

Local: 118410 m. Altitud: 1332 metros
GMT: 06:07:16 p.m. Fecha: 09-27-2021

Note: Interventoria Externa IBAL



Cl. 27a #7-14, Ibagué, Tolima, Colombia

Latitude: 4° 26' 3" N
Longitude: -75° 13" W

Local: 118410 m. Altitud: 1332 metros
GMT: 06:07:16 p.m. Fecha: 09-27-2021

Note: Interventoria Externa IBAL



Av. Amalva este 22 B-63 2 piso, Ibagué, Tolima, Colombia

Latitude: 4° 26' 3" N
Longitude: -75° 13" W

Local: 118410 m. Altitud: 1332 metros
GMT: 03:41:01 p.m. Fecha: 09-22-2021

Note: Interventoria Externa IBAL



Cl. 27a #9-8, Ibagué, Tolima, Colombia

Latitude: 4° 26' 3" N
Longitude: -75° 13" W

Local: 112509 m. Altitud: 1326 metros
GMT: 04:28:07 p.m. Fecha: 09-25-2021

Note: Interventoria Externa IBAL



Cl. 27a #9-04, Ibagué, Tolima, Colombia

Latitude: 4° 26' 3" N
Longitude: -75° 13" W

Local: 118410 m. Altitud: 1332 metros
GMT: 03:37:52 p.m. Fecha: 09-01-2021

Note: Interventoria Externa IBAL



INFORME DE INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 - 30/09/2021

SEMANA 5. 27 Septiembre - 03 Octubre

Muro Chao Mugre INSTALACION DOMICILIARIAS ACUEDUCTO




CL. 27a #29-42, Ibagué, Tolima, Colombia
Coordenadas: 4° 26' 3" N 75° 13' 17" W
Fecha del informe: 27 de Septiembre de 2021
Nota: Interventoria Externa IBAL

REPOSICION PLACA DE PISO



CL. 27a #29-42, Ibagué, Tolima, Colombia
Coordenadas: 4° 26' 3" N 75° 13' 17" W
Fecha del informe: 27 de Septiembre de 2021
Nota: Interventoria Externa IBAL

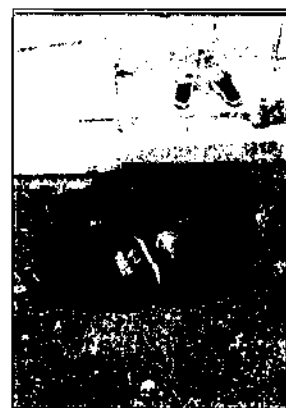

CL. 27a #29-42, Ibagué, Tolima, Colombia
Coordenadas: 4° 26' 3" N 75° 13' 17" W
Fecha del informe: 27 de Septiembre de 2021
Nota: Interventoria Externa IBAL

INSTALACION DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO



CL. 27a #29-42, Ibagué, Tolima, Colombia
Coordenadas: 4° 26' 3" N 75° 13' 17" W
Fecha del informe: 27 de Septiembre de 2021
Nota: Interventoria Externa IBAL





CL. 27a #29-42, Ibagué, Tolima, Colombia
Coordenadas: 4° 26' 3" N 75° 13' 17" W
Fecha del informe: 27 de Septiembre de 2021
Nota: Interventoria Externa IBAL



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021
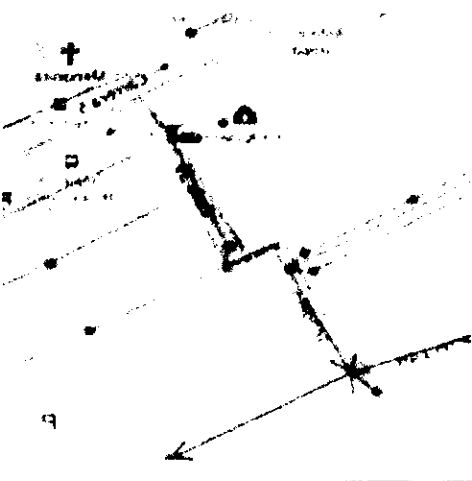
| CALLE/TRAMO | ESTADO INICIAL |
|---|--|
| CALLE 39 ENTRE CARRERA 5 Y 4 H | VIA PAVIMENTADA EN CONCRETO ASFALTICO EN REGULAR ESTADO. TRAMO EN TUBERIA DE 10" EN CONCRETO EN AVANZADO ESTADO DE DETERIORO. |
| LOCALIZACIÓN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR |
|  | <ul style="list-style-type: none">➤ Reposición de acueducto y de alcantarillado en la calle 39 entre kra 5 y 4l➤ Tubería de 10 pul en novafor con el cambio de las domiciliarias de alcantarillado y las respectivas cajas de inspección➤ Reposición de la red de acueducto que se encuentra en tubería e asbesto cemento a tubería pvc de presión.➤ Cambio de las domiciliarias de agua potable. |
| REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL | |
|  | |



**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04**
**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

SEMANA 1 (1 AL 11) DE SEPTIEMBRE

- Se revisan que no se presentes fugas en los sitios donde se ubicaron los collarines, ni en los empalmes, se realiza el lleno de los apiques de inspección.
- Se retira los escombros de la zona, de manera manual.
- Se toma muestra para determinar si la filtración que se presentó al final de la zanja correspondía a agua potable, la cual no dio positiva para agua tratada, por lo que se procedió a tapar, ya que era mínima y por las lluvias de esos días


SEMANA 2 (12 AL 18) DE SEPTIEMBRE

- Se realiza la inspección de la red con el video robot, en la cual se encontró todo bien.



SEMANA 3 (19 AL 24) DE SEPTIEMBRE

- Se realiza la toma de densidades en el tramo de las zanjas realizadas para la instalación de la red de acueducto y de alcantarillado 2 puntos por cada tramo

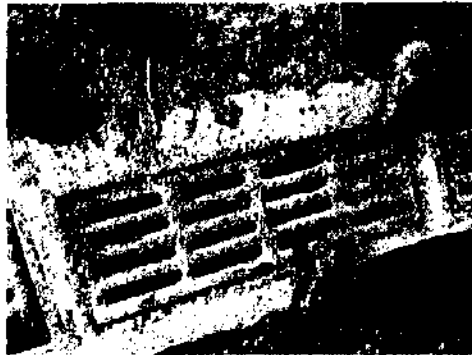REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVADES DEL MES DE SEPTIEMBRE



| | | |
|---|--|--|
|  | <p align="center">INFORME DE INTERVENTORIA No. 04</p> <p align="center">CONTRATO No. 063 DE 2021</p> | <p align="center">CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p align="center">FECHA INFORME: 30/09/2021</p> <p align="center">PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021</p> |
|---|--|--|

| CALLE/TRAMO | ESTADO INICIAL |
|---|---|
| <p align="center">CALLE 22 ENTRE KRA 7 Y Avenida Guabinal BARRIO EL CARMEN</p> | <p>VIA PAVIMENTADA EN CONCRETO ASFALTICO EN REGULAR ESTADO. TRAMO EN TUBERIA DE 10" EN CONCRETO EN AVANZADO ESTADO DE DETERIORO.</p> |
| LOCALIZACIÓN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Reposición de acueducto y de alcantarillado en la calle 22 entre kra 7 y 8 ➤ Tubería de 10 pul en Novafort con el cambio de las domiciliarias de alcantarillado y las respectivas cajas de inspección ➤ Reposición de la red de acueducto que se encuentra en tubería de asbesto cemento a tubería 3 PUL PVC de presión RD 21 ➤ cambio de las domiciliarias de agua potable. |
| REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL | |
|  | |




INFORME DE INTERVENTORIA No. 04
CONTRATO No. 063 DE 2021


CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 - 30/09/2021

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVADES DEL MES DE SEPTIEMBRE

SEMANA 1. 30 Agosto - 5 Septiembre

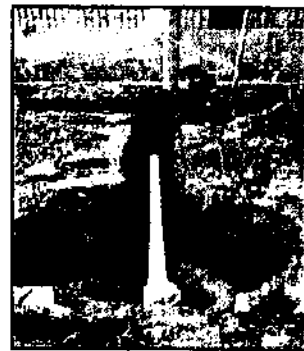

SEMANA 2. 6 SEPTIEMBRE - 12 SEPTIEMBRE

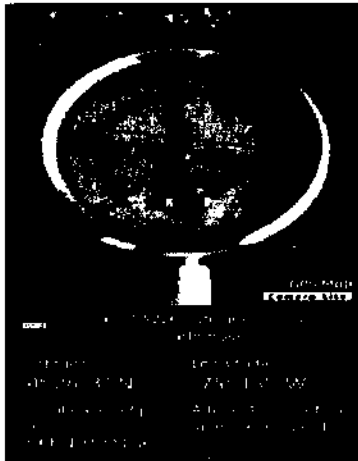





INFORME DE INTERVENTORIA No. 04






CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

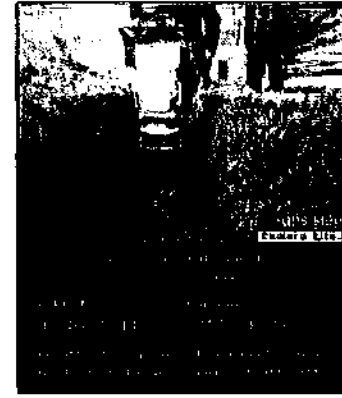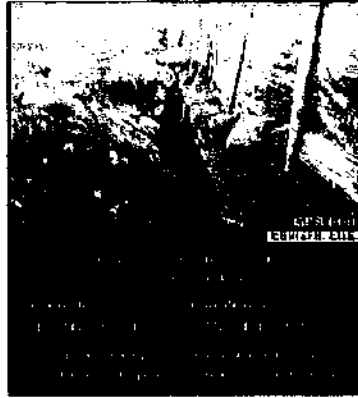

SEMANA 3. 13 SEPTIEMBRE – 19 SEPTIEMBRE

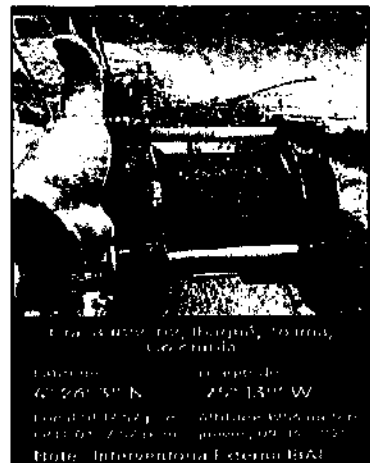




INFORME DE INTERVENTORIA No. 04
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 - 30/09/2021



SEMANA 4. 20 SEPTIEMBRE - 26 SEPTIEMBRE



Calle 2 #254 - 47, Ibagué, Tolima, Colombia
 Ubicación: 4° 26' 5" N 75° 15" W
 Fecha del informe: 26 de Septiembre del 2021
 Período: 01/09/2021 - 30/09/2021
 Nota: Interventoria Externa IBAL

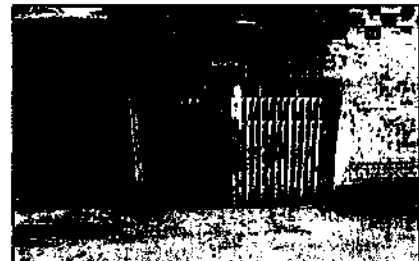

Calle 2 #254 - 47, Ibagué, Tolima, Colombia
 Ubicación: 4° 26' 5" N 75° 15" W
 Fecha del informe: 26 de Septiembre del 2021
 Período: 01/09/2021 - 30/09/2021
 Nota: Interventoria Externa IBAL

| CALLE/TRAMO | ESTADO INICIAL |
|---|---|
| <p align="center">CARRERA_6A_ENTRE_CALLES 42_Y_44_B_Restrepo</p> | <p>Vía con pavimento flexible en muy mal estado . Tramo de la red principal en tubería de 12" en mortero, pendiente de 2,6% y una longitud de 155,45 ml, domiciliarias en gres en 6 pul una en pvc que no cumple el diámetro, cajas de inspección. La red de acueducto se encontró en tubería de asbesto cemento de 3 pul.</p> |
| <p align="center">LOCALIZACIÓN</p> | <p align="center">CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR</p> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Incluye reposición de red de alcantarillado en tubería de pvc de 12" con las respectivas domiciliarias y cajas de inspección cuando se encuentren en mal estado o su adecuación cuando existan y dejando caja por usuario. ➤ La reposición de la red de acueducto por tubería PVC y sus respectivas domiciliarias ➤ Lleno de zanjas con material recebo compactado con medio mecánico |
| <p align="center">RÉGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL</p>  | |



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

SEMANA 1 (1-11) de SEPTIEMBRE

- Relleno de recebo compactado capas compactadas medio mecánico (saltarín)
- Retiro del material excavado ya que no sirve para el lleno de la zanja
- Demolición en el área de excavación de concreto para la ubicación de las cajas de inspección, en muchos puntos no se encontró la tubería donde se esperaba y se requirió romper en áreas mayores.
- Se excava para la instalación de las domiciliarias de alcantarillado

SEMANA 2 (12-18) DE SEPTIEMBRE

- Se continúa con la excavación manual y retiro de material sobrante para las domiciliarias del alcantarillado
- Se supervisa estado de tubería y medida de zanja para instalación de esta tubería.
- Se realiza la actividad de aplicación cama de arena de 10 cm. para la protección de la tubería
- Es retirada la protección con lona verde por personas ajenas a las obras, es repuesta y vuelven a quitarla
- Instalada la tubería se aplica relleno con material de recebo fino espesor de 20 cm
- Para una primera capa compactada manualmente con pisón. Las siguientes en capas de 20 cm compactadas con saltarín.
- Se demarcan los trazos para la excavación de las domiciliarias de alcantarillado.
- Se realiza retiro de material contaminado, previamente acopiado en un solo sitio.

SEMANA 3 (19-25) de Septiembre



- Se continua con la excavación para las domiciliarias y de las cajas de inspección de alcantarillado
- Por las lluvias de dificultan las labores tanto de excavación como de retiro de material.
- Se le solicita al contratista la correcta señalización de las zonas intervenidas que representan un peligro para los peatones del sector.

SEMANA 4 (26 – 30) de Septiembre


- Instalación de tubería de red domiciliaria de 6 pul
- Se continua con el lleno de la zanja y la respectiva compactación mecánica.
- Se señala con cinta de peligro en las excavaciones para las cajas de inspección en la zona de andenes, también se instala camillas en maderas para tapar los huecos de estas
- Construcción de caja de 60x60x100 y/o adecuación de las cajas ya existentes
- Se llenan los formatos suministrados por el IBAL para la aprobación por parte del propietario para los cambios de domiciliaria de acueducto.
- Se inicia la excavación para la res de acueducto.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE


SEMANA 1. 01 - 5 Septiembre

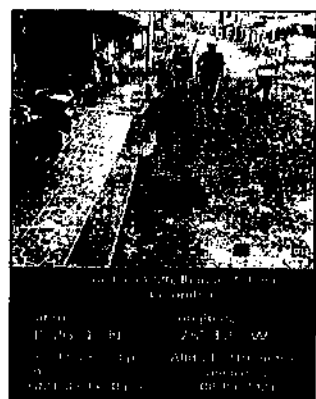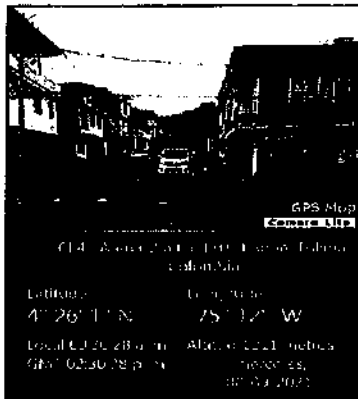

SEMANA 2. 6 SEPTIEMBRE - 12 SEPTIEMBRE

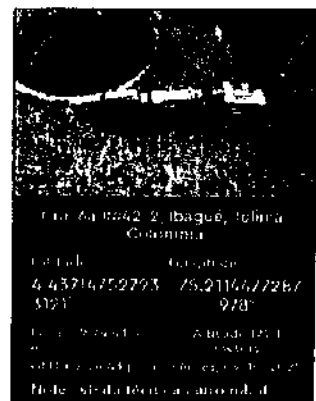

VISITA TECNICA

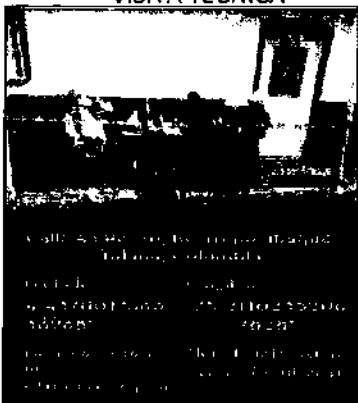





INFORME DE INTERVENTORIA No. 04
CONTRATO No. 063 DE 2021






CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

SEMANA 3, 13 Septiembre – 19 Septiembre

Verificación niveles

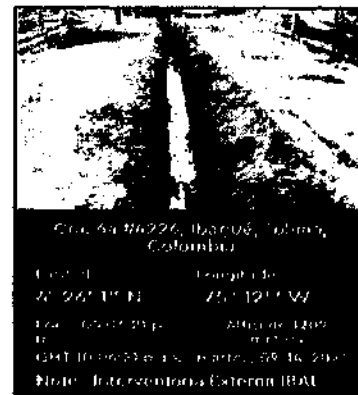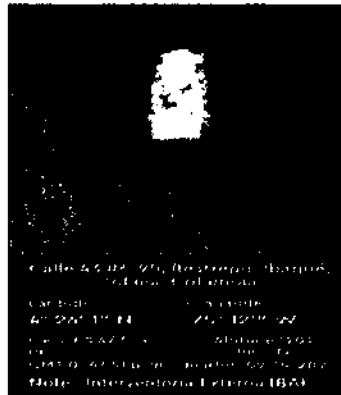



SEMANA 5, 27 Septiembre – 03 Octubre

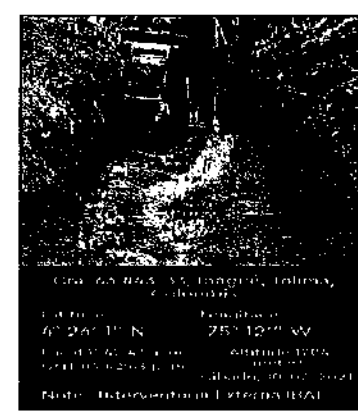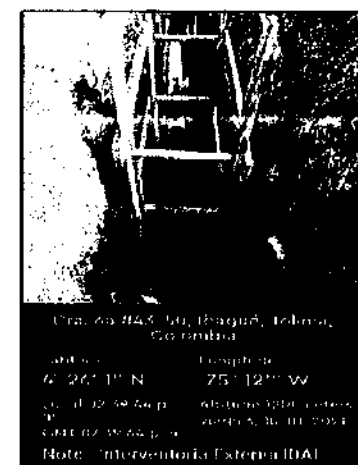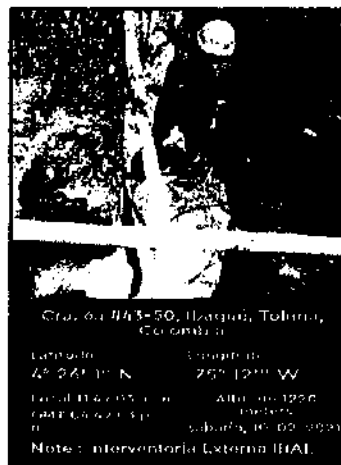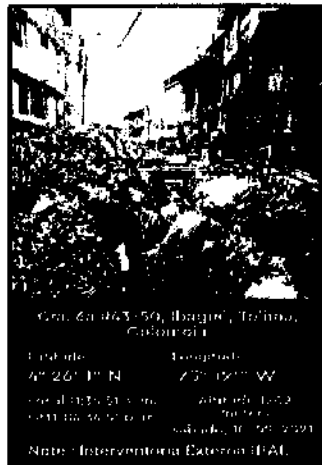




INFORME DE INTERVENTORIA No. 04
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

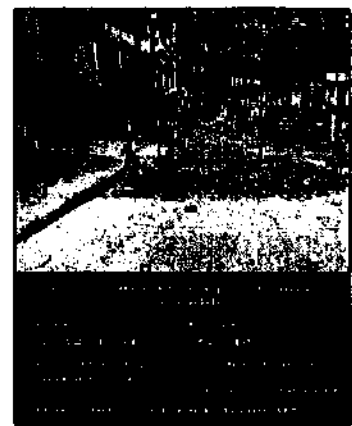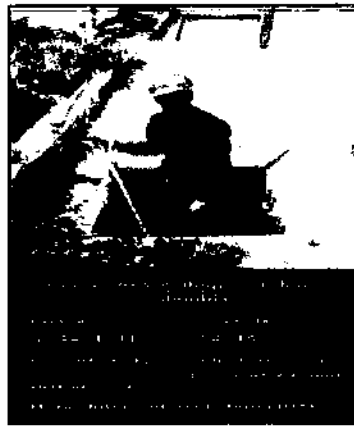

Domiciliaria realizada por usuario Cr 7 42 -24






SEMANA 5. 27 Septiembre – 03 Octubre

EXCAVACION DOMICILIARIAS

CAJAS




FUNDIDAD CAJAS







INFORME DE INTERVENTORIA No. 04
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

| ENTREGA TAPA BOCA | INSP, SEÑALIZACION | VISUALIZACION CLL 43 CR 6a |
|--|---|--|
|  <p>CALLE 43 CR 6a, Tolima, Tolima, Colombia</p> <p>Fecha: 30/09/2021 Hora: 08:00 AM</p> <p>Elaborado por: [Nombre] Revisado por: [Nombre]</p> <p>Datos: Interventoria Externa IBAL</p> |  <p>CALLE 43 CR 6a, Tolima, Tolima, Colombia</p> <p>Fecha: 30/09/2021 Hora: 08:00 AM</p> <p>Elaborado por: [Nombre] Revisado por: [Nombre]</p> <p>Datos: Interventoria Externa IBAL</p> |  <p>CALLE 43 CR 6a, Tolima, Tolima, Colombia</p> <p>Fecha: 30/09/2021 Hora: 08:00 AM</p> <p>Elaborado por: [Nombre] Revisado por: [Nombre]</p> <p>Datos: Interventoria Externa IBAL</p> |

| CALLE/TRAMO | ESTADO INICIAL |
|--|--|
| <p>DIAGONAL 42 ENTRE CARRERA 6A Y CALLE 44_B_Restrepo</p> | <p>Vía cajeada por el municipio en su programa de recuperación de vías . y con la red de alcantarillado ya cambiada La red de acueducto se encontró en tubería de asbesto cemento de 3 pul</p> |
|  | <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ La reposición de la red de acueducto por tubería PVC y sus respectivas domiciliarias ➤ Lleno de zanjas con material rebase compactado con medio mecánico ➤ Instalación de válvula |
| <p>LOCALIZACIÓN REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL</p>  | |

| | | |
|---|--|--|
|  | <p align="center">INFORME DE INTERVENTORIA No. 04</p> <p align="center">CONTRATO No. 063 DE 2021</p> | <p align="center">CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p align="center">FECHA INFORME: 30/09/2021</p> <p align="center">PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021</p> |
|---|--|--|

| |
|--|
| <p align="center">DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE</p> |
| <p align="center"><u>SEMANA 4 (19 – 25) de Septiembre</u></p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Se demarcan los trazos para la excavación para la instalación del tubo de 3 pul con retroexcavadora ➤ Se le solicita al contratista la correcta señalización de las zonas intervenidas que representan un peligro para los peatones del sector. ➤ Instalación de tubería de red principal del acueducto ➤ Se continua con el lleno de la zanja y la respectiva compactación mecánica. ➤ Se señaliza con cinta de peligro en las excavaciones, también se instala bolsas llenas de material proveniente de la excavación formando peldaños para mejorar la movilidad de los peatones. |
| <p align="center"><u>SEMANA 4 (25-30) de Septiembre</u></p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Se continua con la excavación, encontrando piedras de gran tamaño en el trazo de la red, ➤ Se aplica capa de arena ➤ Se instala la tubería de PVC de 3 pul ➤ Se realiza el lleno de la excavación y la compactación con medio mecánico en capas |


| | | |
|--|--|--|
| <p align="center">REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE</p> | | |
|  <p align="center">GPS Map Google Earth</p> <p align="center">E: 76° 40' 00" W: 75° 12' 00" S: 257° 12' 00" N: 4° 26' 17" W</p> <p align="center">Calle: Calle 25 de Agosto, Barrio: San Antonio, Ciudad: Ibagué, Tolima, Colombia</p> <p align="center">Nombre: Interventoría Externa IBAL</p> |  <p align="center">GPS Map Google Earth</p> <p align="center">E: 76° 40' 00" W: 75° 12' 00" S: 257° 12' 00" N: 4° 26' 17" W</p> <p align="center">Calle: Calle 25 de Agosto, Barrio: San Antonio, Ciudad: Ibagué, Tolima, Colombia</p> <p align="center">Nombre: Interventoría Externa IBAL</p> |  <p align="center">GPS Map Google Earth</p> <p align="center">E: 76° 40' 00" W: 75° 12' 00" S: 257° 12' 00" N: 4° 26' 17" W</p> <p align="center">Calle: Calle 25 de Agosto, Barrio: San Antonio, Ciudad: Ibagué, Tolima, Colombia</p> <p align="center">Nombre: Interventoría Externa IBAL</p> |
|  <p align="center">GPS Map Google Earth</p> <p align="center">E: 76° 40' 00" W: 75° 12' 00" S: 257° 12' 00" N: 4° 26' 17" W</p> <p align="center">Calle: Calle 25 de Agosto, Barrio: San Antonio, Ciudad: Ibagué, Tolima, Colombia</p> <p align="center">Nombre: Interventoría Externa IBAL</p> |  <p align="center">GPS Map Google Earth</p> <p align="center">E: 76° 40' 00" W: 75° 12' 00" S: 257° 12' 00" N: 4° 26' 17" W</p> <p align="center">Calle: Calle 25 de Agosto, Barrio: San Antonio, Ciudad: Ibagué, Tolima, Colombia</p> <p align="center">Nombre: Interventoría Externa IBAL</p> |  <p align="center">GPS Map Google Earth</p> <p align="center">E: 76° 40' 00" W: 75° 12' 00" S: 257° 12' 00" N: 4° 26' 17" W</p> <p align="center">Calle: Calle 25 de Agosto, Barrio: San Antonio, Ciudad: Ibagué, Tolima, Colombia</p> <p align="center">Nombre: Interventoría Externa IBAL</p> |

Dirección: Centro Comercial Arroyuelos, Local 6, Ibagué, Tolima.
Teléfono: 300 556 1508 - Correo electrónico: interventoriaexterna2021@gmail.com



INFORME DE INTERVENTORIA No. 04
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021





SEMANA 5. 27 SEPTIEMBRE – 03 OCTUBRE

EXCAVACION MECANICA

CHEQUE EXCAVACION




INST. TUBERIA



CAMA ARENA TUBERIA

ANDENES DAÑADOS

ESTADO FINAL

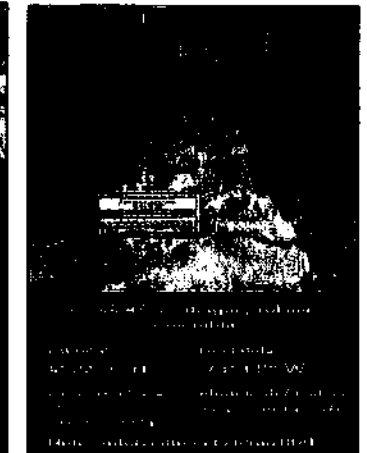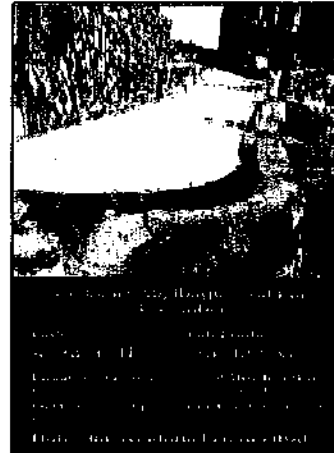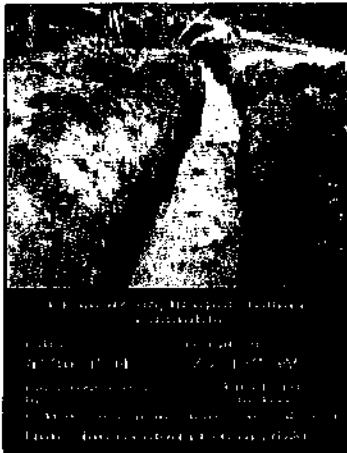



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

| CALLE/TRAMO | ESTADO INICIAL |
|--|--|
| Carrera 12 Bis entre calle 32 y casa 33-104 Barrio Viveros | Vía con pavimento rígido en mal estado. Tramo de la red principal en tubería de 3" en asbesto, y Válvula de desfogue al final de la vía |
|  | <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR</p> <ul style="list-style-type: none">➤ La reposición de la red de acueducto por tubería PVC y sus respectivas domiciliarias➤ Lleno de zanjas con material rebase compactado con medio mecánico➤ Cambio de válvula. |
| REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL | |
|  | |

| | | |
|--|--|---|
|  <p>IBAL SA ESP. OFICIAL</p> | <p>INFORME DE INTERVENTORIA No. 04</p> <p>CONTRATO No. 063 DE 2021</p> | <p>CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p>FECHA INFORME: 30/09/2021</p> <p>PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021</p> |
|--|--|---|

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

SEMANA 3 (12-18) de Septiembre

- Se inicia con la inspección visual mediante apiques en el área a intervenir, se ubica la red en servicio la cual está en 3 pulgadas en asbesto cemento, en la margen derecha de la vía, a una profundidad de 1,0 mts
- Se inicia con la excavación manual para la instalación de la red de acueducto
- Se hace huecos para la hincar la guadua para el cerramiento perimetral
- Se rompe el pavimento rígido con compresor
- Se continua con la excavación para la red principal a una profundidad de 1,20
- Se instala la lona de cerramiento
- Por las lluvias de dificultan las labores tanto de excavación como de retiro de material.
- Se le solicita al contratista la correcta señalización de las zonas intervenidas que representan un peligro para los peatones del sector.

SEMANA 4 (19 – 24) de Septiembre

- Instalación de tubería de red
- Se continúa con el lleno de la zanja y la respectiva compactación mecánica.
- Se supervisa estado de tubería y medida de zanja para instalación de esta tubería.
- Se realiza la actividad de aplicación cama de arena de 10 cm. para la protección de la tubería
- Instalada la tubería se aplica relleno con material de recebo fino espesor de 20 cm
- Para una primera capa compactada manualmente con pisón. Las siguientes en capas de 20 cm compactadas con saltarín.
- Se demarcan los trazos para la excavación de las domiciliarias.

SEMANA 5 (25 – 30) de Septiembre

- Se continua con la excavación y la aplicación de la capa de arena para la instalación de la tubería de 3 pulgadas
- Se continúa con el lleno de la zanja y la compactación con medio mecánico.
- Se presenta socavación en la línea de excavación por la presencia del tubo perforado que al parecer lleva tiempo votando agua
- Se realiza la prueba de hermeticidad la cual no presento fugas en el tramo




INFORME DE INTERVENTORIA No. 04
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE



Ibagué, Tolima, Colombia
Ubicación: **4° 22' 57" N - 75° 13' 11" W**
Elevación: 2000 m.s.n.m. Altitud: 2000 m.s.n.m.
GMT: 05:00:00. Zona: 05-10-2021
Note: Interventoria Externa IBAL




Ibagué, Tolima, Colombia
Ubicación: **4° 22' 57" N - 75° 13' 11" W**
Elevación: 2000 m.s.n.m. Altitud: 2000 m.s.n.m.
GMT: 05:00:00. Zona: 05-10-2021
Note: Interventoria Externa IBAL



Ibagué, Tolima, Colombia
Ubicación: **4° 22' 57" N - 75° 13' 11" W**
Elevación: 2000 m.s.n.m. Altitud: 2000 m.s.n.m.
GMT: 05:00:00. Zona: 05-10-2021
Note: Interventoria Externa IBAL



Ibagué, Tolima, Colombia
Ubicación: **4° 22' 57" N - 75° 13' 11" W**
Elevación: 2000 m.s.n.m. Altitud: 2000 m.s.n.m.
GMT: 05:00:00. Zona: 05-10-2021
Note: Interventoria Externa IBAL

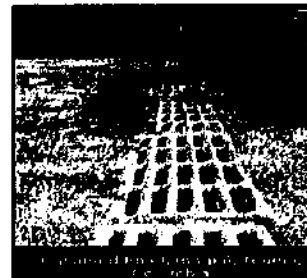

Ibagué, Tolima, Colombia
Ubicación: **4° 22' 57" N - 75° 13' 11" W**
Elevación: 2000 m.s.n.m. Altitud: 2000 m.s.n.m.
GMT: 05:00:00. Zona: 05-10-2021
Note: Interventoria Externa IBAL



Ibagué, Tolima, Colombia
Ubicación: **4° 22' 57" N - 75° 13' 11" W**
Elevación: 2000 m.s.n.m. Altitud: 2000 m.s.n.m.
GMT: 05:00:00. Zona: 05-10-2021
Note: Interventoria Externa IBAL


SEMANA 3. 13 Septiembre – 19 Septiembre



Ibagué, Tolima, Colombia
Ubicación: **4° 22' 11" N - 75° 12' 11" W**
Elevación: 2000 m.s.n.m. Altitud: 2000 m.s.n.m.
GMT: 05:00:00. Zona: 05-10-2021
Note: Interventoria Externa IBAL



Ibagué, Tolima, Colombia
Ubicación: **4° 22' 11" N - 75° 12' 11" W**
Elevación: 2000 m.s.n.m. Altitud: 2000 m.s.n.m.
GMT: 05:00:00. Zona: 05-10-2021
Note: Interventoria Externa IBAL

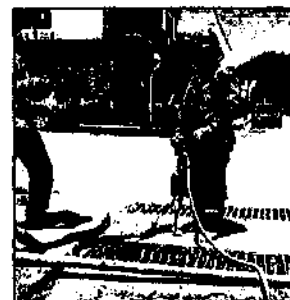

Ibagué, Tolima, Colombia
Ubicación: **4° 22' 47" N - 75° 13' 11" W**
Elevación: 2000 m.s.n.m. Altitud: 2000 m.s.n.m.
GMT: 05:00:00. Zona: 05-10-2021
Note: Interventoria Externa IBAL



INFORME DE INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 30/09/2021

PERIODO: 01/09/2021 - 30/09/2021

SEMANA 4. 20 Septiembre - 26 Septiembre

Cra. 13 853-89, Ibagué, Tolima, Colombia

Ubicación: 4° 26' 40" N 75° 13' 17" W

Fecha: 20/09/2021

Alcaldía: 2021

GMT: 05:00:00

Note: Interventoria Externa IBAL

Cra. 13 853-89, Ibagué, Tolima, Colombia

Ubicación: 4° 26' 40" N 75° 13' 17" W

Fecha: 21/09/2021

Alcaldía: 2021

GMT: 05:00:00

Note: Interventoria Externa IBAL

Cra. 13 853-89, Ibagué, Tolima, Colombia

Ubicación: 4° 26' 40" N 75° 13' 17" W

Fecha: 22/09/2021

Alcaldía: 2021

GMT: 05:00:00

Note: Interventoria Externa IBAL

Cra. 13 853-89, Ibagué, Tolima, Colombia

Ubicación: 4° 26' 40" N 75° 13' 17" W

Fecha: 23/09/2021

Alcaldía: 2021

GMT: 05:00:00

Note: Interventoria Externa IBAL

Cra. 13 853-89, Ibagué, Tolima, Colombia

Ubicación: 4° 26' 40" N 75° 13' 17" W

Fecha: 24/09/2021

Alcaldía: 2021

GMT: 05:00:00

Note: Interventoria Externa IBAL

Cra. 13 853-89, Ibagué, Tolima, Colombia

Ubicación: 4° 26' 40" N 75° 13' 17" W

Fecha: 25/09/2021

Alcaldía: 2021

GMT: 05:00:00

Note: Interventoria Externa IBAL

SEMANA 5. 27 Septiembre - 03 Octubre

Cra. 13 853-89, Ibagué, Tolima, Colombia

Ubicación: 4° 26' 40" N 75° 13' 17" W

Fecha: 27/09/2021

Alcaldía: 2021

GMT: 05:00:00

Note: Interventoria Externa IBAL

Cra. 13 853-89, Ibagué, Tolima, Colombia

Ubicación: 4° 26' 40" N 75° 13' 17" W

Fecha: 28/09/2021

Alcaldía: 2021

GMT: 05:00:00

Note: Interventoria Externa IBAL

Cra. 13 853-89, Ibagué, Tolima, Colombia


Ubicación: 4° 26' 40" N 75° 13' 17" W


Fecha: 29/09/2021

Alcaldía: 2021

GMT: 05:00:00

Note: Interventoria Externa IBAL

| | | |
|---|--|---|
|  | INFORME DE INTERVENTORIA No. 04 | CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL |
| | CONTRATO No. 063 DE 2021 | FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021 |

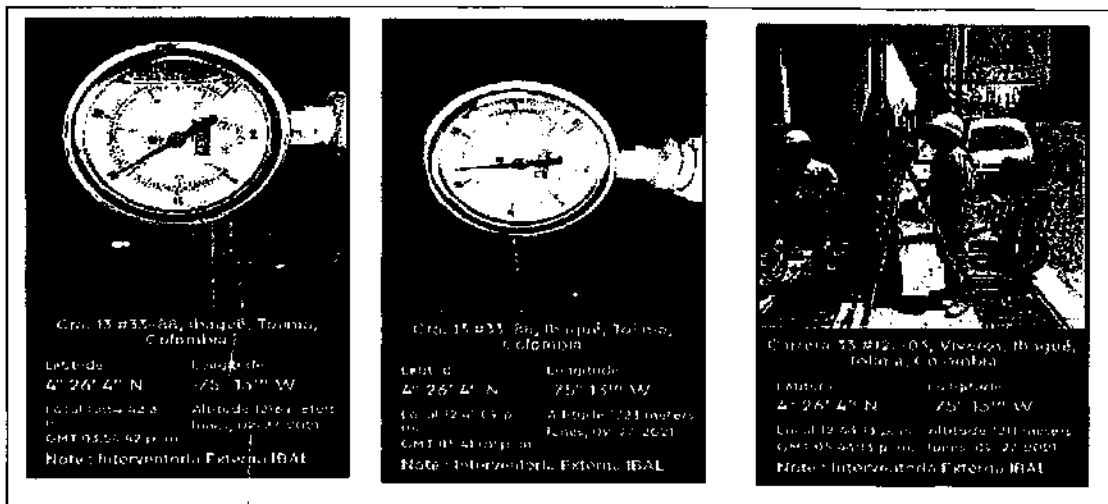

2.3.4. Seguimiento de garantías contractuales

| Contrato de Obra No. 069 de 2021 | | | | |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| No. | Aseguradora | Amparo | Vigencia | Observaciones |
| 1140101041619 | SEGUROS ESTADO S.A. | CUMPLIMIENTO | 14/05/2021 14/05/2022 | |
| 1140101041619 | SEGUROS ESTADO S.A. | CALIDAD DEL SERVICIO | 14/05/2021 14/11/2024 | |
| 1140101041619 | SEGUROS ESTADO S.A. | SALARIOS Y PRESTACIONES | 14/05/2021 14/11/2022 | |
| 1140101041619 | SEGUROS ESTADO S.A. | ESTABILIDAD | 14/05/2021 14/11/2026 | |
| 1140101041619 | SEGUROS ESTADO S.A. | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC. | 14/05/2021 14/11/2022 | |


2.3.5. Avance Físico

A la fecha del presente informe se evidencia el siguiente avance:

| CUADRO COMPARATIVO DE ACTIVIDADES | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| MESES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PROGRAMADO | 15% | 15% | 20% | 20% | 15% | 15% |
| EJECUTADO | 11% | 12% | 27% | | | |
| EJECUTADO acumulado | 11% | 23% | 50% | | | |

| | | |
|---|--|---|
|  | INFORME DE INTERVENTORIA No. 04 | CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL |
| | CONTRATO No. 063 DE 2021 | FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021 |

AVANCE DISTRITO 4

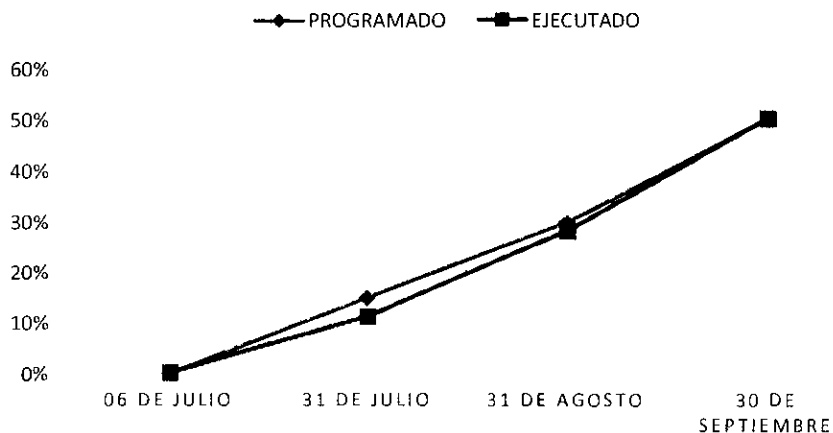


2.3.6. Avance Financiero

De acuerdo a las actividades realizadas durante el presente periodo el contratista a ejecutado un valor de \$654.718.387,50 equivalente al 50.0% del valor del contrato de \$1.309.436.775

2.3.7. Balance del Contrato

| | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| VALOR CONTRATADO | \$1.309.436.775 | |
| VALOR EJECUTADO | | \$ 654.718.387,50 |
| VALOR POR EJECUTAR | | \$ 654.718.387,50 |
| SUMAS IGUALES | \$1.309.436.775 | \$ 1.309.436.775 |

PORCENTAJE DE EJECUCION

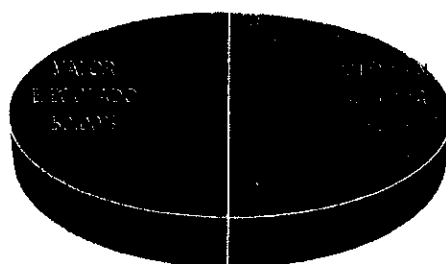



■ VALOR SIN EJECUTAR ■ VALOR EJECUTADO

| | | |
|---|--|--|
|  | <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORIA No. 04</p> <p style="text-align: center;">CONTRATO No. 063 DE 2021</p> | <p style="text-align: center;">CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p style="text-align: center;">FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021</p> |
|---|--|--|

2.3.8. Gestión de las comunicaciones
CORRESPONDENCIA DEL DISTRITO

2.3.9. Información relacionada con los ensayos de Laboratorio

- Se ha realizado prueba de hermeticidad en la red de acueducto del sector de la calle 22 con 4 tamana y 4 estadio sector de la Estación, calle 22 con kra 7 y guabinal sector el Carmen, calle 27 entre avenida guabinal y avenida Ambala sector Belalcázar, calle 28 entre avenida guabinal y avenida Ambala sector la granja, en una duración de tres horas y media, no se encontraron fugas, De la cual se anexan los resultados entregados por la persona que realiza la prueba.
- Se realiza la toma de densidades al material de lleno de zanjas en los sectores de; Calle 22 con kra 4 estadio y 4 Tamana, Calle 22 entre avenida guabinal y kra 7 , Calle 39 entre kra 5 y kra 41 De la cual se anexan los resultados entregados por el laboratorio.
- Se realiza la inspección de los tramos de tubería de alcantarillado instalado por parte de la empresa Ibal en los sectores de; Calle 22 con kra 4 estadio y 4 Tamana, Calle 22 entre avenida guabinal y kra 7, Calle 39 entre kra 5 y kra 41 ,calle 28 entre avenida guabinal y avenida Ambala sector la granja de las cuales la única que no fue certificado fue la de la calle 22 sector Carmen, en la que se encontró un taponamiento.

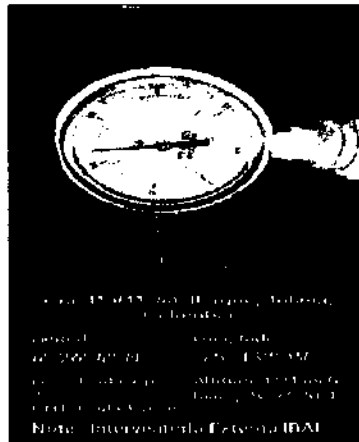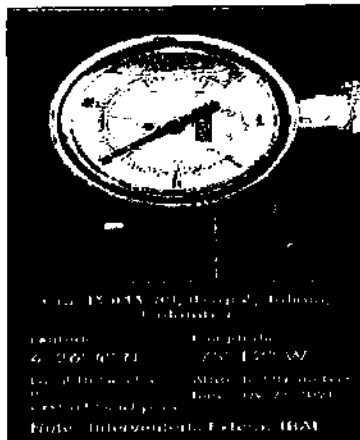


| | | |
|---|--|---|
|  | <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORIA No. 04</p> <p style="text-align: center;">CONTRATO No. 063 OE 2021</p> | <p style="text-align: center;">CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p style="text-align: center;">FECHA INFORME: 30/09/2021</p> <p style="text-align: center;">PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021</p> |
|---|--|---|

1.2.9. Dificultades en la ejecución de los proyectos

| a ste | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Período muy lluvioso que ha ocasionado que las zanjas se llenen de agua, demoran las actividades por tener que extraer el agua. ➤ El retiro de escombros retrasa por la dificultad para el cargue de volquetas y porque no reciben material en la escombrera ➤ El material para el lleno de zanja no lo pueden suministrar por lo que saturado no se recibe en la obra ➤ Falta de adecuada entibación en el frente de la 27 con guabinal no se le permite trabajar hasta que no lo realicen. ➤ La rotura de redes hidráulicas retrasa las labores ➤ La escases de accesorios para empalmes válvulas, tee en las ferreterías de la ciudad ➤ El continuo robo del sistema de protección con lona hace que los transeúntes y vehículos ingresen en el área de trabajo. ➤ La falta de continuidad en la zona de andenes en el sector de restrepo hace que los transeúntes ingresen en el área a intervenir. ➤ Por los cortes de agua en la ciudad se retrasan las pruebas hidrostáticas por ende los empalmes. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Se ha colocado entibación en las zanjas y se instalan lonas con material proveniente de la excavación formando gradas. | |

| | | |
|---|--|---|
|  | INFORME DE INTERVENTORIA No. 04 | CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL |
| | CONTRATO No. 063 DE 2021 | FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021 |

2.4. DISTRITOS HIDRÁULICOS No. 5 – 5ª Y 8 CONTRATO DE OBRA No. 113 DEL 11 DE AGOSTO DE 2021.

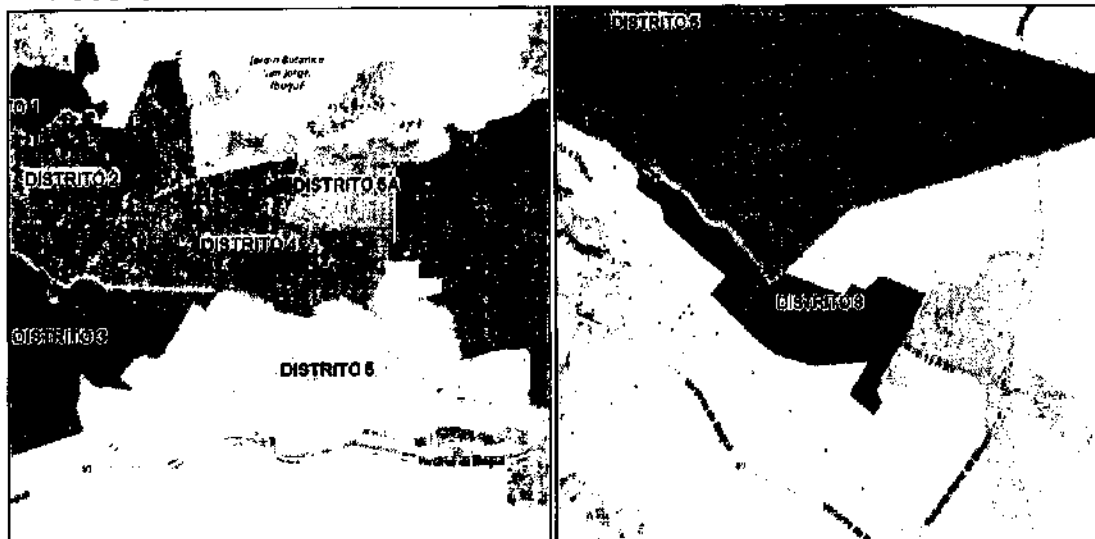



2.4.1. Información general del contrato.

| | |
|-----------------------------|--|
| CONTRATO No | 113 |
| FECHA | 11 DE AGOSTO DE 2021 |
| CONTRATISTA | UNION TEMPORAL RB INGENIEROS R.L. DUVAN RAMIREZ BAYONA |
| CLASE | OBRA |
| VALOR | MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRECECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE (\$1.843.886.333) |
| PLAZO | CIENTO OCHENTA (180) DIAS |
| FECHA DE INICIO | 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |
| FECHA DE TERMINACION | 08 DE MARZO DE 2022 |
| OBJETO | REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 5, 5A Y 8 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE. |

| | | |
|---|--|--|
|  | <p align="center">INFORME DE INTERVENTORIA No. 04</p> <p align="center">CONTRATO No. 063 DE 2021</p> | <p align="center">CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p align="center">FECHA INFORME: 30/09/2021</p> <p align="center">PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021</p> |
|---|--|--|

2.4.2. Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes.
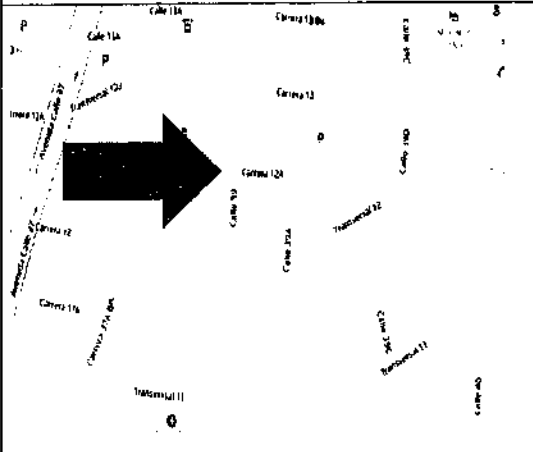
| CALLE/TRAMO | ESTADO INICIAL |
|---|--|
| <p align="center">CARRERA 12A ENTRE CALLE 39 Y 39A BARRIO GAITAN.</p> | <p>VIA EN PAVIMENTO RIGIDO EN BUEN ESTADO. NO EXISTE TUBERIA PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO NI POZO INICIAL. CARCAVA EXISTENTE.</p> |
| LOCALIZACIÓN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR |
|  | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL | <p>PROYECTO: Reposición de tubería de alcantarillado y acueducto.</p> |
|  | <p>Actividades de inicio de excavación de manera mecánica, corte y demolición de placa para la zanja de acometidas de alcantarillado e instalación de tubería.</p> |



**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04**

**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**

**FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021**

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

- Se inicia con la instalación de cerramiento perimetral del área a intervenir.

Semana 1:

- Localización y replanteo del tramo de alcantarillado a rehabilitar
- Corte de pavimento rígido con cortadora
- Demolición de pavimento rígido.
- Excavación mecánica para red principal de alcantarillado.
- Instalación de entibado
- Retiro de sobrantes


Semana 2:

- Excavación mecánica para red principal.
- Excavación manual para domiciliarias de alcantarillado
- Suministro e instalación de lecho en triturado para tubería de alcantarillado
- Instalación de tubería PVC corrugada 8 pulgadas.
- Relleno y compactación con recebo

Semana 3:

- Excavación manual de acometidas de alcantarillado
- Instalación de tubería PVC corrugada 6 pulgadas de acometida
- Relleno y compactación con recebo
- Construcción de cajas de inspección
- Excavación para pozo inicial

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE




Excavación mecánica/Retiro de suelo contaminado



**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04**
**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021



Entibado en madera para excavación / Carcava en domiciliaria



Instalación de lecho en triturado y tubería PVC corrugada 8"/Silla Yee 8" x 6" instalada



Pozo de inspección inicial.





**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04**

**CONTRATO No. 063 DE
2021**


**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**

FECHA INFORME: 30/09/2021

PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021
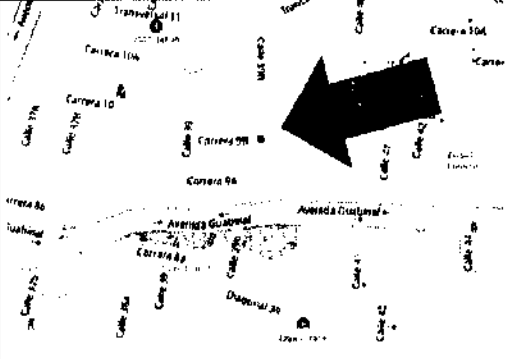
| CALLE/TRAMO | ESTADO INICIAL |
|---|---|
| CALLE 39ª ENTRE 9A Y 10 BARRIO GAITAN. | VIA EN PAVIMENTO FLEXIBLE BASTANTE DETERIORADO CON PERDIDA DE CARPETA DE RODADURA EN GRAN PARTE DE LA VIA. TUBERIA DE ACUEDUCTO NO CUMPLE PROFUNDIDAD. |
| LOCALIZACIÓN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR |
|  | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL | PROYECTO: Reposición de red principal y acometidas de alcantarillado y acueducto. |
|  | <p>Actividades de excavación mecánica, corte y demolición de placa para la zanja de acometidas de alcantarillado e instalación de tubería en PVC corrugada de 15".</p> <p>Excavación manual para instalación de tubería de 3" en PVC RDE 21 para red de acueducto y accesorios para acometidas.</p> |

| | | |
|---|--|---|
|  | <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORIA No. 04</p> <p style="text-align: center;">CONTRATO No. 063 DE 2021</p> | <p style="text-align: center;">CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p style="text-align: center;">FECHA INFORME: 30/09/2021</p> <p style="text-align: center;">PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021</p> |
|---|--|---|

| DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Se inicia con la instalación de cerramiento perimetral del área a intervenir. <p>Semana 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Localización y replanteo del tramo de alcantarillado a rehabilitar • Excavación mecánica para red principal de alcantarillado. • Retiro de sobrantes |
| REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE |
|  <p style="text-align: center;">Excavación mecánica para red principal de alcantarillado de 16"</p> |

2.4.3. Seguimiento a garantías contractuales

| Contrato de Obra No. 113 de 2021 | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| No. | Aseguradora | Amparo | Vigencia | Observaciones |
| I- 100006204 | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS | CUMPLIMIENTO | 09/09/2021 05/09/2022 | |
| I- 100006204 | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS | SALARIOS Y PRESTACIONES | 09/09/2021 08/03/2025 | |
| I- 100006204 | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS | CALIDAD DEL SERVICIO | 09/09/2021 08/03/2023 | |
| I- 100006204 | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS | ESTABILIDAD | 08/03/2022 08/03/2027 | |

| | | |
|---|--|---|
|  | INFORME DE INTERVENTORIA No. 04 | CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL |
| | CONTRATO No. 063 DE 2021 | FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021 |


| | | | | |
|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|
| RCE I- 100001440 | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC. | 09/09/2021 08/03/2023 | |
|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|

2.4.4. Avance Físico

A la fecha del presente informe se evidencia el siguiente avance:

| CUADRO COMPARATIVO DE ACTIVIDADES | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| MESES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PROGRAMADO | 15% | 15% | 20% | 20% | 15% | 15% |
| EJECUTADO | 7.0% | | | | | |
| EJECUTADO ACUMULADO | 7.0% | | | | | |

AVANCE DISTRITOS 5 -5A Y 8

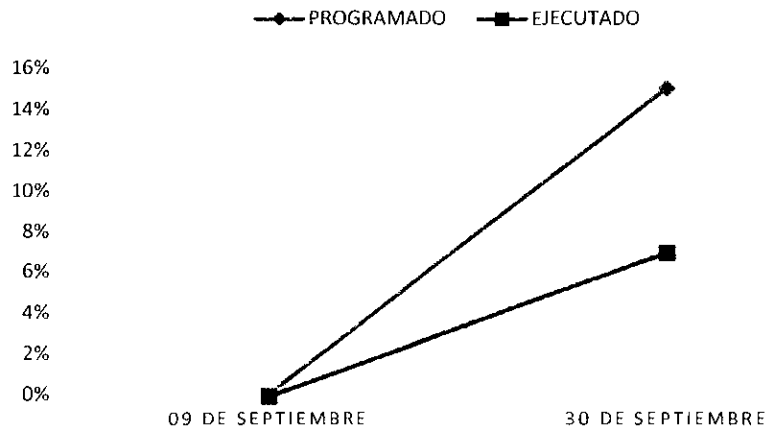


2.4.5. Avance Financiero

De acuerdo a las actividades realizadas durante el presente período el contratista a ejecutado un valor de \$ 129.330.097,82 equivalente al 7% del valor del contrato de \$ 1.847.572.826,00

| | | |
|---|--|--|
|  | <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORIA No. 04</p> <p style="text-align: center;">CONTRATO No. 063 DE 2021</p> | <p style="text-align: center;">CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p style="text-align: center;">FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021</p> |
|---|--|--|

2.4.6. Balance del Contrato

PORCENTAJE DE EJECUCION

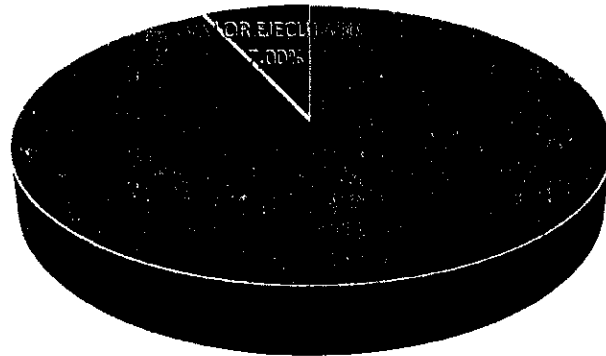

■ VALOR SIN EJECUTAR ■ VALOR EJECUTADO

2.4.7. Gestión de las comunicaciones

CORRESPONDENCIA DEL DISTRITO

2.4.8. Información relacionada con los ensayos de Laboratorio.

Se anexan resultados de ensayos de laboratorio realizados durante el periodo del presente informe.

| | | |
|---|--|---|
|  | <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORIA No. 04</p> <p style="text-align: center;">CONTRATO No. 063 DE 2021</p> | <p style="text-align: center;">CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p style="text-align: center;">FECHA INFORME: 30/09/2021</p> <p style="text-align: center;">PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021</p> |
|---|--|---|

2.4.9. Dificultades en la ejecución de los proyectos

| Incidente | Solución | Proceso / Avance a fecha de corte de este informe |
|---|--|---|
| <p>Se han presentado lluvias fuertes, que ha retrasado actividades de excavación, retiro, relleno y compactación.</p> | <p>El contratista debe realizar el correspondiente manejo de aguas y organizar logística para aprovechar el buen cambio del clima.</p> | |

| | | |
|---|--|---|
|  | INFORME DE INTERVENTORIA No. 04 | CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL |
| | CONTRATO No. 063 DE 2021 | FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021 |

2.5. DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 CONTRATO DE OBRA No. 089 DEL 18 DE JUNIO DE 2021.





2.5.1. Información general del contrato.

| | |
|-----------------------------|--|
| CONTRATO No | 089 |
| FECHA | 18 DE JUNIO DE 2021 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO SECTOR 6 R.L. JHON JAIRÓ PEÑA SERRATO |
| CLASE | OBRA |
| VALOR | DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE (\$2.784.659.942) |
| PLAZO | CIENTO OCHENTA (180) DIAS |
| FECHA DE INICIO | 12 DE JULIO DE 2021 |
| FECHA DE TERMINACION | 08 DE ENERO DE 2022 |
| OBJETO | REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE. |

| | | |
|---|--|---|
|  | <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORIA No. 04</p> <p style="text-align: center;">CONTRATO No. 063 DE 2021</p> | <p style="text-align: center;">CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p style="text-align: center;">FECHA INFORME: 30/09/2021</p> <p style="text-align: center;">PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021</p> |
|---|--|---|

2.5.2. Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes.
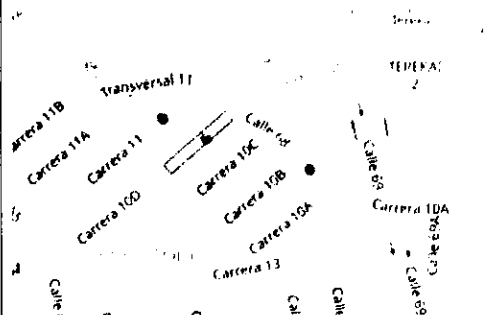
| CALLE/TRAMO | ESTADO INICIAL |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">CARRERA 10 D ENTRE CALLE 67 - 68, MANZANAS T y Y BARRIO JORDAN 9 ETAPA.</p> | <p>VIA SIN PAVIMENTAR. TRAMO EN TUBERIA DE DISTINTOS DIAMETROS EN SU TRAYECTO, EN CONCRETO EN AVANZADO ESTADO DE DETERIORO O COLAPSADA.</p> |
| LOCALIZACIÓN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR |
|  | <p>PROYECTO: Reposición de tubería de alcantarillado y acueducto.</p> |
| REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL | |
|  | <p>Actividades de inicio de excavación de manera mecánica, corte y demolición de placa para la zanja de acometidas de alcantarillado e instalación de tubería.</p> |
| DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES | |
| <p>Semana 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Excavación mecánica de la zanja de alcantarillado principal • Instalación de tubería principal • Relleno y compactación con recebo <p>Semana 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Excavación de acometidas de alcantarillado • Instalación de tubería de acometida • Relleno y compactación con recebo | |



**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04**
**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

- Construcción de cajas

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

Semana 1:



Excavación de zanjas para acometidas de alcantarillado, instalación y relleno de tubería principal.



Excavación de zanjas de acometidas e instalación de tubería






**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04**
**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021


Semana 2:




Excavación e instalación de tubería para acometidas.

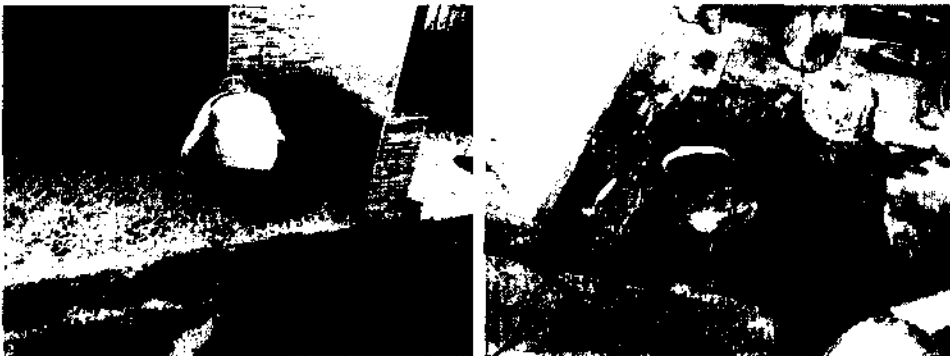

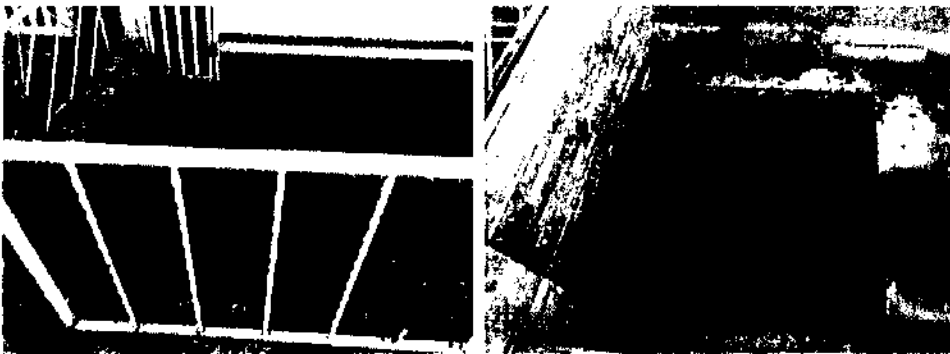

Trazado, corte y excavación de cajas de alcantarillado



Construcción de cajas de alcantarillado

| | | |
|---|--|--|
|  | <p align="center">INFORME DE INTERVENTORIA No. 04</p> <p align="center">CONTRATO No. 063 DE 2021</p> | <p align="center">CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p align="center">FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021</p> |
|---|--|--|

| | |
|---|--|
| <p align="center">CALLE 59 ENTRE 1 A Y 2DA BARRIO HACIENDA PIEDRAPINTADA (FLORESTA).</p> | <p>VIA SIN PAVIMENTAR. TRAMO EN TUBERIA DE DISTINTOS DIAMETROS EN SU TRAYECTO, EN CONCRETO ESTADO DE DETERIORO.</p> |
| <p align="center">LOCALIZACIÓN</p> | <p align="center">CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR</p> |
|  | <p>PROYECTO: Reposición de tubería de alcantarillado y acueducto.</p> |
| <p align="center">REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL</p> | |
|  | <p>Actividades de inicio de excavación de manera mecánica para zanja de alcantarillado, corte y demolición de placa para la zanja de acometidas de alcantarillado e instalación de tubería, también se realiza las actividades de corte y demolición de la red principal de acueducto.</p> |
| <p align="center">DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES</p> | |
| <p>Semana 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Excavación de zanja de alcantarillado. • Excavación de para cajas de alcantarillado • Excavación de red principal de acueducto • Empalme de tubería de alcantarillado <p>Semana 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Excavación de zanjas de acomidas para acueducto. • Construcción de cajas de alcantarillado • Instalación de tubería. | |




**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04**
**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE

Semana 1:

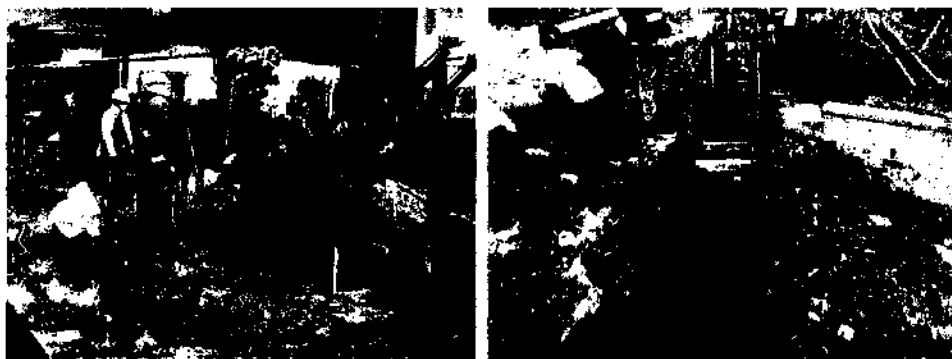

Excavación de zanja principal de alcantarillado



Excavación de acometida de alcantarillado y empalme de tubería de alcantarillado



Excavación de zanja de acueducto



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021


CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021



Excavación de zanja de acometida de acueducto



Construcción de cajas de alcantarillado

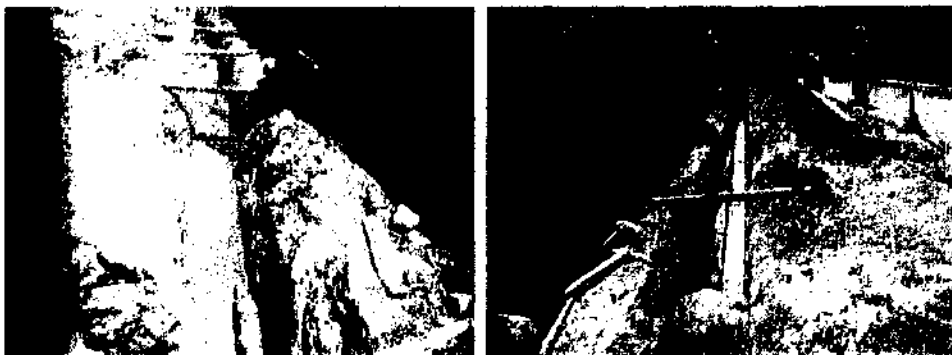

Instalación de tubería de acueducto





**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04**

**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**

**FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021**
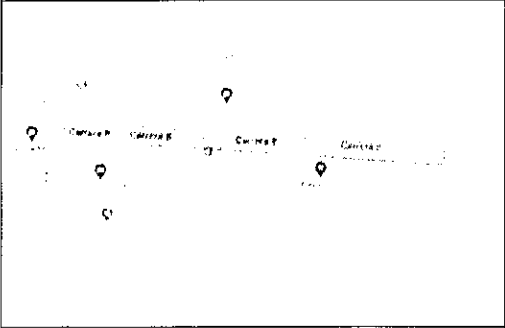
| | |
|---|--|
| <p>CARRERA 8 ENTRE CALLE 44 Y 46 BARRIO CALARCA.</p> | <p>VIA SIN PAVIMENTAR. TRAMO EN INTERVENCION DE RED PRINCIPAL DE ACUEDUCTO EN AMBOS COSTADOS.</p> |
| <p>LOCALIZACIÓN</p> | <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR</p> |
|  | <p>PROYECTO: Reposición de tubería de acueducto de ambos ramales.</p> |
| <p>REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL</p> | |
|  | <p>Actividades de inicio de excavación de manera maneras de zanjas principales, corte y demolición de acometidas de acueducto y excavación manual, relleno y compactación de material de recebo.</p> |
| <p>DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES</p> | |
| <p>Semana 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Excavación de ramal izquierdo de acueducto • Excavación de acometidas • Instalación de tubería <p>Semana 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Excavación de ramal derecho de acueducto. • Excavación de acometidas • Instalación de tuberías | |



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021


CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE


Semana 1:



Excavación de ramal derecho de acueducto

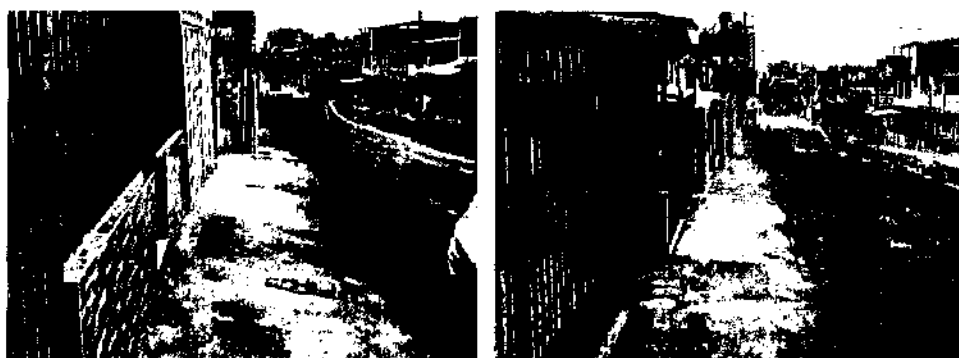

Corte y demolición de acometidas de acueducto.

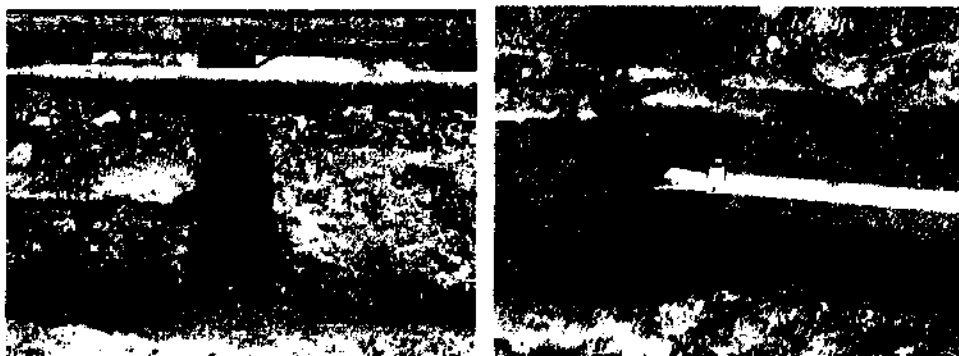

Excavación de acometidas, instalación de tubería



**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04**

**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**

**FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021**

Semana 2:



Excavación del ramal derecho de red principal de acueducto



Relleno y compactación de forma mecánica




Excavación de acometida para acueducto e instalación de tubería



INFORME DE INTERVENTORIA No. 04
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

| CALLE/TRAMO | ESTADO INICIAL |
|---|--|
| CARRERA 11 ENTRE CALLE 67 – 68 BARRIO JORDAN 9 ETAPA. | VIA SIN PAVIMENTAR. TRAMO EN TUBERIA DE DISTINTOS DIAMETROS EN SU TRAYECTO, EN CONCRETO EN AVANZADO ESTADO DE DETERIORO O COLAPSADA. |
| LOCALIZACIÓN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR |
|  | <p>PROYECTO: Reposición de tubería de alcantarillado y acueducto.</p> |
| REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL | <p>Actividades de inicio de excavación de manera mecánica, corte y demolición de placa para la zanja de acometidas de alcantarillado e instalación de tubería.</p> |
| DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES | |
| <p>Semana 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Excavación mecánica de red principal • Instalación de tubería • Relleno y compactación con material de recebo <p>Semana 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Excavación de acometidas de alcantarillado • Excavación de red principal • Instalación de tubería | |




INFORME DE INTERVENTORIA No. 04
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

Semana 1:

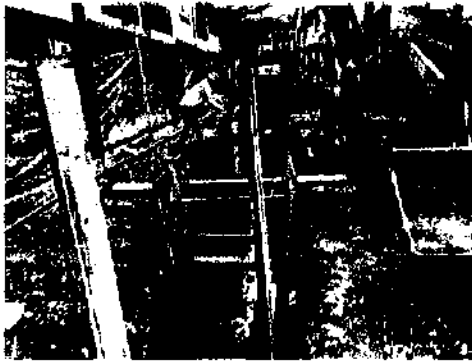

Excavación de red principal de alcantarillado, relleno y compactación



Instalación de tubería



Excavación de acometidas para alcantarillado



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04
CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

Semana 2:




Excavación, instalación de tubería y relleno y compactación con material de recebo



Instalación de tubería para acometidas.



| | | |
|---|--|--|
|  | INFORME DE INTERVENTORIA No. 04 | CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021 |
| | CONTRATO No. 063 DE 2021 | |

2.5.3. Seguimiento a garantías contractuales


| Contrato de Obra No. 062 de 2021 | | | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| No. | Aseguradora | Amparo | Vigencia | Observaciones |
| I-100004725 | SEGUROS MUNDIAL | CUMPLIMIENTO | 05/05/2021 06/05/2022 | |
| I-100004725 | SEGUROS MUNDIAL | SALARIOS Y PRESTACIONES | 06/05/2021 02/11/2024 | |
| I-100004725 | SEGUROS MUNDIAL | CALIDAD DEL SERVICIO | 06/05/2021 02/11/2022 | |
| I-100004725 | SEGUROS MUNDIAL | ESTABILIDAD | 02/11/2021 02/11/2026 | |
| I-100001180 | SEGUROS MUNDIAL | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC. | 06/05/2021 02/11/2022 | |

2.5.4. Avance Físico

A la fecha del presente informe se evidencia el siguiente avance:

| CUADRO COMPARATIVO DE ACTIVIDADES | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| MESES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PROGRAMADO | 15% | 15% | 20% | 20% | 15% | 15% |
| EJECUTADO | 7.0% | 14% | 9% | | | |
| EJECUTADO ACUMULADO | 7.0% | 21% | 30% | | | |

AVANCE DISTRITO 6

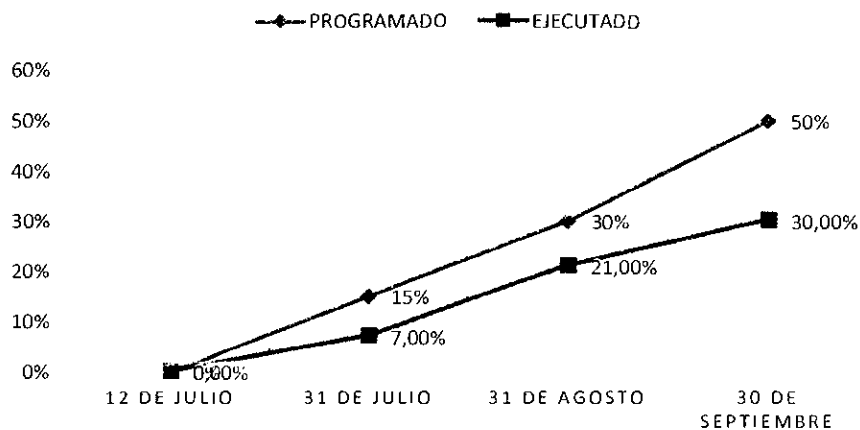


| | | |
|---|--|--|
|  | <p align="center">INFORME DE INTERVENTORIA No. 04</p> <p align="center">CONTRATO No. 063 DE 2021</p> | <p align="center">CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p align="center">FECHA INFORME: 30/09/2021</p> <p align="center">PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021</p> |
|---|--|--|

2.5.5. Avance Financiero

De acuerdo a las actividades realizadas durante el presente periodo el contratista a ejecutado un valor de \$ 835.397.982,60 equivalente al 30.0% del valor del contrato de \$2.784.659.942

2.5.6. Balance del Contrato

PORCENTAJE DE EJECUCION

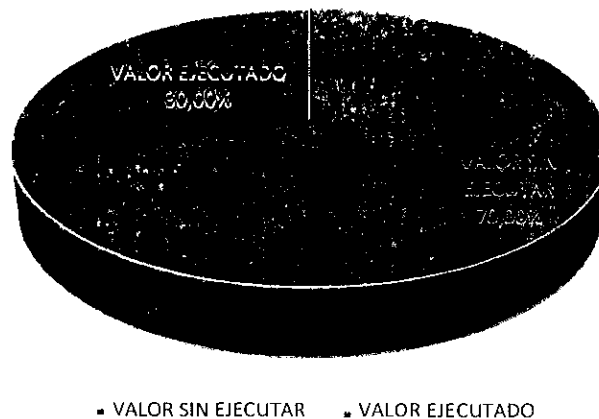

2.5.7. Gestión de las comunicaciones

CORRESPONDENCIA DEL DISTRITO


2.5.8. Información relacionada con los ensayos de Laboratorio.

Se anexan resultados de ensayos de laboratorio realizados durante el periodo del presente informe.


| | | |
|---|--|---|
|  | <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORIA No. 04</p> <p style="text-align: center;">CONTRATO No. 063 DE 2021</p> | <p style="text-align: center;">CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p style="text-align: center;">FECHA INFORME: 30/09/2021</p> <p style="text-align: center;">PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021</p> |
|---|--|---|

2.5.9. Dificultades en la ejecución de los proyectos

| | | Medidas / Acciones / Medidas de mitigación |
|---|--|--|
| <p>Se han presentado lluvias fuertes, que ha retrasado actividades de excavación, retiro, relleno y compactación.</p> | <p>El contratista debe realizar el correspondiente manejo de aguas y organizar logística para aprovechar el buen cambio del clima.</p> | |


| | | |
|---|--|---|
|  | INFORME DE INTERVENTORIA No. 04 | CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL |
| | CONTRATO No. 063 DE 2021 | FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021 |

2.6. DISTRITO HIDRÁULICO No. 7 CONTRATO DE OBRA No. 062 DEL 06 DE MAYO DE 2021.

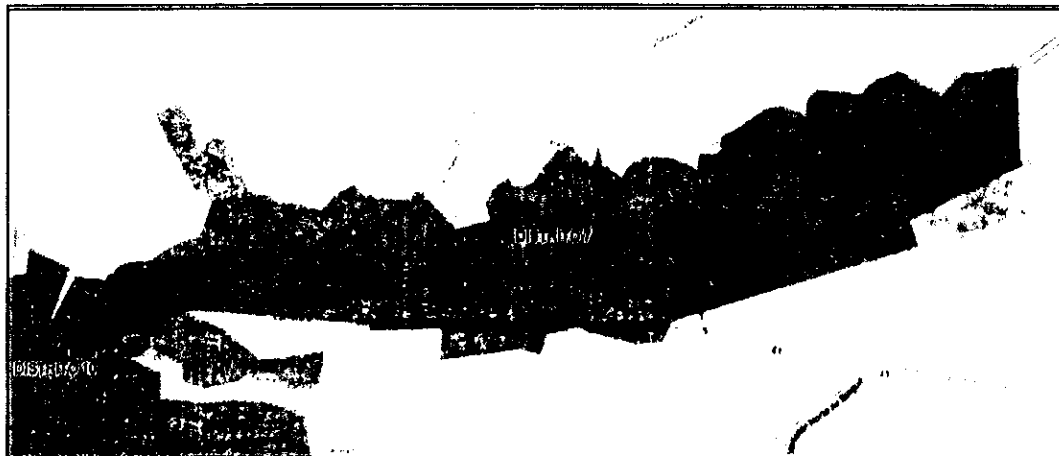



2.6.1. Información general del contrato.

| | |
|-----------------------------|--|
| CONTRATO No. | 062 |
| FECHA | 06 DE MAYO DE 2021 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021 R.L. JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA |
| CLASE | OBRA |
| VALOR | TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE (\$3.947.940.553) |
| PLAZO | CIENTO OCHENTA (180) DIAS |
| FECHA DE INICIO | 01 DE JUNIO DE 2021 |
| FECHA DE TERMINACION | 28 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| OBJETO | REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 7 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE. |

| | | |
|---|--|--|
|  | <p align="center">INFORME DE INTERVENTORIA No. 04</p> <p align="center">CONTRATO No. 063 DE 2021</p> | <p align="center">CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p align="center">FECHA INFORME: 30/09/2021</p> <p align="center">PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021</p> |
|---|--|--|

2.6.2. Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes.

| CALLE/TRAMO | ESTADO INICIAL |
|--|--|
| <p align="center">CARRERA 13 ENTRE 125 Y 126 O ENTRE LA MANZANA C Y EL CEMENTERIO LA MILAGROSA BARRIO ALBERTO LLERAS</p> | <p align="center">VIA SIN ESTRUCTURA EN MAL ESTADO. TRAMO EN TUBERIA DE 8"</p> |
| <p align="center">LOCALIZACIÓN</p> | <p align="center">CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR</p> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zanja para tubería de 8" de 0,65 m ➤ Zanja para tubería de 6" de 0,60m- 1 m respectivamente ➤ Protección de los tramos a construir con revestimiento de la tubería acorde con la normativa vigente respectivamente. |
| <p align="center">REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL</p> | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Construcción de cajas de inspección para cada vivienda ➤ Relleno manual y compactación con recebo Retiro de sobrantes con medio mecánico Corte y demolición para cajas de inspección ➤ Excavaciones para cajas de inspección 0,80m x 0,80m ➤ Llenos en recebo compactado hasta rasante de vía. ➤ Excavación para zanja de acueducto con ancho establecido 0,375 m. |



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04
CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES
01 DE SEPTIEMBRE 30 SEPTIEMBRE

SEMANA 6 (01-04 Septiembre)

- Excavación de acometidas domiciliarias
- Fundida de caja de inspección
- Excavación de red principal
- Construcción de pozo PP2
- Instalación de tubería de red principal
- Instalación de tubería domiciliaria
- Relleno y compactación en recebo de red principal y domiciliarias
- Construcción de pozo PP3A
- Excavación de cajas de inspección
- Limpieza con retroexcavadora de área intervenida

SEMANA 7 (06-11 Septiembre)

- Continua Construcción de pozo PP3A
- Instalación de tubería domiciliaria
- Lleno y compactación en recebo de excavación principal
- Fundido de caja de inspección
- Limpieza con retroexcavadora de área intervenida
- Excavación de red domiciliaria
- Corte y demolición de placa para caja de inspección.
- Fundido de resanes en andén.
- Limpieza y recuperación de andenes.

Observaciones

Llueve fuertemente el 06/09/2021 hasta las 11:00 am retrasando actividades en la jornada laboral.

Llueve fuertemente el 08/09/2021 hasta las 9:30 am retrasando actividades en la jornada laboral.

SEMANA 8 (13-18 Septiembre)

- Continúan actividades de lleno y compactación de red principal.
- Se hacen pruebas de densidades.
- Inicia excavación de zanja para acueducto.

Observaciones

El 17/09/2021 Se hace visita por parte de la supervisora de acueducto del IBAL para contabilizar empalmes y accesorios correspondientes a la red de acueducto. Se identifica filtración de agua proveniente de la casa 4 y se determina hacer prueba de cloro.



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 - 30/09/2021

SEMANA 9 (20-25 Septiembre)

- Limpieza de área de intervención con retro excavadora.
- Continúa excavación para red de acueducto.
- Excavación para red domiciliaria.
- Instalación de tubería de 6".
- Excavación para caja de inspección.
- Fundida de revestimientos para domiciliarias.
- Fundida de cajas de inspección.

Observaciones

Al ejecutar excavación de zanja para acueducto se identificó línea de alcantarillado en mal estado, por consiguiente, se determina por el supervisor del contrato intervenir en líneas de alcantarillado en mal estado y conectar directamente al colector de 40".

SEMANA 6 (27-30 Septiembre)

- Continua excavación para red de acueducto
- Apique para localizar empalme de tubo antiguo de la red de acueducto
- Corte de pavimento rígido para zanjas de mangueras de agua
- Excavación para zanjas de mangueras de agua
- Relleno de zanjas de mangueras de agua .

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

01 DE SEPTIEMBRE - 30 SEPTIEMBRE

SEMANA 6 (01-04 Septiembre)

- Excavación de red principal.



- Construcción de pozo PP2



Dirección: Centro Comercial Arroyuelos, Local 6, Ibagué, Tolima.

Teléfono: 300 556 1508 - Correo electrónico: interventoriaexterna2021@gmail.com



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 - 30/09/2021

- Instalación de tubería de red principal



- Relleno y compactación en recebo de red principal y domiciliarias



- Construcción de pozo PP3A



- Limpieza con retroexcavadora de área intervenida






**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04**
**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

SEMANA 7 (06-11 Septiembre)

- Instalación de tubería domiciliaria



OBSERVACIONES

- Lluve fuertemente el 06/09/2021 hasta las 11:00 am retrasando actividades en la jornada laboral.
- Lluve fuertemente el 08/09/2021 hasta las 9:30 am retrasando actividades en la jornada laboral.

SEMANA 8 (13-18 Septiembre)

- Se hacen pruebas de densidades - Inicia excavación de zanja para acueducto



OBSERVACIONES

- El 17/09/2021 Se hace visita por parte de la supervisora de acueducto del IBAL para contabilizar empalmes y accesorios correspondientes a la red de acueducto.
- Se identifica filtración de agua proveniente de la casa 4 y se determina hacer prueba de cloro.



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04
CONTRATO No. 063 DE
2021


CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

SEMANA 9 (20-25 Septiembre)

- Continua excavación para red de acueducto - Instalación de tubería de 6"



- Fundida de cajas de inspección - Relleno con recebo para zanjas de domiciliar de alcantarillado.



- Compactación de recebo con saltarín



OBSERVACIONES

- Al ejecutar excavación de zanja para acueducto se identificó línea de alcantarillado en mal estado, por consiguiente, se determina por el supervisor del contrato intervenir en líneas de alcantarillado en mal estado y conectar directamente al colector de 40"

SEMANA 6 (27-30 Septiembre)



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04
CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 - 30/09/2021

- Continua excavación para red de acueducto - Apique para localizar empalme de tubo antiguo de la red de acueducto



- Corte de pavimento rígido para zanjas de mangueras de agua - Excavación para zanjas de mangueras de agua





Nota: Hasta la fecha continúan actividades de excavación de zanja para acueducto y excavación para mangueras, faltan las respectivas instalaciones de mangueras al medidor de agua y conexión del tubo nuevo de acueducto principal al tubo antiguo, tal como se estableció con el ingeniero residente.

Se recomienda al contratista la entrega correspondiente de los materiales para la correcta ejecución de las actividades, a su vez disponer de las herramientas y equipos de trabajo necesarios para un buen desarrollo de la obra, se solicita la organización y el cumplimiento de las acciones establecidas en el cronograma, brindar dotación correspondiente a los trabajadores, disponer de un espacio en horas laborales para la limpieza y organización del área de trabajo.



**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04**
**CONTRATO No. 063 OE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

| CALLE/TRAMO | ESTADO INICIAL |
|---|---|
| CARRERA 15 ENTRE 121 Y 121 ^B PRADERAS DEL NORTE | VIA PAVIMENTADA EN CONCRETO ASFALTICO EN REGULAR ESTADO. TRAMO EN TUBERIA DE 10" EN CONCRETO EN AVANZADO ESTADO DE DETERIORO |
| LOCALIZACIÓN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR |
|  | <ul style="list-style-type: none">➤ Zanja para tubería de 10" de 0,70 m➤ Zanja para tubería de 6" de 0,60 m- 1 m respectivamente➤ Protección de los tramos a construir con revestimiento de la tubería acorde con la normativa vigente.➤ Construcción de cajas de inspección para cada vivienda➤ Relleno y compactación con recebo con medio mecánico➤ Retiro de sobrantes con medio mecánico➤ Corte y demolición de zonas a intervenir tanto en concreto asfáltico como en concreto rígido➤ Excavaciones para cajas de inspección 0,80m x 0,80m➤ Llenos en recebo compactado hasta rasante de vía. |
| REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL | |
|  | |



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021

CDNSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES
01 DE SEPTIEMBRE- 30 SEPTIEMBRE

SEMANA 8 (01-04 Septiembre)

- Demolición y excavación para zanja de acueducto
- Excavación para zanjas domiciliarias
- Excavación de tubería
- Fundición de cajas de inspección
- Cortes de asfalto y concreto para instalación de red de acueducto
- Instalación de tubería para red domiciliarias
- Se funden tapas para cajas de inspección
- Demolición y excavación para fundido de cajas de inspección.

SEMANA 9 (06-11 Septiembre)

- Demolición de andén para cajas de inspección
- Excavación manual para zanjas domiciliarias
- Excavación para cajas de inspección
- Demolición de asfalto y excavación para red de acueducto
- Instalación de tubería de alcantarillado
- Revestimiento de tubería
- Nivelación de tubería de red principal de alcantarillado
- Se realizan apiques para localizar cajas de inspección antiguas
- Lleno y compactación con recebo para zanja principal de alcantarillado
- Fundida de cajas de inspección
- Instalación de tubería de 3" para acueducto
- Revestimiento para tubería principal de acueducto
- Revestimiento para tubería domiciliaria de alcantarillado.

SEMANA 10 (13-18 Septiembre)

- Excavación para zanjas domiciliarias
- Demolición y excavación para red de acueducto
- Fundido de cajas de inspección
- Instalación y revestimiento de tubería de alcantarillado
- Cortes para cajas de inspección
- Se realizan pruebas de densidad del terreno compactado
- Lleno de zanja y acometida de acueducto
- Lleno y compactación de zanja principal de alcantarillado
- Realización de cañuelas para cajas de inspección
- Limpieza de material proveniente de la excavación por medio mecánico

SEMANA 11 (20-25 Septiembre)

- Corte excavación y demolición para zanja de red de acueducto
- Lleno y compactación en recebo para red de alcantarillado
- Fundido de cañuelas para cajas de inspección



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

- Fundido de cajas de inspección
- Instalación de tapas para cajas de inspección
- Excavación para red de 6" domiciliaria
- Demolición y excavación para cajas de inspección
- Lleno y compactación de red principal de alcantarillado con recebo
- Limpieza de material proveniente de la excavación con medio mecánico
- Instalación y revestimiento para tubería domiciliaria
- Lleno y compactación para cajas de inspección

SEMANA 12 (27-30 Septiembre)

- Revestimiento de red de acueducto
- Instalación de tubería principal de acueducto
- Excavación para cajas de inspección
- Limpieza de material proveniente de la excavación con medio mecánico
- Lleno y compactación con recebo para zanjas de alcantarillado
- Instalación de tapas para cajas de inspección
- Resanes y cortes para cajas de inspección
- Fundido de cañuelas y cajas de inspección
- Corte demolición y excavación para zanja de acueducto
- Cortes y llenos para cajas de inspección.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

01 DE SEPTIEMBRE- 30 SEPTIEMBRE

SEMANA 8 (01-04 Septiembre)

- Demolición y excavación para zanja de acueducto - Excavación para zanjas domiciliarias



- Excavación de tubería



- Fundición de cajas de inspección





INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 - 30/09/2021

- Cortes de asfalto y concreto para instalación de red de acueducto - Se funden tapas para cajas de inspección.



- Demolición y excavación para fundido de cajas de inspección



SEMANA 9 (06-11 Septiembre)

- Excavación manual para zanjas domiciliarias - Demolición de asfalto y excavación para red de acueducto.



- Instalación de tubería de alcantarillado - Revestimiento de tubería





INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 - 30/09/2021

- Se realizan apiques para localizar cajas de inspección antiguas - Fundida de cajas de inspección.



- Instalación de tubería de 3" para acueducto - Revestimiento para tubería principal de acueducto - Revestimiento para tubería domiciliaria de alcantarillado



SEMANA 10 (13-18 Septiembre)

- Excavación para zanjas domiciliarias - Demolición y excavación para red de acueducto





INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04


CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

➤ Fundido de cajas de inspección - instalación y revestimiento de tubería de alcantarillado



➤ Se realizan pruebas de densidad del terreno compactado - Lleno de zanja y acometida de acueducto



➤ Lleno y compactación de zanja principal de alcantarillado - Limpieza de material proveniente de la excavación por medio mecánico.



SEMANA 11 (20-25 Septiembre)

➤ Corte excavación y demolición para zanja de red de acueducto –





INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 - 30/09/2021

- Fundido de cañuelas para cajas de inspección - Fundido de cajas de inspección.



- Limpieza de material proveniente de la excavación con medio mecánico - Instalación y revestimiento para tubería domiciliaria.



SEMANA 12 (27-30 Septiembre)

- Resanes y cortes para cajas de inspección - Fundido de cañuelas y cajas de inspección



- Corte demolición y excavación para zanja de acueducto





**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04**



**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**

FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

Nota: Hasta la fecha continúan actividades de excavación para zanja de red de acueducto e instalación de maneras de acueducto. Se solicita entrega final al día de actividades de alcantarillado.

Se recomienda al contratista la entrega correspondiente de los materiales para la correcta ejecución de las actividades, a su vez disponer de las herramientas y equipos de trabajo necesarios para un buen desarrollo de la obra, se solicita la organización y el cumplimiento de las acciones establecidas en el cronograma, brindar dotación correspondiente a los trabajadores, disponer de un espacio en horas laborales para la limpieza y organización del área de trabajo.

| CALLE/TRAMO | ESTADO INICIAL |
|---|--|
| <p>CARRERA 8 E BIS ENTRE CALLES 131ª Y 132 BARRIO SANLUCAS</p> | <p>VIA CON ESTRUCTURA EN MAL ESTADO. TRAMO EN TUBERIA DE 8"</p> |
| LOCALIZACIÓN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zanja para tubería de 8" de 0,70 m ➤ Zanja para tubería de 6" de 0,60m- 1 m respectivamente ➤ Protección de los tramos a construir con revestimiento de la tubería acorde con la normativa vigente respectivamente. ➤ Construcción de cajas de inspección para cada vivienda ➤ Relleno manual y compactación con recebo ➤ Llenos en recebo compactado hasta rasante de vía. ➤ Corte y demolición para cajas de inspección ➤ Excavaciones para cajas de inspección 0,80m x 0,80m x 1,00m |
| REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL | |
|  | |



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES
01 DE SEPTIEMBRE 30 SEPTIEMBRE

SEMANA 2 (01-04 Septiembre)

- Instalación de lecho en grava.
- Instalación y atraque de tubería de 8" .
- Demolición de placa para caja de inspección.
- Excavación para cajas de inspección.
- Fundida de revestimiento para tubería principal.
- Demolición de asfalto para red domiciliaria.
- Excavación para zanjas domiciliarias.
- Limpieza de excavación para cajas de inspección.

SEMANA 3 (06-11 Septiembre)

- Instalación de tubería de 6" para red domiciliaria
- Demolición de asfalto para red domiciliaria
- Excavación para red domiciliaria
- Fundida de caja de inspección
- Instalación de tubería de 6"
- Fundidas de revestimientos para domiciliarias
- Lleno y compactación de recebo para red principal y domiciliaria
- Fundida de cañuelas para cajas de inspección
- Instalación de tapas para cajas de inspección

Observaciones

El 06/09/2021 Lluve fuertemente hasta las 11:00am retresando actividades previstas

SEMANA 4 (13-18 Septiembre)

- Lleno y compactación de zanja principal y domiciliaria
- Lleno en recebo para cajas de inspección
- Fundido de resanes en andenes
- Limpieza de material de sitio con retro excavadora




INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04
CONTRATO No. 063 OE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

**REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES
01 DE SEPTIEMBRE - 30 SEPTIEMBRE**

SEMANA 2 (01-04 Septiembre)

- Instalación de lecho en grava - Instalación y atraque de tubería de 8"



- Demolición de placa para caja de inspección



- Excavación para cajas de inspección - Limpieza de excavación para cajas de inspección





INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04
CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 - 30/09/2021

- Fundida de revestimiento para tubería principal



- Demolición de asfalto para red domiciliaria



- Excavación para zanjas domiciliarias



SEMANA 3 (06-11 Septiembre)

- Instalación de tubería de 5" para red domiciliaria





INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021


CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 - 30/09/2021

- Demolición de asfalto para red domiciliaria



- Excavación para red domiciliaria



- Fundida de caja de inspección



- Instalación de tubería de 6"





INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04
CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

- Fundidas de revestimientos para domiciliarias



- Lleno y compactación de recebo para red principal y domiciliaria



- Fundida de cañuelas para cajas de inspección - Instalación de tapas para cajas de inspección.



SEMANA 4 (13-18 Septiembre)

- Lleno y compactación de zanja principal y domiciliaria






INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

➤ Lleno en recebo para cajas de inspección

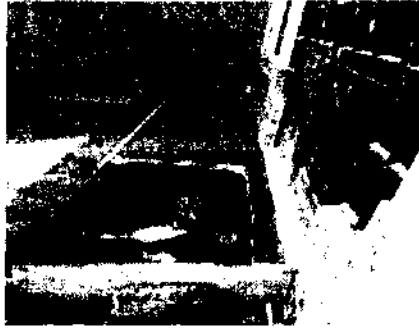

➤ Fundido de resanes en andenes



➤ Limpieza de material de sitio con retro excavadora





Nota: Culminan actividades de lleno y compactación de red principal, se hace limpieza con retro excavadora y se recoge cerramiento. Se Solicita al contratista la organización y culminación de actividades con jornada de aseo en el área intervenida para posterior verificación y aprobación por parte de Interventoría.



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04
CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

| CALLE/TRAMO | ESTADO INICIAL |
|---|---|
| CALLE 129 ENTRE CARRERAS 9 Y 10 MILAGROSA BARRIO MONTECARLO | VIA CON ESTRUCTURA EN MAL ESTADO. TRAMO EN TUBERIA DE 8" |
| LOCALIZACIÓN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR |
|  | <ul style="list-style-type: none">➤ Zanja para tubería de 8" de 0,70 m➤ Zanja para tubería de 6" de 0,60m- 1 m respectivamente➤ Protección de los tramos a construir con revestimiento de la tubería acorde con la normativa vigente respectivamente.➤ Construcción de cajas de inspección para cada vivienda➤ Relleno manual y compactación con recebo➤ Llenos en recebo compactado hasta rasante de vía.➤ Corte y demolición para cajas de inspección➤ Excavaciones para cajas de inspección 0,80m x 0,80m x 1,00m |
| REGISTRD FOTOGRAFICO INICIAL | |
|  | |



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES
01 DE SEPTIEMBRE 30 SEPTIEMBRE

SEMANA 3 (01-04 Septiembre)

- Inicio entibado en excavación de zanja principal
- Inicio aplique para localizar tubería de red domiciliaria
- Excavación de domiciliaria
- Lleno y compactación en recebo de red Principal
- Instalación de silla YEE
- Instalación de tubería 6"
- Inicia fundida de revestimiento

Observaciones: 03.09.21 No se han encontrado dos redes domiciliarias

SEMANA 4 (06-11 Septiembre)

- Limpieza de zanja principal
- Lleno y compactación en recebo de red Principal
- Lavado de tubería de 14" con el vector
- Instalación de acometida de 6"
- Continua excavación de domiciliaria
- Continuo aplique para búsqueda de red domiciliaria
- Inspección de robot dentro de tubería de 14"
- Continua actividades de lleno y compactación de relleno de domiciliarias
- Relleno y compactación de zanja principal
- Inicio de aplique para ubicar válvula de red de acueducto
- Limpieza del terreno con retroexcavadora

Observaciones : 07.09.21 La tubería de alcantarillado se intercepta con la nueva red de alcantarillado

SEMANA 5 (13-18 Septiembre)

- Excavación manual para empalme de red de acueductos
- Excavación de cajas domiciliarias
- Nivelación de red principal
- Instalación de tubería 8" para red principal
- Instalación de formaleta para fundir cajas de inspección
- Fundido de cajas de inspección
- Relleno con recebo en zanja de red principal
- Aplique para red domiciliaria

Observaciones: 15.09.21 Visita del IBAL con Vector que ejecuto lavado de tubería de 8" y 14" la cual presento tubería colapsada, 17.09.21 Cambio de subcontratista.



**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04**
**CONTRATO No. 063 OE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

SEMANA 6 (20-25 Septiembre)

- Nivelación de red principal
- Relleno de cajas de inspección
- Relleno y compactación de zanja red principal
- Instalación de tubería 8"
- Aplique para red domiciliaria
- Instalación de silla Yee para conexión de acometida

SEMANA 7 (27-30 Septiembre)

- Llano con recebo y compactación con saltarín de red principal
- Limpieza de material proveniente de la excavación con retroexcavadora
- Excavación para instalación de cajas de inspección
- Excavación de zanjas para conexión de red domiciliaria
- Fundición de cajas de inspección
- Fundición de tapas para las cajas de inspección
- Llano con recebo y compactación con saltarín para domiciliaria de alcantarillado
- Cortes y demolición para cajas de inspección
- Instalación de tubería 6" de alcantarillado para red domiciliaria
- Limpieza de sumidero de aguas lluvias.

**DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES
01 DE SEPTIEMBRE 30 SEPTIEMBRE**

SEMANA 3 (01-04 Septiembre)

- Inicio entibado en excavación de zanja principal - Excavación de domiciliaria





INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04
CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

- Lleno y compactación en recebo de red Principal - Instalación de tubería 6"



Observaciones: 03.09.21 No se han encontrado dos redes domiciliarias

SEMANA 4 (06-11 Septiembre)

- Lleno y compactación en recebo de red Principal - Lavado de tubería de 14" con el vector



- Continuo aplique para búsqueda de red domiciliaria - Relleno y compactación de zanja principal.



- Limpieza del terreno con retroexcavadora



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04
CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021




Observaciones: 07.09.21 La tubería de alcantarillado se intercepta con la nueva red de alcantarillado

SEMANA 5 (13-18 Septiembre)

- Excavación de cajas domiciliarias - Instalación de tubería 8" para red principal



- Instalación de formaleta para fundir cajas de inspección - Fundido de cajas de inspección




Observaciones : 15.09.21 Visita del IBAL con Vector que ejecuto lavado de tubería de 8" y 14" la cual presento tubería colapsada, 17.09.21 Cambio de subcontratista.

SEMANA 6 (20-25 Septiembre)

- Relleno de cajas de inspección - Relleno y compactación de zanja red principal



- Aplique para red domiciliaria - Instalación de silla Yee para conexión de acometida

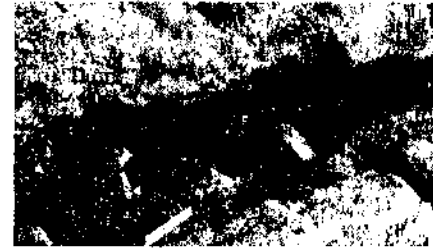


SEMANA 7 (27-30 Septiembre)

- Lleno con recebo y compactación con saltarín de red principal - Limpieza de material proveniente de la excavación con retroexcavadora



- Excavación para instalación de cajas de inspección - Excavación de zanjas para conexión de red domiciliaria.

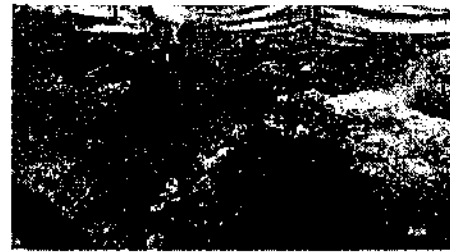



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021



CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021


- Fundición de cajas de inspección - Fundición de tapas para las cajas de inspección



- Cortes y demolición para cajas de inspección - Instalación de tubería 6" de alcantarillado para red domiciliaria.

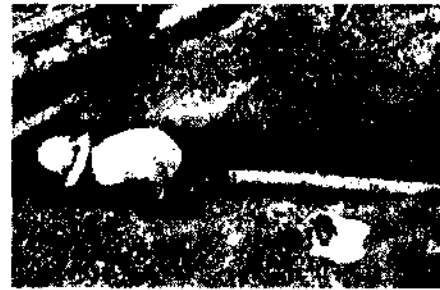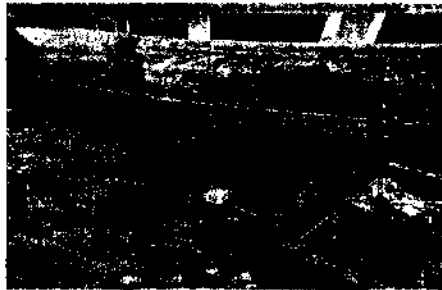

- Limpieza de sumidero de aguas lluvias -

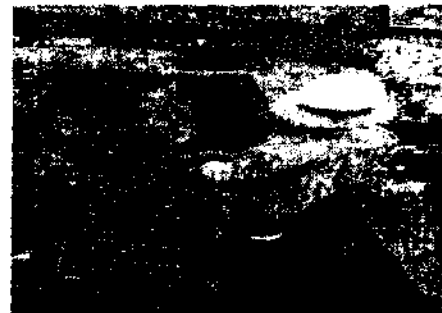

Nota: Hasta la fecha continúan actividades de excavación de zanja para alcantarillado de domiciliarias, fundición de cajas de inspección y llenos y compactación de zanjas, falta dar inicio para intervenir la tubería de 14" antigua y dar inicio a la instalación de la red de acueducto.

Se recomienda al contratista la entrega correspondiente de los materiales para la correcta ejecución de las actividades, a su vez disponer de las herramientas y equipos de trabajo necesarios para un buen desarrollo de la obra, se solicita la organización y el cumplimiento de las acciones establecidas en el cronograma, brindar dotación correspondiente a los trabajadores, disponer de un espacio en horas laborales para la limpieza y organización del área de trabajo.





INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

| CALLE/TRAMO | ESTADO INICIAL |
|---|--|
| CALLE 145 CON CARRERA 81 BARRIO SALADO | VIA CON ESTRUCTURA EN MAL ESTADO. TRAMO EN TUBERIA DE 10" |
| LOCALIZACIÓN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR |
|  | <ul style="list-style-type: none">➤ Zanja para tubería de 10" de 0,70 m➤ Zanja para tubería de 6" de 0,50m respectivamente➤ Instalación de silla T para red domiciliaria➤ Construcción de cajas de inspección para cada vivienda➤ Relleno manual y compactación con recebo➤ Llenos en recebo compactado hasta rasante de vía.➤ Excavaciones para cajas de inspección 0,80m x 0,80m |
| REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL | |
|  | |



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES
01 DE SEPTIEMBRE 30 SEPTIEMBRE

SEMANA 1 (01-04 Septiembre)

- Realización de actos de vecindad y socialización del proyecto
- Investigación y levantamiento topográfico del tramo a intervenir
- Instalación de cerramientos
- Corte de asfalto para zanja principal
- Demolición de sardinel para continuidad al flujo vehicular por el otro carril
- Inicia excavación con retroexcavadora para zanja principal

SEMANA 2 (06-11 Septiembre)

- Excavación con retroexcavadora para zanja principal
- Corte de asfalto para zanja principal
- Inicia demolición de asfalto para zanja de domiciliarias
- Verificación de profundidad con nivel de precisión
- Inicia actividades de lleno y compactación de recebo en zanja principal
- Instalación de tubería de 10"
- Inicia instalaciones de sillas YEE para domiciliarias
- Instalación de lecho de grava
- Verificación de nivel en tubería de 10"

Observaciones: 06.09.21 Lluve fuertemente hasta las 11:00 am retrasando actividades,

SEMANA 3 (13-18 Septiembre)

- Fundida de revestimiento para tubería de 10"
- Continúa actividades de lleno y compactación de zanja principal
- Instalación de silla YEE
- Instalación de tubería de 6" para domiciliaria
- Fundida de revestimiento en red principal
- Excavación manual para domiciliar
- Pruebas de densidad
- Instalación de tubería en red principal
- Instalación de sillas YEE para domiciliarias
- Instalación de red domiciliaria
- Excavación para cajas de inspección

| | | |
|---|--|--|
|  | <p align="center">INFORME DE INTERVENTORIA No. 04</p> <p align="center">CONTRATO No. 063 DE 2021</p> | <p align="center">CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p align="center">FECHA INFORME: 30/09/2021</p> <p align="center">PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021</p> |
|---|--|--|

SEMANA 4 (20-25 Septiembre)

- Excavación para red domiciliaria
- Fundida de cajas de inspección
- Actividades de relleno y compactación
- Excavación para cajas de inspección
- Armado de parrillas para tapas de inspección
- Actividades de llenos y compactación en recebo para red domiciliaria
- Instalación de tubería 6"
- Fundida de revestimiento para tubería principal
- Excavación mecánica con retroexcavadora para red principal
- Fundida de tapas para caja de inspección
- Nivelación de tubería con nivel de precisión
- Excavación manual de red principal
- Lleno y compactación de recebo para red domiciliaria

SEMANA 5 (27-30 Septiembre)

- Excavación de cajas de inspección
- Fundido de caja de inspección
- Limpieza con retroexcavadora
- Lleno y compactación de zanja principal en recebo.

**REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES
01 DE SEPTIEMBRE - 30 SEPTIEMBRE**

SEMANA 1 (01-04 Septiembre)

- Realización de actos de vecindad y socialización del proyecto
- Investigación y levantamiento topográfico del tramo a intervenir
- Instalación de cerramientos



}



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04
CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

- Corte de asfalto para zanja principal



- Inicia excavación con retroexcavadora para zanja principal



SEMANA 2 (06-11 Septiembre)

- Excavación con retroexcavadora para zanja principal



- Corte de asfalto para zanja principal





INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021


CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021


- Inicia demolición de asfalto para zanja de domiciliarias



- Verificación de profundidad con nivel de precisión

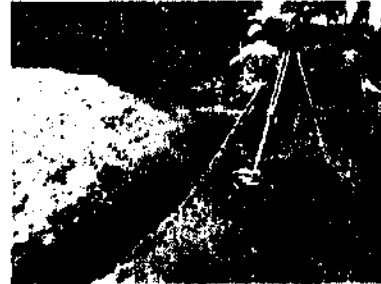

- Inicia actividades de lleno y compactación de rebo en zanja principal



- Instalación de lecho de grava - Instalación de tubería de 10"



Observaciones:

06/09/21 Lluve fuertemente hasta las 11:00 am retrasando actividades



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04


CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL


FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

SEMANA 3 (13-18 Septiembre)


- Fundida de revestimiento para tubería de 10"

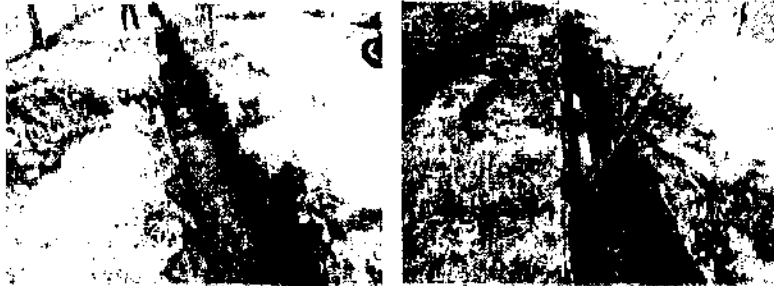


- Continúa actividades de lleno y compactación de zanja principal

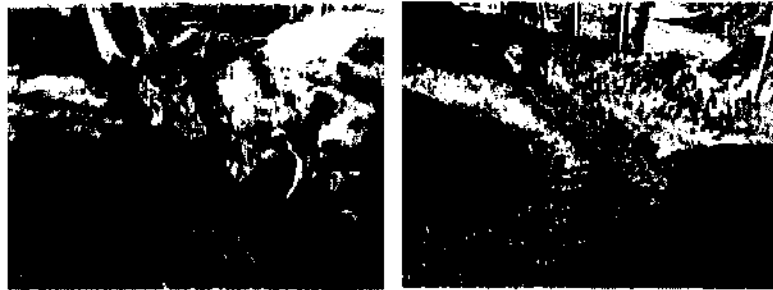

- Instalación de silla YEE - Instalación de tubería de 6" para domiciliaria

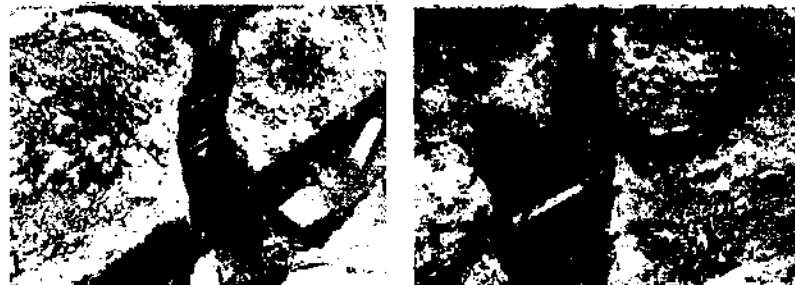

- Fundida de revestimiento en red principal

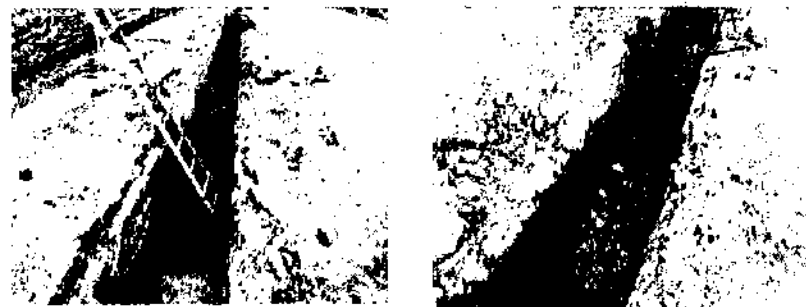



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 - 30/09/2021

➤ Excavación manual para domiciliar



➤ Pruebas de densidad



➤ Instalación de tubería en red principal



➤ Excavación para cajas de inspección





**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04**

**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**

**FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021**

SEMANA 4 (20-25 Septiembre)



- **Excavación para red domiciliaria**



- **Fundida de cajas de inspección**



- **Actividades de relleno y compactación**



- **Excavación para cajas de inspección**






INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04
CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 - 30/09/2021

- Armado de parrillas para tapas de inspección



- Actividades de llenos y compactación en recebo para red domiciliaria



- Instalación de tubería 6"



- Fundida de revestimiento para tubería principal - Nivelación de tubería





INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

- Fundida de tapas para caja de inspección



- Excavación manual de red principal




SEMANA 5 (27-30 Septiembre)

- Excavación de cajas de inspección



- Lleno y compactación de zanja principal en recebo



Nota: Hasta la fecha continúan actividades de lleno y compactación de red principal, excavación de red domiciliaria, falta por instalar sillas Yee para lotes en gestión de matrícula


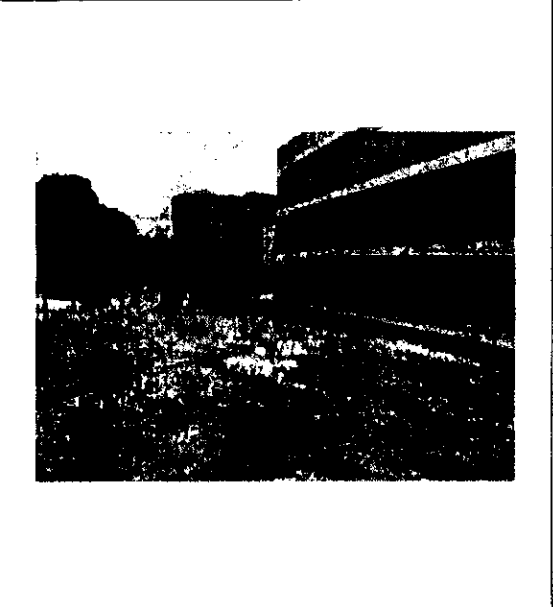
Se recomienda al contratista la instalación de tapas para cajas de inspección y la entrega correspondiente de las mismas, a su vez disponer de las herramientas, materiales y equipos de trabajo necesarios para un buen desarrollo de las actividades, se solicita la organización y el cumplimiento de las acciones establecidas en el cronograma, brindar dotación correspondiente a los trabajadores, disponer de un espacio en horas laborales para la limpieza y organización del área de trabajo.



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

| CALLE/TRAMO | ESTADO INICIAL |
|---|---|
| CARRERA 8B ENTRE CALLE 145 Y 147 BARIO MIRADOR DE LOS ALPES | VIA SIN ESTRUCTURA. TRAMO EN TUBERIA DE 10" |
| LOCALIZACIÓN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR |
|  | <ul style="list-style-type: none">➤ Zanja para tubería de 10" de 0,70 m.➤ Zanja para tubería de 6" de 0,50m respectivamente.➤ Instalación de silla T para red domiciliaria.➤ Construcción de cajas de inspección para cada vivienda. |
| REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL | <ul style="list-style-type: none">➤ Relleno manual y compactación con recebo.➤ Llenos en recebo compactado hasta rasante de vía.➤ Excavaciones para cajas de inspección 0,80m x 0,80m. |
|  | |



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

01 DE SEPTIEMBRE 30 SEPTIEMBRE

SEMANA 1 (06-11 Septiembre)

- Realización de actas de vecindad y socialización del proyecto y tramo a intervenir
- Investigación y levantamiento topográfico del tramo a intervenir
- Inicio de obra con cerramiento perimetral en poli sombra
- Replanteo topográfico para localización de pozos existentes
- Inicio de excavación mecánica para cajeo y zanja de tubería desde el pozo de alcantarillado PE6 hasta PE7
- Demolición de red de alcantarillado existente con retroexcavadora

SEMANA 2 (13-18 Septiembre)

- Verificación de niveles de excavación
- Instalación de tubos de 10" para red principal
- Actividades de entibado para seguridad de los trabajadores
- Inicio de lleno y compactación de recebo para cajón y zanja de red principal
- Instalación de silla T y tubería de 6" para domiciliaria
- Retiro de material proveniente de la excavación
- Actividades de apique para identificar cajas de inspección existentes
- Continuas actividades de excavación con retroexcavadora para red principal
- Instalación de lecho en grava para nivelación de tubería

SEMANA 3 (20-25 Septiembre)

- Continuas actividades de excavación con retroexcavadora para red principal entre pozos existente 7 hasta pozo existente 8
- Excavación manual para red domiciliaria
- Lleno y compactación en recebo para red principal
- Instalación de tubería 6" para red domiciliaria
- Instalación de tubería para red principal
- Excavación de cajón superior entre pozo 8 a pozo 9

SEMANA 4 (27-30 Septiembre)

- Excavación para red domiciliaria
- Lleno en recebo compactado con saltarín para red central
- Excavación de cajón superior entre pozo 8-9 para red central
- Instalación de tuberías para redes domiciliarias
- Excavación para cajas de inspección
- Lleno en recebo compactado con saltarín para redes domiciliarias
- Fundida de cajas de inspección
- Corte y demolición de placa en concreto



**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04**

**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

**REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES
01 DE SEPTIEMBRE - 30 SEPTIEMBRE**

SEMANA 1 (06-11 Septiembre)

- Inicio de obra con cerramiento perimetral en poli sombra



- Inicio de excavación mecánica para cajeo y zanja de tubería desde el pozo de alcantarillado PE6 hasta PE7



- Demolición de red de alcantarillado existente con retroexcavadora





INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04
CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

SEMANA 2 (13-18 Septiembre)

- Instalación de tubos de 10" para red principal




- Actividades de entibado para seguridad de los trabajadores



- Inicio de lleno y compactación de recebo para cajón y zanja de red principal



- Instalación de silla T y tubería de 6" para domiciliaria





INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04
CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021


- Retiro de material proveniente de la excavación



- Actividades de apique para identificar cajas de inspección existentes



- Continuas actividades de excavación con retroexcavadora para red principal

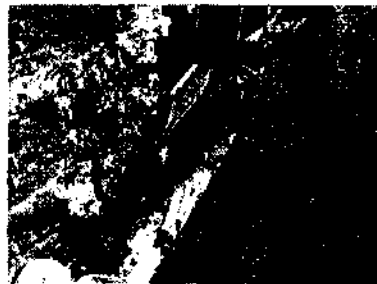

SEMANA 3 (20-25 Septiembre)

- Continuas actividades de excavación con retroexcavadora para red principal entre pozos existente 7 hasta pozo existente 8





INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021


CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

➤ Excavación manual para red domiciliaria



➤ Lleno y compactación en recebo para red principal

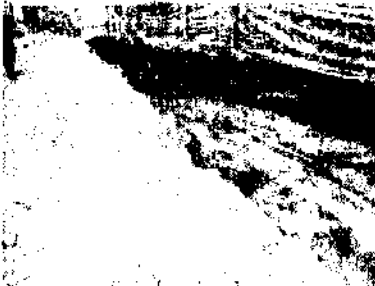

➤ Instalación de tubería 6" para red domiciliaria



➤ Excavación de cajón superior entre pozo 8 a pozo 9





INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04
CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

SEMANA 4 (27-30 Septiembre)

- Excavación para red domiciliaria




- Lleno en recebo compactado con saltarín para red central



- Excavación de cajón superior entre pozo 8-9 para red central



- Instalación de tuberías para redes domiciliarias

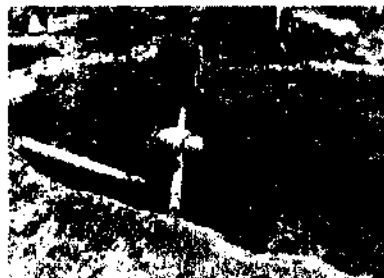



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

- Excavación para cajas de inspección



- Fundida de cajas de inspección



- Corte y demolición de placa en concreto



Nota: Hasta la fecha continúan actividades de excavación para cajas de inspección, se interviene la sección entre posos PE2-PE3 con excavación mecánica, Continúan actividades de compactación de recho para zanja principal, Se recomienda al contratista para las actividades posteriores el aumento del personal para la aceleración de los procesos constructivos, disponer de las herramientas, materiales y equipos de trabajo necesarios para un buen desarrollo de las actividades, a su vez la organización y el cumplimiento de las acciones establecidas en el cronograma, Rigurosidad en el manejo y aplicación de entibado en el área a intervenir, disponer de un espacio en horas laborales para la limpieza y organización del área de trabajo, ajustar metodología de trabajo para evitar posibles alteraciones e incumplimientos con las actividades a ejecutar.






INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021.


CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

| CALLE/TRAMO | ESTADO INICIAL |
|---|--|
| CARRERA 8A ENTRE CALLE 138 Y 141 BARIO CEIBA NORTE | VIA SIN ESTRUCTURA. TRAMO EN TUBERIA DE 10" |
| LOCALIZACIÓN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR |
|  | <ul style="list-style-type: none">➤ Zanja para tubería de 8" Y 12" con anchos de 0,60 m y 0,70m➤ Zanja para tubería de 6" de 0,50m respectivamente.➤ Instalación de silla Yee para red domiciliaria.➤ Construcción de cajas de inspección para cada vivienda.➤ Llenos en recebo compactado hasta rasante de vía.➤ Excavaciones para cajas de inspección 0,80m x 0,80m |
| REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL | |
|  | |

| | | |
|---|--|--|
|  | <p align="center">INFORME DE INTERVENTORIA No. 04</p> <p align="center">CONTRATO No. 063 DE 2021</p> | <p align="center">CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p align="center">FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021</p> |
|---|--|--|

| DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 01 DE SEPTIEMBRE 30 SEPTIEMBRE |
|---|
| <u>SEMANA 1 (18 Septiembre)</u> |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Realización actas de vecindad y socialización del proyecto a la comunidad. |
| <u>SEMANA 3 (20-25 Septiembre)</u> |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Investigación Levantamiento topográfico del sector ➤ Continuas actividades de actas de vecindad y socialización del proyecto ➤ Excavación para guaduas de cerramiento ➤ Instalación de poli sombra ➤ Cimbrado de eje para excavación entre pozos ➤ Excavación mecánica con retroexcavadora para red principal ➤ Limpieza de zanja principal ➤ Instalación de lecho en grava ➤ Instalación de tubería de 12" |
| <u>SEMANA 4 (27-30 Septiembre)</u> |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Instalación de tubería de 12" ➤ Atraque de tubería de 12" ➤ Retiro de material proveniente de la excavación ➤ Apiques para cajas de inspección ➤ Demolición de placa para cajas de inspección ➤ Lleno y compactación en recebo para zanja principal ➤ Limpieza de material proveniente de la excavación con retro excavadora. |

| REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 01 DE SEPTIEMBRE - 30 SEPTIEMBRE |
|---|
| <u>SEMANA 1 (18 Septiembre)</u> |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Realización actas de vecindad y socialización del proyecto a la comunidad |
| <u>SEMANA 3 (20-25 Septiembre)</u> |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cimbrado de eje para excavación entre pozos |
|  |



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

- Excavación mecánica con retroexcavadora para red principal.



- Limpieza de zanja principal




- Instalación de lecho en grava - instalación de tubería de 12"



SEMANA 4 (27-30 Septiembre)

- Instalación de tubería de 12"





INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

- Atraque de tubería de 12" - Retiro de material proveniente de la excavación



- Apiques para cajas de inspección - Demolición de placa para cajas de inspección



- Lleno y compactación en recebo para zanja principal.
- Limpieza de material proveniente de la excavación con retro excavadora



| | | |
|---|--|---|
|  | INFORME DE INTERVENTORIA No. 04 | CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL |
| | CONTRATO No. 063 DE 2021 | FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021 |

2.6.3. Seguimiento a garantías contractuales


| CONTRATO DE OBRA NO. 062 DE 2021 | | | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| No. | Aseguradora | Amparo | Vigencia | Observaciones |
| I-100004725 | SEGUROS MUNDIAL | CUMPLIMIENTO | 05/05/2021 06/05/2022 | |
| I-100004725 | SEGUROS MUNDIAL | SALARIOS Y PRESTACIONES | 06/05/2021 02/11/2024 | |
| I-100004725 | SEGUROS MUNDIAL | CALIDAD DEL SERVICIO | 06/05/2021 02/11/2022 | |
| I-100004725 | SEGUROS MUNDIAL | ESTABILIDAD | 02/11/2021 02/11/2026 | |
| I-100001180 | SEGUROS MUNDIAL | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC. | 06/05/2021 02/11/2022 | |

2.6.4. Avance Físico

A la fecha del presente informe se evidencia el siguiente avance

| CUADRO COMPARATIVO DE ACTIVIDADES | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|
| MESES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PROGRAMADO | 15% | 15% | 20% | 20% | 15% | 15% |
| EJECUTADO | 7.02% | 13% | 8% | 9% | | |
| EJECUTADO ACUMULADO | 7.02% | 20.02% | 28% | 37% | | |

AVANCE DISTRITO 7

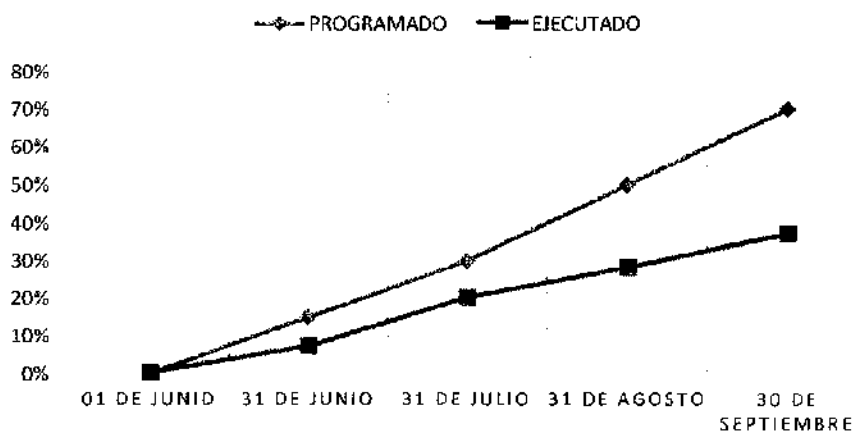

| | | |
|---|--|---|
|  | INFORME DE INTERVENTORIA No. 04 | CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL |
| | CONTRATO No. 063 DE 2021 | FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021 |

2.6.5. Avance Financiero

De acuerdo a las actividades realizadas durante el presente periodo el contratista a ejecutado un valor de \$ 1.460.738.004,61 equivalente al 37% del valor del contrato de \$3.947.940.553.

2.6.6. Balance del Contrato

| | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------|
| VALOR CONTRATADO | \$3.947.940.553,00 | |
| VALOR EJECUTADO | | \$ 1.460.738.004,61 |
| VALOR POR EJECUTAR | | \$ 2.487.202.548,39 |
| SUMAS IGUALES | \$3.947.940.553,00 | \$3.947.940.553,00 |

PORCENTAJE DE EJECUCION



■ VALOR SIN EJECUTAR ■ VALOR EJECUTADO

2.6.7. Gestión de las comunicaciones

CORRESPONDENCIA DEL DISTRITO

2.6.8. Información relacionada con los ensayos de Laboratorio.

No se realizaron ensayos de laboratorio durante este periodo.


| | | |
|---|--|--|
|  | <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORIA No. 04</p> <p style="text-align: center;">CONTRATO No. 063 DE 2021</p> | <p style="text-align: center;">CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p style="text-align: center;">FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021</p> |
|---|--|--|

2.6.9. Dificultades en la ejecución de los proyectos

| Inconveniente | Solución | Proceso % Avance a fecha de corte de este informe |
|---|---|---|
| <p>Carencia de información exacta sobre el trazado de redes existentes de servicios públicos en la zona de intervención. Se ocasionan daños a redes de acueducto o gas por no tener la información exacta de su paso por el subsuelo. Las reparaciones de dichos daños ocasionan sobrecostos, demoras, cortes del servicio y perjuicio a la imagen de la E.S.P.</p> | <p>Solicitar herramientas para mejorar la calidad de la información sobre el catastro de redes hidrosanitarias en el área de influencia</p> | <p>Se han realizado apiques sin éxito para tratar de encontrar línea de acueducto. Se ha solicitado apoyo a IBAL SA ESP OFICIAL en cuanto al uso de equipos especializados como el geófono, sin embargo, dicho equipo no se encuentra en servicio por el momento. De igual manera se ha logrado la localización de redes existentes por exploración o conocimiento de funcionarios de la empresa contratante.</p> |

| | | |
|---|--|---|
|  | INFORME DE INTERVENTORIA No. 04 | CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL |
| | CONTRATO No. 063 DE 2021 | FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021 |

2.7. DISTRITO HIDRÁULICO No. 9 y 10 CONTRATO DE OBRA No. 093 DEL 29 DE JULIO DE 2021

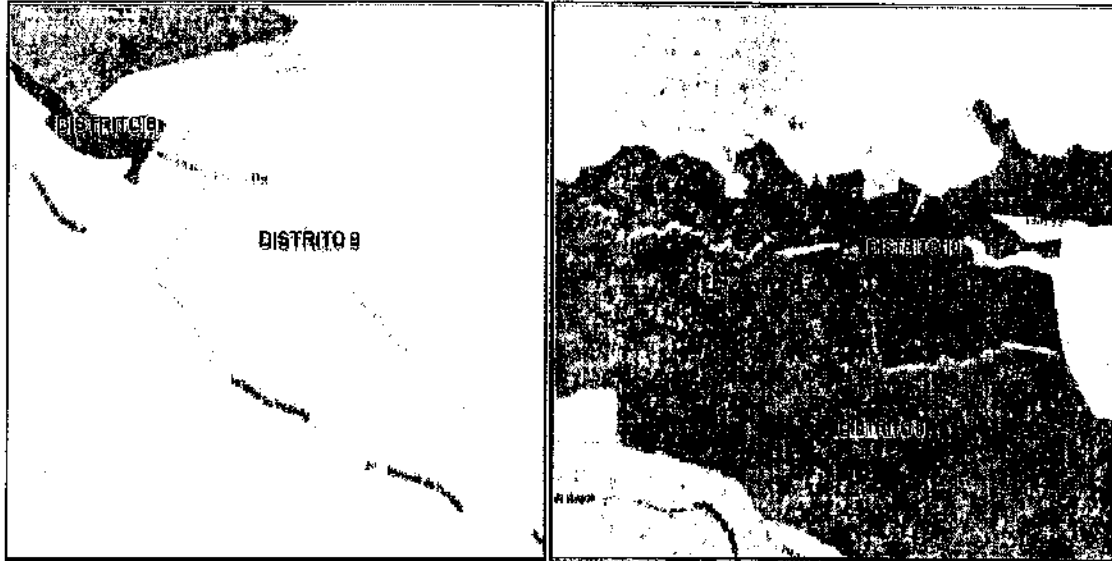

2.7.1. Información general del contrato.

| | |
|-----------------------------|---|
| CONTRATO No | 093 |
| FECHA | 29 DE JUNIO DE 2021 |
| CONTRATISTA | UNION TEMPORAL JPO 19 R.L. PIEDAD PINZON CORTES |
| CLASE | OBRA |
| VALOR | SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUARENTA PESOS (\$673.982.040) MCTE |
| PLAZO | CIENTO OCHENTA (180) DIAS |
| FECHA DE INICIO | 12 DE JULIO DE 2021 |
| FECHA DE TERMINACION | 08 DE ENERO DE 2022 |
| OBJETO | REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 9 Y 10 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE. |

| | | |
|---|--|--|
|  | <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORIA No. 04</p> <p style="text-align: center;">CONTRATO No. 063 DE 2021</p> | <p style="text-align: center;">CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p style="text-align: center;">FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021</p> |
|---|--|--|



2.7.2. Estado inicial de los tramos intervenidos en el presente mes.

| SE REALIZA LA DESCRIPCION GENERAL DE CADA CONTRATO EN EJECUCION |
|--|
| <p style="text-align: center;"><u>SECTOR CALLE 144 ENTRE CARRERAS 15 I SUR Y 15 F SUR BARRIO LAS AMERICAS</u></p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Revestimiento en concreto de 3000 psi para protección de tuberías entre el tramo P 1 – P 2 red central y domiciliarias. ➤ Excavación manual para las redes domiciliarias ➤ Retiro de material sobrante de las excavaciones manuales y demoliciones. ➤ Manejo de aguas. ➤ Corte con cortadora en pavimento flexible para construcción de redes domiciliarias. ➤ Demolición de concreto rígido para construcción de cajas y parte de las redes domiciliarias ➤ Corte con cortadora en concreto rígido (andenes) para construcción de cajas y parte de las redes domiciliarias. ➤ Rotura de pavimento asfáltico para construcción de redes domiciliarias. ➤ Suministro e Instalación de tubería plástica de diámetro 6" para las redes domiciliarias e instalación de sillas yee de 8" x 6". ➤ Construcción de lecho en grava para tubería Domiciliarias. ➤ Relleno con recebo compactado medio mecánico. ➤ Construcción de cajas domiciliarias de inspección. ➤ Reposición andenes en concreto (sitio de cajas y redes) ➤ Se concluyen todas las actividades del presente tramo. |
| <p style="text-align: center;"><u>SECTOR COMPRENDIDO EN LA CALLE 144 ENTRE CARRERAS 15 I SUR Y 15 F SUR</u></p> |
| <p style="text-align: center;"><u>BARRIO LAS AMERICAS.</u></p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Se termina el corte con cortadora en concreto asfáltico para las redes domiciliarias tramos PE 3A – PE 2A, PE 2A – PE 1A. ➤ Terminan la rotura de concreto asfáltico para las redes domiciliarias PE 3A – PE 2A, PE 2A – PE 1A. ➤ Corte con cortadora en concreto rígido (andenes) para construcción de cajas faltantes y el resto de las redes domiciliarias. ➤ Terminan la demolición de concreto rígido para construcción de cajas faltantes y el resto de las redes domiciliarias. ➤ Concluyen la excavación manual para las redes domiciliarias PE 3A – PE 2A, PE 2A – PE 1A. ➤ Terminan la instalación de tubería plástica de 6" para redes domiciliarias PE 3A – PE 2A, PE 2A – PE 1A. ➤ Extienden el lecho en grava para redes domiciliarias PE 3A – PE 2A, PE 2A – PE 1A. ➤ Se realiza el retiro del material sobrante de toda la zona intervenida tanto de la excavación como de las demoliciones. ➤ Suministro e Instalación de tubería plástica de diámetro 6" para las redes domiciliarias. ➤ Revestimiento en concreto de 3000 psi para protección de tuberías red domiciliarias entre el tramo PE 2A – PE 1A. ➤ Terminan la conformación de rellenos con recebo medio mecánico cada 0,15m para las redes domiciliarias de los tramos. ➤ Construcción de cajas domiciliarias de inspección. |



INFORME DE INTERVENTORIA No. 04
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Reposición andenes en concreto (sitio de cajas y redes) ➤ Se concluyen todas las actividades del presente tramo. (sitio de cajas y redes). | |
| CALLE/TRAMO | estado inicial |
| calle 144 entre carreras 15 i sur y 15 f sur barrio las Américas | Vía pavimentada en concreto asfaltico en mal estado. Tramo en tubería de 8" en concreto en avanzado estado de deterioro. |
| LOCALIZACIÓN | características técnicas de las obras a ejecutar |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Demolición de concreto rígido para construcción de cajas y parte de las redes domiciliarias. ➤ Rotura de concreto asfaltico para las redes domiciliarias ➤ Corte con cortadora en concreto rígido (andenes) para construcción de cajas y parte de las redes domiciliarias. ➤ Corte con cortadora en concreto asfaltico para las redes domiciliarias de intervenidos. ➤ Excavación manual para las redes domiciliarias ➤ Instalación de tubería plástica de 6" para redes domiciliarias tramos intervenidos. ➤ Construcción de lecho en grava para redes domiciliarias. ➤ Revestimiento en concreto de 3000 psi para protección de tuberías redes domiciliarias entre el tramo PE 2A – PE 1A ➤ Conformación de rellenos con recebo medio mecánico cada 0,15m para las redes domiciliarias de los dos tramos. ➤ Retiro de todo el material sobrante tanto de la excavación como de las demoliciones de las redes domiciliarias de los dos tramos. ➤ Suministro e Instalación de tubería plástica de diámetro 6" para las redes domiciliarias. ➤ Construcción de cajas domiciliarias. ➤ Reposición andenes en concreto (sitio de cajas y redes) ➤ Realizan limpieza y retiro de basuras de la zona intervenida. |
| REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL | |
|  | |

| | | |
|---|--|---|
|  <p>IBAL SA ESP OFICIAL</p> | <p>INFORME DE INTERVENTORIA No. 04</p> <p>CONTRATO No. 063 DE 2021</p> | <p>CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p>FECHA INFORME: 30/09/2021</p> <p>PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021</p> |
|---|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>➤ Se concluyen todas las actividades del presente tramo.</p> |
| <p>DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Se termina el corte con cortadora en concreto asfáltico para las redes domiciliarias tramos PE 3A – PE 2A, PE 2A – PE 1A. ➤ Terminan la rotura de concreto asfáltico para las redes domiciliarias PE 3A – PE 2A, PE 2A – PE 1A. ➤ Corte con cortadora en concreto rígido (andenes) para construcción de cajas faltantes y el resto de las redes domiciliarias. ➤ Terminan la demolición de concreto rígido para construcción de cajas faltantes y el resto de las redes domiciliarias. ➤ Concluyen la excavación manual para las redes domiciliarias PE 3A – PE 2A, PE 2A – PE 1A. ➤ Terminan la instalación de tubería plástica de 6" para redes domiciliarias PE 3A – PE 2A, PE 2A – PE 1A. ➤ Extienden el lecho en grava para redes domiciliarias PE 3A – PE 2A, PE 2A – PE 1A. ➤ Se realiza el retiro del material sobrante de toda la zona intervenida tanto de la excavación como de las demoliciones. ➤ Suministro e Instalación de tubería plástica de diámetro 6" para las redes domiciliarias. ➤ Revestimiento en concreto de 3000 psi para protección de tuberías red domiciliarias entre el tramo PE 2A – PE 1A. ➤ Terminan la conformación de rellenos con recebo medio mecánico cada 0,15m para las redes domiciliarias de los tramos. ➤ Construcción de cajas domiciliarias de inspección. ➤ Reposición andenes en concreto (sitio de cajas y redes) ➤ Realizan limpieza y retiro de basuras de la zona intervenida. | |
| <p>NOTA: Queda pendiente el suministro de instalación de Dos aros tapa completa vibro compactada (Pozos PE 1A, PE 2A)</p> | |



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

**REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE
SEPTIEMBRE**





**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04**

**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**

FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

| REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CALLE 144 ENTRE CARRERAS 15 I SUR Y 15 F SUR BARRIO LAS AMERICAS, DEL MUNICIPIO DE IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | | | | | |
|---|---|---------|----------|---------------|-------------------------|
| ITEM | ACTIVIDADES | UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR./PARCIAL |
| 1,0 | PRELIMINARES | | | | |
| 1,1 | Localización y replanteo Topografico | ml | 129,83 | \$ 5.106,00 | \$ 662.911,98 |
| 1,8 | Cargue y Retiro de sobrantes hasta 8 Kms a Maquina | m3/comp | 194,26 | \$ 26.251,00 | \$ 5.099.519,26 |
| 1,11 | Suministro de Recebo en zanja compactado c/ 15 Cms. Medio mecánico | m3/comp | 146,67 | \$ 68.652,00 | \$ 10.069.188,84 |
| 1,12 | Acarreo interno en obra 50 mts | m3 | 0,00 | \$ 16.231,00 | \$ - |
| 3,0 | EXCAVACIONES A MANO | | | | |
| | De 0 a 2 mts en Seco | | | | |
| 3,1 | Excavaciones en material común | m3 | 77,22 | \$ 31.090,00 | \$ 2.400.750,46 |
| 4,0 | EXCAVACIONES A MAQUINA | | | | |
| | De 0 a 2 mts en Seco | | | | |
| 4,1 | Excavaciones en material común y Conglomerado | m3 | 102,40 | \$ 24.104,00 | \$ 2.468.261,32 |
| 6,14 | ROTURA PAVIMENTO FLEXIBLE | m2 | 103,62 | \$ 20.937,00 | \$ 2.169.491,94 |
| 6,19 | Corte de Pavimento Flexible con Cortadora | ml | 345,40 | \$ 15.649,00 | \$ 5.405.164,60 |
| 15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA Norma Técnica Colombiana 3722-1 y Norma Técnica Colombiana 4764 (100% de Ermeticidad) | | | | |
| 15,1 | De 0,00 a 2.00 Mts | | | | |
| 15,1,1 | De Diametro 6" | ml | 93,05 | \$ 57.032,00 | \$ 5.306.827,60 |
| 15,1,3 | De Diametro 8" | ml | 127,43 | \$ 80.152,00 | \$ 10.213.769,36 |
| 19,1,8 | Caja de inspeccion 60 x 60 x 100 cmts en ladrillo, concreto de 2500 psi y tapa reforzada en concreto de 3000 psi. | und | 0,00 | \$ 393.561,00 | \$ - |
| 20 | OTROS | | | | |
| 20,1 | SEÑALIZACION EN GUADUA C/3 Mts Y POLISOMBRA DE h=2 Mts | ml | 275,66 | \$ 16.875,00 | \$ 4.651.762,50 |
| 20,51 | Cerramiento en malla de polietileno naranja h=1,0m, con señalizador tubular de 1.30m. Con 3 cintas | m | 0,00 | \$ 51.230,00 | \$ - |
| 20,52 | Señales provisional móvil para obra tipo tripode incluye tablero | und | 4,00 | \$ 282.037,00 | \$ 1.128.148,00 |
| 20,5 | Suministro e Instalacion Lecho en Grava para Cama de Tuberia D= 1/2 a 3/4 | m3 | 15,97 | \$ 122.311,00 | \$ 1.953.061,22 |
| 20,7 | Suministro e Instalacion de Kit Silla Yee 8"X 6" PVC Incluye Agarraderas Caucho y Adherencia | und | 20,00 | \$ 186.273,00 | \$ 3.725.460,00 |
| 20,53 | Suministro de maletines para cerramiento (2m X 1m x 0.50m) con cinta reflectiva grado ingenieria incluye tapa de llenado y tapon de drenaje. 30kg | und | 0,00 | \$ 424.345,00 | \$ - |
| 20,54 | Suministro de valla informativa de piso según diseño IBAL | und | 1,00 | \$ 467.917,00 | \$ 467.917,00 |
| 20,43 | Manejo de Aguas Con Diametros de 8" a 12" | gib | 1,00 | \$ 674.894,00 | \$ 674.894,00 |
| | ITEMS NO CONTRATADOS | | | | |
| 6,20 | CDRTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADRA | ml | 115,98 | \$ 18.246,00 | \$ 2.116.171,08 |
| 6,22 | ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO | m2 | 29,74 | \$ 22.815,00 | \$ 678.449,66 |
| | Suministro e instalacion de entibado en madera apuntalado | m2 | 110,04 | \$ 25.497,00 | \$ 2.805.689,88 |
| 5,13 | ANDEN EN CONCRETO DE 2500 PSI ESP 0,10, INCLUYE ALISTADO Y NIVELACION | m2 | 29,55 | \$ 78.522,00 | \$ 2.320.325,10 |
| | SUMINISTRO DE INSTALACION DE CODOS ALCANTARILLADO TDP 45" , 6" | und | 12,00 | \$ 85.618,00 | \$ 1.027.416,00 |
| | Caja de inspeccion 60x60x100 Cmts concreto de 3000 PSI y tapa reforzada en concreto de 3000 PSI | und | 20,00 | \$ 514.902,00 | \$ 10.298.040,00 |
| | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARO TAPA COMPLETA VIBROCOMPACTADA | und | 2,00 | \$ 766.261,00 | \$ 1.532.522,00 |
| 5,5 | Concreto de 20,7 Mpa (3.000 PSI) | m3 | 13,98 | \$ 666.154,00 | \$ 9.312.832,92 |
| | TOTAL CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES | | | | \$ 86.485.270,13 |

Dirección: Centro Comercial Arroyuelos, Local 6, Ibagué, Tolima.

Teléfono: 300 556 1508 - Correo electrónico: interventoriaexterna2021@gmail.com



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL


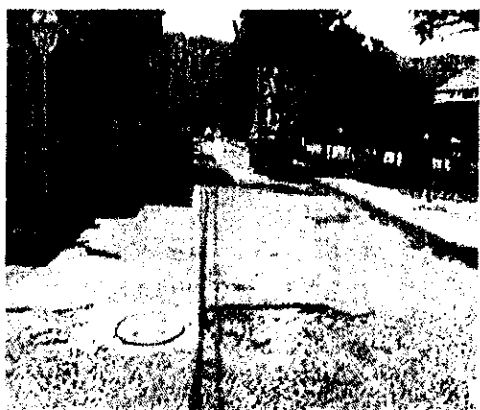
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

SE REALIZA LA DESCRIPCIÓN GENERAL DE CADA CONTRATO EN EJECUCIÓN

SECTOR CALLE 144 ENTRE CARRERAS 15 F SUR Y 15 C SUR BARRIO LAS AMERICAS

- Corte del área a intervenir en la carpeta asfáltica con cortadora para las redes domiciliarias entre los tramos PE 5A – PE 4A, PE 4A – PE 3A
- Rotura de la carpeta asfáltica para las redes domiciliarias entre los tramos PE 5A – PE 4A, PE 4A – PE 3A.
- Excavación manual redes domiciliarias entre los tramos comprendidos entre el PE 5A – PE 4A PE 4A – PE 3A.
- Instalación de entibado de madera entre los tramos PE 5A – PE 4A, (8 veces) y para el tramo PE 4A – PE 3A, (10 veces)
- Excavación manual para lecho redes domiciliarias y cajas domiciliarias.
- Manejo de aguas.
- Suministro e Instalación de tubería plástica de diámetro 6" para la red domiciliaria entre los tramos PE 5A – PE 4A, PE 4A – PE 3A.
- Construcción de lecho en grava para tubería.
- Relleno con recebo compactado medio mecánico tramos PE 5A – PE 4A, PE 4A – PE 3A hasta llegar a la rasante. Esta actividad se repitió para las redes domiciliarias.
- Revestimiento en concreto de 3000 psi para protección de tuberías de la red domiciliaria entre el tramo PE 5A – PE 4A que contemplan las abscisas 000.90 y 026.00.
- Corte en concreto rígido con cortadora en los andenes para la construcción de las cajas domiciliarias.
- Rotura de concreto rígido para construcción de cajas domiciliarias.
- Retiro de material sobrante de las excavaciones y demoliciones.
- Construcción de cajas domiciliarias de 60 x 60 en concreto de 3000 psi.
- Reposición de andenes en concreto de 2500 psi

| | | |
|--|---|--|
|  IBAL <small>SA ESP OFICIAL</small> | INFORME DE INTERVENTORIA No. 04 CONTRATO No. 063 DE 2021 | CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021 |
|--|---|--|

| Calle/Tramo | Estado Inicial |
|---|---|
| CALLE 144 ENTRE CARRERAS 15 F SUR Y 15 C SUR BARRIO LAS AMÉRICAS | VÍA PAVIMENTADA EN CONCRETO ASFALTICO EN MAL ESTADO. TRAMO EN TUBERÍA DE 8" EN CONCRETO EN AVANZADO ESTADO DE DETERIORO. |
| LOCALIZACIÓN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Corte del área a intervenir en la carpeta asfáltica con cortadora para las redes domiciliarias entre los tramos PE 5A – PE 4A, PE 4A – PE 3A ➤ Rotura de la carpeta asfáltica para las redes domiciliarias entre los tramos PE 5A – PE 4A, PE 4A – PE 3A. ➤ Excavación manual redes domiciliarias entre los tramos comprendidos entre el PE 5A – PE 4A PE 4A – PE 3A. ➤ Instalación de entibado de madera entre los tramos PE 5A – PE 4A, (8 veces) y para el tramo PE 4A – PE 3A, (10 veces) ➤ Excavación manual para lecho redes domiciliarias y cajas domiciliarias. ➤ Manejo de aguas. ➤ Suministro e Instalación de tubería plástica de diámetro 6" para la red domiciliaria entre los tramos PE 5A – PE 4A, PE 4A – PE 3A. ➤ Construcción de lecho en grava para tubería. ➤ Relleno con recebo compactado medio mecánico tramos PE 5A – PE 4A, PE 4A – PE 3A hasta llegar a la rasante. Esta actividad se repitió para las redes domiciliarias. ➤ Revestimiento en concreto de 3000 psi para protección de tuberías de la red domiciliaria entre el tramo PE 5A – PE 4A que contemplan las abscisas 000.90 y 026.00. ➤ Corte en concreto rígido con cortadora en los andenes para la construcción de las cajas domiciliarias. |
| REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL | |
|  | |



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

- Rotura de concreto rígido para construcción de cajas domiciliarias.
- Retiro de material sobrante de las excavaciones y demoliciones.
- Construcción de cajas domiciliarias de 60 x 60 en concreto de 3000 psi.
- Reposición de andenes en concreto de 2500 psi
- Limpieza general de la zona intervenida

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

- Se realiza corte del área a intervenir con cortadora en la carpeta asfáltica para las redes domiciliarias entre los tramos PE 5A – PE 4A, PE 4A – PE 3A.
- Se ejecuta la rotura de la carpeta asfáltica para redes domiciliarias entre los tramos PE 5A – PE 4A, PE 4A – PE 3A.
- Se continua con la construcción e instalación de entibado de madera entre los tramos PE 5A – PE 4A, PE 4A – PE 3A; ya que superan la altura permitida para laborar en zanjas sin este mecanismo.
- Excavación manual para lecho en grava, red domiciliaria, cajas domiciliarias entre los tramos PE 5A – PE 4A, PE 4A – PE 3A, se ejecuta el retiro de material sobrante de las excavaciones y demoliciones de las actividades realizadas en las redes domiciliarias entre los tramos PE 5A – PE 4A, PE 4A – PE 3A.
- Se hace el manejo de aguas con motobomba eléctrica (sumergible) diámetro de 2".
- Suministro e instalación de tubería plástica o lisa NTC 3722 -1 de diámetro 6" para la red domiciliaria entre los tramos PE 5A – PE 4A, PE 4A – PE 3A.
- Construcción de lecho en grava de ¾" para las tuberías de las redes domiciliarias, se realiza relleno con recebo compactado c/ 0,15 medio mecánico tramos PE 5A – PE 4A, PE 4A – PE 3A hasta llegar a la rasante incluyendo las redes domiciliarias.
- Se encofra en concreto de 3000 psi para protección de tuberías de las redes domiciliarias entre el tramo PE 5A – PE 4A Entre las abscisas 000.90 y 026.00, ya que no cumplen con la norma RAS (profundidad mínima a cota clave en vía vehicular 1.20mts).
- Corte en concreto rígido con cortadora en los andenes para la construcción de las cajas domiciliarias.
- Rotura de concreto rígido para construcción de cajas domiciliarias.
- Retiro de material sobrante de las excavaciones y demoliciones.
- Construcción de cajas domiciliarias de 60 x 60 en concreto de 3000 psi.
- Reposición de andenes en concreto de 2500 psi
- Limpieza general de la zona intervenida.

NOTA: Queda pendiente el suministro de instalación de Un aro tapa completa vibro compactada (Pozos PE 4A).




**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04**

**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021**

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

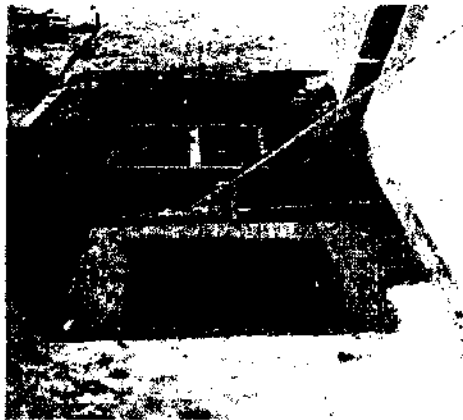



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021





**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04**
**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

| REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CALLE 144 ENTRE CARRERAS 15 F SUR Y 15 C SUR BARRIO LAS AMERICAS, DEL MUNICIPIO DE IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | | | | | |
|---|---|---------|----------|---------------|-------------------------|
| ITEM | ACTIVIDADES | UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR./PARCIAL |
| 1,0 | PRELIMINARES | | | | |
| 1,1 | Localización y replanteo Topografico | ml | 135,44 | \$ 5.106,00 | \$ 691.556,64 |
| 1,8 | Cargue y Retiro de sobrantes hasta 8 Kms a Maquina | m3/comp | 211,37 | \$ 26.251,00 | \$ 5.548.673,87 |
| 1,11 | Suministro de Recebo en zanja compactado c/ 15 Cms. Medio mecánico | m3/comp | 168,13 | \$ 68.652,00 | \$ 11.542.460,76 |
| 1,12 | Acarreo interno en obra 50 mts | m3 | 0,00 | \$ 16.231,00 | \$ - |
| 3,0 | EXCAVACIONES A MANO | | | | |
| | De 0 a 2 mts en Seco | | | | |
| 3,1 | Excavaciones en material común | m3 | 84,32 | \$ 31.090,00 | \$ 2.621.508,80 |
| 4,0 | EXCAVACIONES A MAQUINA | | | | |
| | De 0 a 2 mts en Seco | | | | |
| 4,1 | Excavaciones en material común y Conglomerado | m3 | 113,85 | \$ 24.104,00 | \$ 2.744.299,16 |
| 6,19 | Corte de Pavimento Flexible con Cortadora | ml | 367,28 | \$ 15.649,00 | \$ 5.747.564,72 |
| 15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA Norma Técnica Colombiana 3722-1 y Norma Técnica Colombiana 4764 (100% de Ermeticidad) | | | | |
| 15,1 | De 0,00 a 2.00 Mts | | | | |
| 15,1,1 | De Diametro 6" | ml | 80,73 | \$ 57.032,00 | \$ 4.604.193,36 |
| 15,1,2 | De Diametro 8" | ml | 133,04 | \$ 80.152,00 | \$ 10.663.422,08 |
| 20 | OTROS | | | | |
| 20,1 | SEÑALIZACION EN GUADUA C/3 Mts Y POLISOMBRA DE h=2 Mts | ml | 290,88 | \$ 16.875,00 | \$ 4.908.600,00 |
| 20,51 | Cerramiento en malla de polietileno naranja h=1,0m, con señalizador tubular de 1.30m. Con 3 cintas | m | 0,00 | \$ 51.230,00 | \$ - |
| 20,52 | Señales provisional movil para obra tipo tripode incluye tablero | und | 6,00 | \$ 282.037,00 | \$ 1.692.222,00 |
| 20,5 | Suministro e Instalacion Lecho en Grava para Cama de Tuberia D= 1/2 a 3/4 | m3 | 12,33 | \$ 122.311,00 | \$ 1.508.094,63 |
| 20,6 | Suministro e Instalacion de Kit Silla Yee 8"X 6" PVC Incluye Agarraderas Caucho y Adherencia | und | 20,00 | \$ 186.273,00 | \$ 3.725.460,00 |
| 20,53 | Suministro de maletines para cerramiento (2m X 1m x 0.50m) con cinta reflectiva grado ingeniería incluye tapa de llenado y tapon de drenaje. 30kg | und | 0,00 | \$ 424.345,00 | \$ - |
| 20,54 | Suministro de valla informativa de piso según diseño IBAL | und | 1,00 | \$ 467.917,00 | \$ 467.917,00 |
| 20,43 | Manejo de Aguas Con Diametros de 8" a 12" | glb | 1,00 | \$ 674.894,00 | \$ 674.894,00 |
| | ITEMS NO CONTRATADOS | | | | |
| 6,20 | CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA | ml | 96,10 | \$ 18.246,00 | \$ 1.753.440,60 |
| 6,14 | ROTURA PAVIMENTO FLEXIBLE esp= 0,10 | m2 | 110,50 | \$ 20.937,00 | \$ 2.313.632,72 |
| 6,13 | ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO EP5= 0,10 | m2 | 23,58 | \$ 22.815,00 | \$ 537.977,70 |
| 5,13 | ANDEN EN CONCRETO DE 2500 PSI ESP 0,10, INCLUYE ALISTADO Y NIVELACION | m2 | 23,56 | \$ 78.522,00 | \$ 1.849.978,32 |
| 5,5 | Concreto de 20,7 Mpa (3.000 PSI) | m3 | 7,07 | \$ 666.154,00 | \$ 4.712.452,58 |
| NP3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO ALCANTARILLADO TDP 45°, 6" | UND | 1,00 | \$ 85.618,00 | \$ 85.618,00 |
| NP4 | Caja de inspeccion 60x60x100 Cmts en , concreto de 3000 PSI y tapa reforzada en concreto de 3000 PSI | UND | 20,00 | \$ 514.902,00 | \$ 10.298.040,00 |
| NP1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTIBADO EN MADERA APUNTALADO | M2 | 348,19 | \$ 25.497,00 | \$ 8.877.851,42 |
| 19.1.6 | suministro e instalacion de aro tapa completa vibrocompactada | UND | 1,00 | \$ 766.261,00 | \$ 766.261,00 |
| | TOTAL CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES | | | | \$ 88.338.134,00 |


Dirección: Centro Comercial Arroyuelos, Local 6, Ibagué, Tolima.
Teléfono: 300 556 1508 - Correo electrónico: interventoriaexterna2021@gmail.com




INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021
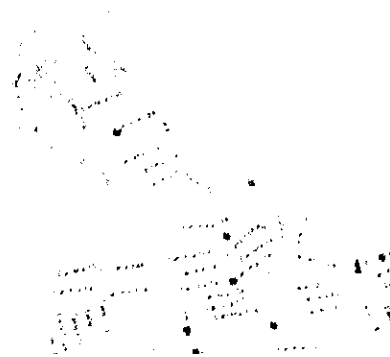
| CALLE/TRAMO | ESTADO INICIAL |
|--|--|
| SECTOR CARRERA 16 SUR ENTRE CALLES 143A Y 145 BARRIO LOS TUNJOS | VIA PAVIMENTADA EN CONCRETO ASFALTICO EN MAL ESTADO. TRAMO EN TUBERIA DE 8" EN CONCRETO EN AVANZADO ESTADO DE DETERIORO . |
| LOCALIZACIÓN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR |
|  | <ul style="list-style-type: none">➤ Se terminan todas las actividades entre los tramos PE 1 – PE 2, PE 3 – PE 4 para las redes domiciliarias tales como: corte de la carpeta asfáltica con pulidora, rotura de la carpeta asfáltica, demolición concreto rígido para cajas domiciliarias a construir, excavaciones manuales para y cajas, retiro de material sobrante de las excavaciones y demoliciones, manejo de aguas, suministro e instalación de tubería plástica de diámetro 6" para redes domiciliarias del tramo PE 3 – PE 4.➤ Construcción de lecho en grava para tubería para redes domiciliarias tramo PE 3 – PE 4, relleno con recebo compactado medio mecánico hasta la rasante de la vía incluyendo las redes domiciliarias, construcción de cajas domiciliarias,➤ reposición faltante de andenes en concreto de 2500 psi en los sitios intervenidos para la construcción de cajas domiciliarias y redes.➤ Limpieza general de la zona intervenida.➤ NOTA: Obra totalmente terminada |

| | | |
|--|--|---|
|  <p>IBAL SA ESP. OFICIAL</p> | <p>INFORME DE INTERVENTORIA No. 04</p> <p>CONTRATO No. 063 DE 2021</p> | <p>CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p>FECHA INFORME: 30/09/2021</p> <p>PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021</p> |
|--|--|---|

| |
|--|
| <p>DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Se terminan todas las actividades concernientes a las redes domiciliarias tales como: ➤ Rotura de pavimento asfáltico, demolición de concreto rígido para construcción de cajas, construcción de cajas domiciliarias, excavación manual para las redes domiciliarias y lecho en grava de las mismas, retiro de sobrantes, construcción de lecho en grava para redes domiciliarias, instalación tubería plástica para domiciliarias diámetro de 6", relleno con recebo compactado medio mecánico c/ 0.15 hasta la rasante de la vía incluyendo las redes domiciliarias. ➤ Retiro de todo el material sobrante resultante de las de la excavación como de las demoliciones de las redes domiciliarias, construcción de cajas domiciliarias faltantes, reposición andenes en concreto (sitio de cajas y redes) ➤ NOTA: Obra totalmente terminada. |

| | |
|--|--|
| <p>REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE</p> | |
|  |  |
|  |  |






**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04
CONTRATO No. 063 DE
2021**


**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021**

| REPOSICION REO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CARRERA 16 SUR ENTRE CALLES 143A Y 145 BARRIO LOS TUÑOS, DEL MUNICIPIO DE IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | | | | | |
|--|---|---------|----------|---------------|--------------------------|
| ITEM | ACTIVIDADES | UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR./PARCIAL |
| 1,0 | PRELIMINARES | | | | |
| 1,1 | Localización y replanteo Topografico | ml | 151,80 | \$ 5.106,00 | \$ 775.090,80 |
| 1,8 | Cargue y Retiro de sobrantes hasta 8 Kms a Maquina | m3/comp | 341,27 | \$ 26.251,00 | \$ 8.958.678,77 |
| 1,11 | Suministro de Recebo en zanja compactado c/ 15 Cms. Medio mecánico | m3/comp | 325,09 | \$ 68.652,00 | \$ 22.318.078,68 |
| 1,12 | Acarreo interno en obra 50 mts | m3 | 0,00 | \$ 16.231,00 | \$ - |
| 3,0 | EXCAVACIONES A MANO | | | | |
| | De 0 a 2 mts en Seco | | | | |
| 3,1 | Excavaciones en material común | m3 | 50,93 | \$ 31.090,00 | \$ 1.583.364,89 |
| 3,2 | Excavaciones en material conglomerado | m3 | 69,07 | \$ 36.781,00 | \$ 2.540.463,67 |
| | De 2 a 4 mts en seco | | | | |
| 3,7 | Excavaciones en material común y conglomerado | m3 | 1,52 | \$ 51.817,00 | \$ 78.930,76 |
| 4,0 | EXCAVACIONES A MAQUINA | | | | |
| | De 0 a 2 mts en Seco | | | | |
| 4,1 | Excavaciones en material común y Conglomerado | m3 | 153,33 | \$ 24.104,00 | \$ 3.695.980,39 |
| | De 2 a 4 mts en seco | | | | |
| 4,5 | Excavaciones en material común y conglomerado | m3 | 10,14 | \$ 33.455,00 | \$ 339.199,58 |
| 6,19 | Corte de Pavimento Flexible con Cortadora | ml | 401,40 | \$ 15.649,00 | \$ 6.281.508,60 |
| 6,20 | Corte de pavimento rígido con cortadora | ml | 140,50 | \$ 18.246,00 | \$ 2.563.563,00 |
| 6,22 | Rotura de pavimento rígido | m3 | | \$ 137.487,00 | \$ - |
| 15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA D LISA Norma Técnica Colombiana 3722-1 y Norma Técnica Colombiana 4764 (100% de Ermeticidad) | | | | |
| 15,1 | De 0,00 a 2,00 Mts | | | | |
| 15,1,1 | De Diametro 6" | ml | 101,95 | \$ 57.032,00 | \$ 5.814.412,40 |
| 15,1,2 | De Diametro 8" | ml | 51,95 | \$ 80.152,00 | \$ 4.163.896,40 |
| 15,1,3 | De diametro 10" | ml | 51,30 | \$ 106.941,00 | \$ 5.486.073,30 |
| 19,1,8 | Caja de inspeccion 60 x 60 x 100 cms en ladrillo, concreto de 2500 psi y tapa reforzada en concreto de 3000 psi. | und | 0,00 | \$ 393.561,00 | \$ - |
| 20 | OTROS | | | | |
| 20,1 | SEÑALIZACION EN GUADUA C/3 Mts Y POLISOMBRA DE h=2 Mts | ml | 343,80 | \$ 16.875,00 | \$ 5.801.625,00 |
| 20,51 | Cerramiento en malla de polietileno naranja h=1,0m, con señalizador tubular de 1.30m. Con 3 cintas | m | 0,00 | \$ 51.230,00 | \$ - |
| 20,52 | Señales provisional movil para obra tipo tripode incluye tablero | und | 6,00 | \$ 282.037,00 | \$ 1.692.222,00 |
| 20,5 | Suministro e Instalacion Lecho en Grava para Cama de Tuberia D= 1/2 a 3/4 | m3 | 14,69 | \$ 122.311,00 | \$ 1.796.198,19 |
| 20,7 | Suministro e Instalacion de Kit Silla Yee 8"X 6" PVC Incluye Agarraderas Caucho y Adherencia | und | 8,00 | \$ 186.273,00 | \$ 1.490.184,00 |
| | Suministro e instalacion de kit silla Yee 10" x 6" PVC Incluye Agarraderas Caucho y Adherencia | und | 14,00 | \$ 277.152,00 | \$ 3.880.128,00 |
| 20,53 | Suministro de maletines para cerramiento (2m X 1m x 0,50m) con cinta reflectiva grado ingenieria incluye tapa de llenado y tapon de drenaje. 30kg | und | 0,00 | \$ 424.345,00 | \$ - |
| 20,43 | Manejo de Aguas Con Diametros de 8" a 12" | gib | 2,00 | \$ 674.894,00 | \$ 1.349.788,00 |
| | ITEMS NO CONTRATADOS | | | | |
| 16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA Norma Técnica Colombiana 3722-1 y Norma Técnica Colombiana 4764 (100% de Ermeticidad) | | | | |
| 16,1 | De 2,00 a 4,00 Mts | | | | |
| 16,1,1 | De Diametro 8" | ml | 6,75 | \$ 82.224,00 | \$ 555.012,00 |
| 16,1,2 | De diametro de 10" | ml | 39,40 | \$ 109.151,00 | \$ 4.300.549,40 |
| 6,13 | ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO ESP= 0,10m | m2 | 36,57 | \$ 22.815,00 | \$ 2.715.424,22 |
| 6,21 | ROTURA PAVIMENTO FLEXIBLE esp= 0,10 m | m2 | 129,70 | \$ 20.937,00 | \$ 2.715.424,22 |
| NP1 | SUMINISTRO E INSTACION DE ENTIBADO EN MADERA APUNTALADO | m2 | 240,70 | \$ 25.497,00 | \$ 6.137.025,91 |
| NP3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CDDOS DE ALCANTARILLADO TDP 45", 6" | Unid | 14,00 | \$ 85.618,00 | \$ 1.198.652,00 |
| | ANDEN EN CONCRETO DE 2500 PSI ESP 0,10, INCLUYE ALISTADO Y NIVELACION | m2 | 35,29 | \$ 78.522,00 | \$ 2.771.041,38 |
| NP4 | CAJA DE INSPECCION DE 60 X 60 X 100 CMS, CDNCRETO DE 3000 PSI Y TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3000 PSI. | UND | 22,00 | \$ 514.902,00 | \$ 11.327.844,00 |
| 20,54 | Suministro de valla informativa de piso según diseño IBAL | und | 1,00 | \$ 467.917,00 | \$ 467.917,00 |
| TOTAL CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES | | | | | \$ 110.082.853,00 |

Dirección: Centro Comercial Arroyuelos, Local 6, Ibagué, Tolima.
Teléfono: 300 556 1508 - Correo electrónico: interventoriaexterna2021@gmail.com

| | | |
|---|--|--|
|  | <p align="center">INFORME DE INTERVENTORIA No. 04</p> <p align="center">CONTRATO No. 063 DE 2021</p> | <p align="center">CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p align="center">FECHA INFORME: 30/09/2021</p> <p align="center">PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021</p> |
|---|--|--|

| CALLE/TRAMO | ESTADO INICIAL |
|--|--|
| <p align="center">CARRERA 50B SUR ENTRE CALLES 143 Y 144 BARRIO PORTAL DE LOS TUNJOS</p> | <p>VIA PAVIMENTADA EN CONCRETO ASFALTICO EN MAL ESTADO. TRAMO EN TUBERIA DE 8" EN CONCRETO EN AVANZADO ESTADO DE DETERIORO.</p> |
| LOCALIZACIÓN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Localización y replanteo entre los tramos desde el pozo PE 1 hasta el pozo PE 4. ➤ Se realiza investigación del estado actual de los pozos de los tramos a intervenir, verificación de diámetros y alturas de las redes. ➤ Se instala cerramiento en poli sombra alrededor de la zona a intervenir entere la calle 143 y 144. ➤ Corte del área a intervenir en la carpeta asfáltica con cortadora entre los tramos desde el pozo PE 1 hasta el pozo PE 4. ➤ Rotura de la carpeta asfáltica con compresor entre los tramos desde el pozo PE 1 hasta el pozo PE 4. ➤ Corte concreto rígido para andenes y cajas domiciliarias entre los tramos PE 1 – PE 2. ➤ Rotura de concreto rígido para redes domiciliarias y cajas. ➤ Excavaciones medio mecánico entre los tramos comprendidos entre desde el pozo PE 1 hasta el pozo PE 4. ➤ Excavación manual para lecho en grava redes domiciliarias y cajas entre los tramos antes mencionados. ➤ Retiro de material sobrante de las excavaciones y demoliciones. ➤ Manejo de aguas. ➤ Suministro e Instalación de tubería plástica o lisa NTC 3722 -1 de diámetro 8" para la red central desde el tramo desde el pozo PE 1 hasta el pozo PE 3 y de 6" para las redes domiciliarias. ➤ Instalación de sillas yee de 8" x 6" para redes domiciliarias de ambos tramos. |
| <p align="center">REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL</p>  | |

| | | |
|---|--|--|
|  | <p align="center">INFORME DE INTERVENTORIA No. 04</p> <p align="center">CONTRATO No. 063 DE 2021</p> | <p align="center">CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p align="center">FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021</p> |
|---|--|--|

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Construcción de lecho en grava para tuberías (red central y domiciliarias). ➤ Revestimiento en concreto de 3000 psi para protección de tuberías entre el tramo PE 1 – PE 2 red central y domiciliarias. ➤ Relleno con recebo compactado medio mecánico entre los tramos PE 1 – PE 2 (red central) ➤ Construcción de cajas domiciliarias de las 8 primeras domiciliarias. |
|--|---|

| DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Localización y replanteo entre los tramos PE 1 - PE 4, investigación del estado actual de los pozos de los tramos a intervenir, verificación de diámetros y alturas de las redes, instalación de cerramiento en poli sombra alrededor de la zona a intervenir entre la calle 143 y 144, corte del área a intervenir con cortadora en la carpeta asfáltica con entre los tramos PE 1 - PE 4, Rotura de la carpeta asfáltica con compresor entre los tramos PE 1 al PE 4. ➤ Corte con concreto rígido para andenes y cajas domiciliarias entre los tramos PE 1 – PE 2, rotura de concreto rígido para redes domiciliarias y cajas. ➤ Excavaciones medio mecánico entre los tramos comprendidos entre el PE 1 al PE 4. ➤ Excavación manual para lecho en grava redes domiciliarias y cajas entre los tramos antes mencionados. ➤ Retiro de material sobrante de las excavaciones y demoliciones. ➤ Manejo de aguas. ➤ Suministro e Instalación de tubería plástica o lisa NTC 3722 -1 de diámetro 8" para la red central entre los tramos PE 1 – PE 2, PE 2 – PE 3 y de 6" para las redes domiciliarias, instalación de sillas yee de 8" x 6" para redes domiciliarias de ambos tramos, construcción de lecho en grava para tuberías (red central y domiciliarias). ➤ Revestimiento en concreto de 3000 psi para protección de tuberías entre el tramo PE 1 – PE 2 red central y 8 redes domiciliarias. ➤ Relleno con recebo compactado medio mecánico entre los tramos PE 1 – PE 2 (red central) ➤ Construcción de cajas domiciliarias de las primeras domiciliarias. |




INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 - 30/09/2021

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

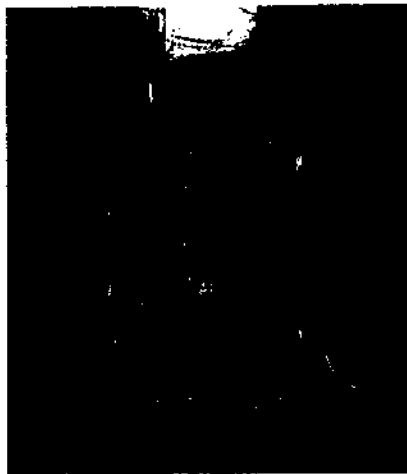




INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04

CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 - 30/09/2021



| | | |
|---|--|--|
|  | INFORME DE INTERVENTORIA No. 04 | CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021 |
| | CONTRATO No. 063 DE 2021 | |



| REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CALLE 144 ENTRE CARRERAS 15 I SUR Y 15 F SUR BARRIO LAS AMERICAS, DEL MUNICIPIO DE IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | | | | | |
|---|---|---------|----------|---------------|-------------------------|
| ITEM | ACTIVIDADES | UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR./PARCIAL |
| 1,0 | PRELIMINARES | | | | |
| 1,1 | Localización y replanteo Topografico | ml | 129,83 | \$ 5.106,00 | \$ 662.911,98 |
| 1,8 | Cargue y Retiro de sobrantes hasta 8 Kms a Maquina | m3/comp | 194,26 | \$ 26.251,00 | \$ 5.099.519,26 |
| 1,11 | Suministro de Recebo en zanja compactado c/ 15 Cms. Medio mecánico | m3/comp | 146,67 | \$ 68.652,00 | \$ 10.069.188,84 |
| 1,12 | Acarreo interno en obra 50 mts | m3 | 0,00 | \$ 16.231,00 | \$ - |
| 3,0 | EXCAVACIONES A MANO | | | | |
| | De 0 a 2 mts en Seco | | | | |
| 3,1 | Excavaciones en material común | m3 | 77,22 | \$ 31.090,00 | \$ 2.400.750,46 |
| 4,0 | EXCAVACIONES A MAQUINA | | | | |
| | De 0 a 2 mts en Seco | | | | |
| 4,1 | Excavaciones en material común y Conglomerado | m3 | 102,40 | \$ 24.104,00 | \$ 2.468.261,32 |
| 6,14 | ROTURA PAVIMENTO FLEXIBLE | m2 | 103,62 | \$ 20.937,00 | \$ 2.169.491,94 |
| 6,19 | Corte de Pavimento Flexible con Cortadora | ml | 345,40 | \$ 15.649,00 | \$ 5.405.164,60 |
| 15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA Norma Técnica Colombiana 3722-1 y Norma Técnica Colombiana 4764 (100% de Ermeticidad) | | | | |
| 15,1 | Oe 0,00 a 2,00 Mts | | | | |
| 15,1,1 | De Diametro 6" | ml | 93,05 | \$ 57.032,00 | \$ 5.306.827,60 |
| 15,1,3 | De Diametro 8" | ml | 127,43 | \$ 80.152,00 | \$ 10.213.769,36 |
| 19,1,8 | Caja de inspeccion 60 x 60 x 10D cmts en ladrillo, concreto de 2500 psi y tapa reforzada en concreto de 3000 psi. | und | 0,00 | \$ 393.561,00 | \$ - |
| 20 | OTROS | | | | |
| 20,1 | SEÑALIZACION EN GUADUA C/3 Mts Y POLISOMBRA DE h=2 Mts | ml | 275,66 | \$ 16.875,00 | \$ 4.651.762,50 |
| 20,51 | Cerramiento en malla de polietileno naranja h=1,0m, con señalizador tubular de 1.30m. Con 3 cintas | m | 0,00 | \$ 51.230,00 | \$ - |
| 20,52 | Señales provisional movil para obra tipo tripode incluye tablero | und | 4,00 | \$ 282.037,00 | \$ 1.128.148,00 |
| 20,5 | Suministro e Instalacion Lecho en Grava para Cama de Tuberia D= 1/2 a 3/4 | m3 | 15,97 | \$ 122.311,00 | \$ 1.953.061,22 |
| 20,7 | Suministro e Instalacion de Kit Silla Yee 8"X 6" PVC Incluye Agarraderas Caucho y Adherencia | und | 20,00 | \$ 186.273,00 | \$ 3.725.460,00 |
| 20,53 | Suministro de maletines para cerramiento (2m X 1m x 0.50m) con cinta reflectiva grado ingenieria incluye tapa de llenado y tapon de drenaje. 30kg | und | 0,00 | \$ 424.345,00 | \$ - |
| 20,54 | Suministro de valla informativa de piso según diseño IBAL | und | 1,00 | \$ 467.917,00 | \$ 467.917,00 |
| 20,43 | Manejo de Aguas Con Diametros de 8" a 12" | glb | 1,00 | \$ 674.894,00 | \$ 674.894,00 |
| | ITEMS NO CONTRATADOS | | | | |
| 6,20 | CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA | ml | 115,98 | \$ 18.246,00 | \$ 2.116.171,08 |
| 6,22 | ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO | m2 | 29,74 | \$ 22.815,00 | \$ 678.449,66 |
| | Suministro e instalacion de entibado en madera apuntalado | m2 | 110,04 | \$ 25.497,00 | \$ 2.805.689,88 |
| 5,13 | ANDEN EN CONCRETO DE 2500 PSI ESP 0,10, INCLUYE ALISTADO Y NIVELACION | m2 | 29,55 | \$ 78.522,00 | \$ 2.320.325,10 |
| | SUMINISTRO DE INSTALACION DE CODOS ALCANTARILLADO TDP 45°, 6" | und | 12,00 | \$ 85.618,00 | \$ 1.027.416,00 |
| | Caja de inspeccion 60x60x10D Cmts concreto de 3000 PSI y tapa reforzada en concreto de 3000 PSI | und | 20,00 | \$ 514.902,00 | \$ 10.298.040,00 |
| | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARO TAPA COMPLETA VIBROCOMPACTADA | und | 2,00 | \$ 766.261,00 | \$ 1.532.522,00 |
| 5,5 | Concreto de 20,7 Mpa (3.000 PSI) | m3 | 13,98 | \$ 666.154,00 | \$ 9.312.832,92 |
| | TOTAL CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES | | | | \$ 86.485.270,13 |

Dirección: Centro Comercial Arroyuelos, Local 6, Ibagué, Tolima.
 Teléfono: 300 556 1508 - Correo electrónico: interventoriaexterna2021@gmail.com



INFORME DE INTERVENTORIA No. 04
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

| CALLE/TRAMO | ESTADO INICIAL |
|---|--|
| SECTOR CARRERA 14 ENTRE CALLES 95 Y 95 B BARRIO ARKAMBUCO. | VIA PAVIMENTADA EN CONCRETO ASFALTICO EN REGULAR ESTADO. TRAMO EN TUBERIA DE 12" EN CONCRETO EN AVANZADO ESTADO DE DETERIORO. |
| LOCALIZACIÓN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Localización y replanteo entre los tramos desde el pozo PE 1 hasta el pozo PP 2A. ➤ Se realiza investigación del estado actual de los pozos de los tramos a intervenir, verificación de diámetros y alturas de las redes. ➤ Se instala cerramiento en poli sombra alrededor de la zona a intervenir entre la calle 95 y 95 B. ➤ Instalación de cerramiento en malla de polietileno naranja h=1,0m, con señalizador tubular de 1.30m. Con 3 cintas ➤ Instalación de señalización fijas (Inicio de obra) ➤ Instalación de señales provisionales móvil para obra tipo trípode incluye tablero ➤ Suministro de valla informativa de piso según diseño IBAL ➤ Suministro de maletines para cerramiento (2m X 1m x 0.50m) con cinta reflectiva grado Ingeniería incluye tapa de llenado y tapón de drenaje. 30kg ➤ Corte concreto rígido para andenes y cajas domiciliarias entre los tramos PE 1 – PP 2A. ➤ Rotura de concreto rígido para redes domiciliarias y cajas. ➤ Excavaciones medio mecánico entre el tramo comprendidos entre el pozo PE 1 hasta el pozo PP 2A. ➤ Excavación mecánica para pozo PP1A |
| REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL | |
|  | |



INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04
CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

- Excavación manual para lecho en grava redes domiciliarias
- Excavación manual para piso de pozo PP 1A
- Excavación manual para lecho en grava redes domiciliarias.
- Retiro de material sobrante de las excavaciones y demoliciones.
- Manejo de aguas.
- Suministro e Instalación de tubería plástica o lisa NTC 3722 -1 de diámetro 12" para la red central desde el tramo desde el pozo PE 1 hasta el pozo PP 2A y de 6" para las redes domiciliarias.
- Instalación de sillas yee de 12" x 6" para redes domiciliarias.
- Construcción de lecho en grava para tuberías (red central y domiciliarias).
- Relleno con recebo compactado medio mecánico entre los tramos PE 1 – PP 2A (red central)

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

- Localización y replanteo entre los tramos PE 1 - PP 2A, investigación del estado actual de los pozos de los tramos a intervenir, verificación de diámetros y alturas de las redes,
- Instalación de cerramiento en poli sombra alrededor de la zona a intervenir entere la calle 95 y 95 B, Instalación de cerramiento en malla de polietileno naranja h=1,0m, con señalizador tubular de 1.30m. Con 3 cintas, Instalación de señalización fijas (Inicio de obra), Instalación de señales provisionales móvil para obra tipo trípode incluye tablero, Suministro de valla informativa de piso según diseño IBAL, Suministro de maletines para cerramiento (2m X 1m x 0.50m) con cinta reflectiva grado ingeniería incluye tapa de llenado y tapón de drenaje. 30kg.
- Corte con concreto rígido para andenes y cajas domiciliarias entre los tramos PE 1 – PP 2A, rotura de concreto rígido para redes domiciliarias y cajas.
- Excavaciones medio mecánico entre el tramo comprendidos entre el PE 1 al PP 2ª, excavación mecánica para pozo PP1A.
- Excavación manual para lecho en grava redes domiciliarias, excavación manual para piso de pozo PP 1A
- Excavación manual para lecho en grava redes domiciliarias.
- Retiro de material sobrante de las excavaciones y demoliciones Manejo de aguas.
- Suministro e Instalación de tubería plástica o lisa NTC 3722 -1 de diámetro 12" para la red central entre el tramo PE 1 – PP 2A y de 6" para las redes domiciliarias, instalación de sillas yee de 12" x 6" para redes domiciliarias, construcción de lecho en grava para tuberías (red central y domiciliarias).
- Relleno con recebo compactado medio mecánico entre el tramo PE 1 – PP 2A (red central)



**INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04**

**CONTRATO No. 063 DE
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE






INFORME DE
INTERVENTORIA No. 04


CONTRATO No. 063 DE
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 - 30/09/2021

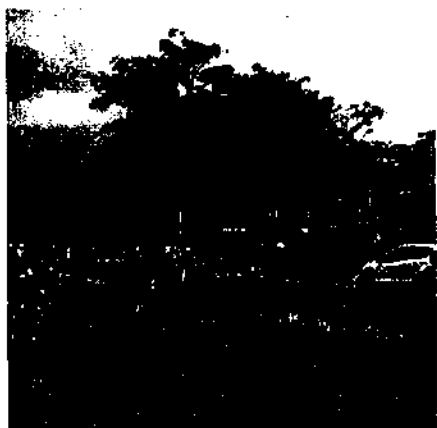

Dirección: Centro Comercial Arroyuelos, Local 6, Ibagué, Tolima.
Teléfono: 300 556 1508 - Correo electrónico: interventoriaexterna2021@gmail.com

| | | |
|---|--|--|
|  | INFORME DE INTERVENTORIA No. 04 | CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021 |
| | CONTRATO No. 063 DE 2021 | |

| REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CARRERA 14 ENTRE CALLES 95 Y 95 B | | | | | BARRIO |
|--|---|---------|----------|---------------|-------------------------|
| ARKAMBUCO, DEL MUNICIPIO DE IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | | | | | |
| ITEM | ACTIVIDADES | UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR./PARCIAL |
| 1,0 | PRELIMINARES | | | | |
| 1,1 | Localización y replanteo Topografico | ml | 105,80 | \$ 5.106,00 | \$ 540.214,80 |
| 1,8 | Cargue y Retiro de sobrantes hasta 8 Kms a Maquina | m3/comp | 398,86 | \$ 26.251,00 | \$ 10.470.594,27 |
| 1,11 | Suministro de Recebo en zanja compactado c/ 15 Cms. Medio mecánico | m3/comp | 386,65 | \$ 68.652,00 | \$ 26.543.981,71 |
| 1,12 | Acarreo interno en obra 50 mts | m3 | 0,00 | \$ 16.231,00 | \$ - |
| 3,0 | EXCAVACIONES A MANO | | | | |
| | De 0 a 2 mts en Seco | | | | |
| 3,1 | Excavaciones en material común | m3 | 4,83 | \$ 31.090,00 | \$ 150.164,70 |
| | De 2 a 4 mts en seco | | | | \$ - |
| 3,7 | Excavaciones en material comun y conglomerado | m3 | 2,30 | \$ 51.817,00 | \$ 119.184,53 |
| 4,0 | EXCAVACIONES A MAQUINA | | | | |
| | De 0 a 2 mts en Seco | | | | |
| 4,1 | Excavaciones en material común y Conglomerado | m3 | 108,95 | \$ 24.104,00 | \$ 2.626.082,93 |
| | De 2 a 4 mts en seco | | | | |
| 4,5 | Excavaciones en material comun y conglomerado | m3 | 8,09 | \$ 33.455,00 | \$ 270.549,09 |
| 6,19 | Corte de Pavimento Flexible con Cortadora | ml | 0,00 | \$ 15.649,00 | \$ - |
| 15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA Norma Técnica Colombiana 3722-1 y Norma Técnica Colombiana 4764 (100% de Ermeticidad) | | | | |
| 15,1 | De 0,00 a 2,00 Mts | | | | |
| 15,1,1 | De Diametro 6" | ml | 0,00 | \$ 57.032,00 | \$ - |
| 15,1,14 | De Diametro 12" | ml | 59,12 | \$ 149.146,00 | \$ 8.817.511,52 |
| 16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA Norma Técnica Colombiana 3722-1 y Norma Técnica Colombiana 4764 (100% de Ermeticidad) | | | | |
| 16,1,3 | De 2,00 a 4,00 Mts | | | | |
| 16,1,3 | De Diametro 12" | ml | 26,88 | \$ 151.696,00 | \$ 4.077.588,48 |
| 20 | OTROS | | | | |
| 20,1 | SEÑALIZACION EN GUADUA C/3 Mts Y PDLISDMBRA DE h=2 Mts | ml | 183,60 | \$ 16.875,00 | \$ 3.098.250,00 |
| 20,51 | Cerramiento en malla de polietileno naranja h=1,0m, con señalizador tubular de 1.30m. Con 3 cintas | m | 0,00 | \$ 51.230,00 | \$ - |
| 20,52 | Señales provisional movil para obra tipo tripode incluye tablero | und | 2,00 | \$ 282.037,00 | \$ 564.074,00 |
| 20,5 | Suministro e Instalacion Lecho en Grava para Cama de Tuberia D= 1/2 a 3/4 | m3 | 5,96 | \$ 122.311,00 | \$ 728.606,63 |
| 20,8 | Suministro e Instalacion de Kit Silla Yee 12"X 6" PVC Incluye Agarraderas Caucho y Adherencia | und | 4,00 | \$ 186.273,00 | \$ 745.092,00 |
| 20,53 | Suministro de maletines para cerramiento (2m X 1m x 0.50m) con cinta reflectiva grado Ingenieria incluye tapa de llenado y tapon de drenaje. 30kg | und | 0,00 | \$ 424.345,00 | \$ - |
| 20,54 | Suministro de valla informativa de piso según diseño IBAL | und | 1,00 | \$ 467.917,00 | \$ 467.917,00 |
| 20,43 | Manejo de Aguas Con Diametros de B" a 12" | glb | 1,00 | \$ 674.894,00 | \$ 674.894,00 |
| | ITEMS NO CDNTRATAOOS | | | | |
| NP4 | CAJA DE INSPECCION DE 60 X 60 X 100 CMS, CONCRETO DE 3000 PSI Y TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3000 PSI. | und | 0,00 | \$ 514.902,00 | \$ - |
| 6,20 | CDRTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CDRTADDDRA | ml | 55,00 | \$ 18.246,00 | \$ 1.003.530,00 |
| 6,21 | ROTURA PAVIMENTD FLEXIBLE ESP=0,10 | m2 | 0,00 | \$ 20.937,00 | \$ - |
| 6,22 | ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO ESP = 0,10 | m2 | 0,00 | \$ 22.815,00 | \$ - |
| 20,48 | ENTIBADO TIPO 1A (DISCONTINUO EN MADERA) | m2 | 185,64 | \$ 27.653,00 | \$ 5.133.502,92 |
| 5,13 | ANDEN EN CONCRETO DE 2500 PSI ESP 0,10, INCLUYE ALISTAOO Y NIVELACION | m2 | 0,00 | \$ 84.298,00 | \$ - |
| 5,5 | Concreto de 20,7 Mpa (3.000 PSI) | m3 | 0,00 | \$ 666.154,00 | \$ - |
| TOTAL CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES | | | | | \$ 66.031.739,00 |

Dirección: Centro Comercial Arroyuelos, Local 6, Ibagué, Tolima.
Teléfono: 300 556 1508 - Correo electrónico: interventoriaexterna2021@gmail.com



INFORME DE INTERVENTORIA No. 04
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
FECHA INFORME: 30/09/2021
PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021

2.7.5. Seguimiento a garantías contractuales


| CONTRATO DE OBRA NO. 041 DE 2021 | | | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| No. | Aseguradora | Amparo | Vigencia | |
| I-100004333 | SEGUROS MUNDIAL | CUMPLIMIENTO | 07/04/2021 04/04/2022 | |
| I-100004333 | SEGUROS MUNDIAL | SALARIOS Y PRESTACIONES | 07/04/2021 04/10/2024 | |
| I-100004333 | SEGUROS MUNDIAL | CALIDAD DEL SERVICIO | 07/04/2021 04/10/2022 | |
| I-100004333 | SEGUROS MUNDIAL | ESTABILIDAD | 04/10/2021 04/10/2026 | |
| I-100001109 | SEGUROS MUNDIAL | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC. | 07/04/2021 04/10/2022 | |


2.7.6. Avance Físico

A la fecha del presente informe se evidencia el siguiente avance:

| CUADRO COMPARATIVO DE ACTIVIDADES | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| MESES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PROGRAMADO | 12% | 15% | 23% | 20% | 15% | 15% |
| EJECUTADO | 14.5% | 33.5% | 17% | 0% | 0% | 0% |
| EJECUTADO ACUMULADO | 14.5% | 48% | 65% | | | |

AVANCE DISTRITO 9 Y 10

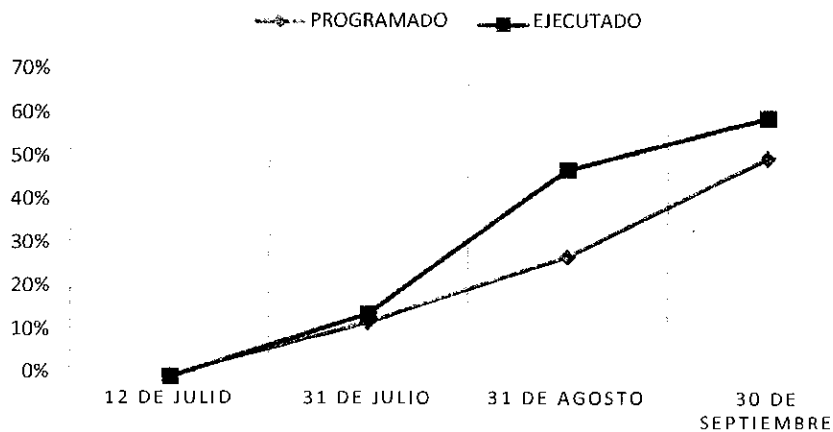

| | | |
|---|--|---|
|  | INFORME DE INTERVENTORIA No. 04 | CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL |
| | CONTRATO No. 063 DE 2021 | FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021 |


2.7.7. Avance Financiero

De acuerdo a las actividades realizadas durante el presente periodo el contratista a ejecutado un valor de \$505.419.030,00 equivalente al 75% del valor del contrato de \$673.892.040

2.7.8. Balance del Contrato

| | | |
|---------------------------|---------------|-------------------|
| VALOR CONTRATADO | \$673.892.040 | |
| VALOR EJECUTADO | | \$ 505.419.030,00 |
| VALOR POR EJECUTAR | | \$ 168.473.010,00 |
| SUMAS IGUALES | \$673.892.040 | \$673.892.040 |

PORCENTAJE DE EJECUCION

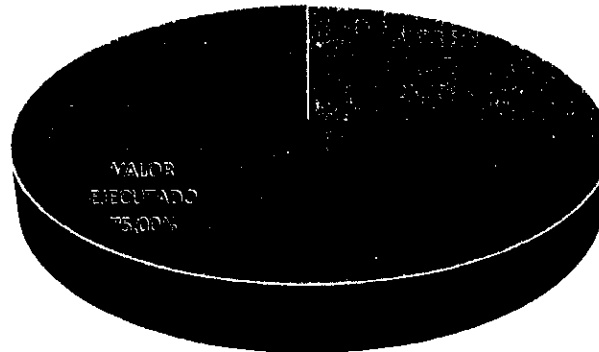

■ VALOR SIN EJECUTAR ■ VALOR EJECUTADO

2.7.9. Gestión de las comunicaciones

Se anexa correspondencia relacionada al distrito 9 Y 10.

2.7.10. Información relacionada con los ensayos de Laboratorio.

Se anexan resultados de ensayos de laboratorio practicados durante el periodo del presente informe.

2.7.11. Dificultades en la ejecución del proyecto

| Inconveniente | Solución | Proceso / Avance a fecha de corte de este informe |
|----------------------|-----------------|--|
| NO APLICA | | |

| | | |
|---|--|---|
|  | INFORME DE INTERVENTORIA No. 04 | CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL |
| | CONTRATO No. 063 DE 2021 | FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021 |

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.


3.1. Información general del contrato.

| | |
|-----------------------------|--|
| CONTRATO No | 063 |
| FECHA | 06 DE MAYO DE 2021 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL R.L. LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ |
| CLASE | INTERVENTORIA |
| VALOR | MIL TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE (\$1.038.941.400,00). |
| PLAZO | DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS |
| OBJETO | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS DISTRITOS HIDRAULICOS DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S.A. E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE |
| FECHA DE INICIO | 01 DE JUNIO DE 2021 |
| FECHA DE TERMINACION | 28 DE NOVIEMBRE DE 2021 |

3.2. Control del equipo de la Interventoría

Para cumplir el objeto del contrato, se ha utilizado diversidad de elementos, equipos y herramientas para medir, registrar y documentar el avance y elaborar un registro histórico detallado del desarrollo de las obras objeto de esta interventoría.

| EQUIPO | CANTIDAD |
|---|----------|
| Vehículo | 4 |
| Equipo de Topografía (Nivel de Precisión) | 2 |
| Equipos de cómputo y comunicaciones | 2 |
| Decámetro | 4 |
| Flexómetro | 6 |
| Impresora Multifuncional | 1 |
| Cámara fotográfica | 6 |

| | | |
|---|--|---|
|  | INFORME DE INTERVENTORIA No. 04 | CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL |
| | CONTRATO No. 063 DE 2021 | FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021 |

3.3. Control del personal de Interventoría

Cumpliendo los perfiles y requerimientos para el personal profesional y operativo de la interventoría se han presentado y aprobado las hojas de vida del personal que va a permanecer en obra cumpliendo las diversas obligaciones contratadas.

| CARGO | CANTIDAD |
|---------------------------|----------|
| Director de Interventoría | 1 |
| Ingeniero Residente | 4 |
| Profesional SISOMA | 1 |
| Profesional Ambiental | 1 |
| Asesor Hidráulico | 1 |
| Topógrafo | 2 |
| Inspector | 7 |
| Cadenero | 4 |
| Auxiliar administrativo | 1 |

3.4. Trabajo de campo y actividades realizadas

- Dentro de los trabajos realizados por Interventoría está el levantamiento topográfico de los proyectos iniciados en este periodo, así como la supervisión y visita de cada uno de los contratos vigentes con el fin de llevar a cabo la correspondiente localización y replanteo.
- Control de calidad de materiales y proceso constructivo.
- Control de seguridad industrial y salud en el trabajo.
- Control de cantidades de obra y ejecución de presupuesto.
- Acompañamiento técnico y administrativo.
- Registro fotográfico.
- Documentación de los eventos y actividades diarias del contratista.
- Seguimiento al impacto social generado por la ejecución de la obra.
- Control de ejecución de Plan de Manejo Ambiental.
- Control de Plan de manejo de Transito
- Control y seguimiento a ensayos de laboratorio

3.5. Informes técnicos mensuales

Dentro del contrato de Interventoría se han realizado los siguientes informes mensuales:

| INFOME | DE | HASTA |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Informe Mensual No.01 | 01 de JUNIO DE 2021 | 30 DE JUNIO DE 2021 |
| Informe Mensual No.02 | 01 de JULIO DE 2021 | 31 DE JULIO DE 2021 |
| Informe Mensual No.03 | 01 de AGOSTO DE 2021 | 31 DE AGOSTO 2021 |
| Informe Mensual No.04 | 01 de SEPTIEMBRE DE 2021 | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |

| | | |
|---|--|--|
|  | <p style="text-align: center;">INFORME DE INTERVENTORIA No. 04</p> <p style="text-align: center;">CONTRATO No. 063 DE 2021</p> | <p style="text-align: center;">CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</p> <p style="text-align: center;">FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021</p> |
|---|--|--|

Total informes mensuales presentados: 4

3.6. Estado contrato interventoría


Durante la ejecución del contrato de interventoría se han realizado las siguientes actas:

Tabla No. 5. Resumen actas del contrato de Interventoría.


| DESCRIPCIÓN | CANT. |
|--|----------|
| Acta de iniciación de Interventoría – 01 de Junio de 2021. | 1 |

3.7. Información financiera del Interventor

AVANCE COMPARATIVO ENTRE DISTRITOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

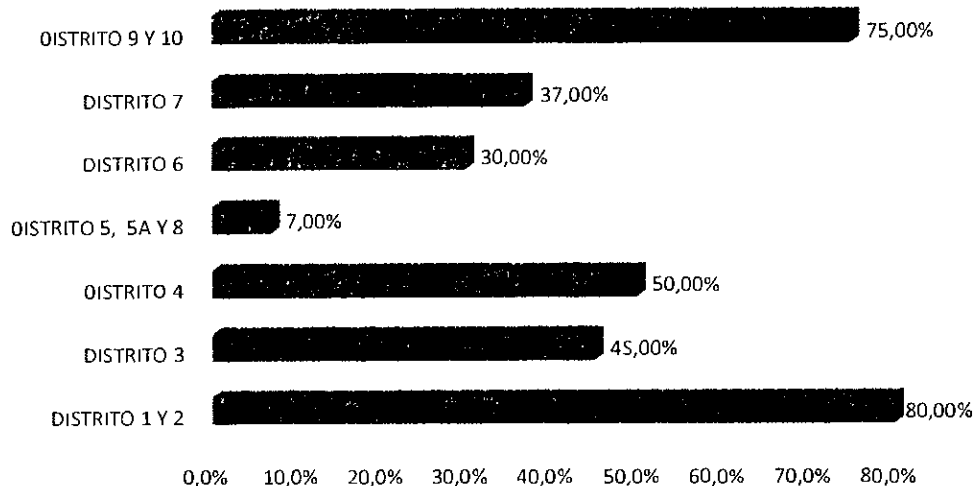

De acuerdo a la CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO del contrato No. 063 de 2021, el avance de la interventoría y el valor a pagar al CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL reflejan el avance financiero de los contratos de obra adelantados por el IBAL SA ESP OFICIAL.


| | | |
|---|--|---|
|  | INFORME DE INTERVENTORIA No. 04 | CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL |
| | CONTRATO No. 063 DE 2021 | FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021 |

AVANCE FINANCIERO POR CADA DISTRITO


| DISTRITO | VALOR DEL CONTRATO | VALOR EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE | VALOR POR EJECUTAR |
|--|-------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| DISTRITO 1 Y 2 | \$ 710.581.102,00 | \$ 568.464.881,60 | 80,00% | \$ 355.290.551,00 |
| DISTRITO 3 | \$3.528.154.037,00 | \$1.587.669.316,65 | 45,00% | \$ 2.399.144.745,1600 |
| DISTRITO 4 | \$1.309.436.775,00 | \$ 654.718.387,50 | 50,00% | \$ 942.794.478,0000 |
| DISTRITO 5, 5A Y 8 | \$1.847.572.826,00 | \$ 129.330.097,82 | 7,00% | \$ 1.847.572.826,0000 |
| DISTRITO 6 | \$2.784.659.942,00 | \$ 835.397.982,60 | 30,00% | \$ 2.199.881.354,18 |
| DISTRITO 7 | \$3.947.940.553,00 | \$1.460.738.004,61 | 37,00% | \$ 2.842.517.198,16 |
| DISTRITO 9 Y 10 | \$ 673.892.040,00 | \$ 505.419.030,00 | 75,00% | \$ 350.423.860,80 |
| TOTAL | \$14.802.237.275 | \$5.741.737.700,78 | | \$ 10.937.625.013,30 |
| PORCENTAJE INFORME ANTERIOR | | | 26.11% | |
| PORCENTAJE DE AVANCE PRESENTE PERIODO | | | 12.68% | |
| PORCENTAJE DE AVANCE GENERAL | | | 38.79% | |

3.8. Balance del Contrato de Interventoría.

| | | |
|--|---------------------------|----------------------------|
| VALOR CONTRATO | \$1.038.941.400,00 | |
| VALOR EJECUTADO SEGÚN PORCENTAJE DE AVANCE GENERAL DE CONTRATOS DE OBRA ACTA PARCIAL No. 01 | | \$144.828.431 |
| VALOR EJECUTADO SEGÚN PORCENTAJE DE AVANCE GENERAL DE CONTRATOS DE OBRA ACTA PARCIAL No. 02 | | \$126.439.168 |
| VALOR EJECUTADO SEGÚN PORCENTAJE DE AVANCE GENERAL DE CONTRATOS DE OBRA ACTA PARCIAL No. 03 | | \$131.734.250 |
| SALDO POR EJECUTAR | | \$ 635.939.551 |
| SUMAS IGUALES | \$1.038.941.400,00 | \$ 1.038.941.400,00 |

| | | |
|---|--|---|
|  | INFORME DE INTERVENTORIA No. 04 | CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL |
| | CONTRATO No. 063 DE 2021 | FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021 |

BALANCE DE CONTRATO DE INTERVENTORIA

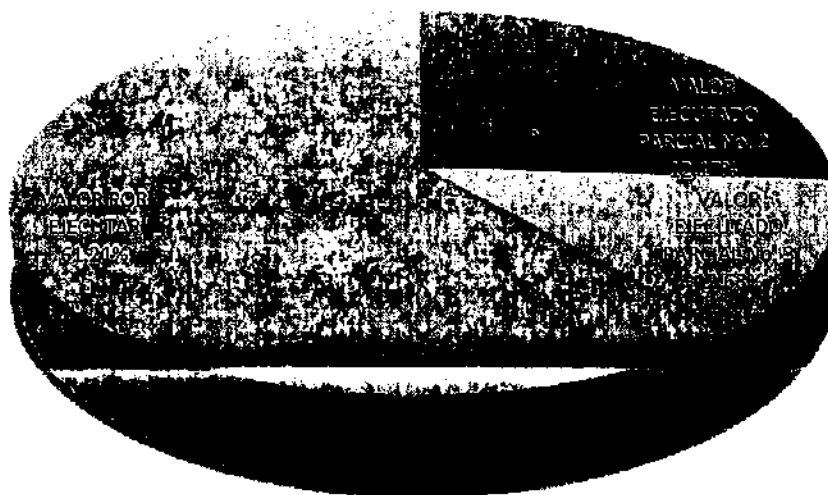

3.9. Información financiera contrato de interventoría.

A la fecha del presente informe se ha ejecutado un valor de \$ 403.001.849 del contrato de interventoría lo que es equivalente al 38.79% del total del valor del contrato de interventoría.


3.10. Informe de Inversión y buen manejo del anticipo.

De acuerdo con el plan de inversión del anticipo presentado por la Interventoría y avalado por el IBAL SA ESP OFICIAL la ejecución del anticipo se presenta a continuación:

| | | |
|---|-----------------------|-------------------------|
| VALOR ANTICIPO | \$ 311.682.420 | |
| MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 1 | | \$ 43.448.529,30 |
| MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 2 | | \$ 37.931.750 |
| MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 3 | | \$ 39.520.275,00 |
| SALDO POR AMORTIZAR | | \$ 190.781.865,7 |
| SUMAS IGUALES | \$ 311.682.420 | \$ 311.682.420 |

| | | |
|---|--|---|
|  | INFORME DE INTERVENTORIA No. 04 | CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL |
| | CONTRATO No. 063 DE 2021 | FECHA INFORME: 30/09/2021 PERIODO: 01/09/2021 – 30/09/2021 |

BALANCE DE ANTICIPO

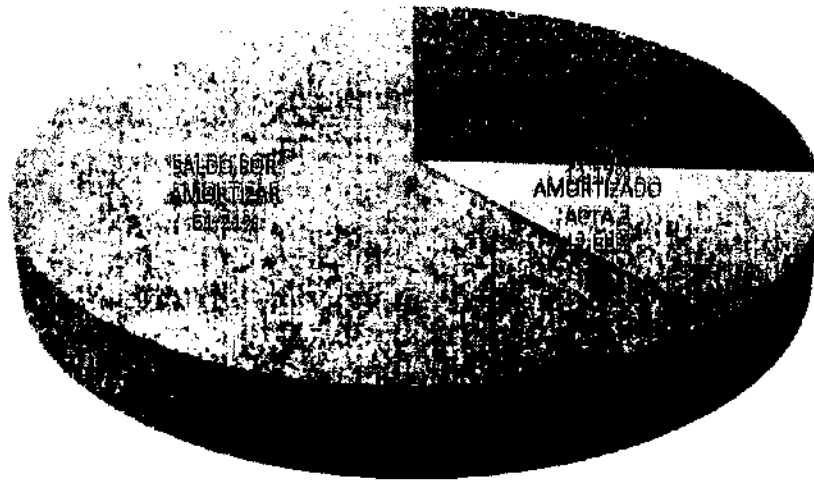

3.11. Seguimiento a garantías contractuales

| Contrato de Interventoría No. 063 de 2021 | | | | |
|---|--------------------|--|-------------------------|---------------|
| No. | Aseguradora | Amparo | Vigencia | Observaciones |
| 21-44-101349794 | SEGUROS DEL ESTADO | BUEN MANEJO DE ANTICIPO | 01/06/2021 – 01/07/2022 | |
| 21-44-101349794 | SEGUROS DEL ESTADO | CUMPLIMIENTO | 01/06/2021 – 01/06/2022 | |
| 21-44-101349794 | SEGUROS DEL ESTADO | SALARIOS Y PRESTACIONES | 01/06/2021 – 31/12/2024 | |
| 21-44-101349794 | SEGUROS DEL ESTADO | CALIDAD DEL SERVICIO | 01/06/2021 – 31/12/2022 | |
| 21-40-101165079 | SEGUROS DEL ESTADO | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 01/06/2021 – 31/12/2022 | |


LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
 Representante Legal
 CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL



INTERVENTORIA EXTERNA IBAL

INFORME SST AMBIENTAL

2021



**INFORME MENSUAL SST AMBIENTAL No. 4
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0063
de 2021**

**CONSORCIO
INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**

CONSORCIO INTERVENTORÍA EXTERNA IBAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°063 DE 2021

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS DISTRITOS HIDRAULICOS DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S.A. E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE”.

INFORME MENSUAL SST AMBIENTAL No. 4.

PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

Contratistas:

CONSOCIO IC DISRITO 1, contrato No. 0092 de 2021
UNION TEMPORAL AGUAS 2021 contrato No. 0041 de 2021.
CONSORCIO DISTRITO 4 2021 contrato No. 0069 de 2021.
CONSORCIO SECTOR 6 contrato No. 0089 de 2021
CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021 contrato No. 0062 de 2021
CONSORICO JOP 19 contrato No. 0093 de 2021,

Interventoría:

CONSORCIO INTERVENTORÍA EXTERNA IBAL

OCTUBRE DE 2021.



INFORME MENSUAL SST AMBIENTAL No. 4
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0063
de 2021

CONSORCIO
INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

| ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN INTERVENTORIA | | | |
|---|-----------------------------------|--------|-------------------------------|
| ELABORÓ | | REVISÓ | |
| | | | |
| Nombre | Francisco Javier Cardozo Bermúdez | Nombre | Luis Francisco España Ramírez |
| Cargo | Interventor SST | Cargo | Director de Interventoría |
| Fecha | 10/10/2021 | Fecha | 10/10/2021 |

| CONTROL DE CAMBIOS AL CONTENIDO DEL DOCUMENTO | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| Version No. | Fecha de elaboración | Control de cambios |
| 01 | 10/10/2021 | Emisión del documento |

| LISTA DE DISTRIBUCIÓN | |
|--------------------------------|---------------|
| DEPENDENCIA | No. DE COPIAS |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO DE IBAGUE | ORIGINAL |



TABLA DE CONTENIDO

| | |
|---|----------|
| 1. OBJETIVOS..... | 6 |
| 1.1. OBJETIVO GENERAL..... | 6 |
| 1.2. OBJETIVO ESPECIFICOS | 6 |
| 2. CONTRATO DE OBRA | 7 |
| 2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA | 7 |
| 2.1. RELACIÓN DE FRENTE DE OBRA ACTIVOS..... | 8 |
| 3. CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO..... | 9 |
| 3.1. ASPECTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO..... | 9 |
| 3.1.1. <i>Proceso de Planificación y liderazgo de la alta dirección.</i> | 9 |
| 3.1.2. <i>Contratación del Personal</i> | 9 |
| 3.1.2.1. Contratación personal Consorcio IC Distrito 1. | 10 |
| 3.1.2.2. Contratación personal Unión Temporal Aguas 2021. | 10 |
| 3.1.2.3. Contratación personal Consorcio Distrito 4 2021. | 11 |
| 3.1.2.4. Contratación personal Consorcio Sector 6. | 12 |
| 3.1.2.5. Contratación personal Consorcio Redes Hidráulicas. | 12 |
| 3.1.2.6. Contratación personal Unión Temporal JPO 19. | 13 |
| 3.1.3. <i>Política de seguridad y salud en el trabajo.</i> | 13 |
| 3.1.4. <i>Marco Legal en Seguridad y Salud en el Trabajo</i> | 15 |
| 3.1.5. <i>Reglamento de Higiene Y Salud Ocupacional</i> | 15 |
| 3.1.6. <i>Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST</i> | 15 |
| 3.1.7. <i>Comité de Convivencia Laboral</i> | 16 |
| 3.1.8. <i>Diagnóstico integral de condiciones de trabajo.</i> | 16 |
| 3.2. IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. | 16 |
| 3.2.1. <i>Sub programa de Medicina Preventiva y del Trabajo.</i> | 16 |
| 3.2.1.1. Exámenes médicos. | 16 |
| 3.2.1.2. Programa de Ausentismo Laboral. | 17 |
| 3.2.2. <i>Sub programa de Higiene y seguridad Industrial.</i> | 17 |
| 3.2.2.1. Procedimientos de trabajo seguro. | 17 |
| 3.2.2.2. Dotación de Elementos de protección Personal. | 27 |
| 3.2.2.3. Señalización y demarcación. | 29 |
| 3.2.2.4. Plan de Emergencias | 32 |
| 3.2.2.5. Inspecciones Planeadas. | 35 |
| 3.2.2.6. Estadísticas SST. | 36 |
| 3.2.2.7. Inducción y Capacitación. | 37 |
| 3.2.2.8. Protocolo de Bioseguridad para COVID-19..... | 37 |
| • Estadísticas Protocolo de Bioseguridad para COVID-19. | 38 |



| | | |
|-----------|--|-----------|
| 4. | CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL DE OBRAS - PEGMA..... | 39 |
| 4.1. | ADECUACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMPAMENTOS, TALLERES Y BODEGAS..... | 40 |
| 4.2. | CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO..... | 42 |
| 4.3. | MANEJO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS..... | 43 |
| 4.4. | MANEJO DE RCD..... | 43 |
| 4.5. | CLASIFICACIÓN Y DISPOSICION DE RESIDUOS DOMÉSTICOS..... | 43 |
| 4.1. | MANEJO DE MATERIALES..... | 45 |
| 4.2. | MANEJO DE COMPONENTE HÍDRICO..... | 46 |
| 4.3. | ORDEN Y ASEO EN LA OBRA..... | 48 |
| 5. | CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..... | 49 |
| 6. | ANEXOS..... | 49 |

ÍNDICE DE TABLAS

| | | |
|-----------|---|----|
| TABLA 1. | INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA..... | 7 |
| TABLA 2. | RELACIÓN DE FRENTES DE OBRA ACTIVO EN EL PERIODO..... | 8 |
| TABLA 3. | PERSONAL ACTIVO DEL CONSORCIO INTERVENTORÍA EXTERNA IBAI, SEPTIEMBRE DE 2021..... | 9 |
| TABLA 4. | INGRESO PERSONAL DEL CONSORCIO IC DISTRITO 1, SEPTIEMBRE DE 2021..... | 10 |
| TABLA 5. | PERSONAL QUE INGRESA UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021, SEPTIEMBRE DE 2021..... | 11 |
| TABLA 6. | PERSONAL QUE INGRESA CONSORCIO DISTRITO 4, SEPTIEMBRE DE 2021..... | 12 |
| TABLA 7. | PERSONAL QUE INGRESA CONSORCIO SECTOR 6, SEPTIEMBRE DE 2021..... | 12 |
| TABLA 8. | PERSONAL QUE INGRESA CONSORCIO REDES HIDRÁULICAS, SEPTIEMBRE DE 2021..... | 12 |
| TABLA 9. | PERSONAL QUE INGRESA UNIÓN TEMPORAL JPO 19, SEPTIEMBRE DE 2021..... | 13 |
| TABLA 10. | RELACIÓN DE AUSENTISMO CONTRATISTAS, SEPTIEMBRE DE 2021..... | 17 |
| TABLA 11. | INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD. CONSORCIO INTERVENTORÍA EXTERNA IBAI MES DE SEPTIEMBRE DE 2021..... | 36 |
| TABLA 12. | INDICADORES SST. CONSORCIO INTERVENTORÍA EXTERNA IBAI MES DE SEPTIEMBRE DE 2021..... | 37 |
| TABLA 13. | ESTADÍSTICAS IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO COVID-19 CONSORCIO INTERVENTORÍA EXTERNA IBAI. JUNIO DE 2021..... | 38 |



INFORME MENSUAL SST AMBIENTAL No. 4
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0063
de 2021

CONSORCIO
INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL

INTRODUCCIÓN

El presente informe relaciona las actividades de seguimiento realizado por la interventoría de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental, establecidos en el contrato de Interventoría **063 de 2021**, cuyo objeto es la ***“Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la ejecución de obras de rehabilitación y/o recuperación y/o reposición de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los distritos hidráulicos del perímetro hidrosanitario del IBAL S.A. E.S.P oficial en la ciudad de Ibagué”***; en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 2021, tomando en cuenta la gestión desarrollada y los compromisos adquiridos por los contratistas de obra CONSOCIO IC DISRITO 1 contrato No. 0092 de 2021, UNION TEMPORAL AGUAS 2021 contrato No. 041 de 2021, CONSORCIO DISTRITO 4 2021 contrato No. 0069 de 2021, CONSORCIO SECTOR 6 contrato No. 0089 de 2021, CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021 contrato No. 0062 de 2021 y CONSORICO JOP 19 contrato No. 0093 de 2021, enmarcados en el Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Programa de Ejecución de la Guía de Manejo Ambiental de Obras (PEGMA), establecidos para cada uno de los contratos de Obra, las directrices establecidas por la Empresa de Acueducto de Ibagué – IBAL, los dispuesto por el Ministerio de Trabajo y las normas vigentes relacionadas con la gestión Ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.




1. OBJETIVOS.

1.1. OBJETIVO GENERAL

Presentar los registros de supervisión, seguimiento y control del cumplimiento a los compromisos establecidos en los aspectos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, por los contratistas de obra CONSORCIO IC DISTRITO 1 contrato No. 0092 de 2021, UNION TEMPORAL AGUAS 2021 contrato No. 041 de 2021, CONSORCIO DISTRITO 4 2021 contrato No. 0069 de 2021, CONSORCIO SECTOR 6 contrato No. 0089 de 2021, CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021 contrato No. 0062 de 2021 y CONSORCIO JOP 19 contrato No. 0093 de 2021, durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 2021.

1.2. OBJETIVO ESPECIFICOS

- Describir las actividades de ambientales y de SST que se desarrollaron durante el periodo evaluado; las cuales se encuentran divididas por componentes y programas de acuerdo a lo establecido en el plan de acción SST de la interventoría y de los Contratistas, junto con lo establecido en el Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 - Generar registros que evidencien el cumplimiento de las actividades ambientales y SST por parte del contratista y el seguimiento a estas por parte de la Interventoría.
 - Verificar y validar el seguimiento de la totalidad de las actividades ambientales y SST dando cumplimiento a lo establecido en el contrato, leyes, decretos, resoluciones, normas, manuales y guías ambientales y de seguridad y salud en el trabajo vigente para el contrato.
 - Propender porque durante el desarrollo del contrato se implementen las medidas de manejo Ambiental y de SST por parte del contratista.
 - Exigir y cumplir con los lineamientos en materia ambiental que establece el IBAL.
 - Verificar el cumplimiento en los soportes de pagos de seguridad social y nómina del personal de los contratistas y el contrato de Interventoría.
-

| | | |
|---|--|---|
|  | INFORME MENSUAL SST AMBIENTAL No. 4 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0063 de 2021 | CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL |
|---|--|---|

2. CONTRATO DE OBRA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

En la Tabla 1, se incluye la información general del contrato de interventoría:

Tabla 1. Información general del contrato de interventoría.

| INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO | |
|--|---|
| CONTRATANTE: | EMPRESA DE ACUEDUCTO DE IBAGUÉ - IBAL |
| TIPO CONTRATO: | CONTRATO DE INTERVENTORÍA |
| CONTRATO: | 063 DE 06 DE MAYO DE 2021 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL |
| OBJETO DEL CONTRATO: | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS DISTRITOS HIDRAULICOS DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S.A. E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE. |
| VALOR DEL CONTRATO: | MIL TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE (\$1.038.941.400,00). |
| PLAZO: | DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS |
| ACTA DE INICIO | 01 DE JUNIO DE 2021 |
| PRORROGAS-SI APLICA | N/A |
| ADICIONES- SI APLICA | N/A |
| SUSPENSIONES-SI APLICA | N/A |
| (FECHA Y No. DE | N/A |
| FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRORROGAS Y | 28 DE DICIEMBRE DE 2021 |



2.1. RELACIÓN DE FRENTE DE OBRA ACTIVOS

En la Tabla 1, se incluye la información general sobre los frentes de obra que se encuentran activos en el periodo del presente:

Tabla 2. Relación de frentes de obra activo en el periodo.

| DISTRITO | FRENTE DE OBRA | BARRIO | CONTRATISTA |
|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------------|
| 1 | Calle 12 Cra 13 y 15 | 20 de Julio | CONSORCIO IC DISTRITO 1. |
| | Calle 4 D entre Cra. 11A y 12 | San Diego | |
| 3 | Clle 24 Cra 1 y 2 sur | Las Ferias | UNION TEMPORAL AGUAS 2021 |
| | Cra 10 Sur Clle 24 y 27 | Villa Claudia | |
| | Clle 20 Cra 11 C Sur y 12 Sur | Ricaurte | |
| | Cra 12 Clle 23 C Y 23 B | Villa Luz | |
| 4 | Calle 42 Cra 6A | Calle 42 | CONSORCIO DISTRITO 4 |
| | Calle 27 entre Av Guabinal y Ambalá | Granja | |
| | Calle 28 entre Av Guabinal y Ambalá | Granja | |
| | Diagonal 42 entre Carrera 6A y Calle 44 | Restrepo | |
| 6 | Mza U y T | Jordán 9 etapa | CONSORCIO SECTOR 6 |
| | Mza U y T entre Cra 11 Call 67 y 68 | Jordán 9 etapa | |
| 7 | Cra 13 CII 124 y 126 | Alberto Lleras Camargo | CONSORCIO REDES HIDRÁULICAS |
| | Mz 2 Casa1 a 7 | Ceibita | |
| | Cra 13 CII 115 y 120 | Cantabria | |
| | Cra 15 CII 120 y 121 | Praderas del Norte | |
| | Cra 16A CII 121 y 121A | Praderas del Norte | |
| | Clle 1415 Cra 17 y 19B | Montecarlo | |
| | Calle 148 entre Carrera 9 | Salado | |
| Carrera 8B entre calles 145 y 147 | Inocencio Chinca | | |
| 9 | Cr 18 F Sur entre CL 140B y Cr 18E sur | Portal los Tunjos | UNION TEMPORAL JPO19 |
| | Carrera 14 entre calles 95 y 96 | Arkanbuco | |

Fuente: Consorcio interventoría externa IBAL, septiembre de 2021.



3. CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

3.1. ASPECTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

3.1.1. Proceso de Planificación y liderazgo de la alta dirección.

El Consorcio Interventoría externa IBAL, diseñó y estructuró el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST para el Contrato de Interventoría N° 063 de 2021, con el fin de promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y trabajo, y preservar un estado de salud, bienestar físico, mental y social de los trabajadores, la prevención de accidentes y enfermedades laborales factibles de intervención, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

La interventoría, en su función de seguimiento a la aplicación del SG SST de los contratistas de obra CONSORCIO IC DISTRITO 1 contrato No. 0092 de 2021, UNION TEMPORAL AGUAS 2021 contrato No. 041 de 2021, CONSORCIO DISTRITO 4 2021 contrato No. 0069 de 2021, CONSORCIO SECTOR 6 contrato No. 0089 de 2021, CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021 contrato No. 0062 de 2021 y CONSORCIO JOP 19 contrato No. 0093 de 2021, realizó la verificación de su implementación, a través de las medidas de seguridad establecidas para el control de los factores de riesgo presentes en la ejecución de los contratos de obra en el periodo del presente informe.

3.1.2. Contratación del Personal

El este periodo el consorcio INTERVENTORÍA EXTERNA IBAL no realizó ingreso de personas, sin embargo se realiza el pago al sistema general de seguridad social del todo el personal activo, como se evidencia en el Anexo 1. Afiliaciones y pago seguridad social del informe mensual SST No. 4 de la interventoría.

Tabla 3. Personal activo del Consorcio Interventoría Externa IBAL, septiembre de 2021.

| ITEM | NOMBRE | CEDULA | CARGO |
|------|-------------------------------------|------------|-----------------------|
| 1 | Luis Francisco España Ramírez | 93.398.180 | Director |
| 2 | Jaime Orlando Vélez Osorio | 93.367.386 | Residente 1 |
| 3 | Martha Cecilia Urquiza Rivera | 60.282.762 | Residente 2 |
| 4 | Andrés Fernando Villanueva Barragán | 93.239.654 | Residente 3 |
| 5 | Juan Carlos Salazar Lozano | 93.409.239 | Residente 4 |
| 6 | German Monsalve Sanz | 10.221.652 | Asesor Hidráulico |
| 7 | Francisco Javier Cardozo Bermúdez | 2.230.520 | Profesional SST |
| 8 | Ingrid Alexandra Vanegas Otálora | 52.996.519 | Profesional Ambiental |
| 9 | José Edwin Gutiérrez Trujillo | 5.824.751 | Inspector 1 |



**INFORME MENSUAL SST AMBIENTAL No. 4
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0063
de 2021**

**CONSORCIO
INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**

| ITEM | NOMBRE | CEDULA | CARGO |
|------|--------------------------------|---------------|-------------------------|
| 10 | Franklin Góngora Arias | 93.377.886 | Inspector 2 |
| 11 | Karen Johana Monroy Niño | 1.090.461.154 | Inspector 3 |
| 12 | Juan Sebastian Sierra Ramírez | 1.110.543.502 | Inspector 4 |
| 13 | Yerson Andrés Aviles Acosta | 1.110.496.070 | Inspector 5 |
| 14 | Carol Vanessa Claros Ramírez | 1.110.505.368 | Inspector 6 |
| 15 | Juan David Ríos | 1.110.556.807 | Inspector 7 |
| 16 | Juan Carlos Segovia | 93.365.009 | Topógrafo 1 |
| 17 | Wilson Andrade Lozano | 93.371.137 | Topógrafo 2 |
| 18 | Roberto Alonso Calderón | 14.270.989 | Cadenero 1 |
| 19 | Julio Cesar González Hernández | 2.399.915 | Cadenero 2 |
| 20 | Diana Maritza Calderón Ortegón | 52.953.687 | Cadenero 3 |
| 21 | Andrés Fabián Garzón Cervantes | 93.374.004 | Cadenero 4 |
| 22 | Carolina García Grajales | 1.053.766.053 | Auxiliar Administrativo |

Fuente: Consorcio Interventoría Externa IBAL. Septiembre de 2021.

3.1.2.1. Contratación personal Consorcio IC Distrito 1.

El consorcio Interventoría Externa IBAL realizó el seguimiento al ingreso del personal nuevo en el Consorcio IC Distrito 1, verificando los soportes de afiliación a la seguridad social, como se evidencia en el Anexo afiliaciones del informe SST No. 4 del contratista. A continuación se relaciona el listado de los ingresos en el mes de septiembre de este contratista.

Tabla 4. Ingreso personal del Consorcio IC Distrito 1, septiembre de 2021.

| ITEM | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO |
|------|------------------------|----------------|----------|
| 1 | Hector Favio Ossa | 1094275699 | Ayudante |
| 2 | Miguel Ángel Cobos | 1005691282 | Ayudante |
| 3 | Jesús Antonio Suarez | 93377148 | Oficial |
| 4 | Javier Florez | 93412145 | Ayudante |
| 5 | Carlos Yesid Hernández | 93398573 | Ayudante |

Fuente: Consorcio Distrito 1. Septiembre de 2021.

3.1.2.2. Contratación personal Unión Temporal Aguas 2021.

El consorcio Interventoría Externa IBAL realizó el seguimiento al ingreso del personal nuevo en la Unión Temporal Aguas 2021, verificando los soportes de afiliación a la seguridad social, como se evidencia en el



informe SST No. 4 Anexo 1. Afiliaciones y seguridad social. A continuación se relaciona el listado de los ingresos en el mes de septiembre de este contratista.

Tabla 5. Personal que ingresa Unión Temporal Aguas 2021, septiembre de 2021.

| ITEM | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO |
|------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| 1 | Jeison Darwin Rodríguez | 1110528271 | Inspector Obra |
| 2 | Never Cardozo | 5.887.890 | Maestro |
| 3 | Rafael Chiquillo | 1049929443 | Ayudante |
| 4 | Alpidio Luna | 93207421 | Ayudante |
| 5 | Orlando Alvarado | 1005825324 | Ayudante |
| 6 | Luis Fernando Campos Restrepo | 1006117194 | Auxiliar de tráfico |
| 7 | Cristian Andrés Cuesta Soto | 1110506932 | Auxiliar de tráfico |
| 8 | Jhonatan Andrés Vargas Marin | 1088332777 | Auxiliar de tráfico |
| 9 | Julian Andrés Gutiérrez Delgado | 1234645536 | Auxiliar de tráfico |
| 10 | Davinis Stiven Córdoba Ortiz | 1234639366 | Auxiliar de tráfico |
| 11 | Abner Orlando Vargas | 1110556258 | Ayudante |
| 12 | Alvaro Augusto Marulanda | 1234641703 | Ayudante |
| 13 | Erinson Javier Garzon | 1106486303 | Ayudante |
| 14 | Ernesto Betancourth | 93384138 | Ayudante |
| 15 | Jhonatan Garcia Robles | 93237164 | Ayudante |
| 16 | Kevin Stiben Hernandez | 1006122262 | Ayudante |
| 17 | Luis Albeto Martinez | 1110468822 | Ayudante |
| 18 | Andrés Felipe Martínez | 1110578683 | Ayudante |
| 19 | Anival Arias | 8,03523E+14 | Ayudante |
| 20 | Juan Carlos Candía | 934040320 | Operador |
| 21 | Juan Carlos Mora Arias | 93470980 | Ayudante |
| 22 | Michael Serna | 1110487803 | Ayudante |

Fuente: Unión Temporal Aguas 2021. Septiembre de 2021.

3.1.2.3. Contratación personal Consorcio Distrito 4 2021.

El consorcio Interventoría Externa IBAL realizó la verificación de la documentación necesaria para el ingreso del personal nuevo en el Consorcio Distrito 4 2021, revisando los soportes de afiliación a la seguridad social, como se evidencia en el informe SST No. 4 Anexo Afiliaciones y seguridad social. A continuación, se relaciona el listado de los ingresos en el mes de septiembre de este contratista.



Tabla 6. Personal que ingresa Consorcio Distrito 4, septiembre de 2021.

| ITEM | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO |
|------|------------------------|----------------|----------|
| 1 | Junior Andrés Monsalve | 1033797066 | Auxiliar |
| 2 | Jose William Cárdenas | 93361462 | Oficial |
| 3 | Albeiro Ramírez | 93341276 | Oficial |
| 4 | José Fernando Linares | 93340560 | Maestro |
| 5 | Hamilton Mosquera | 1076386754 | Auxiliar |

Fuente: Consorcio Distrito 4. Septiembre de 2021.

3.1.2.4. Contratación personal Consorcio Sector 6.

El consorcio Interventoría Externa IBAL realizó el seguimiento al ingreso del personal nuevo en el Consorcio Sector 6, verificando los soportes de afiliación a la seguridad social, como se evidencia en el informe SST No. 2. A continuación se relaciona el listado de los ingresos en el mes de septiembre de este contratista.

Tabla 7. Personal que ingresa Consorcio Sector 6, septiembre de 2021.

| ITEM | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO |
|------|---------------------------------|----------------|----------|
| 1 | Diego Fabián Ospina Sanabria | 1106396090 | Oficial |
| 2 | Johan Sebastian Ospina Martínez | 1106396537 | Oficial |
| 3 | Reinol Osorio Son | 10111818 | Oficial |
| 4 | Carlos Andrés Tovar Quintero | 1110542812 | Ayudante |

Fuente: Consorcio Sector 6. Septiembre de 2021.

3.1.2.5. Contratación personal Consorcio Redes Hidráulicas.

El consorcio Interventoría Externa IBAL realizó el seguimiento al ingreso del personal nuevo en el consorcio Redes Hidráulicas, verificando los soportes de afiliación a la seguridad social, como se evidencia en el informe SST No. 4 Anexo 15, seguridad social. A continuación se relaciona el listado de los ingresos en el mes de septiembre de este consorcio. En este periodo se presentó un ingreso retiro por lo cual solo se registran 10 ingresos.

Tabla 8. Personal que ingresa Consorcio Redes Hidráulicas, septiembre de 2021.

| ITEM | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO |
|------|--------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | German Gil García | 93413090 | Oficial de obra |
| 2 | Jelber Hernández | 1110547488 | BOAL |
| 3 | Carlos Alberto Montilla | 93393554 | BOAL |
| 4 | Jairo Alonso | 74321968 | BOAL |
| 5 | Carlos Alfredo Paternina | 1102855410 | Ayudante |



**INFORME MENSUAL SST AMBIENTAL No. 4
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0063
de 2021**

**CONSORCIO
INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**

| | | | |
|----|-----------------------|------------|----------|
| 6 | Jeison Andrés Ruiz | 1005719979 | Ayudante |
| 7 | Jesús Adolfo Andrade | 14398399 | Ayudante |
| 8 | José Walter Gómez | 1006130089 | Ayudante |
| 9 | Luis Edicson Vergaño | 1110516625 | Ayudante |
| 10 | Manuel Enrique Pinzón | 1071168009 | Operador |

Fuente: Consorcio Redes Hidráulicas. Septiembre de 2021.

3.1.2.6. Contratación personal Unión Temporal JPO 19.

El consorcio Interventoría Externa IBAL realizó el seguimiento al ingreso del personal nuevo en la Unión Temporal JPO 19, verificando los soportes de afiliación a la seguridad social, como se evidencia en el informe SST No. 4 Anexo Afiliaciones al sistema de seguridad social. A continuación se relaciona el listado de los ingresos en el mes de septiembre de este contratista.

Tabla 9. Personal que ingresa Unión Temporal JPO 19, septiembre de 2021.

| ITEM | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO |
|------|----------------------------------|----------------|----------|
| 1 | Carlos Javier Hurtado Gallego | 93361041 | Ayudante |
| 2 | Duvernei Agudelo Muñoz | 93236087 | Ayudante |
| 3 | Juan Carlos Montealegre Capera | 5828179 | Ayudante |
| 4 | Hernan Javier Herrera Rodríguez | 93296533 | Ayudante |
| 5 | Juan Camilo Saavedra Betancourth | 1110561278 | Auxiliar |

Fuente: Consorcio JPO 19. Septiembre de 2021.

3.1.3. Política de seguridad y salud en el trabajo.

El consorcio Interventoría Externa IBAL cuenta con políticas de seguridad y salud en el trabajo y prevención de alcohol, tabaco y drogas, las cuales se encuentran publicados en la oficina de la interventoría y fueron socializados a todo el personal que fue vinculado, a través de la inducción SST.

La interventoría, en la revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratistas CONSORCIO IC DISTRITO 1, UNION TEMPORAL AGUAS 2021, CONSORCIO DISTRITO 4 2021, CONSORCIO SECTOR 6, CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021 y CONSORCIO JOP 19, corroboró que cuenta con una Política de SST, complementado con las Políticas de prevención del consumo de alcohol, drogas y tabaco. En revisión de campamentos, la interventoría evidenció que las políticas se encontraban publicadas en los campamentos de cada uno de los frentes de obra de los contratistas.



Foto 1. Publicación Políticas Distrito 1




Foto 2. Publicación Políticas Distrito 3.

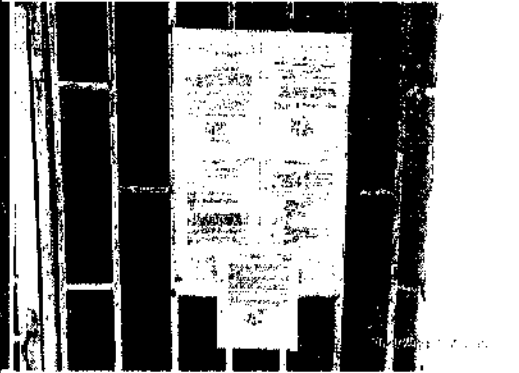


Foto 3. Publicación Políticas Distrito 3

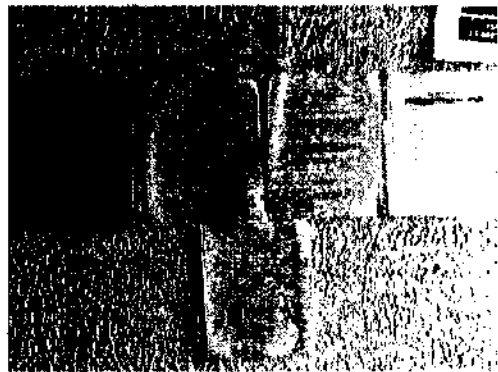



Foto 4. Publicación Políticas Distrito 6.



Foto 5. Publicación Políticas Distrito 7.



Foto 6. Publicación Políticas Distrito 9.





3.1.4. Marco Legal en Seguridad y Salud en el Trabajo

El consorcio Interventoría Externa IBAL cuenta con una matriz de requisitos legales relacionados con el aspecto de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se encuentra incluido dentro del SG SST que fue entregado al IBAL, en la fase preliminar. En el seguimiento realizado al SG SSG de los contratistas CONSORCIO IC DISTRITO 1, UNION TEMPORAL AGUAS 2021, CONSORCIO DISTRITO 4 2021, CONSORCIO SECTOR 6, CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021 y CONSORCIO JOP 19, se evidenció que también cuenta con la matriz de requisitos legales ajustado a la ejecución de las actividades establecidas para cada uno de los contratos.

3.1.5. Reglamento de Higiene Y Salud Ocupacional

El consorcio Interventoría Externa IBAL estableció el reglamento de higiene y salud ocupacional en el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo contrato de interventoría No. 063 de 2021 y realizó su publicación en la oficina de interventoría. En verificación realizada por la interventoría en los campamentos de los contratistas, se observó que se encuentran publicados su reglamento de higiene y salud ocupacional, el cual fue aprobado previo al inicio de las actividades constructivas.

3.1.6. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST

El consorcio Interventoría Externa IBAL designó a Francisco Javier Cardozo Bermúdez como representante del consorcio y al señor FRANKLIN GONGORA ÁRIAS como representante de los trabajadores, tal como se evidencia en el acta de conformación del 27 de mayo de 2021.

El consorcio IC Distrito 1, realizó la reunión del COPASST para este periodo el día 7 de septiembre de 2021, como se evidencia en el Acta No. 2 del anexo acta de reunión COPASST del informe SST No. 3 del contratista.

El contratista UNION TEMPORAL AGUAS 2021 realizó la reunión mensual del COPASST, como se evidencia en el acta de reunión realizada el 30 de septiembre de 2021 el cual está consignado en el anexo 7 de SG SST No. 4.

El consorcio Distrito 4, realizó reunión COPASST el día 27 de septiembre de 2021, como se evidencia en el anexo Acta de Reunión del informe SST No. 3.

El consorcio Sector 6, realizó la reunión del COPASST el día 17 de septiembre de 2021 como se evidencia en el anexo Acta COPASST del informe SST No. 3 del contratista.



**INFORME MENSUAL SST AMBIENTAL No. 4
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0063
de 2021**

**CONSORCIO
INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**

El contratista CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021 realizó la reunión del COPASST según acta No. 4 de fecha del 27 de septiembre de 2021, como se evidencia en el anexo 10 de su informe mensual SST No. 3.

El consorcio JPO 19, realizó conformación del COPASST, como se evidencia en el acta de conformación del día 27 de septiembre de 2021 incluida en el informe SST No. 3 del contratista.

3.1.7. Comité de Convivencia Laboral.

El consorcio Interventoría Externa IBAL conformó el comité de convivencia Laboral, mediante acta de fecha 25 de junio de 2021, designando Francisco Javier Cardozo Bermúdez como representante del consorcio y al señor FRANKLIN GONGORA ÁRIAS como representante de los trabajadores, como se evidencia en el anexo 4. ACTA DE CONFORMACION CCL, del informe mensual SST No. 1 de la interventoría.

El consorcio ID Distrito 1, tiene programado su reunión en el mes de octubre. La unión temporal Aguas 2021, tiene registrado CCL de uno de sus consorciados y no registró reunión para este periodo. El consorcio Sector 6, realizó reunión CCL el día 17 de septiembre de 2021. Los demás contratistas no registraron reunión de CCL para este periodo.

3.1.8. Diagnóstico integral de condiciones de trabajo.

Los contratistas CONSORCIO IC DISTRITO 1, UNION TEMPORAL AGUAS 2021, CONSORCIO DISTRITO 4 2021, CONSORCIO SECTOR 6, CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021 y CONSORICO JOP 19, identificaron y priorizaron los factores de riesgo en el formato de matriz de riesgo, y a través de él se identificaron las condiciones de riesgo presentes en las actividades que se desarrollaran en cada una de las áreas en las diferentes etapas del contrato, definiendo las medidas de intervención para cada riesgo.

3.2. IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

3.2.1. Sub programa de Medicina Preventiva y del Trabajo.

3.2.1.1. Exámenes médicos.

En este periodo el consorcio Interventoría Externa IBAL no realizó exámenes médicos ocupacionales de ingreso debido a que no se realizaron ingresos para este periodo.

En verificación documental se evidenció que los contratistas realizaron los exámenes médicos ocupacionales de ingreso a todo su personal y fueron adjuntados en sus informes mensuales SST del mes de septiembre de 2021.



3.2.1.2. Programa de Ausentismo Laboral.

El consorcio Interventoría Externa IBAL, para el periodo del presente informe, tiene una tasa de ausentismo general de 0% debido a que se no se presentó pérdida de días por accidentes o enfermedades laborales. Ver Anexo. Estadísticas SG SST, mensual SST No. 4 de interventoría.

A continuación se relaciona los días perdidos por accidentes laborales generados este periodo en los diferentes contratistas:

Tabla 10. Relación de ausentismo contratistas, septiembre de 2021.

| EMPRESA | DIAS PERDIDOS |
|----------------------------------|---------------|
| CONSORCIO IC DISTRITO 1 | 0 |
| UNION TEMPORAL AGUAS 2021 | 0 |
| CONSORCIO DISTRITO 4 2021 | 2 |
| CONSORCIO SECTOR 6 | 3 |
| CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021 | 0 |
| CONSORICO JOP 19 | 2 |

Fuente: Consorcio Interventoría Externa IBAL. Septiembre de 2021.

3.2.2. Sub programa de Higiene y seguridad Industrial.

3.2.2.1. Procedimientos de trabajo seguro.

La interventoría realizó el seguimiento de los procedimientos de seguridad en las actividades realizadas en el desarrollo de los contratos ejecutados por los contratistas CONSORCIO IC DISTRITO 1, UNION TEMPORAL AGUAS 2021, CONSORCIO DISTRITO 4 2021, CONSORCIO SECTOR 6, CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021 y CONSORICO JOP 19.

- **DISTRITO 1**

En este distrito se encuentra desarrollando las obras de rehabilitación y/o recuperación y/o reposición de las redes de acueducto y alcantarillado el consorcio DISTRITO 1, implementando el SG SST con las siguientes actividades:

En el frente 20 de Julio, se encuentran adelantando las labores de excavación manual y mecánica, instalando sistema de entibado apropiado para la estabilización del talud. Adicionalmente se realizan

labores de instalación de tubería, llenos y compactación, cumpliendo con los procedimientos de seguridad establecidos para estas actividades. Fue requerido al contratista por la limpieza de vías y manejo de materiales y RCD en obra.

Foto 7. Excavación con entibado.




Foto 8. Excavación manual.




En el frente San Diego, se encuentran adelantando las labores de excavación mecánica y manual, instalando sistema de entibado apropiado para la estabilización del talud. Adicionalmente se realizan labores de instalación de tubería, llenos y compactación, cumpliendo con los procedimientos de seguridad establecidos para estas actividades. Fue requerido al contratista por el manejo de materiales y RCD.

Foto 9. Excavación mecánica.



Foto 10. Excavación manual.



- **DISTRITO 3**

En este distrito se encuentra desarrollando las obras de rehabilitación y/o recuperación y/o reposición de las redes de acueducto y alcantarillado La Unión Temporal Aguas 2021, implementando el SG SST con las siguientes actividades:

En el frente Las Ferias (calle 24 Cra 1 y 2 sur), se encuentran adelantando las labores de excavación mecánica, instalando sistema de entibado apropiado para la estabilización del talud. Adicionalmente se realizan labores de instalación de tubería, llenos y compactación. La interventoría evidenció en campo el mejoramiento en la instalación de entibado en excavaciones de 1,5 metros e implementación de EP individuales y colectivos para el trabajo en alturas.

Foto 11. Excavación con sistema de entibado.



Foto 12. Excavación con sistema de entibado.



En el frente Villa Claudia (Cra 10 sur Cile 24 y 27), se encuentran adelantando las labores de excavación mecánica y manual, instalando sistema de entibado apropiado para la estabilización del talud. Adicionalmente se realizan labores de instalación de tubería, llenos y compactación. La interventoría evidenció en campo que se tuvieron en cuenta los requerimiento realizados por la interventoría sobre mejoramiento de instalación de entibado en excavaciones de 1,5 metros e implementación de EP individuales y colectivos para el trabajo en alturas. Se realizó requerimiento sobre el mejoramiento del orden y aseo en la obra y manejo adecuado de RCD y materiales

Foto 13. Excavación con entibado.




Foto 14. Excavación manual y señalización.



En el frente Ricaurte, se encuentran adelantando las labores de excavación mecánica y manual. Adicionalmente se realizan labores de instalación de tubería, llenos y compactación, cumpliendo con los procedimientos de seguridad establecidos para estas actividades. La interventoría realizó requerimiento sobre el mejoramiento del aislamiento y protección de cajas y orden y limpieza en el frente de obra.

Foto 15. Excavación manual y llenos.



Foto 16. Señalización áreas de riesgo.



En el frente Villa Luces, se encuentran adelantando las labores de excavación mecánica, instalando sistema de entibado de manera parcial para la estabilización del talud. Adicionalmente se realizan labores de instalación de tubería, llenos y compactación. La interventoría realizó requerimiento mediante oficio sobre mejoramiento de instalación de entibado en excavaciones de 1,5 metros e implementación de EP individuales y colectivos para el trabajo en alturas, y la utilización de EPP para manejo de aguas servidas.

Foto 17. Excavación sin entibado parcial.




Foto 18. Excavación sin sistema de entibado.



DISTRITO 4

En este distrito se encuentra desarrollando las obras de rehabilitación y/o recuperación y/o reposición de las redes de acueducto y alcantarillado el consorcio DISTRITO 4, implementando el SG SST con las siguientes actividades:

En el frente de la calle 27 fueron realizadas excavaciones manuales para la instalación de tubería domiciliaria, lo cual se dificultó por las condiciones del suelo que generaban constante riesgo de desprendimiento de material. También se realizaron labores de instalación de llenos y compactación, cumpliendo con los procedimientos de seguridad establecidos para estas actividades.

Foto 19. Excavación manual.



Foto 20. Excavación manual.



En el frente de la calle 42 fueron realizadas excavaciones con sistema de entibado que garantizaban la protección en la totalidad del talud y excavación es manuales para domiciliarias. Adicional a esto fueron desarrolladas actividades de instalación de tubería, llenos y compactación de material, cumpliendo con los procedimientos de seguridad establecidos para estas actividades.

Foto 21. Excavación manual.


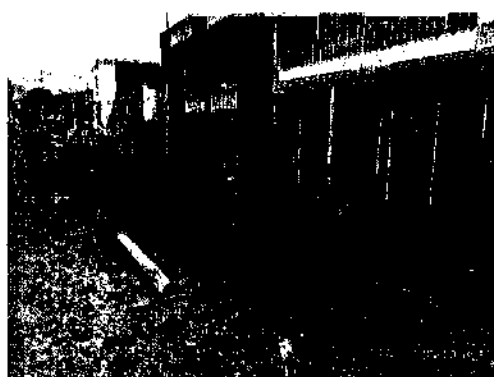


Foto 22. Excavación manual.

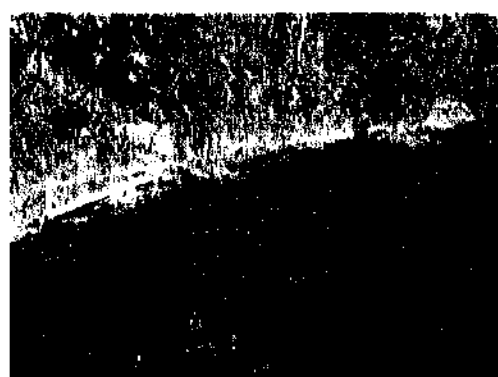

DISTRITO 6

En este distrito se encuentra desarrollando las obras de rehabilitación y/o recuperación y/o reposición de las redes de acueducto y alcantarillado el consorcio Sector 6, implementando el SG SST con las siguientes actividades:

En el frente Jordán 9 etapa, se encuentran adelantando las labores de excavación manual para redes domiciliarias, instalación de tubería, llenos y compactación, cumpliendo con los procedimientos de seguridad establecidos para estas actividades, pero la interventoría realizó requerimiento debido a la falta de señalización de zonas de riesgo en la intervención de andenes, falta de cerramiento en los frentes de obra y protección de áreas de riesgo.

Foto 23. Excavación sin señalización.





Foto 24. Áreas de riesgo sin señalización.



DISTRITO 7

En este distrito se encuentra desarrollando las obras de rehabilitación y/o recuperación y/o reposición de las redes de acueducto y alcantarillado el consorcio Sector 6, implementando el SG SST con las siguientes actividades:

En el frente La Cabaña, se encuentran adelantando las labores de excavación manual para redes domiciliarias, instalación de tubería, llenos y compactación, cumpliendo con los procedimientos de seguridad establecidos para estas actividades, pero la interventoría realizó requerimiento debido a la falta de señalización de zonas de riesgo, falta de cerramiento en los frentes de obra y orden y aseo en la obra.

Foto 25. Excavación manual.



Foto 26. Excavación manual.



En el frente Praderas del norte, se encuentran adelantando las labores de excavación manual para redes domiciliarias, instalación de tubería, llenos y compactación, cumpliendo con los procedimientos de seguridad establecidos para estas actividades, pero la interventoría realizó requerimiento debido a la falta de señalización de zonas de riesgo en la intervención de andenes, falta de cerramiento en los frentes de obra y orden y aseo en manejo materiales.

Foto 27. Excavación manual.



Foto 28. Excavación manual.



En el frente ente Mz C barrio Alberto Lleras (Cementerio), se encuentran adelantando las labores de excavación manual para redes domiciliarias, instalación de tubería, llenos y compactación, cumpliendo con los procedimientos de seguridad establecidos para estas actividades, pero la interventoría realizó requerimiento debido a la falta de señalización de zonas de riesgo en la intervención de andenes, falta de cerramiento en los frentes de obra y protección de áreas de riesgo.

Foto 29. Excavación manual.



Foto 30. Excavación manual.



En el frente Montecarlo, se encuentran adelantando las labores de excavación manual para redes domiciliarias, instalación de tubería con sistema de entibado, llenos y compactación, cumpliendo con los procedimientos de seguridad establecidos para estas actividades, pero la interventoría realizó requerimiento debido a la falta de cerramiento en los frentes de obra, manejo de materiales y protección de áreas de riesgo.

Foto 31. Excavación sin entibado.



Foto 32. Excavación con sistema de entibado.



En el frente Paarquadero, se encuentran adelantando las labores de excavación manual para redes domiciliarias, instalación de tubería, llenos y compactación, cumpliendo con los procedimientos de seguridad establecidos para estas actividades, pero la interventoría realizó requerimiento debido a la falta de señalización de zonas de riesgo en la intervención de andenes, falta de cerramiento en los frentes de obra y protección de áreas de riesgo.

Foto 33. Excavación sin entibado.




Foto 34. Excavación con sistema de entibado.



En el frente Salado, se encuentran adelantando las labores de excavación manual para redes, instalación de tubería, llenos y compactación, cumpliendo con los procedimientos de seguridad establecidos para estas actividades, cumpliendo con los procedimientos de seguridad establecidos para esta actividad.

Foto 35. Excavación sin entibado.



Foto 36. Excavación con sistema de entibado.



En el frente Chincá, realizó labores de excavación mecánica, utilizando el método de terraceo para disminuir el riesgo por derrumbe. El desarrollo de las actividades de excavación, fueron detenidas por no contar con las medidas de protección de taludes y del personal que se encontraba dentro de la excavación. Fue solicitado al contratista instalación de sistema de entibado continuo y entrega de dotación para trabajo en alturas al personal. El contratista atendió el requerimiento y subsanó instando el sistema de entibado y entregando amés y línea de vida para los trabajadores que desarrollaban las actividades dentro de la excavación y salida segura del personal con la instalación de escalera.

Foto 37. Excavación sin entibado.





Foto 38. Excavación con sistema de entibado.

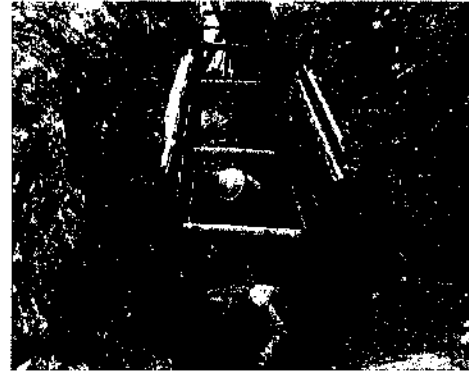

DISTRITOS 9 Y 10


En este distrito se encuentra desarrollando las obras de rehabilitación y/o recuperación y/o reposición de las redes de acueducto y alcantarillado el consorcio JPO 19, implementando el SG SST con las siguientes actividades:

En el frente Arkanbucu, se encuentran adelantando las labores de excavación mecánica y manual para instalación de tubería con instalación de entibado, llenos y compactación, cumpliendo con los procedimientos de seguridad establecidos para estas actividades, pero la interventoría realizó requerimiento para el mejoramiento del aislamiento de la obra.

Foto 39. Excavación sin entibado.



Foto 40. Excavación con sistema de entibado.

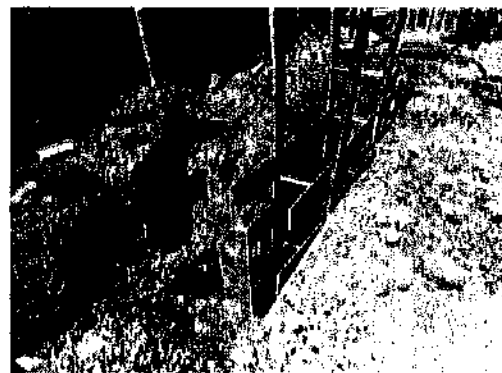

En el frente Portal de los Tunjos, se encuentran adelantando las labores de excavación mecánica y manual para instalación de tubería, llenos y compactación, cumpliendo con los procedimientos de seguridad

establecidos para estas actividades. La interventoría solicita mejorar el orden y aseo de la obra en el manejo de materiales y RCD.

Foto 41. Excavación sin entibado.



Foto 42. Excavación con sistema de entibado.



3.2.2.2. Dotación de Elementos de protección Personal.

El consorcio Interventoría Externa IBAL realizó entrega de los elementos de dotación personal en este periodo a todo el personal de interventoría, acorde a la actividad de seguimiento que se va a realizar.

En el seguimiento realizado por la interventoría, se corroboró mediante revisión en campo, que todos los contratista mejoraron en el cumplimiento del uso de EPP, pero fue evidenciado en campo que el personal solo cuenta con un overol, lo cual dificulta la continuidad en el porte adecuado de este elemento. En el Distrito 4 se solicita mejorar la entrega de protectores respiratorios al personal.

Foto 43. Personal con EPP. Distrito 1.



Foto 44. Personal con EPP. Distrito 1.



Foto 45. Personal con EPP. Distrito 3.



Foto 46. Personal con EPP. Distrito 3.



Foto 47. Personal con EPP. Distrito 4.



Foto 48. Personal sin EPP. Distrito 6.



Foto 49. Personal con EPP. Distrito 7.



Foto 50. Personal sin EPP. Distrito 10.



3.2.2.3. Señalización y demarcación.

Fue verificado por parte de la interventoría, la instalación del cerramiento perimetral de la obra, garantizando de esta manera el aislamiento de los riesgos propios de la ejecución de las actividades constructivas.

En este periodo los contratistas realizaron el cerramiento de los frentes de obra, utilizando lona verde, soportado en parales de guadua, con el fin de aislar los riesgos generados en las áreas de intervención. La interventoría realizó seguimiento a las actividades de mantenimiento del cerramiento y se recomendó al contratista el mantenimiento continuo de los cerramientos de los frentes que se encuentran activos al cierre de este periodo.

Foto 51. Cerramiento Distrito 1, 20 de julio



Foto 52. Cerramiento Distrito 1, San Diego

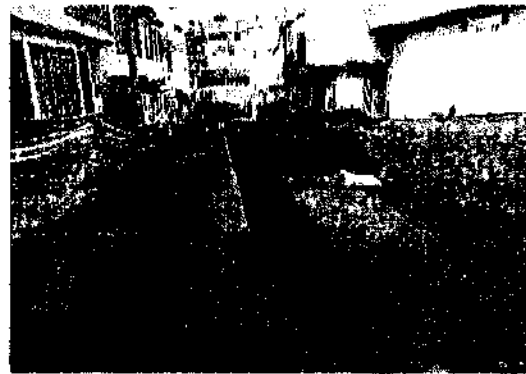


Foto 53. Cerramiento Distrito 3, Las Ferias



Foto 54. Cerramiento Distrito 3, Ricaurte.





Foto 55. Cerramiento Dto 3 Villa Claudia



Foto 56. Cerramiento Dto 3 Villa Luces



Foto 57. Cerramiento Distrito 4, Calle 28



Foto 58. Cerramiento Distrito 4, Calle 42



Foto 59. Cerramiento Dto 6, Jordán



Foto 60. Cerramiento Dto 7, Cabaña





Foto 61. Cerramiento Dto 7, praderas



Foto 62. Cerramiento Dto 7 Cementerio



Foto 63. Cerramiento Dto 7 Montecarlo



Foto 64. Cerramiento Dto 7 Parqueadero



Foto 65. Cerramiento Dto 7, Salado



Foto 66. Cerramiento Dto 7 Chinca


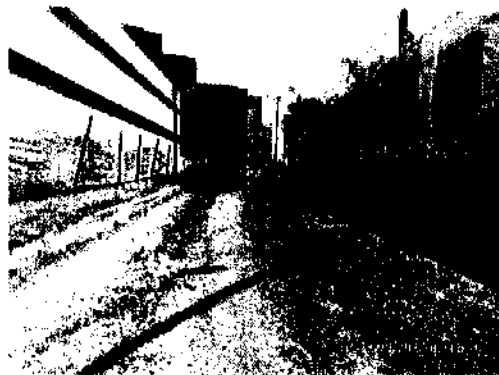


Foto 67. Cerramiento Dto 9, Los Tunjos



Foto 68. Cerramiento Dto 7 Arkanbuco.

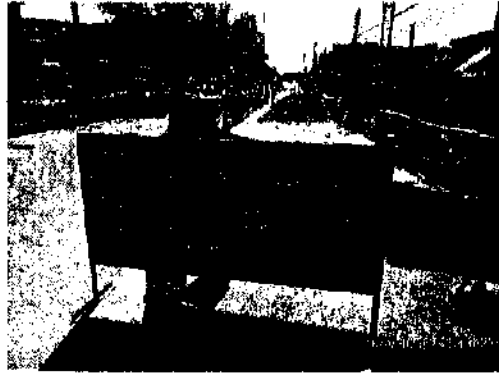

3.2.2.4. Plan de Emergencias

El consorcio Interventoría Externa IBAL cuenta con un plan de emergencias que establece las herramientas necesarias para planear, organizar, dirigir y controlar las actividades a seguir frente a la ocurrencia de una emergencia. Para darle cumplimiento, el consorcio ubicó los elementos de emergencia en la oficina.

- **DISTRITO 1.**

En el seguimiento realizado al Consorcio ID DISTRITO 1, cuenta con Brigada de emergencias y realiza la implementación del plan de emergencia con la instalación de los elementos de emergencia en el campamento en los frentes de obra.

Foto 69. Elementos emergencia 20 julio

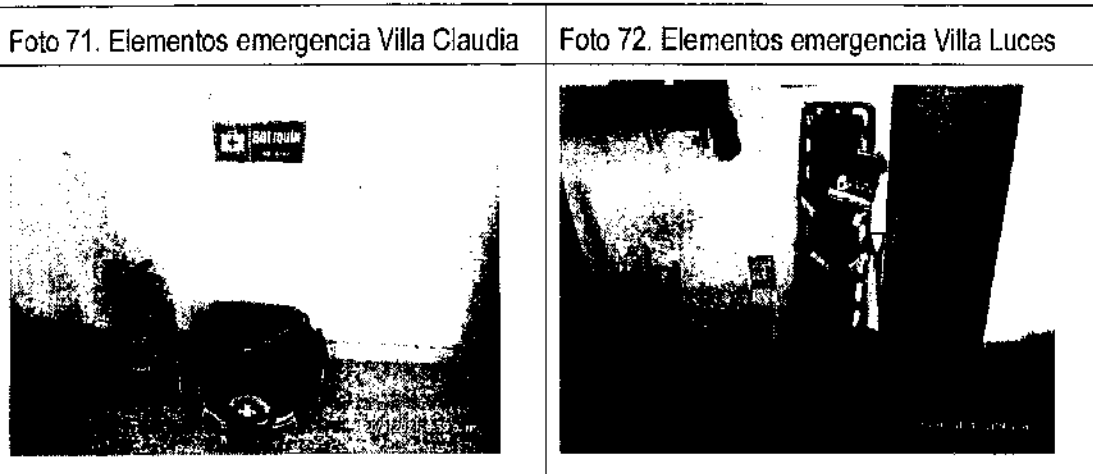


Foto 70. Elementos emergencia San Diego.



- **DISTRITO 3.**

En el seguimiento realizado a La Unión Temporal Aguas 2021, se verificó la instalación de los elementos de emergencia en el campamento en los frentes de obra. En el frente Ricaurte se recomendó realizar el mejoramiento en la ubicación de estos elementos.



- **DISTRITO 4.**

En el seguimiento realizado al Consorcio Distrito 4, se verificó la instalación de los elementos de emergencia en el campamento en los frentes de obra, pero en el frente de la granja, parte de estos elementos fueron hurtados y al cierre de este periodo no se habían reemplazado.

Foto 73. Elementos emergencia Calle 42



- **DISTRITO 6.**

En el seguimiento realizado al Consorcio Sector 6, se evidenció la instalación de los elementos de emergencia en el campamento en los frentes de obra.

Foto 74. Elementos emergencia Jordán



• DISTRITO 7.

En el seguimiento realizado al Consorcio REDES HIDRAULICAS 2021, se evidenció la instalación de los elementos de emergencia en el campamento en los frentes de obra y la implementación del ingreso y salida segura del personal en las excavaciones mediante la ubicación de escaleras.

Foto 75. Elementos emergencia Montecarlo




Foto 76. Elementos emergencia Cementerio.



Foto 77. Elementos emergencia Chinca



Foto 78. Elementos emergencia Salado.



• **DISTRITO 9.**

En el seguimiento realizado a la Unión Temporal JPO 19, se evidenció la instalación de los elementos de emergencia en el campamento en los frentes de obra.

Foto 79. Elementos emergencia Arkanbuco




Foto 80. Elementos emergencia Los Tunjos.



3.2.2.5. Inspecciones Planeadas.

La interventoría mediante revisión documental e inspecciones planeadas en campo, verificó la ejecución del cronograma de inspecciones del contratista. Los hallazgos encontrados fueron entregados mediante requerimiento escrito al contratista para su subsanación.

En verificación documental realizada al contratista Consorcio ID DISTRITO 1, se evidenció que en el mes de septiembre de 2021 realizó inspecciones de elementos de emergencia, maquinaria, equipo y EPP, como se evidencia en el Informe SST No. 3 contratista.



**INFORME MENSUAL SST AMBIENTAL No. 4
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0063
de 2021**

**CONSORCIO
INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**

El contratista UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021, realizó en el mes de septiembre inspecciones de elementos de emergencia, maquinaria, herramienta menor, EPP y señalización temporal en obra, como se evidencia en el anexo 9 del Informe SST No. 4 del contratista. Esa información fue verificada mediante revisión documental por parte de la interventoría.

En verificación documental realizada al contratista Consorcio DISTRITO 4, se evidenció que no aporta los soportes de gestión relacionados a las inspecciones en el mes de septiembre de 2021. La interventoría reitera la solicitud sobre el diligenciamiento de formatos para evidenciar esta gestión.

En verificación documental realizada al contratista Consorcio SECTOR 6, se evidenció que en el mes de septiembre de 2021 realizó inspecciones de maquinaria y equipos, como se evidencia en los anexos del Informe SST No. 3 contratista.

En verificación documental realizada al contratista Consorcio REDES HIDRAULICAS, se evidenció que en el mes de septiembre de 2021 realizó inspecciones de elementos de emergencia, maquinaria y equipos, como se evidencia en el Anexo 7 del Informe SST No. 4 contratista.

En verificación documental realizada al contratista UNIÓN TEMPORAL JPO 19, se evidenció que en el mes de septiembre de 2021 realizó inspección general de obra, inspección a herramientas manuales y equipos, como se evidencia en el Informe SST No. 3 contratista.

3.2.2.6. Estadísticas SST.

Para el periodo del presente informe no se presentaron accidentes ni enfermedades laborales en el consorcio Interventoría Externa IBAL, como se relaciona en las Tablas 5 y 6.

Tabla 11. Indicadores de accidentalidad. Consorcio INTERVENTORÍA EXTERNA IBAL mes de septiembre de 2021.

| AÑO 2020/2021 | DIAS PROGRAM DE TRABAJO | TOTAL HORAS HOMBRE TRABAJADAS | PROM. TRABAJA DDR | INCIDENTES | | | | |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | ACCIDENTE TRABAJO INCAPACITANT E | ACCIDENTES MDRTALES | ACCIDENTE TRABAJO SIN INCAPACIDAD | DIAS INCAPACIDAD | TOTAL ACCIDENTES |
| Junio 2021 | 24 | 3.872 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio 2021 | 25 | 3.960 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto 2021 | 24 | 3.960 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septiembre 2021 | 26 | 4.224 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fuente: Consorcio INTERVENTORÍA EXTERNA IBAL. Septiembre de 2021.



Tabla 12. Indicadores SST. Consorcio INTERVENTORÍA EXTERNA IBAL mes de septiembre de 2021.

| MES | F.A. Frecuencia de accidentalidad | S.A. Severidad de accidentalidad | P.A.M. Proporción de accidentes de accidentes mortales | INCIDENCIA Enfermedad Laboral | Prevalencia Enfermedad Laboral | AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA |
|--------------------|---|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Junio 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septiembre 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fuente: Consorcio INTERVENTORÍA EXTERNA IBAL. Septiembre de 2021.

En el seguimiento realizado a los contratistas, se evidenció mediante revisión documental que cuentan con el procedimiento para reportar e investigar accidentes en caso que se presenten algún evento en el desarrollo de la obra. En el mes de septiembre de 2021 se presentaron accidentes en la Unión Temporal JPO 19 y los consorcios Distrito 4 y Sector 6, el cual fue reportado pero la ARL posteriormente no lo cataloga como accidente laboral. A continuación se relacionan los accidentes presentados:

| EMPRESA | NUMERO DE ACCIDENTES |
|----------------------------------|-------------------------|
| CONSORCIO IC DISTRITO 1 | 0 |
| UNION TEMPORAL AGUAS 2021 | 0 |
| CONSORCIO DISTRITO 4 2021 | 1 |
| CONSORCIO SECTOR 6 | 1 |
| CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021 | 0 |
| CONSORICO JOP 19, | 1 |

3.2.2.7. Inducción y Capacitación.

La interventoría mediante verificación documental corroboró que los contratistas realizaron inducción SST a todas las personas que ingresaron y capacitación de acuerdo al cronograma de capacitaciones propuestas, como se evidencian en los anexos de los informes SST de este periodo.

3.2.2.8. Protocolo de Bioseguridad para COVID-19.

El consorcio INTERVENTORÍA EXTERNA IBAL implementó el protocolo de bioseguridad para COVID-19, consistente en la toma de condiciones diarias de salud, lavado de manos cada 3 horas, área de lavado de manos y desinfección tanto en los frentes de obra, como en el ACUAPUNTO.

- **Estadísticas Protocolo de Bioseguridad para COVID-19.**

En el mes de septiembre de 2021, en el consorcio INTERVENTORÍA EXTERNA IBAL no se presentaron casos confirmados para COVID-19. Se realizó el seguimiento diario de las condiciones de salud a todo el personal de la interventoría, para identificar síntomas asociados a esta enfermedad de manera temprana.

Tabla 13. Estadísticas implementación protocolo COVID-19 Consorcio INTERVENTORÍA EXTERNA IBAL. Junio de 2021.

| MES | CASOS CON SOSPECHA PARA COVID-19 | CASOS CONFIRMADOS PARA COVID-19 | SEGUIMIENTO A CASOS CONFIRMADOS PARA COVID-19 |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| Junio 2021 | 0 | 0 | 0 |
| Julio 2021 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto 2021 | 0 | 0 | 0 |
| Septiembre 2021 | 0 | 0 | 0 |

Fuente: Consorcio INTERVENTORÍA EXTERNA IBAL, Septiembre de 2021.

Los contratistas, implementaron el protocolo de bioseguridad realizando, desinfección y lavado de manos en los campamentos. La interventoría mediante recorridos de campo, evidenció que el personal del contratista cuenta con los elementos de protección respiratoria y no presentó casos con sospecha para COVID-19, ni casos confirmados para COVID-9, en el periodo del presente informe.

Foto 81. Área de lavado de manos. Consorcio IC Distrito 1.

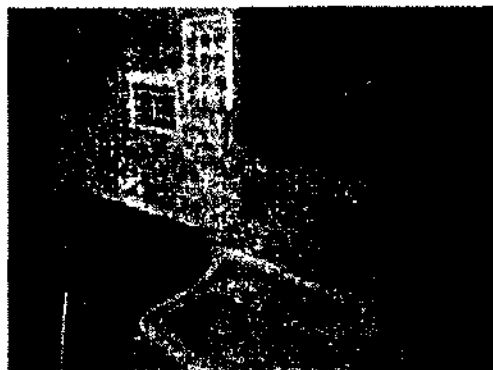


Foto 82. Área de lavado de manos. Consorcio IC Distrito 1.

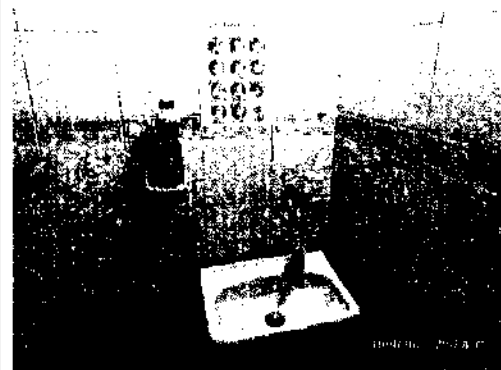


Foto 83. Área de lavado de manos. Unión Temporal Aguas 2021.



Foto 84. Área de lavado de manos. Consorcio Distrito 4.

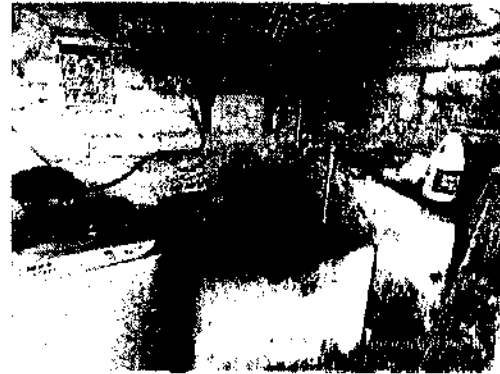


Foto 85. Área de lavado de manos. Consorcio Redes Hidráulicas 2021.



Foto 86. Área de lavado de manos. Consorcio Redes Hidráulicas 2021.



4. CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL DE OBRAS - PEGMA.

Los contratistas por los contratistas de obra CONSORCIO IC DISTRITO 1 contrato No. 0092 de 2021, UNION TEMPORAL AGUAS 2021 contrato No. 041 de 2021, CONSORCIO DISTRITO 4 2021 contrato No. 0069 de 2021, CONSORCIO SECTOR 6 contrato No. 0089 de 2021, CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021 contrato No. 0062 de 2021 y CONSORICO JOP 19 contrato No. 0093 de 2021, cuentan con el Programa de ejecución de la Guía de Manejo Ambiental de Obra – PEGMA ajustado a cada uno de los contratos, los cuales contienen las medidas necesarias para realizar un manejo ambiental adecuado en la ejecución de las actividades constructivas.



4.1. ADECUACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMPAMENTOS, TALLERES Y BODEGAS.

La Consorcio Interventoría Externa IBAL, cuenta con una oficina ubicada en la avenida Ambala Carrera 90, Conjunto Arroyuelos oficina, la cual cuenta con acceso a baterías sanitarias con conexión a la red de acueducto y alcantarillado. Con relación al seguimiento a los contratistas, se evidenció lo siguiente:

El consorcio ID DISTRITO 1, tomo en arriendo un parqueadero en la Calle 11 # 13 – 69 en el barrio 20 de julio y una casa en la calle 4C # 11 a – 22 del Barrio San Diego, los cuales funcionan como bodega de equipos menores. Estos sitios cuentan con baños y lavamanos que están conectados a la red de acueducto y alcantarillado.

La UNION TEMPORAL AGUAS 2021 cuenta con campamentos ubicados en los frentes de obra, los cuales se cuentan con baño y lavamanos conectados a la red de acueducto y alcantarillado y se utilizan para almacenar equipos menores y herramientas. En el frente Villa Claudia se encuentra ubicado en la Carrera 10 calle 27 sur, Salón comunal de villa Claudia; el frente Las Ferias se encuentra en la Carrera 2 sur # 24 - 60 Barrio Las Ferias; En el frente Ricaurte se alquiló una parte de un parqueadero pero no cumplía con las condiciones para se utilizado como campamento, por lo cual fue requerido al contratista, el cual no había mejorado al cierre de este informe.

El consorcio DISTRITO 4, tomo en arriendo un sector del parqueadero ubicado en la Calle 42, el cual cuenta con elementos de emergencia y es utilizado como bodega. Este parqueadero cuenta con baño y lavamanos conectado a la red de acueducto y alcantarillado.

El consorcio SECTOR 6, instaló un container cerca al frente de obra en el Jordán 9ª etapa, en donde fue adecuado la oficina y elementos de emergencia. Adicional a esto cuenta con punto ecológico, punto de lavado de manos y baño portátil.

el CONSORCIO REDES HIDRAULICAS, tomó una bodega en arriendo, ubicada en la Manzana C Casa 18 Barrio Julieta, para el frente La cabaña; en la Manzana H Casa 1 barrio El Limón la oficina en obra y los demás frentes ubicados cerca del frente de obra, en la Carrea 13ª calle 125 Barrio Alberto Lleras para el frente Cementerio; en la Carrera 15 calle 121 en el frente Praderas, en la Calle 129 Carrera 10 el Frente Montecarlo, En la Calle 145 con 8l en el frente el Salado y en l Carrera 8B con calle 146, en el frente Chincá. En estos campamentos se adecuaron sitios para almacenamiento de herramientas y equipos menores y cuentan con baño y lavamanos, conectados a la red de acueducto y alcantarillado.

La UNIÓN TEMPORAL JPO 19 alquiló un área ubicada en la carrerea 20 # 95 – 70 Barrio Arkambuco y otro sitio en la Manzana C casa 2 del barrio Portal de los Tunjos, para la ubicación de elementos de emergencia y herramientas y equipos menores. Estos sitios cuentan con área de lavado de manos y batería sanitaria conectada a la red de acueducto y alcantarillado.

Foto 87. Campamento frente 20 de Julio



Foto 88. Campamento frente Las Ferias



Foto 89. Campamento frente Las Ferias



Foto 90. Campamento frente de obra Ricaurte



Foto 91. Campamento frente de obra Jordán



Foto 92. Campamento frente Villa Luces



Foto 93. Campamento frente La Cabaña





Foto 94. Campamento frente Cementerio

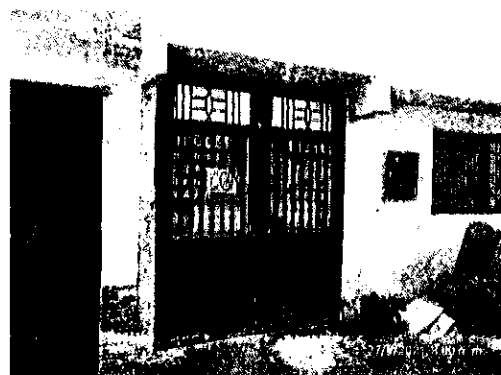

4.2. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO.

La interventoría verifico mediante revisión en campo, que los vehículos utilizados por el contratista no utilizan accesorios generadores de ruido como bocinas o claxon.

Además, se verificó que las obras se están ejecutando dentro del horario diurno estableciendo ciclos de descanso adecuados para el personal.

Hasta el cierre del periodo del presente informe no se han recibido quejas por parte de la comunidad por generación de ruido.

Control de emisiones atmosféricas

El contratista conformo Brigadas de Orden y Limpieza – BOAL. En revisión de los frentes de obra se pudo corroborar que el contratista mejoro en las actividades de limpieza de vía, atendiendo de esta manera las recomendaciones realizadas por la interventoría, con el fin de disminuir la emisión de material particulado en los frentes de obra. Fueron requeridos el Consorcio Distrito 1 en el frente 20 de Julio, Consorcio Sector 6 en el frente Jordán 9ª Etapa, Unión Temporal Aguas 2021 en el frente Villa Claudia y Villa Luces y Consorcio Redes Hidráulicas en el frente Praderas del Norte y Montecarlo, por el manejo de materiales y limpieza de vías. Estas contratistas atendieron los requerimientos, pero en el caso del Consorcio Sector 6, estas medidas no se mantienen.

Las volquetas que realizan la evacuación de personal no exceden los 40 km/h, para evitar las emisiones fugitivas.


Las áreas intervenidas cuentan con aislamiento perimetral de los frentes que permiten disminuir la aspersion de partículas a las zonas aledañas.



4.3. MANEJO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.

El contratista no ha realizado mantenimiento de los equipos en el área de trabajo.

La Interventoría mediante revisión documental, realizó la verificación de los certificados de revisión técnico mecánica de la maquinaria que se encuentran en operación en el periodo del presente informe, evidenciando que las emisiones de gases no sobrepasan los límites permisibles establecidos por las normas vigentes sobre emisión de contaminantes por fuentes móviles. Además, se realiza revisión periódica de las inspecciones pre operacionales para detectar fallas mecánicas o inconvenientes en la maquinaria, que puedan generar impactos ambientales.

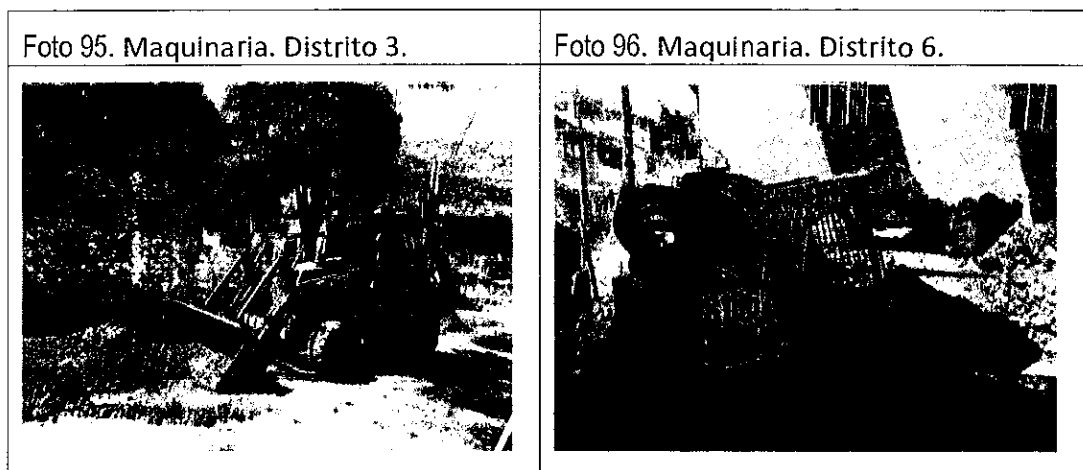

4.4. MANEJO DE RCD.

Los contratistas están realizando el retiro del material producto de la excavación para la instalación de tubería. Estos RCD son dispuestos en escombrera autorizadas. Los contratistas en general realizan retiro de material en un lapso mayor a 24 horas, pero La Unión Temporal Aguas 2021, en su frente de Villa Luces, es que más ha presentado de manera reiterada, acopios de material de excavación por tiempo prolongado. La interventoría realizó requerimiento y permanentemente solicita al contratista la evacuación del material en el tiempo establecido.

4.5. CLASIFICACIÓN Y DISPOSICION DE RESIDUOS DOMÉSTICOS.

Durante el periodo del presente informe, el contratista realizó la clasificación de los residuos sólidos, utilizando puntos ecológicos permitiendo su separación en la fuente en los frentes de obra. Fueron ubicados tres recipientes con codificación de colores, para facilitar su separación.

Foto 97. Punto ecológico Frente 20 de Julio




Foto 98. Punto ecológico Frente San Diego.



Foto 99. Punto ecológico Frente Villa Claudia



Foto 100. Punto ecológico Frente Las Ferias.



Foto 101. Punto ecológico Frente Villa Luces



Foto 102. Punto ecológico Frente Cementerio.



Foto 103. Punto ecológico Frente Arkanbuco



Foto 104. Punto ecológico Frente Arkanbuco.



En los frentes de obra fueron ubicados puntos ecológicos adecuados con madera y lonas identificados con letreros describiendo el tipo de residuo a disponer.

Debido a que la cantidad generada en los frentes de obra es muy pequeña, fueron entregados a la empresa de aseo del sector respetando sus horarios y rutas de recolección.


4.1. MANEJO DE MATERIALES.

Los contratistas están comprando los materiales en canteras autorizadas. La interventoría ha evidenciado que el acopio de materiales en los frentes de obra no ha sido adecuada, debido a que no están protegidos con plástico, generando que se dispersen en las vías y lleguen en algunos casos a los sumideros. La interventoría ha realizado requerimientos reiterativos, pero los contratistas argumentan que la protección es levantada por personas de la comunidad.

Foto 105. Protección material frente 20 de julio



Foto 106. Material sin protección frente Los Tunjos.

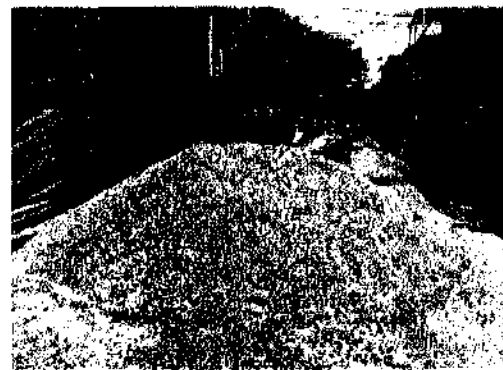

4.2. MANEJO DE COMPONENTE HÍDRICO.

Protección de sumideros.

Con el fin de evitar que material que se pueda dispersar de la obra lleguen al sistema pluvial, la interventoría solicitó a los contratistas, realizar el inventario y protección de los sumideros contiguos a las áreas de intervención, utilizando para ello malla que cumple la función de tamiz. Hasta el cierre del presente informe se había realizado el mantenimiento e instalación de manera parcial, por lo que fue requerido a los contratistas para realizar las acciones necesarias para corregir esta situación, especialmente los sumideros ubicados en el frente de Villa Claudia, Montecarlo, Ricaurte y praderas.

Foto 107. Protección de sumidero San Diego.




Foto 108. Protección Sumidero frente Cementerio.



Manejo de Residuos líquidos

Para realizar el manejo de las aguas generadas en los frentes de obra, los contratistas cuentan con baños en los campamentos adecuados para el desarrollo de las actividades constructivas, garantizando de esta manera el manejo adecuado de este tipo de residuos. En este periodo, el frente Ricaurte no contaba con batería sanitaria por lo que la interventoría realizó el requerimiento para su subsanación. Para esto el contratista realizó convenio con un local del sector para prestar este servicio.

Foto 109. Baño Frente de obra San Diego

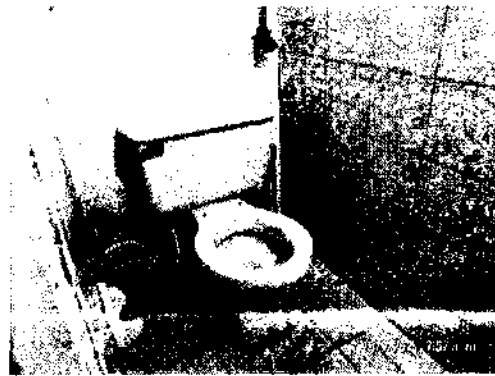


Foto 110. Baño Frente de obra Villa Claudia.




Foto 111. Baño Frente de obra Villa Luces



Foto 112. Baño Frente de obra Calle 42.




Foto 113. Baño Frente de obra Cementerio.

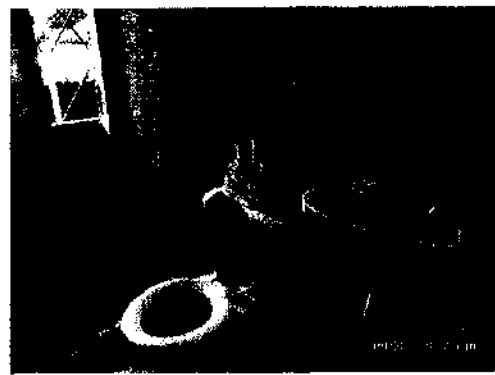


Foto 114. Baño Frente de obra Montecarlo.

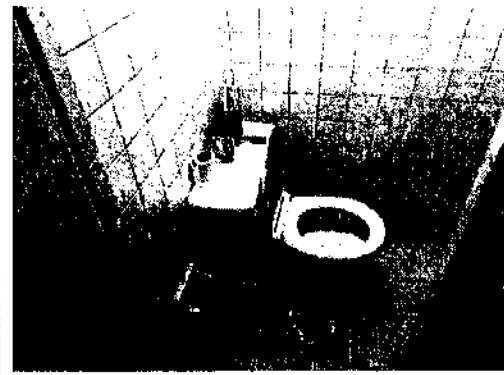


Foto 115. Baño Frente de obra Salado.





Foto 116. Baño Frente de obra Arkanbuco.



Foto 117. Baño Frente de obra Jordán




Foto 118. Baño Frente de obra La Cabaña

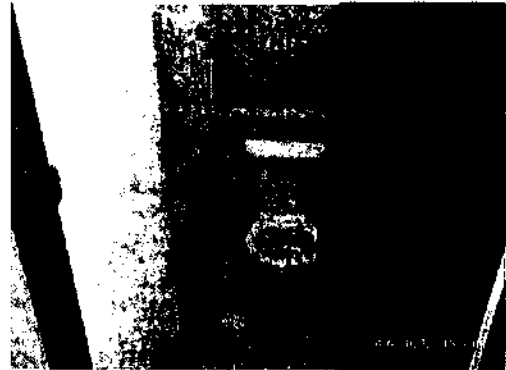

4.3. ORDEN Y ASEO EN LA OBRA.

La interventoría mediante recorridos, evidencio que el contratista ha tomado medidas correctivas sobre las labores de orden y aseo en los frentes de obra. La brigada de orden, aseo y limpieza están desarrollando actividades de limpieza de vías y mantenimiento de cerramiento, pero se continúan presentado hallazgos sobre limpieza de vías y manejo de materiales en los frentes de villa Luces Distrito 3, Jordán 9 Etapa Distrito 6, Praderas Distrito 7.

| | | |
|--|---|---|
|  IBAL <small>LA EMPRESA</small> | INFORME MENSUAL SST AMBIENTAL No. 4 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0063 de 2021 | CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL |
|--|---|---|

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Realizar la reunión mensual del COPASST.

Implementar el sistema de entibado y sistemas de trabajo en altura en las excavaciones que lo requieran.

Verificar la implementación de los elementos y las medidas contempladas en el plan de emergencia, especialmente los relacionados con trabajos en alturas.

Realizar el mantenimiento y protección de sumideros aledaños a los frentes de obra

Garantizar el buen estado y la permanencia de los cerramientos y señalización en los frentes de obra.

Continuar con las medidas de seguridad en el frente de obra, asegurando la entrega y porte de los EPP para el desarrollo de todas las actividades constructivas.

6. ANEXOS.



**INFORME MENSUAL SST AMBIENTAL No. 4
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0063
de 2021**

**CONSORCIO
INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**

ANEXO 1. SEGURIDAD SOCIAL.



**INFORME MENSUAL SST AMBIENTAL No. 4
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0063
de 2021**

**CONSORCIO
INTERVENTORIA
EXTERNA IBAL**

ANEXO 2. ESTADÍSTICAS SG SST.

INDICADORES

CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA
IBAL

FRECUENCIA DE
ACCIDENTALIDAD

INCIDENCIA DE
ENFERMEDAD LABORAL

AUSENTISMO POR
CAUSA MÉDICA

FRECUENCIA
INCAPACITANTE DE
ACCIDENTALIDAD

PREVALENCIA DE
ENFERMEDAD LABORAL

AUSENTISMO POR
ENFERMEDAD COMÚN

SEVERIDAD POR
ACCIDENTALIDAD

PROPORCIÓN DE
MORTALIDAD

AUSENTISMO POR
ENFERMEDAD LABORAL

FRECUENCIA POR
INCIDENTES LABORALES

AUSENTISMO POR
LICENCIA DE
MATERNIDAD




INDICADOR DE RESULTADO

Indicador: Frecuencia de accidentes de trabajo
 Año: 2021
 Fórmula: $\frac{\text{Total de accidentes de trabajo en el mes} \times 100}{\text{Total de trabajadores en el mes}}$
 Constante (K): 100
 Periodicidad del report: Mensual
 Meta: 0
 Límite máximo de control: 3
 Fuente de información: Caracterización de AT
 A quién se le comunica los resultados: EAAB E.S.P

| Datos | Total de accidentes de trabajo | Total de trabajadores | Frecuencia |
|------------|--------------------------------|-----------------------|------------|
| Enero | | | |
| Febrero | | | |
| Marzo | | | |
| Abril | | | |
| Mayo | | | |
| Junio | 0 | 22 | 0 |
| Julio | 0 | 22 | 0 |
| Agosto | 0 | 22 | 0 |
| Septiembre | 0 | 22 | 0 |
| Octubre | | | |
| Noviembre | | | |
| Diciembre | | | |
| Promedio | 0 | 22 | 0.000 |

Por cada 100 trabajadores se presentan xxx accidentes

Frecuencia de accidentes

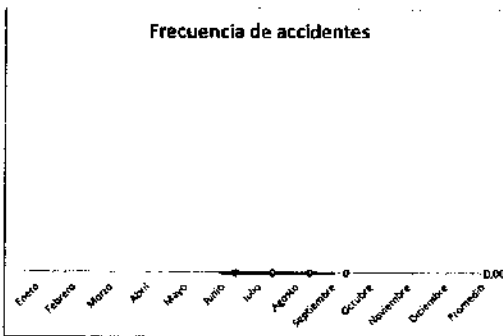

SEGUIMIENTO AL INDICADOR


| MES | ANÁLISIS DE CAUSAS | OBSERVACIONES |
|----------------|--------------------|---------------|
| Enero | | |
| Febrero | | |
| Marzo | | |
| Abril | | |
| Mayo | | |
| Junio | | |
| Julio | | |
| Agosto | | |
| Septiembre | | |
| Octubre | | |
| Noviembre | | |
| Diciembre | | |
| Análisis Anual | | |

INDICADOR DE RESULTADO

Indicador: Frecuencia de accidentes de trabajo incapacitantes
 Año: 2021
 Fórmula: Total de accidentes de trabajo en el mes x 100 / Total de trabajadores
 Constante (K): 100
 Periodicidad del reporte: Mensual
 Meta: 0
 Límite máximo de control: 1
 Fuente de Información: Caracterización de AT
 A quién se le comunica los resultados: EAAB E.S.P

| Datos | Total de accidentes de trabajo incapacitantes | Total de trabajadores | Frecuencia |
|------------|---|-----------------------|------------|
| Enero | | | |
| Febrero | | | |
| Marzo | | | |
| Abril | | | |
| Mayo | | | |
| Junio | 0 | 22 | 0,000 |
| Julio | 0 | 22 | 0,000 |
| Agosto | 0 | 22 | 0,000 |
| Septiembre | 0 | 22 | 0,000 |
| Octubre | | | |
| Noviembre | | | |
| Diciembre | | | |
| Promedio | 0 | 88 | 0,000 |

Por cada 100 trabajadores se presentan xxx accidentes incapacitantes

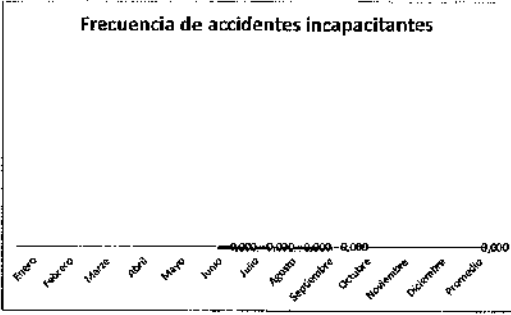

| SEGUIMIENTO AL INDICADOR | | |
|--------------------------|--------------------|---------------|
| MES | ANÁLISIS DE CAUSAS | OBSERVACIONES |
| Enero | | |
| Febrero | | |
| Marzo | | |
| Abril | | |
| Mayo | | |
| Junio | | |
| Julio | | |
| Agosto | | |
| Septiembre | | |
| Octubre | | |
| Noviembre | | |
| Diciembre | | |
| Análisis Anual | | |

INDICADOR DE RESULTADO

Indicador: Severidad de accidentes de trabajo
 Año: 2011
 Fórmula: $\frac{\text{Total de días perdidos por accidente de trabajo} + \text{días cargados en el mes} \times 100}{\text{Total de trabajadores}}$

Constante (K): 100
 Periodicidad del reporte: Mensual
 Meta: 0
 Umbral mínimo de control: 1
 Fuente de Información: Caracterización de AT
 Actualiza se le comenta los resultados E&AS E.S.P

| Mes | Días perdidos por AT | Total de trabajadores | Días cargados | Severidad |
|------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------|
| Enero | | | | |
| Febrero | | | | |
| Marzo | | | | |
| Abril | | | | |
| Mayo | | | | |
| Junio | 0 | 22 | 0 | 0,000 |
| Julio | 0 | 22 | 0 | 0,000 |
| Agosto | 0 | 22 | 0 | 0,000 |
| Septiembre | 0 | 22 | 0 | 0,000 |
| Diciembre | | | | |
| Noviembre | | | | |
| Diciembre | | | | |
| Promedio | 0 | 22 | | 0,000 |

Por cada 100 trabajadores se presentan six días perdidos




| SEGUIMIENTO AL INDICADOR | | |
|--------------------------|--------------------|---------------|
| MES | ANÁLISIS DE CAUSAS | OBSERVACIONES |
| Enero | | |
| Febrero | | |
| Marzo | | |
| Abril | | |
| Mayo | | |
| Junio | | |
| Julio | | |
| Agosto | | |
| Septiembre | | |
| Octubre | | |
| Noviembre | | |
| Diciembre | | |
| Análisis Anual | | |

INDICADOR DE RESULTADO

Indicador: Incidentes de trabajo
 Año: 2021
 Fórmula: Total de incidentes de trabajo en el mes x K / Total de trabajadores
 Constante (K): 100
 Periodicidad del reporte: Mensual
 Métrica: D
 Límite máximo de control: 3
 Fuente de información: Caracterización de AT
 A quién se le comunica los resultados: EAABE,S,P

| Datos | Total de accidentes de trabajo | Total de trabajadores | Frecuencia |
|------------|--------------------------------|-----------------------|------------|
| Enero | | | |
| Febrero | | | |
| Marzo | | | |
| Abril | | | |
| Mayo | | | |
| Junio | 0 | 22 | 0,000 |
| Julio | 0 | 22 | 0,000 |
| Agosto | 0 | 22 | 0,000 |
| Septiembre | 0 | 22 | 0,000 |
| Octubre | | | |
| Noviembre | | | |
| Diciembre | | | |
| Promedio | 0 | 22 | 0,000 |

Por cada 100 trabajadores se han presentado xxx Incidentes

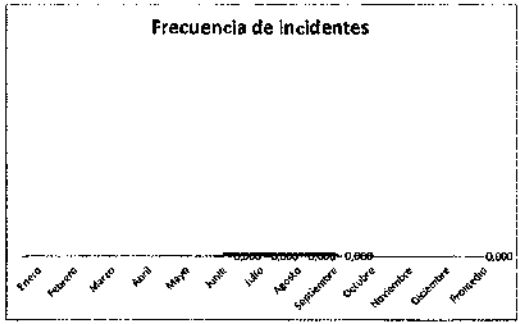

| SEGUIMIENTO AL INDICADOR | | |
|--------------------------|--------------------|---------------|
| MES | ANÁLISIS DE CAUSAS | OBSERVACIONES |
| Enero | | |
| Febrero | | |
| Marzo | | |
| Abril | | |
| Mayo | | |
| Junio | | |
| Julio | | |
| Agosto | | |
| Septiembre | | |
| Octubre | | |
| Noviembre | | |
| Diciembre | | |
| Análisis Anual | | |

← INICIO

INDICADOR DE RESULTADO

Indicador: Incidencia

Año: 2023

Fórmula: $\frac{\text{Total de enfermedades laborales nuevas en el periodo}}{\text{Promedio total de trabajadores}} \times 100000$

Constante: 100000

Periodicidad del reporte: Anual

Meta: 0

Límite máximo de control: 1

Fuente de información: Caracterización de AT

A quién se le comunican los resultados: EAM E.S.P

| datos | Total de enfermedades laborales en el periodo X | Total de trabajadores | Incidencia |
|-------|---|-----------------------|------------|
|-------|---|-----------------------|------------|

| | | | |
|------------|---|----|-------|
| Enero | | | |
| Febrero | | | |
| Marzo | | | |
| Abril | | | |
| Mayo | | | |
| Junio | 0 | 22 | 0.00% |
| Julio | 0 | 22 | 0.00% |
| Agosto | 0 | 22 | 0.00% |
| Septiembre | 0 | 22 | 0.00% |
| Octubre | | | |
| Noviembre | | | |
| Diciembre | | | |
| Promedio | 0 | 22 | |

Por cada 100000 trabajadores se presentan **0** enfermedades laborales nuevas en el periodo 2023

Incidencia



| SEGUIMIENTO AL INDICADOR | | |
|--------------------------|--------------------|---------------|
| MES | ANÁLISIS DE CAUSAS | OBSERVACIONES |
| Enero | | |
| Febrero | | |
| Marzo | | |
| Abril | | |
| Mayo | | |
| Junio | | |
| Julio | | |
| Agosto | | |
| Septiembre | | |
| Octubre | | |
| Noviembre | | |
| Diciembre | | |
| Análisis Anual | | |

15.610

INDICADOR DE RESULTADO

Indicador: Prevalencia
Año: 2021


Fórmula: Total de enfermedades laborales antiguas y casos nuevos en el periodo / Promedio total de trabajadores * 100000

Constante: 100000
Constante: 100000
Periodicidad del reporte: anual
Meta: 0
Unidad mínima de control: 1
Fuente de información: Caracterización de AT
¿quién es la cuenta los resultados: E.A.M.B.E.S.P.

| Mes | Total de enfermedades laborales antiguas en el periodo | Total de enfermedades laborales nuevas en el periodo | Total de trabajadores | Prevalencia |
|------------|--|--|-----------------------|-------------|
| Enero | | | | |
| Febrero | | | | |
| Marzo | | | | |
| Abril | | | | |
| Mayo | | | | |
| Junio | 0 | 0 | 21 | 0.0 |
| Julio | 0 | 0 | 22 | 0.0 |
| Agosto | 0 | 0 | 22 | 0.0 |
| Septiembre | 0 | 0 | 22 | 0.0 |
| Octubre | | | | |
| Noviembre | | | | |
| Diciembre | | | | |
| Promedio | 0 | | 21 | 0.0 |

Por cada 100000 trabajadores se presentan xix enfermedades laborales nuevas y antiguas en el periodo xxx

Prevalencia



SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| MES | ANÁLISIS DE CAUSAS | OBSERVACIONES |
|----------------|--------------------|---------------|
| Enero | | |
| Febrero | | |
| Marzo | | |
| Abril | | |
| Mayo | | |
| Junio | | |
| Julio | | |
| Agosto | | |
| Septiembre | | |
| Octubre | | |
| Noviembre | | |
| Diciembre | | |
| Análisis Anual | | |

← INICIO **INDICADOR DE RESULTADO**

Indicador: Mortalidad
 Año: 2021
 Fórmula: Total de accidentes de trabajo mortales en el mes / Total de trabajadores
 Periodicidad del reporte: Anual
 Meta: 0
 Límite máximo de control: 0
 Fuente de Información: Caracterización de AT
 A quién se le comunican los resultados: SAAB E.S.P

| Fecha | Total de accidentes de trabajo mortales | Número de accidentes en el mes | Proporción de mortalidad |
|------------|---|--------------------------------|--------------------------|
| Enero | | | |
| Febrero | | | |
| Marzo | | | |
| Abril | | | |
| Mayo | 0 | 0 | 0/000/00 |
| Junio | 0 | 0 | 0/000/00 |
| Julio | 0 | 0 | 0/000/00 |
| Agosto | 0 | 0 | 0/000/00 |
| Septiembre | 0 | 0 | 0/000/00 |
| Octubre | | | |
| Noviembre | | | |
| Diciembre | | | |
| Promedio | 0 | 0 | 0/000/00 |

En el año, el 00% de los accidentes laborales fueron mortales




| REGISTRO AL INDICADOR | | |
|-----------------------|--------------------|---------------|
| MES | ANÁLISIS DE CAUSAS | OBSERVACIONES |
| Enero | | |
| Febrero | | |
| Marzo | | |
| Abril | | |
| Mayo | | |
| Junio | | |
| Julio | | |
| Agosto | | |
| Septiembre | | |
| Octubre | | |
| Noviembre | | |
| Diciembre | | |
| Análisis Anual | | |

INDICADOR DE RESULTADO

Indicador: Ausentismo por condición médica
 Año: 2021
 Fórmula: $\frac{\text{Número de días de ausencia en el mes por incapacidad médica a 300}}{\text{Número de días de trabajo programados en el mes}}$
 Incapacidad médica: Ausencias por enfermedad común, enfermedad laboral y accidente laboral
 Número de días programados en el mes: # de trabajadores del mes x # de días laborales en el mes
 Constante (K): 100
 Periodicidad del reporte: Mensual
 Meta: 0
 Límite máximo de control: 2
 Fuente de información: Ausentismo general
 A quién se le comunica los resultados: EAJE E.S.P

| Datos | Total de días de ausencia mes | Total de trabajadoras | Días programados | Ausentismo |
|------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| Enero | | | | |
| Febrero | | | | |
| Marzo | | | | |
| Abril | | | | |
| Mayo | | | | |
| Junio | 0 | 22 | 24 | 0.000 |
| Julio | 0 | 22 | 25 | 0.000 |
| Agosto | 0 | 22 | 24 | 0.000 |
| Septiembre | 0 | 22 | 26 | 0.000 |
| Octubre | | | | |
| Noviembre | | | | |
| Diciembre | | | | |
| Promedio | 0 | 22 | 25 | 0.000 |

En el mes se perdió xx% de días programados de trabajo por incapacidad médica.



| MES | SEGUIMIENTO AL INDICADOR | |
|----------------|--------------------------|---------------|
| | ANÁLISIS DE CAUSAS | OBSERVACIONES |
| Enero | | |
| Febrero | | |
| Marzo | | |
| Abril | | |
| Mayo | | |
| Junio | | |
| Julio | | |
| Agosto | | |
| Septiembre | | |
| Octubre | | |
| Noviembre | | |
| Diciembre | | |
| Análisis Anual | | |



INDICADOR DE RESULTADO

Indicador: Ausentismo por enfermedad común

Año: 2011

Fórmula: $\frac{\text{Número de días de ausencia por enfermedad común en el mes} \times 100}{\text{Número de días de trabajo programados en el mes}}$

Número de días programados en el mes: # de trabajadores del mes x N de días laborales en el mes
Constante (K): 100

Periodicidad del reporte: Mensual

Base: 0

Límite máximo de control: 7


Fuente de información: Ausentismo general

A quién se le comunica los resultados: SAAB S.S.P.

| Mes | Total de días de ausencia | Total de trabajadores | Días programados | Ausentismo |
|------------|---------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| Enero | | | | |
| Febrero | | | | |
| Marzo | | | | |
| Abril | | | | |
| Mayo | | | | |
| Junio | 0 | 22 | 24 | 0.00% |
| Julio | 0 | 22 | 25 | 0.00% |
| Agosto | 0 | 22 | 24 | 0.00% |
| Septiembre | 0 | 22 | 26 | 0.00% |
| Octubre | | | | |
| Noviembre | | | | |
| Diciembre | | | | |
| Promedio | 0 | 22 | 24 | 0.00% |

En el mes se perdió 0% de días programados de trabajo por enfermedad común.

Ausentismo por enfermedad común




| SEGUIMIENTO AL INDICADOR | | |
|--------------------------|--------------------|---------------|
| MES | ANÁLISIS DE CAUSAS | OBSERVACIONES |
| Enero | | |
| Febrero | | |
| Marzo | | |
| Abril | | |
| Mayo | | |
| Junio | | |
| Julio | | |
| Agosto | | |
| Septiembre | | |
| Octubre | | |
| Noviembre | | |
| Diciembre | | |
| Análisis Anual | | |

← **INDICADOR DE RESULTADO**

Indicador: Ausentismo por enfermedad médica
Año: 2021
Elemento: Número de días de ausencia por E.O. en el mes x 100
Número de días programados en el mes: $\frac{\text{Número de días de trabajo programados en el mes}}{\text{Cantidad (E)}} \times 100$
Formulación del reporte: Mensual
Nivel: O
Unidad medidora de control: %
Fuente de la información: Asistencia personal
Acciones de control: Verificar los resultados. (ANEXO 5.1)


| Mes | Días de ausencia | Total de días de trabajo programados | Total de trabajadores | Días programados | Ausentismo |
|--------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Enero | | | | | |
| Febrero | | | | | |
| Marzo | | | | | |
| Abril | | | | | |
| Mayo | | | | | |
| Junio | 0 | 0 | 12 | 28 | 0.00% |
| Julio | 0 | 0 | 12 | 25 | 0.00% |
| Agosto | 0 | 0 | 12 | 23 | 0.00% |
| Septiembre | 0 | 0 | 12 | 26 | 0.00% |
| Octubre | | | | | |
| Noviembre | | | | | |
| Diciembre | | | | | |
| Total | 0 | 0 | 12 | 99 | 0.00% |



| SEGUIMIENTO AL INDICADOR | | |
|--------------------------|----------------------|---------------|
| MES | VALORES Y TENDENCIAS | OBSERVACIONES |
| Enero | | |
| Febrero | | |
| Marzo | | |
| Abril | | |
| Mayo | | |
| Junio | | |
| Julio | | |
| Agosto | | |
| Septiembre | | |
| Octubre | | |
| Noviembre | | |
| Diciembre | | |
| Análisis Final | | |

| INDICADOR DE PROCESO | | | | |
|---|--|-----------------------|------------------|--------------|
| Indicador: Ausentismo por condición médica | | | | |
| Año: 2021 | | | | |
| Fórmula: $\frac{\text{Número de días por maternidad en el mes} \times 100}{\text{Número de días de trabajo programados en el mes}}$ | | | | |
| Número de días programados a n al mes: # de trabajadores del mes x # de días laborados en el mes | | | | |
| Constante (K): 100 | | | | |
| Periodicidad del reporte: Mensual | | | | |
| Fuente de información: Ausentismo general | | | | |
| A quién se le comunica los resultados: EAAD E.S.P. | | | | |
| Datos | Total de días de ausencia por maternidad en el mes | Total de trabajadores | Días programados | Ausentismo |
| Enero | | | | |
| Febrero | | | | |
| Marzo | | | | |
| Abril | | | | |
| Mayo | | | | |
| Junio | 0 | 22 | 24 | 0,000 |
| Julio | 0 | 22 | 25 | 0,000 |
| Agosto | 0 | 22 | 24 | 0,000 |
| Septiembre | 0 | 22 | 26 | 0,000 |
| Octubre | | | | |
| Noviembre | | | | |
| Diciembre | | | | |
| Total | 0 | 22 | 99 | 0,000 |

En el mes se perdió xx% de días programados de trabajo por licencia de maternidad.

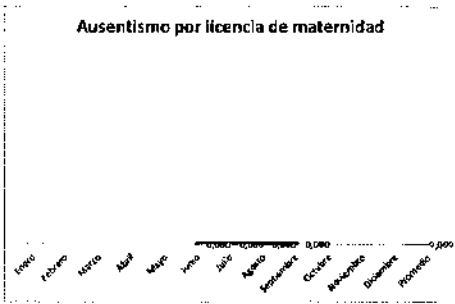

| SEGUIMIENTO AL INDICADOR | | |
|--------------------------|--------------------|---------------|
| MES | ANÁLISIS DE CAUSAS | OBSERVACIONES |
| Enero | | |
| Febrero | | |
| Marzo | | |
| Abril | | |
| Mayo | | |
| Junio | | |
| Julio | | |
| Agosto | | |
| Septiembre | | |
| Octubre | | |
| Noviembre | | |
| Diciembre | | |
| Análisis Anual | | |




INTERVENTORIA EXTERNA IBAL


BITACORAS

2021

3/07/2011
 Clima = Sin novedad
 Magnitud = u.u.
 Personal = Topografo
 Cadencio
 Ayu. General
 Siso
 Res Social


Descripción = Se dispone de Comisión de topografía en el frente de obra para realizar actividad de localización y replanteo en el obra a intervenir continuando con gestión social de redes de veredas en la calle 21 Barrio Occidente



 Residente Contratista


 Residente Interventor

14/04/2011
 Clima = Sin novedad
 Magnitud = u.u.
 Personal = Ing. Residente
 Topografo
 Cadencio
 Ayudante
 Siso
 Res Social

Descripción = Se continua actividad de localización y replanteo del tramo calle 21 Barrio Occidente. Se localiza intancia de red de alcantarillado entre el pozo 3 al pozo 4 identificando conexiones en los pozos revisados.
 Continúa gestión social.


 Residente Contratista


 Residente Interventor

15/09/2021 Clima = Soleado

Maquinaria = H.M

Personal = - Ing Residente

- Ing Auxiliar

- Inspector de obra


- Cadenero


- Siso

- Maestro

- Ayudante

Descripción = Se da inicio de la actividad de Cerramiento al frente de obra a intervenir Calle 21 del barrio Ricuarte.


Residente Contratista


Residente Interventor

16/09/2021 Clima = Soleado

Maquinaria = Retroexcavadora

Personal = Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero

Siso

Maestro

Ayudante

Descripción = Se continúa con el cerramiento del frente de obra calle 21 barrio Ricuarte y se realiza un apique a la altura del demarcado por 2 esto realiza para encontrar la tubería existente ya que se encuentra el pozo totalmente colmatado y es imposible de identificarlo luego procedemos con una localización y un replanteo para calcular las pendientes a los tramos a intervenir.

M.H.
Residente Contratista

P. J. J.
Residente Interventor

12/09/2021

Clima =

Máquinaria = Petróleo, excavadora, c.

P. Contratista Pavimento Demoledor

- Personal =
- Inq. Residente
 - Inq. Auxiliar
 - Inspector
 - Cadenero
 - S. S.
 - Maestro
 - Ayudantes

Descripción: Se da inicio a la jornada laboral haciendo un lleno de recepción a los cercos existentes ya que la maquinaria no puede garantizar la entrada y salida durante el tiempo de reparación del alcantarillado residual en el tramo pozo 3 al pozo 2. Dichos llenos se hacen en recepción ya que el material de excavación se encuentra contaminado con desperdicios y excrementos de las personas que viven en el sector. Paralelo se realiza el corte del pavimento y la demolición del mismo.


M.H.
Contratista Residente


P. J. J.
Contratista Interventor

18/09/2014
 Clima = Soleado
 Maquinaria = Retroexcavadora
 Demoledor

Personal =
 Planta
 Ing Residente
 Ing Auxiliar
 Inspector
 Cadenero
 SISO
 Maestro
 Ayudante

Descripción = Se da inicio al día labora
 continuando con la demolición del pavimento
 rígido desde el pozo 3 al pozo 1.
 Se labora hasta el medio día.


 Contratista Residente


 Contratista Interinterim

20/09/2014 Clima = lluvia 3:00 pm - 4:30 pm

Maquinaria = Retroexcavadora
 Demoledor

Personal =
 Planta eléctrica
 - Ing Residente
 - Ing Auxiliar
 - Inspector
 - Cadenero
 - SISO
 - Maestro
 - Ayudante

Descripción = Se da inicio a la jornada
 laboral continuando con la demolición a su
 totalidad desde el pozo 3 al pozo 2 para
 luego proceder con la actividad de excavación.

a maquina para la instalacion de tuberia de 10 pulgadas. se realiza una excavacion de 5ml y se tiene que hacer un cillo por ciertos puntos que se presentaran al finalizar la jornada.

MH

Contratista Residente

Paula

Contratista Interventora

4/09/2021

Clima = Soleado

Máquina: Retroexcavadora

Demoledor

Planta electrica

Descripción = Se continua con la excavacion a maquina del pozo 3 al pozo 2, durante la excavacion nos percatamos de que el material de excavacion se encuentra totalmente contaminado por lo que la interventora toma la decision de hacer un lleno de relleno para descansar la tuberia a instalar.


Se hace la instalacion del entibado para 3 tubos y se instala la cama de grava seguida los tubos de 10 pulgadas, se realiza un lleno de relleno en arena y se hace compactacion.

MH

Contratista Residente


Paula


Contratista Interventora



| | | |
|------------|-----------|------------------|
| 22/09/2021 | Clima | Colocador |
| | Magnética | Retrosceccionera |
| | | Demoledor |
| | | Plantas |
| Personal | | Jef. Residente |
| | | Jef. Auxiliar |
| | | Tijpetes |
| | | Cidene-c |
| | | SISO |
| | | Maestro |
| | | Ayudante |


Descripción = Se continúa con la excavación de la misma en el tramo pozo 3 pozo 2. Se realiza la instalación del entubado para 2 tubos más 1 que se ha excavado de grava para encajarlos. Se realiza la debida instalación de los tubos mencionados; con esta instalación se realiza a su totalidad el tramo pozo 3 pozo 2 dejando conectado.



 Contralista Residente


 Contralista Interventor

| | | |
|------------|-----------|------------------|
| 23/09/2021 | Clima | |
| | Magnética | Retrosceccionera |
| | | Demoledor |
| | | Plantas |
| Personal | | Jef. Residente |
| | | Jef. Auxiliar |
| | | Tijpetes |
| | | Cidene-c |
| | | SISO |
| | | Maestro |
| | | Ayudante |

Resumen = Se da inicio a la jornada laboral haciendo la actividad de excavación a máquina para el segundo tramo pozo 2 pozo 1 se realiza la excavación y la debida entubado para 2 tramos y 1/2 al cual se le hace la respectiva encerrado en grava para su correcta instalación por ultimo se hace un lleno en recebo y compactación del mismo.


Contratorista Residente


Contratorista Interventor

4/10/2021 Clima

Máquina = Retroexcavadora
Demoledor

Planta eléctrica

Personal = Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cidenero

SISO

Maestro

Ayudantes

Descripción = Se continúa con la excavación a máquina en el tramo pozo 2 al pozo 1 haciendo la respectiva excavación llegando al pozo 1 el cual será construido de nuevo demanda por la parte contratista e interventoria ya que el pozo existente al que nos conectaremos no existía una red conectora lo cual permitia la realización de un pozo inicial denominado pozo 1.


Se realizan arreglos al acueducto averiado por excavación a máquina


25/09/2011 Clima = Soleado
Mogunaria = Retroexcavadora
Demolador

Planta electrica
Personal = Ing Residente
Ing Auxiliar
Inspector
Cedenero
S.S.O
Maestro
Ayudantes

Descripción = Se realiza el respectivo entibado para 3 tubos en el tramo pozo 2 pozo 1 para luego instalar el encamado de grava y por ultimo los tubos, tambien se realite un lleno en recebo con su compactación respectiva.

Se labora hasta medio dia.


Contratista Residente


Contratista Interventoria

27/09/2011 Clima = Soleado
Mogunaria = Retroexcavadora
Demolador
Planta electrica

Descripción = Se inicia la jornada laboral preparando el terreno para instalacion del entibado para la instalacion de un tubo de 10" en la red de aguas (lluvia) residuales entre el pozo 2 y el pozo 1. Se realiza la instalacion del tubo correctamente y se deja conectada a red a su totalidad.

MH
Contratista Residente

Paula
Contratista Interventora

26/09/2021

Clima = Soleado
Maquinaria = Demoledor
Planta electrica
Personal = Ing. Residente
Ing. Auxiliar
Inspector
Cudenero
SISO
Maestro
Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral haciendo vacado de recebo en zanja con la respectiva computación.
Se da inicio a las excavaciones manuales para domiciliar las residuales en el tramo pozo 1 al pozo 2.
Se hacen arreglos a la red de acueducto.

MH
Contratista Residente

Paula
Contratista Interventora

24/09/2021

Clima = Soleado
Maquinaria = Demoledor
Planta
Personal = Ing. Residente
Ing. Auxiliar
Inspector
Cudenero
SISO
Maestro

Ayudante

Descripción = Se Continúan las excavaciones manuales para domiciliares residuales entre los pozo 1 y pozo 2. Realizando la ruptura de pavimento rígido.

Se hacen arreglos a la tubería de acueducto averiada, durante dichas excavaciones.

PAH

Contratista Residente

Paul J

Contratista Interventor

Requisitos

Clima = Soleado

Maquinería = Demolidor

Planta eléctrica

Personal = Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero

SSO

Maestro

Ayudante

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando las actividades de excavación manual para domiciliares residuales de pozo 2 domiciliares totalmente excavados a totalidad en el tramo Pozo 1 al pozo 2.

Se Continúan excavaciones durante la jornada.

PAH

Contratista Residente

Paul J

Contratista Interventor

01-09-21

Clima: lluvioso

Maquinaría:

Personal: Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspecto:

Cocinero


Siso

Muestra

Ayudante

Descripción:

Terminamos actividades un poco tarde debido a las lluvias durante todo la mañana, como ya teníamos el soldado del tramo P₂ 5 a P₂ 6bis en la tubería matriz, se instaló tubería de 8" y se hizo el debido recubrimiento. en el tramo P₂ 6 a P₂ 7 se siguió con actividad de instalación de domiciliarios. en el tramo P₂ 5 a P₂ 6bis se sacaron los muestros en cubetas para el laboratorio.


Interventor

02-09-21

clima: Soleado

Maquinaria:

Personal: Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Coolero

Diso

Muestrero

Ayudante

Descripción:

Iniciamos actividades de lleno en el tramo Pe 5 a Pe 6bis. Como la excavación de dicho tramo es de 60cm, el saltorin compactaba parte del pavimento y se dañó, en horas de la tarde se siguió la actividad con el saltorin arreglado. En el tramo Pe 6 a Pe 7 se fundieron cajas de inspección, las muestras de laboratorio se sacaron de los cilindros y se dejaron en agua.

Residente Contratista

Residente Intendencia

03/09/21

clima: Soleado

Maquinaria:

Personal: Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Coolero

Diso

Muestrero

Ayudante

Descripción:
 Iniciamos actividades con compactación de lleno con material recibo en el tramo P₁ a P₂ sbs. En el tramo P₁ b a P₂ (no encontramos que a las 45 mts ya no se encuentre fbo de alcatrillado, dicha actividad se realiza con excavación mecánica

04/09/21

Clima: Soleado

Meteorología:

Personal: Ing Residente
 Ing Auxiliar
 Inspector
 Cudenero
 Siso
 Maestro
 Ayudante

[Signature]
 Residente
 Residente Int.

Descripción:
 Iniciamos actividades con excavación manual para domesticación y a su vez excavación manual para caya de inspección, el señor Franklyn en conjunto con contratista y con el inspector observan una fuga de agua potable en el tramo P₁ b a P₂ se informa inmediatamente a Vanessa sobre dicha problemática.

[Signature]
 Residente Contratista

[Signature]
 Residente Int.

04/09/21

Domingo


06/09/21


domingo

Ing Auxiliar
Inspecta
Cadenas
Siso
Maestro
Ayudante

Descripción:

Trabajamos actividades perfilando tramo Pe 1 a Pe 4, en el tramo Pe 6 a Pe 5 se realizó excavación manual para instalación de domiciliaria. En el tramo Pe 2 a Pe 3 se realizó cerramiento para su debida cubrición, en el tramo Pe 2 a Pe 6 se realizaron excavaciones manuales para cajas de inspección


Residente Contratista


Residente Trabajadora

07/09/21

clima: Soleado

Materia: Retroexcavación
Personal: Ing Residente
Ing Auxiliar
Inspecta
Cadenas
Siso
Maestro
Ayudante

Descripción:

Trabajamos actividades de provisión mecánica para instalación tubería de 12" en el tramo Pe 6 a Pe 3 con su debida cubrición, en algunos tramos ya se ha excavado para la instalación de tubería de 12" en el tramo Pe 6 a Pe 3 con su debida cubrición

excavación para su debida elaboración, en el tramo Pz 6 a Pz 5 se realizó excavación manual para casos de inspección y en el tramo Pz 6 a Pz 2 seguimos con excavación manual para domesticarlas.

PH
Residente Contratista

[Signature]
Residente Interventor

08/09/11

Alcorno Muisca
Mantenimiento Petrocarreteras y
Personal Ing. Residente
Ing. Auxiliare
Inspector
Luiseneu
Jisu
Muestras
Ayudante

Descripción

Trabajamos actividades en poco trazo por motivo de lluvias durante la mañana. En el tramo Pz 5 a Pz 6 instalamos domesticarías y se funcionan cajas de inspección. En el tramo Pz 5 a Pz 5a se realizó excavación manual para domesticarías y en el tramo Pz 6 al Pz 2 instalamos tubería y se llenó con material Receta y se compacta con Sulfuro. En el tramo Pz 3 a Pz 1 se hizo actividad de excavación mecánica para inspección de tubería 12", se habló con labor de Interventoría: 10 cm, cuando grave por el flujo del agua residual y encima el salado de 10 cm, se instaló tubería de 12" y se hace recubrimiento de concreto.

Residente Contratista


[Signature]
Residente Interventoría


09/07/21

clima
 Mag. natia
 Personal:
 Retroexcavadora
 Ing. Residente
 Ing. Auxiliar
 Inspector
 Cudenero
 Siso
 Maestro
 Ayudante

Descripción:

LA INTERVENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE QUE SE HAN HECHO REPARACIONES PERTENECIENTES POR PARTE DE LOS SUPERVISORES PARA QUE SE LEVE A CABO EL FORTIBADO DE LAS EXCAVACIONES, PERO PASE A ELLO SIEMPRE REALIZANDO EXCAVACIONES E INSTALANDO TUBERÍA SIN LA PROTECCIÓN CORRESPONDIENTE. ES MUY IMPORTANTE PROTEGER LAS EXCAVACIONES PARA EVITAR CUALQUIER ACCIDENTE QUE COMPROMETA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES.


 Residente Central


 Residente Intervención



10/07/21

clima
 Mag. natia
 Personal:
 Ing. Residente
 Ing. Auxiliar
 Inspector
 Cudenero
 Siso
 Maestro
 Ayudante

Descripción:

Trasladar actividades con retiro de material

recabo de excavación en el tramo P₂ 6 a P₂ 7. En este mismo tramo se realizó la actividad de lleno con material recabo y compactado con saltorín. También seguimos nuestros en labores de apoyo de inspección en el tramo P₂ 5 a P₂ 5 por continuamos en excavación manual para instalaciones de Armadura

Residente  Contratista Residente  Interventor

11/09/21

Clima.

Maquinaria:

Personal:

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadena



Siso

Muestro

Ayudante

Descripción

Iniciamos actividades con lleno en el tramo P₂ 6 a P₂ 7 con material recabo y compactado con saltorín. En el tramo P₂ 6 a P₂ 7 se duró la tubería del Paul asegurando calidad el arreglo

Residente  Contratista Residente  Interventor

12/09/21

Clima Domingo

Maquinaria:


Personal:


13/09/21

clima: Soleado
 Muestreo: Retroexcavador
 Personal: Ing Residente
 Ing Auxiliar
 Inspector
 Cadenero
 Siso
 Maestro
 Ayudante

Descripción:

Iniciamos actividades en este día en el turno P₂ 1 a P₂ 3 con excavación mecánica para instalación de tubería 12". En el turno P₂ 3 a P₂ 3bis iniciamos actividad de excavación para instalación de tubería 12" con su debido encofrado y entibado para su correcta instalación. En este día se habló con el personal de Interventoría ya que en el turno P₂ 1 a P₂ 3 la pendiente es muy mínima entonces iniciamos a cambiar la pendiente en el turno P₂ 3 a P₂ 3bis para cambiar el pozo existente en el P₂ 3 y cambiar la pendiente en el P₂ 1 a P₂ 3, esto con autorización del señor Wilson de Interventoría.


 Residente Contratista



 Residente Interventoría


14/09/21

clima: Soleado
 Muestreo:
 Personal: Ing Residente
 Ing Auxiliar
 Inspector
 Cadenero

Muestrero
Ayudante

Descripción:
Iniciamos actividades en este día con recepción
en Sanjacinto en el tramo P₂ 5 a P₂ 5bis.
En el tramo P₂ 5 a P₂ 6 iniciamos actividad
de excavación manual para instalación de tuberías
con su debida espesura y lleno con material
recepto y compactado con saltador. En el tramo
P₂ 3 a P₂ 3bis seguimos con actividades de
instalación de tubería de 12" con su encumbrado
y entubado para su correcta instalación.


Resident Contratista


Resident Interventor

15/09/21 clima: Soleado



Muestrero:

Personal: Ing Residente
Ing Auxiliar
Inspector
Cudatario
Sisa
Muestrero
Ayudante

Descripción

Iniciamos actividades en este día con lleno
de material recepto traído de cantera y compactado
con saltador en el tramo P₂ 3 a P₂ 3bis.
En el tramo P₂ 5 a P₂ 5bis iniciamos con
actividad de excavación manual para instalación
de tuberías. En el tramo P₂ 5 a P₂ 6

iniciamos con actividad de excavación manual para instalación de tubería 6" domiciliaria. en este tiempo encontramos que la domiciliaria existente tenía recubrimiento en concreto, poco adecuado. En el tramo Pz 1 a Pz 3 se realizó limpieza para cambiar dicha pendiente por instalación de tubería de 12".




Residente Contabilista 
Residente Interventor

16/09/21

Clima: Retroexcavadora
Materiales: Ing Residente
Personal: Ing Auxiliar
Inspector
Cederao
Siso
Maestro
Ayudante

Descripción

Realizamos jornada laboral con excavación manual para domiciliarias en el tramo Pz 6 a Pz 2. En el frente Pz 5 a Pz 6 se fundió caja de inspección y recubrimiento de domiciliaria. En el tramo Pz 6 a Pz 2 se hizo excavación manual para no causar daño alguno en tubería del Ibal y mangera.


Residente Contabilista 
Residente Interventor

17/09/21

clima :


Maquinaria :


Personal :

- Ing Residente
- Ing Auxiliar
- Inspector
- Cadenero
- Siso
- Muestro
- Ayudante

Descripción:

Iniciamos la jornada laboral con retiro de pavimento rígido para excavación manual para instalación de domiciliario en el tramo P2 6 a P2 7. En el tramo P2 3 a P2 3, iniciamos con excavación mecánica para instalación de tuberías aguas residuales. En el tramo P2 5 a P2 5 bis instalación de domiciliario con recubrimiento y fundido de caja.


Residente Contratista


Residente Interventor

18/09/21

clima

Maquinaria

Personal :

- Ing Residente
- Ing Auxiliar
- Inspector
- Cadenero
- Siso
- Muestro
- Ayudante

Descripción:

Iniciamos jornada laboral con retiro de pavimento rígido para excavación manual para instalación de domiciliario en el tramo P2 6 a P2 7.

mecanica para instalacion de tuberia 12" dicha excavacion se realizo hasta el Pozo 3 desde el Pozo 5a. En el tramo Pz 1 a Pz 3 se realizo cambio de pendiente para su debida instalacion de tuberia

AAH
Ing Residente Contratista

Residente Interventor

19/09/21 Domingo

20/09/21 clima: Soleado

Maquinaria:

- Personal: Ing Residente
- Ing Auxilia
- Inspector Cadenaro
- Siso
- Maestro
- Ayudante

Descripcion

Iniciamos jornada laboral con entubado para tuberia 12" con su debida entramado en el tramo Pz 3a a Pz 3 con instalaciones de sila yee 12 x f. En el tramo Pz 6 a Pz 2 iniciamos jornada con excavacion de domicilio nueva. En el tramo Pz 5 a Pz 5bis iniciamos jornada laboral con excavacion de domicilio nueva.

AAH
Residente Contratista

Residente Interventor

21/09/21 clima: Nublado

Maquinaria:

Personal:

Eng Auxiliar
Inspector
Cadenero
Muestro
Ayudante

Descripción

Revisando el frente de obra Ullhu Lca,
El día de hoy 21-09-2021 se pudo
apreciar una obra que parece abandonada
tramos de Alcantarillado abiertos sin
terminar Material de excavación sobre
la vía, mucho desorden, cerramientos
en malas condiciones solo 3 personas
se encuentran trabajando y no tienen
la dotación correspondiente a
Imperativo Realizar rápidamente
la Instalación de la tubería plana
de las excavaciones y Retiro de
los sobantes así como el arreglo
del cerramiento perimetral.

Francisco González
Interventor

~~Residente Contratista~~

22/09/21
Clima
Magnitud
Pavoral

Eng Residente
Eng Auxiliar
Inspector
Cadenero
Muestro
Ayudante

Maestro
Ayudante

Descripción

Iniciamos jornada laboral con excavación manual para instalación de tuberías domiciliarias en el tramo Pz 6 a Pz 2, en este mismo tramo se instalaban algunas domiciliarias. En el tramo Pz 5 a Pz 5bis se fundieron cajas de inspección y recubrimiento de domiciliarias. Se hizo el arreglo en el tramo Pz 3a y Pz 3 el cual estaba afectando algunas viviendas de ese tramo.

Residente Contratista Residente Interventor

20/09/21

Clima

Maguayayán

Personal

- Ing Residente
- Ing Auxiliar
- Inspector
- Cabenero
- 5130
- Maestro
- Ayudante

Descripción

Iniciamos jornada laboral con excavación manual para instalación de domiciliarias en el tramo Pz 6 a Pz 3. En el tramo Pz 6 y Pz 5 se instalaron algunas domiciliarias.

24/09/21

clima
Mantenimiento
Personal

Ing Residente
Ing Auxiliar
Inspector
Cadenero
Siso
Maestro
Ayudante

Descripción

Se inicia jornada laboral con la actividad de excavación manual para domesticar en el tramo P2 b a P2. En el tramo P2, Sa a P2 S se realiza lleno con material recibido.

Residente ^{MT} Contratista Residente Interventor

25/09/21


clima
Mantenimiento
Personal


Ing Residente
Ing Auxiliar
Inspector
Cadenero
Siso
Maestro
Ayudante

Descripción

Se inicia jornada laboral con la actividad de excavación manual para domesticar en el tramo P2, Sa a P2 S se realiza lleno con material recibido.

en el tramo Pz 6 a Pz 2 se llenó con material recibo unas domesticas y se compactaron con saltarina.

Residente  Contralista

Residente  Inventario

26/09/21 Domingo

27/09/21 Clima
Maguinarja

Personal Ing Residente
Ing Auxiliar
Inspector
Chadeno
Sisa
Maestro
Ayudante

Descripción

Iniciamos actividades este día con carga y retiro de material de excavación en el tramo Pz 5 a Pz 7. en el tramo Pz 6 a Pz 2 se realizó la actividad de excavación manual para domesticas y la instalación de algunos de ellas.

Residente  Contralista

Residente  Inventario

Cadenero
Siso
Maestro
Ayudante

Descripción

Trabajamos activados este día con instalación de tubería de 12" en el tramo Pa 3a y Pa 3. lleno con material recibo y compactado. En futuro la instalación de tubería se realiza con su debido estudio y su ejecución correspondiente. En el tramo Pa 6 u Pa 2 se realiza actividad de fundación de los de inspección y ejecución de domicilio.

Residente Contabilista

Residente Interventor

29/09/21



Clima
Magnitud
Personal

Ing Residente
Ing Auxiliar
Inspector
Cadenero
Siso
Maestro
Ayudante

Descripción

Trabajamos jornada laboral con fundación de instalación de tubería de 12" en el tramo Pa 3a y Pa 3 con su debido estudio y ejecución correspondiente.

en el tramo Pe 6 a Pe 2 se realizó
excavación manual para domiciliares y también
para cajas de inspección.

 
Residente Contratista Residente Interventor

10/9/21



clima

buena

- Personal
- Ing Residente
- Ing Auxiliar
- Inspector
- Cudenero
- Siso
- Muestrero
- Ayudante

Descripción

Trabajamos actividades este día con instalación
de tubería de 12" en el tramo Pe 3a a Pe 3
con su debido entubado y encamado con grava.
En el tramo Pe 6 a Pe 2 se realizó finalización
de cajas de inspección y excavación de
domiciliares.

 
Residente Contratista Residente Interventor

27/09/2021

Clima = Soleado

Maquinaria = Retroexcavadora

Demoledor

Planta electrica

Personal = Ing. Residente 1

Ing. Auxiliar 1

Inspector 1

Cadenero 1

Siso 1

Maestro 1

Ayudante


Descripción = Se dispone de Comisión de topografía en el frente de obra para regular actividad de localización y replanteo en el área a intervenir en la calle 23 Barrio Recarte. Seguido se realiza la actividad de cerramiento del frente de obra y se da inicio a la actividad de excavación a máquina para la instalación de tubería de 12" poligida en la red de alcantarillado residual, red que sera encofrada ya que no cumple con las medidas correctas de altura.

[Signature]

Residente Contratista

[Signature]

Residente Interventor



28/09/2011

Clima = Soleado

Maquinaria = Retroexcavadora
Demoledor
Planta electrica

Descripción = Ing. Residente 1
Ing. Auxiliar 1
Inspector 1
Cadenero 1
SISO 1
Maestro 1
Ayudante

Descripción = Se continúa la excavaciones a
magana en el tramo pozo 1 al pozo 2
red de alcantarillado residual.

Se hacen arreglos en la red de acueducto
existente cuencado durante las ejecuciones

[Signature] Contralista Residente *[Signature]* Contralista Interventora

29/09/2011

Clima = Soleado

Maquinaria = Retroexcavadora
Demolador
Planta electrica

Personal = Ing. Residente 1
Ing. Auxiliar 1
Inspector 1
Cadenero 1
SISO 1
Maestro 1
Ayudante

Descripción = Se continúa la excavacion a magana
en el tramo pozo 1 al pozo 2 en la red de
alcantarillado residual

Se hacen arreglos en la red de acueducto
convenidos durante excavaciones.

[Signature]

Contratista Residente

[Signature]

Contratista Interventor

30/09/2021

Clima = Soleado

Maquinaria = Retroexcavadora
Demolidor

Planta electrica

- Personal = Ing. Residente 1
- Ing. Auxiliar 1
- Inspector 1
- Cadenero 1
- Siso 1
- Maestro 1
- Ayudante 1


DESCRIPCION = Se da inicio a la jornada lab
iniciando con las actividades para instalacion
tuberia en la red de aguas residuales tuberia
12 pulgadas realizando el debido en tiberia
encamado de grava para la instalacion de 25
metros lineales de tuberia entre los pozos 2 y
pozo 1

[Signature]

Contratista Residente

[Signature]

Contratista Interventor



01/09/2021

Clima = Lluvia 7:00 am - 11:30 am

Maquinaria = Retroexcavadora
Demolador
Planta
Saltorin Compactador

Personal = Ing Residente 1
Ing Auxilia. 1
Inspector 1
Cadenero 1
S.S. 1
Maestro 1
Ayudante

Descripción = Se presentan lluvias fuertes e intermitentes durante la mañana, se reanuda actividades de excavación después de medio día, se presentan sobreeexcavaciones en el tramo poto 14 a poto 19 se realiza de entibado y se instala un tubo con dos orilla yee. Paralelo a esto se realiza vaciado de concreto para dos cajas de inspección en el tramo poto 29 a poto 26, se hace la debida señalización y cerramiento de obra.

Residenta Contratista

Residente Interventor

02/09/2021

Clima =
Maquinaria = Retroexcavadora peyorita


Demolador
Planta
Saltorin Compactador


- Ingeniero Auxiliar 4
- Inspector 1
- Cadenero 1
- Siso 1
- Maestro 1

Ayudantes

Se inicia la jornada laboral haciendo una excavación en el tramo pozo 14 a pozo 10 a se realiza el debido entibado para un tubo, se hace la instalación de lencha en grava y se realiza la instalación del tubo conectando al pozo 10 a se continua con la instalación de relleno en la zanja y se realiza la conformación y compactación, por otro lado se continua con la excavaciones manuales para domedieros en el tramo pozo 19 al pozo 18.

- Por parte del contratista e interventoria se toma la decisión de hacer un lleno en relleno en los Corcebas existentes en el tramo pozo 10 a al pozo 5 esto para garantizar la entrada y salida de maquinaria y volquetes durante la reposición del alcantarillado residual en el tramo mencionado. Dichos llenos se realizaron en material de relleno ya que el material de excavación se encuentra totalmente contaminado por desperdicios y excrementos de las personas que residen en el sector y no brinda las condiciones de estabilidad para garantizar el paso de los equipos mencionados.


Residente Contratista


Residente Interventoria

9

03/09/2021

Clima =

Maquinaria = Retroexcavadora

Demoledor

Planta

Saltoirin Compactador

Personal =

Ing Residente 1

Ing Auxiliar 1

Inspector 1

Cadenero 1


SISO 1

Maestro 1

Ayudantes

Descripción: Se continúa con la excavaciones a máquina en el tramo pto 10 a al pozo 9a se realiza el debido entibado para un tubo de 20" y se hace la instalación con dos dilataces para la domiciliaria; se realiza un lleno de recebo en tanga con su compactación. Paralelo se realiza el vaciado de concreto para las tapas de las cajas de inspección.


Residente Contratista


Residente Interino

04/09/2021

Clima =

Maquinaria = Retroexcavadora Portátil

Demoledor

Planta eléctrica

Saltoirin Compactador

Personal =

Ing Residente 1

Ing Auxiliar 1

Inspector 1

SISO 1
Maestro 1
Ayudantes 10

Descripción = Se continúa la jornada laboral haciendo excavación a maganera en el tramo pozo 10a a pozo 8a realizando e instalando el entubado, pero la instalación de un tubo de 20" con dos sillas y para domar herida residual.

Se realiza las cañuelas de los ceyes de inspección residual en el tramo pozo 29 pozo 26 de donde se ceyes lotas para la entrega a los clientes.


Residente Contratista


Residente Interventor

06/09/2021 Clima = lluvias 7:00 am - 11:30 am

Maganerica = Petroexcavadora Pajarita

Demolidor

Planta

Salterm Compuclador

Personal = Ing Residente 1

Ing Auxiliar 1

Inspector 1

Cadenero 1

SISO 1

Maestro 1

Ayudantes 10

Descripción =

Se inicia la jornada laboral con fuertes lluvias desde la 7:00 am hasta las 11:30 am.

Se reanuda las actividades de excavación en el pozo 10a - al pozo 8a haciendo también instalación de entubado y la instalación de un tubo de 20 pulgadas para la red de domar herida. con dos sillas.

para domiciliarios residuales. Paralelo se adelanten excavaciones para cajas de inspección residuales entre los pozos 14 y 19 y excavaciones manuales entre los pozos 18 y 18a para domiciliarios residuales.

M.H.H.

[Signature]

Contratista Residente

Contratista Interventor

07/09/2021

Clima = Soleado

Máquina = Retroexcavadora Popoita

Demoledor

Planta

Saltarin

Cortadora.

Personal = Ing Residente 1

Ing Auxiliar 1

Inspector 1

Cadenero 1

Siso 1

Maestro 1

Ayudantes

Descripción = Se continúa con la excavación a máquina entre los pozos 10a al pozo 8a.

Se realiza la instalación de dos tubos y dos silla y se instala el entibado correctamente para los dos tubos. Con su cama en grava y relleno en tanga con recebo. Con esta instalación de dos tubos se llega al pozo 8a el cual se construirá.

- se adelantan excavaciones a mano para domiciliarios en el tramo pozo 19 a pozo 18.

M.H.H.

[Signature]

08/09/2011 Clima = Lluvias 7:00 am - 9:00 am

Maquinaria = Retroexcavadora Pajonita

Demoledor

Saltoan

Planta

Personal = Iny Residente 1

Iny Auxiliar 1

Inspector 1

Cadenero 1

Si So 1

Maestro 1

Ayudantes

Descripción: Se inicia labores 9:00 am por lluvias en el sector, se hace un retiro de material de excavación y se procede a continuar con la excavación a máquina en el tramo pozo 8a a pozo 5 red de alcantarillado residual, durante la excavación se presentan deslizamientos de tierra por el terreno afectado por las lluvias. Se procede hacer el entibado y el encajado con grava para luego la instalación de un tubo de 20 pulgadas con tres sillas y se para domos laterales residual.

- Se hace la excavaciones manuales y limpieza del pozo 18a y 10a los cuales se han construido.

- Se realiza la conformación de recebo en el tramo pozo 18 al pozo 18a.

Residente Contralora

Residente Interventora

09/09/2021

Clima =

Maquinaria = Retroexcavadora Pajonta

Demoledor

Saltarin

Planta

Personal = Ing Residente 1

Ing Auxiliar 1

Inspector 1


Cidenero 1

Siso 1


Maestro 1

Ayudantes

Descripción = Se inicia la jornada laboral haciendo una limpieza de la obra para luego continuar con las excavaciones manuales para domicilios residuales en los tramos pozo 18 a 18a y pozo 14 a 10a. Se realiza la ruptura de pavimento para los domicilios, se hace la excavación manual para piso del pozo 10a.



Residente Contratista



Residente Interventor

01/09/2021

Clima =

Maquinaria = Retroexcavadora Pajonta


Demoledor


Saltarin

Planta

Descripción = Se continúa con las excavaciones manuales para domicilios residuales en los tramos pozo 18 al pozo 18a y del pozo 14 al 10a. Se realiza la conformación y compactación

excavación de cajas de inspección residual dependo organizada y limpia la obra, se hace un vaciado de concreto para la placa pro del pozo y oca.


Residente Contratista


Residente Interventoria

11/09/2021


Clima =


Máquinaria = Demoledor
Planta
Sulterm Compresor

Personal = Ing Residente 1
Ing Auxiliar 1
Inspector 1
Cadenero 1
Siso 1
Maestro 1
Ayudantes

Descripción = Se Continúan la excavaciones manuales para demoleren residual en el tramo 14 a 10a y en el tramo pozo 18 al pozo 18a dependo como terminada la excavación 3 casa). Se realiza la excavación para dos cajas de inspección residual en el tramo pozo 18 al pozo 18a y (dep) se hace un vaciado en concreto 3.000 psi para una caja de inspección residual.

Se labora hasta el medio día.


Residente Contratista


Residente Interventoria

10/09/2021

Clima = Soleado

Maquineria = Demoledor

Planta

Retroexcavadora Pajanta

Salton Compactador

Personal = Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero

S.S.O

Maestro

Ayudante

Descripción = Se continúan las excavaciones
necesarias para domesticación residual en los pozos
pozo 18 a 18 a y pozo 14 a pozo 10a dejando
como resultado 4 capas con su respectiva tubería
instalada de 6 pulgadas debidamente citacadas y
compactada. Ya se realiza la construcción del
pozo 10 a en la cilla

Residente Contratista

Residente Interventor

14/09/2021

Clima = Soleado

Maquineria = Demoledor

Planta

Salton Compactador

Personal

Ing Residente 1

Ing Auxiliar 1

Inspector 1

Cadenero 1

S.S.O 1

Ayudantes

Descripción: Se Continúa con la excavaciones manuales para domiciliares y se realiza la excavación para caja de inspección residual (2) y se realiza el vaciado de concreto para la misma de 3000 psi paralelo se hace la excavación manual para dos domiciliares residual y se instala la tubería de alacázanos.

- Se hace limpieza de material excavación del pozo 18a y se vacía concreto 3000 psi para placa pu y se comienza la construcción en labrillo del mismo pozo. Se toman muestras de concreto para ensayos

MTV

Contratista Residente

Contratista Interventor

15/01/2011 Clima = Soleado

Mecanico = Demolido

Planta

Saltam Compactador

Personal = Ing Residente 1

Ing Auxiliar 1

Ing Inspector 1

Cidenero 1

Siso 1

Maestro 1

Ayudantes

Descripción = Se Continúan con las excavaciones manuales para domiciliares y cajas de inspección residual entre los tramos pozo 18 al pozo 18a pozo 14 al pozo 10a; Se Continúan la construcción del pozo 18a se hace mejoramiento de cerramiento y se hace la separación de la obra

AAA

Contratista Residente

RAIPIJU

Contratista Interventor

16/09/2021

Clima =

Maquinaria = Demoledor

Planta

Salterin Compactador

Personal =

Ing Residente 1

Ing Auxiliar 1

Inspector 1

Cadenero 1

S.S.O 1

Maestro 1

Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando el vaciado de concreto para la placa piso de pozo 10 a continuando con el vaciado de concreto para tres cajas de inspeccion residual en el tramo que comprende del pozo 19 al pozo 11 paralelo se realiza la actividad de excavacion manual para domiciliaciones residuales tramo pozo 14 a pozo 10a.

AAA

Contratista Residente

RAIPIJU

Contratista Interventor

17/09/2021

Clima =

Maquinaria = Demoledor

Planta

Salterin Compactador

Personal =

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

- Cadenero
- Siso
- Maestro
- Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral construyendo el cilindro en bodega del pozo 10 a con su respectivo cono de reducción. Realizamos la excavación manual para la domo de la casa C10 24-59 haciendo la respectiva instalación del tubo de 6" con su cono de grava y haciendo un vaciado de relleno y compactación igual que para la casa C10 24-65.

[Signature]
Contratista Residente

[Signature]
Contratista Interventor

18/09/201

Clima =

Máquina = Demolidor

Planta

Saltarin Compactador

Personal = Ing Residente 1

Ing Auxiliar 1

Inspector 1

Cadenero 1

Siso 1


Maestro 1


Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral construyendo el cilindro para el pozo 8a paralelo. Se realiza conformación y compactación de terreno en las diferentes zonas de trabajo y así haciendo un mejoramiento de la obra en cuanto a limpieza.

Se continúan las excavaciones...

dominicales residuales.
se labora hasta medio día


Contratista Residente


Contratista Interventor

10/09/2021

Clima =

Maquinaria = Retroexcavadora

Demoledor

Salton Compactador

Planta

Personal = Ing Residente 1

Ing Auxiliar 1

Inspector 1

Cadenero 1


S.S.O 1


Maestro 1

Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando una localización y replanteo de los pozos 22 al pozo 23 comentando la actividad de excavación a máquina para la instalación de tubería de 16" de red de aguas lluvias.

Se instala el debido entibado para tres tubos y se realiza la respectiva instalación de los tubos mencionados. Paralelo se hace el vacado de concreto para 10 tapas de cajas de inspección residual.


Contratista Residente


Contratista Interventor

21/09/2021

Clima =

Maquinaria = Retroexcavadora

Demoledor

Planta

Saltarin Compactador

Personal = Ing Residente 1

Ing Auxiliar 1

Inspector 1

Cadenero 1


S.S.O 1


Maestro 1

Ayudantes

Descripción = Continuamos con la actividad de excavación o maquinaria para la instalación de tubería de 16 pulgadas en la red de aguas lluvias del pozo 22 al pozo 13 realizando la instalación de dos tubos y conectando la tubería con el pozo 23 dejando realizado dicho tramo.

Paralelo se realiza la excavación domiciliaria residual en 3 casas del pozo 14 al pozo 10.


Contratista Residente


Contratista Interventor

22/09/2021

Clima =

Maquinaria = Retroexcavadora

Demoledor

Planta

Saltarin Compactador

Personal = Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero


S.S.O

-Maestro


-Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando un localización y replanteo de los pozos 22 al pozo 17 comentando la actividad de excavación a máquina para instalación de tubería de 16" de la red de aguas lluvias.

Se instala el debido entubado para dos tubos y se hace el debido proceso para su instalación. Se continúa con las excavaciones manuales y el vaciado de concreto para tres cavas de cajas de inspección residual.



Contratista Residente



Contratista Interventora

23/09/2021

Clima =

Máquina = Retroexcavadora

Demolidor

Planta

Saltarin

Personal = Ing Residente 1

Ing Auxiliar 1

Inspector 1

Cadenero 1

S.S.O 1


Maestro 1


Ayudantes

Descripción = Se continúa con la actividad de excavación a máquina para la instalación de tubería de 16" en la red de aguas lluvias entre los pozos 22 al pozo 17. realizando el debido proceso para la instalación de dos tubos, con su debido

de recebo y compactación del mismo.

Continuamos con excavaciones manuales.


Contratista Residente


Contratista Interventor

24/09/2014

Clima =

Maquinaria = retroexcavadora

Demoledor

Planta

Saltorn Compactador

Personal = Ing Residente 1

Ing Auxiliar 1

Inspector 1

Cedenero 1


S.S.O 1


Muerto 1

Ayudantes

Descripción = Continua actividad de excavación a máquina para instalación de tubería de 16 pulgadas entre los pozos 22 al pozo 17. Se realizó la instalación de un tubo y dejando conectado al pozo 17 dejando así el tramo realizado.

Se hace vaciado de concreto para 3 cajas de inspección residual en el tramo pozo 19 pozo 18 y se continúan excavaciones manuales para domiciliar


Contratista Residente


Contratista Interventor


25/09/2024


Clima =

Maquinaria = Retroexcavadora
Demolidor
Planta
Saltarin Compactador

Personal = Ing Residente 1
Ing Auxiliar 1
Inspector 1
Cadenero 1
Siso 1
Maestro 1
Ayudante

Descripción - Se da inicio a la jornada laboral realizando actividades de limpieza y organización de la obra dejando el cerramiento arreglado. Se realiza retiro de material de excavaciones y se conforma terreno para su compactación. Se labora hasta medio día.


Contralista Residente


Contralista Interventor

27/09/2024


Clima =


Maquinaria = Retroexcavadora
Demolidor
Planta
Saltarin Compactador

Personal = Ing Residente 1
Ing Auxiliar 1
Inspector 1
Cadenero 1
Siso 1
Maestro 1

1 1 1

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral
 haciendo una localización y replanteo de los
 pozos 11 al pozo 11a. Comenzando la
 actividad de excavación en magama para instalación
 de tuberías de 16" red de agua lluvia.
 Se realiza la debida instalación de un tubo con
 su respectivo entibado y cama en grava.
 Se continúan las excavaciones manuales para
 instalaciones residuales en el tramo pz 10 al 11a.


 Contraloría Residente


 Contraloría Interventora

28/10/2021 Claves =

Maquinaria = - Retroexcavadora

- Demolidor

- Planta

- Salterin Competedor

Personal = - Ing Residente 1

- Ing Auxiliar 1

- Inspector 1

- Cadenero 1

- SISO 1

- Maestro 1

- Ayudantes

Descripción = Se continúan las excavaciones a magama
 entre los pz 11 al pz 11a realizando la debida instalación
 de un tubo de 16" pulgadas; se hace instalación de
 entibado y cama en grava.

Se realiza la instalación de tubería de 6" para
 domiciliarias residuales en el tramo pz 14 al pz 10 (3 casas)
 haciendo cama de grava y lleno en recebo.

29/10/2021

Clima =

Maquinaria = Retroexcavadora

Demoledor

Planta

Salterin Competador

Personal = Ing Residente 1

Ing Auxiliar 1

Inspector 1

Cadenero 1

SiSo 1

Maestro 1

Ayudante

Descripción = Por parte Contratista y parte de interventoria se estipula que la longitud de tubería para cada boca calle sea de 4.5ml.

Siendo así tendremos 43 bocas calles que intervenir (4.5ml x 13 = 58.5 ml tubería de 10") lo que corresponde a 10 tubos. Se acuerda adicionar un tubo por desperdicio.

Se Continúan la excavaciones a máquina entre los pozos 11 al pozo 11a realizando la debida instalación de un tubo de 16 pulgadas., se realiza la debida instalación del entibado y encamado en grava. Paralelo se realiza unido de concreto en las torcas (A) entre los pozos 19 al pozo 18 a

[Signature]

Contratista Residente

[Signature]

Contratista Interventoria

30/09/2021

Clima =

Maquinaria = Retroexcavadora pajarita

Demoledor

Planta

Personal =

- Ing Residente 1
- Ing Auxiliar 1
- Inspector 1
- Cadenero 1
- SISO 1
- Maestro 1
- Ayudantes

Descripción = Se Continúan la excavaciones en máquina para la instalación de tubería de 16" en el tramo pozo 11 al pozo 14a hacienda la instalacion de un tubo con su respectivo entibado y cama de grava.

Se realiza el vaciado de concreto para dos cajas de inspeccion residual en el tramo pozo 10 al pozo 14 y continuamos con domiciliarias residuales para culminar la jornada laboral.

[Signature]
Contratista Residente

[Signature]
Contratista Interventor

01/02/2021 Clima = Soleado
Máquina = Retroexcavadora
Demoledor
Planta
Saltarin

Personal =

- Ing Residente 1
- Ing Auxiliar 1
- Inspector 1
- Cadenero 1
- SISO 1
- Maestro 1
- Ayudante

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral en la instalación de material de excavación

29-09-2021

Clima: Soleado

Maquinaria: Herramienta menor

Personal: 1 Maestro, 2 Ayudantes

Descripcion: Se da inicio a las actividades de obra realizando una socializacion con la comunidad; se instala la respectiva señalizacion y el cerramiento de la obra.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

30-09-2021

Clima: Soleado.

Maquinaria: Herramienta menor

Personal: 1 Maestro 2 Ayudantes, 1 Topografo

Descripcion: Se hacen trabajos de topografia y se demarcan los pozos a trabajar; se hace demarcacion de la excavacion y se dejan avisados de esta forma culmen las jornadas laborales.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

01-10-2021

Clima: Soleado

Maquinaria: Retriexcavadora, Demolador

Personal: In Novedad.

Descripcion: Se inician las jornadas laborales haciendo un hueco en la via con resaca para dar acceso a la Retriexcavadora; se realiza corte y demolicion de pavimento rigido y por ultimo se hace excavacion de Pozo 1 a Pozo 2.

RESIDENTE DE OBRA


RESIDENTE DE INTERVENTORIA

02-10-2021 Clima: Soleado


Maquinaria: Mezcladora

Personal: Sin Novedad

Descripción: Se inicia la Jornada laboral verificando Niveles de excavación; durante toda la Jornada se hace instalación de Solado para poder instalar tubería de 10".



RESIDENTE DE OBRA



RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

04-10-2021 Clima: Soleado


Maquinaria: Herramienta menor

Personal: Sin Novedad

Descripción: Se inician Actividades verificando Niveles del Solado en concreto instalado el día anterior; se procede a la instalación de Tubería de 10 pulgadas y A continuación se realiza en concreto Terminando de esta forma la Jornada laboral



RESIDENTE DE OBRA




RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

05-10-2021 Clima: Soleado


Maquinaria: Retroexcavadora

Personal: Sin Novedad

Descripción: Se inicia la jornada laboral trazando la demarcación de excavación en el tramo de Pozo 2 a Pozo 3. A continuación se realiza el corte de Pavimento Rígido y se termina la Jornada con 10 ml de excavación



RESIDENTE DE OBRA



RESIDENTE DE INTERVENTORÍA


06-10-2021


Clima: Soleado

Maquinaria: Retroexcavadora, Cortadora

Personal: Sin Novedad

Descripción: Se inicia la jornada laboral realizando un Doble de flujo Vehicular para poder intervenir la vía donde se encuentra el pozo 3; Se realiza excavación desde pozo 3 a pozo 2; Se construye Cámara de Caida en pozo 3; Se instala Camu en Grúa y Tubo de 10 pulgadas, se realiza el suministro de Recibo en Zanja y Al finalizar la jornada se da apertura a la vía para Normalizar el Flujo Vehicular.


 RESIDENTE DE OBRA


 RESIDENTE DE INTERVENTORIA


07-10-2021


Clima: Soleado



Maquinaria: Retroexcavadora

Personal: Sin Novedad


Descripción: Se realiza el suministro e instalación de Recibo en Zanja en el tramo de pozo 1 a pozo 2; También se hace corte y Demolicion de pavimento antiguo luego se procede a hacer actividades de excavación de esta forma se termina la jornada laboral.


 RESIDENTE DE OBRA


 RESIDENTE DE INTERVENTORIA

| | |
|------------|---|
| 01/09/2021 | <p>Clima: Lluvias de 8:00 am a 1:00 pm.</p> <p>Maquinaria: Retroexcavadora, saltarina, nivel de precisión, demolidor</p> <p>Personal: Sin novedad</p> <p>Descripción: Se da inicio a la jornada laboral adelantando actividades de compactación de cupas de recebo, se presentan lluvias en el frente desde la 8:00 am hasta el medio día, luego de la jornada de almuerzo se reanuda nuevamente las actividades, realizando la excavación final del tramo de la red 2 entre P211 y P28, se entiba el terreno para poder perfilar terreno, se prepara terreno para fundir caja de inspección y se da por finalizada la jornada laboral.</p> |
| | <p> RESIDENTE DE OBRA</p> <p> RESIDENTE INTERVENTORIA</p> |
| 02/09/2021 | <p>Clima: Soleado</p> <p>Maquinaria: Retroexcavadora, nivel de precisión, demolidor, saltarina</p> <p>Personal: Sin novedad</p> <p>Descripción: Se da inicio a la jornada laboral, realizando actividades de perfilación del terreno para poder instalar tubería de 24", se entiba para realizar la instalación de la tubería faltante para finalizar tramo de P211 a P28 en la red 2, se instala dicha tubería chequeando su nivel y alineamiento correspondientes, seguido por la instalación de capa de grava al tercio de la tubería, se realiza apigote para encontrar caja de inspección domiciliaria y se realiza apigote para encontrar la tubería de salida del P23 y poder definir la pendiente final a manejar en este tramo, se funde caja de inspección de vivienda con dirección Calle 24 #1763 sur, se realiza</p> |

la demarcación del ancho de excavación del tramo de PZ8 a PZ3 y se inicia la excavación en los primeros 3 metros lineales y se instalan cupas de recebo en tramo de PZ11 a PZ8 de red 2. y se da por finalizada la jornada laboral.


RESIDENTE DE OBRA


RESIDENTE INTERVENTORÍA

03/09/2021


Clima: Soleado

Magnitud: Retoxavadora, nivel de precisión, sultarín, demoledo

Personal: Sin novedad

Descripción: Se inicia la jornada laboral adelantando actividades de demolición de tubería en llegada a PZ8, se adelanta la compactación de cupas de recebo en tramo de red 2 de PZ11 a PZ8, se demarca y se continúa excavación de tramo de PZ8 a PZ3 en la red 2, se entiba tramo para perfilar terreno e instalar tubería, se realiza la construcción de placa en concreto de 2500 Pcs para encoplado de tubería de 18" de la red 3 de PZ9 a PZ6.

Por orden de la supervisión por parte del IBAL, las actividades del frente de Las Fieras se detienen hasta que se implemente el PMT solicitado.


RESIDENTE DE OBRA


RESIDENTE INTERVENTORÍA

SUPERVISIÓN IBAL

25/09/2021


Clima: (Soleado) Lluvias de 7:00 am a 9:00 am

Maquinaria: Nivel de precisión, saltarín


Personal: Sin novedad

Descripción: Se inician actividades en el frente las Fcivas luego de la autorización por parte de la supervisión del ISAL, luego de que se implementara el PMT en el contraflujo de la calle 25.

Se prepara instalación del primer tubo de 24" entre PZ8 y PZ3 de la red 2, se chequea alineamiento y niveles del primer tubo, se instala capa de grava al tercio de la tubería y se instala Muro para evitar desplazamiento de la tubería en caso de lluvias, se finaliza la jornada laboral.



RESIDENTE DE OBRA



RESIDENTE INTERVENTORÍA


27/09/2021

Clima: Lluvias de 7:00 am a 9:00 am


Maquinaria: Nivel de precisión, saltarín

Personal: Sin novedad





Descripción: Se da inicio a la jornada laboral chequeando tubería instalada el día anterior, se adelantan arreglos de polisonbía y cerramiento en mal estado, se instala segundo tubo de 18" en red 3 de PZ9 a PZ6 y se prepara encubierto so fondo llegada de tubería al PZ8, se deja instalada sifa yee para conexión domiciliar, se realiza encubierto de segundo tubo de 18" y al finalizar la actividad, se da por terminada la jornada laboral



RESIDENTE DE OBRA




RESIDENTE INTERVENTORÍA

| | |
|------------|---|
| 10/09/2021 | <p>Clima: Lluvias de 7:30 am a 8:00 am</p> <p>Maquinaria: Retroexcavadora, nivel de precisión, saltarín</p> <p>Personal: Sin novedad</p> <p>Descripción: Se da inicio a la jornada laboral con lluvias en el frente, se demarca el ancho de excavación de red 2 de P28 a P23 y se procede a realizar la excavación de la misma, se realiza excavación manual para poder instalar tubería de 6" para conexión domiciliar, se entiba para perfiles terreno, se instala segundo tubo de 24" en tramo de P28 a P23, se nivela y se alinea, se instala capa de grava al tercio de la tubería y se instala recebo para evitar desplazamientos</p> |
| | <p> RESIDENTE DE OBRA</p> <p> RESIDENTE INTERVENTORÍA</p> |
| 11/09/2021 | <p>Clima: Lluvias 7:30 am a 8:00 am</p> <p>Maquinaria: Nivel de precisión, retroexcavadora, saltarín</p> <p>Personal: Sin novedad</p> <p>Descripción: Se inicia la jornada laboral realizando la compactación de capas de recebo en red 2 y red 3, el personal del contratista es mínimo solo se adelantan actividades de compactación de recebo y arreglo de cerramiento dando por finalizada la jornada.</p> |
| | <p> RESIDENTE DE OBRA</p> <p> RESIDENTE INTERVENTORÍA</p> |
| 13/09/2021 | <p>Clima: Soleado</p> <p>Maquinaria: Retroexcavadora, nivel de precisión, saltarín, demoleedor</p> <p>Personal: Sin novedad</p> <p>Descripción: Se inicia la jornada con la demarcación del ancho de excavación para continuar con</p> |

la excavación del tramo de p29 a p26 de la red 3, se continúa con la excavación a máquina, se instala estibado, se perfila el terreno y se instala capa de grava para instalación del 3er tubo de 18", al no contar con suficiente personal el contratista se da por finalizada la jornada laboral



RESIDENTE DE OBRA



RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

19/09/2021

Clima: Soleado


Maquinaria: Retroexcavadora, nivel de precisión, saltarín, demoldo

Personal: Sin novedad

Descripción: Se inicia la jornada laboral con la compactación de capas de rebase en tramos de la red 2 y 3, se llena de material la zanja de la red 2 entre p28 y p23 para poder continuar con la excavación de la red 3, se continúa con la instalación del cerramiento cerca a la cámara 1ra, se continúa excavación de la red 3 llegando con la excavación al p26, se demarca la excavación de p28 a p23 y se continúa la misma, se encuentra placa de concreto debajo de tubería existente con dimensiones longitud = 11 m, ancho = 1,1 m, alto = 0,38 m, se dan por finalizadas las labores.



RESIDENTE DE OBRA



RESIDENTE INTERVENTORÍA

19/09/2021

Clima: Lluvias de 7:30 am a 8:00 am

Maquinaria: Retroexcavadora, nivel de precisión, demoldo, saltarín

Personal: Sin novedad

Descripción: Se inicia la jornada laboral, evidenciando la caída del material compactado en la red 2

ya que las excavaciones están muy cerca entonces por seguridad se retira el material compactado, se retira material de obra, se chegran niveles de terreno para instalar capas de grava y se deja la instalación de tubería para el día siguiente.


RESIDENTE DE OBRA


RESIDENTE INTERVENTORIA


16/09/2021

Clima: Soleado

Maquinaria: Retroexcavadora, nivel de precisión, suttarín, demobed

Personal: sin novedad

Descripción: se inicia la jornada laboral, realizando la instalación de capa grava en zanja, se realiza la instalación del 4to tubo de 28" de la MD 3 entre P29 a P26, se chequea alineamiento y niveles del mismo, se instala capa de grava al tercio del tubo, se instala chicote y se nivela y se alinea, se enbuna con concreto se prepara instalación de silla yee para conexión domiciliaria, se realiza compactación de capas de relleno en MD 2, se instalan capas de relleno en cima del 4to tubo y chicote de 19" para evitar desplazamientos en caso de lluvia, se instalan silla yee y silla tee para conexiones domiciliaria, se finaliza jornada laboral


RESIDENTE DE OBRA


RESIDENTE INTERVENTORIA

17/09/2021


Clima: Soleado


Maquinaria: Retroexcavadora, nivel de precisión, suttarín, demobed

Personal: sin novedad

Descripción: se inicia la jornada laboral con la continuación de la excavación de P29 a P25,

se compactan capas de relleno en red 2 y 3, se realiza excavación para conexión domiciliar, se excava manualmente debajo de tubería de 18" en tramo de PZ6 a PZ9 para instalar tubería de 24" de PZ8 a PZ3, se instala entibado para perfilar terreno para instalar tubería, se instala tubería de 6" para conexión domiciliar de vivienda con dirección calle 29 #1-52 su, se demuele placa debajo de tubería existente con dimensiones 11 x 1,2 x 0,38 y se finaliza la jornada laboral



RESIDENTE DE OBRA



RESIDENTE INTERVENTORIA

11/07/2021 Clima: Soleado

Magnitud: Retroexcavadora, nivel de precisión, saltarín, demolidor
Personal

Descripción: se inicia la jornada laboral con la excavación y finalización del tramo de la red 2 entre PZ8 y PZ3, se adelantan actividades de compactación de relleno en excavaciones de las redes 2 y 3 y se reinstalan tramos de cerramiento caídos y dañados y se finaliza la jornada laboral


RESIDENTE DE OBRA



RESIDENTE INTERVENTORIA


01/08/2021 Clima: Soleado

Magnitud: Retroexcavadora, saltarín, nivel de precisión, demolidor
Personal: Sin novedad

Descripción: se inicia el día laboral con la instalación de tubería de 24" y se realiza el entibado para trabajar en la zanja y perfilar terreno, se instala tubería que


conecta en p₂₃ en la red 2, se instala capa de grava al tercio de la tubería finalizando el tramo, se instalan capas de relleno, luego de chequear su respectivo nivel y alineamiento dando por finalizada la jornada



RESIDENTE DE OBRA


RESIDENTE INTERVENTORIA

21-09-2021 Clima: Nublado.

Maquinaria: Retroexcavadora, Nivel de precisión, Demolidor, Saltarin, Pulidora.
DESCRIPCION: Se inicia la jornada laboral con actividades de cerramiento; se hace rotura de concreto para caja de inspección; se hace rotura de pavimento flexible para línea de alcantarillado domiciliario; se hace retiro de material de excavación; se realiza el trazado y la demarcación de la excavación del pozo 9 al Pto 0; se instalan 12m de cama de triturado con espesor de 12cm. Se instalan 12m de tubería de 16" y se instala capa de triturado al tercio del tubo; se corrobora el nivel y el alineamiento del tubo y luego se instalan capas de relleno dando por terminada la jornada laboral.



RESIDENTE DE OBRA


RESIDENTE INTERVENTORIA

22-09-2021 Clima: Soleado

Maquinaria: Retroexcavadora; Nivel de precisión; Demolidor; Saltarin
DESCRIPCION: Se inicia la jornada laboral cargando y retirando material de excavación; se continúa con la excavación del pozo 9 a el pozo 0; se instala cama de triturado con espesor de 10 cm posteriormente se instalan 6m de tubería plástica de 16" corrobora su nivel y alineamiento; por terminar se instala capas de triturado al tercio y capa de relleno para fijar el tubo.

~~MH~~
RESIDENTE DE OBRA


RESIDENTE DE INTERVENTORIA

09-2021

Clima: Soleado

Maquinaria: Retroexcavadora Nivel de precision: Demoledor, Saltarin

Personal: Sin Novedad

Descripcion: Se inicio la jornada laboral con limpiezas del area de trabajo debido al amasijamiento de material ocasionado por las lluvias de la noche anterior; Se continuan actividades de excavacion del pozo 4 al pozo 21; se hace instalacion de tuberia de 16" x 6" y al terminar la jornada de trabajo se funda caja de inspeccion

~~MH~~
RESIDENTE DE OBRA


RESIDENTE DE INTERVENTORIA

10-09-2021


Clima: Soleado

Maquinaria: Retroexcavadora, Nivel de precision, Demoledor, Saltarin.

Personal: Sin Novedad.

Descripcion: Se inicio jornada laboral con actividades de entibido se hace revestimiento de tuberia de 6" Domiciliana; se realiza llano con recebo entre los pozos 8 y 3; al finalizar la jornada se hace la conexcion de tuberia de 16" plasticas a la tuberia existente en concreto entre los pozos 4 y 21.

~~MH~~
RESIDENTE DE OBRA


RESIDENTE DE INTERVENTORIA

15-09-2021


Clima: Soleado


Maquinaria: Retroexcavadora Nivel de precision, Saltarin.

Personal: Sin Novedad.

Descripcion: Se inicio jornada laboral con llano de Triturado espesor 10 cm y al tercio de tubo; Aloninuacion se llana

Con (Tribunado) y Recibo 12 metros lineales entre los pozos 1 y 21; Se hace instalacion de Tuberia de 6" Domiciliaria y por ultimo se funda Tapa de Caja de Inspeccion en concreto Terminando de esta forma la jornada laboral


RESIDENTE DE OBRA



RESIDENTE INTERVENTORIA


27-09-2021 Clima: Soleado

Maquinaria: Retroexcavadora, Dumper.

Personal: Sin Novedad.

Descripcion: Se inicia la jornada laboral arreglando pozos existentes. Se ejecutan actividades de Demolicion de pavimento flexible; Se inicia Excavacion desde el Pozo 7 al Pozo 5 de la Red 1; Se Realizan Apiques para determinar la nueva Red de Acueducto y Al finalizar la jornada se funda Caja de Inspeccion


RESIDENTE DE OBRA



RESIDENTE DE INTERVENTORIA


28-09-2021 Clima: Soleado

Maquinaria: Retroexcavadora, Mezcladora

Personal: Sin Novedad

Descripcion: Se inician actividades de instalacion y suministro de Tuberia de 10 pulgadas desde el Sumidero hasta el Pozo 7; Se hace Revestimiento de Tuberia de 6 Pulgadas 10 pulgadas y 18 pulgadas. Por ultimo se realiza la construccion de cilindro y cono del Pozo 7


RESIDENTE DE OBRA


RESIDENTE DE INTERVENTORIA

09-09-2021 Clima: lluvios 7:00 Am - 10 Am

Maquinaria: Retroexcavadora Marchadoro

Personal: Sin Novedad

Descripcion: SE inician actividades sobre las 10 Am debido a fuertes precipitaciones. Se hace manejo de Agua del pozo 7 al pozo 5 debido a la gran cantidad de Caudal Transitorio. Se hace excavacion por tuberia domiciliar de 6 pulgadas en la casa con direccion Cra 1 # 21-02 de vista previa de Planza la jornada laboral

MHT

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

09-09-2021 Clima: Lluvios 7:00 Am - 9 Am

Maquinaria: Retroexcavador Saltarin

Personal: Sin Novedad

Descripcion: Se inician actividades sobre las 9 Am debido a fuertes precipitaciones. Se hace manejo de Aguas Excavando del pozo 7 al pozo 6 para cambiar el cauce del Agua y poder trabajar en el tramo del pozo 7 al 6 por ultimo se hace Camara de Cauda en el pozo 8 e instalacion de silla yee de la tuberia entre los pozos 4 y 0.

MHT

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA


01-30-2021 Clima: Soleado


Maquinaria: Saltarin, Retroexcavadora

Personal: Sin Novedad

Descripcion: Se inician actividades de suministro e instalacion de lecho en granja de pozo 7 a pozo 5 (6 ml) para manejar el Agua que proviene de la red existente a continuacion se realizan actividades de suministro e instalacion y compactacion de Recibo en granja


01/09/2021 Clima: Lluvias de 8:00 am a 1:00 pm.
 Maquinaria: Retroexcavadora, saltarín, nivel de precisión, demolidor
 Personal: Sin novedad
 Descripción: Se da inicio a la jornada laboral adelantando actividades de compactación de capas de recibo, se presentan lluvias en el frente desde la 9:00 am hasta el medio día, luego de la jornada de almuerzo se reanuda nuevamente las actividades, realizando la excavación final del tramo de la red 2 entre PZ11 a PZ8, se entiba el terreno para poder perfilar terreno, se prepara terreno para fundir caja de inspección y se da por finalizada la jornada laboral.

 RESIDENTE DE OBRA

 RESIDENTE INTERVENTORÍA

02/09/2021 Clima: Soleado
 Maquinaria: Retroexcavadora, nivel de precisión, demolidor, saltarín
 Personal: Sin novedad
 Descripción: Se da inicio a la jornada laboral, realizando actividades de perfilación del terreno para poder instalar tubería de 24", se entiba para realizar la instalación de la tubería faltante para finalizar tramo de PZ11 a PZ8 en la red 2, se instala dicha tubería chequeando su nivel y alineamiento correspondientes, seguido por la instalación de capa de grava al tercio de la tubería, se realiza apigote para encontrar caja de inspección domiciliaria y se realiza apigote para encontrar la tubería de salida del PZ3 y poder definir la pendiente final a manejar en este tramo, se funde caja de inspección de vivienda con dirección Calle 24 #1763 SUR, se realiza

la demarcación del ancho de excavación del tramo de PZ8 a PZ9 y se inicia la excavación en los primeros 3 metros lineales y se instalan capas de relleno en tramo de PZ11 a PZ9 de red 2. y se da por finalizada la jornada laboral.


RESIDENTE DE OBRA


RESIDENTE INTERVENTORÍA

03/07/2021


Clima: Soleado

Máquina: Retroexcavadora, nivel de precisión, sultarín, demolidor

Personal: Sin novedad

Descripción: Se inicia la jornada laboral adelantando actividades de demolición de tubería en llegada a PZ8, se adelanta la compactación de capas de relleno en tramo de red 2 de PZ11 a PZ8, se demarca y se continúa excavación de tramo de PZ8 a PZ3 en la red 2, se entiba tramo para perfilar terreno e instalar tubería, se realiza la construcción de placa en concreto de 2500 PSI para encopado de tubería de 18" de la red 3 de PZ9 a PZ6.

Por orden de la supervisión por parte del IBAL, las actividades del frente de Las Feijas se detienen hasta que se implemente el PMT solicitado.


RESIDENTE DE OBRA


RESIDENTE INTERVENTORÍA

SUPERVISIÓN IBAL

(DIA 43) - 01- Septiembre-2021 (Miércoles)

DIA SOLADO

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Motomochillo (compresor)

Saltarin

Herramienta Menor.

Personal: Supervisor (1)

Residente Interventor (1)

Residente de Obra (1)

Topografo (1)

Sust. (1)

Obreros (2)

Maestro (1)

Se dio inicio a obra en la calle 28 la Granja a la
que se le dio el nombre de la inauguración de la
Calle 28 en honor al topografo
que se le dio el nombre de la inauguración de la

Se dio inicio a obra en la calle 28 la Granja a la
que se le dio el nombre de la inauguración de la
Calle 28 en honor al topografo
que se le dio el nombre de la inauguración de la

- Personal Supervisor (1)
- Res Intermediarios (1)
- Res de Obra (1)
- Topografo (1)
- Sis. (1)
- Obreros (3)
- Maestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Ermita a las 7:00 AM. donde se continua con la colocación del Pavimento Flexible y Rigido.

Se inicia la excavación de la red de Acueducto con el ancho de 0.50 cm y Profundidad de 1.20 mt.

En el kotopamb, inicia la colocación de Pavimento Rigido de 0.15 cm y tambien pavimento Flexible 0.15 cm se coloca material de escombros de manera manual.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Se da inicio de obra en la Calle 28 la Granja
 a las 7:00 Am donde se continua con la rotura
 de Pavimento Flexible y Rigido
 en el Kto 047 en el Frente de la vivienda ubicada
 Calle 28 # 9-34. barrio la Granja se derriba
 el sardinel una vez se esta realizando la
 excavacion de la red de Acueducto
 se continua con la excavacion de la red de
 acueducto, se tiene daño sobre el tubo de
 acueducto existente, sobre el cual se realiza
 reparacion.



M. P. [Signature]
 Jefe Residente de OBRAS

[Signature]
 Asistente

Trabajo realizado el día SABADO
 DIA SOLEADO

[Faded handwritten notes and signatures]

la
 este

Puertes llunas por lo cual no se ha podido
 a veces repulcra
 De la obra con material de la retira a donde
 del Sanchal de la obra sobre la excavacion
 que se esta realizando de acueducto.
 Se continua con la excavacion de la red de
 Acueducto Principal de manera manual, para
 se contina limpieza en la obra



MESA DE TRABAJO
 DEL PROYECTO DE OBRAS

VIZCAYA
 2021

20 de Septiembre - 2021 (DOMINGO)

A las 8:00 horas se le coge a la bomba para
 realizar el trabajo



Se da inicio de obra calle 28 la Broja a las 7:00 Am donde se realiza el retiro de la demolicion del Sardinel de la excavacion de la red principal de Acueducto.

Se continua con la excavacion de la red Principal de Acueducto, y con la rotura de Pavimento Flexible de las domiciliarias.

Se realiza retiro de escombros de manera manual y limpieza en la obra

Maria Vanessa Soto

Residente de OBRAS


Mulquin
Presidente

Dia (49) de Septiembre - 2024 (Martes)

Dia (49) de Septiembre - 2024
OLEADO

Grupo
de se
tudo

Se continúo con la rotura de las domo-culianas con el cotomartillo.
Se realiza retiro de material de manera manual y limpieza de la obra



MARIA VANESSA SOTO
ING. RESPONSABLE DE OBRAS

Valquez
responsable obra

Día (FE) 08 Septiembre 2021 (MIÉRCOLES)

Día (CODI) 08

Herramienta y equipo de trabajo
Estado de conservación
Reservado

Día (01-09-Septiembre-2021 (Jueves)

Día Salsado

Herramienta y Equipo Herramienta Menor

Personal: Supervisor (1)

Residente de obra (1)

Residente de Interventoria (1)

Topógrafo (1)

Siab (1)

Maestro (1)

Obreros (2)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja...
deambula a las 7:00 AM donde se realiza
instalación de la tubería de acueducto de
con un diámetro interno de arena de 10 cm
con un tiempo de ejecución de 1 hora
deambula a las 8:00 AM donde se realiza

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja...
deambula a las 7:00 AM donde se realiza
instalación de la tubería de acueducto de
con un diámetro interno de arena de 10 cm
con un tiempo de ejecución de 1 hora
deambula a las 8:00 AM donde se realiza

Personal Supervisor (1)
 Residente de obra (1)
 Residente de Interventoría (1)
 Topógrafo (1)
 Sirio (1)
 Obreros (2)
 Maestro (1)

Se da inicio de obra a las 7:00 AM en la calle
 29 la Granja, donde se continua con la
 instalación de la tubería de 3 con su respectivo
 empuje de arena de 10 cms, tanto en la parte

inferior y superior.
 Se continúa con el tendido de la tubería de 3 con
 empuje de arena de 10 cms.
 Se continúa con el tendido de la tubería de 3 con
 empuje de arena de 20 cms.
 Se continúa con el tendido de la tubería de 3 con
 empuje de arena de 20 cms.

Se da inicio de obra a las 9:00 Am a las Calle
de la Granja, donde se continua con la excavacion
de domiciliares de Acueducto.

Se continua con la instalacion de tuberia de
3", con las capas de arenas de 10 cms y capas
respectivos rellenos con relleno apisonado con
Saltran.

Retiro de material en volqueta de manera manual
y limpieza de obra.

Kilquiza R.
Presidente Interventor

MARIA VANESA SOTO
INE PRESIDENTE DE OBRA

Día (Cas) - 13 de septiembre - 2021 (DOMINGO)

NO se labora en la calle 28 entre Amalita
y Granja.

del

(Cas)

LEADO

PROCESO

(1)

1051

estria

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja a las 7:00 AM, donde se continua con la excavacion de las domiciliarias de acueducto. Se realiza corte en el orden donde se llegan a los contadores de Agua Potable. Se realiza retiro de material de la excavacion proveniente de la Red de Acueducto. Se realiza limpieza de obra y señalizacion.



MARIA VANESSA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBLA

Vulquignit
Residente Interventor

DIA (ES) - 11 - Septiembre - 2021 (MARTES)

DIA SOLADO

Herramientas y Equipos: Herramientas Menor

Recursos: Supervisores

Recursos de Mano de Obra

Recursos de Materiales

Recursos de Servicios

Recursos de Otros

Recursos de Transporte

Recursos de Energía

Recursos de Agua


Recursos de Aire

Recursos de Suelo

Recursos de Vegetación

Recursos de Otros

A las Acometidas de Acueducto se le
instala coma de arena de espesor de 10 cms
Se realiza refiro de escombros en volquete
de manera manual.



Volquete
Removal de escombros

M. P. V. J. S. S. S.
ING. RESIDENTE DE OBRAS

Día (se) - 15 - Septiembre - 2021 (Miercoles)

Día Festeado

Montevideo y Campos Sathorn

Patidoro

Mano de mano

Personal Supervisor

Personal Supervisor

Personal Supervisor

Personal Supervisor

Personal Supervisor

Personal Supervisor

Personal Supervisor

Personal Supervisor

Personal Supervisor

Personal Supervisor

Personal Supervisor

Personal Supervisor

Personal Supervisor

Personal Supervisor

Personal Supervisor

Personal Supervisor

Personal Supervisor

Mano de mano
Mano de mano
Mano de mano

Mano de mano
Mano de mano

Mano de mano

Día (57) - 16 - Septiembre - 2021 (Jueves)

Día: Sábado

Herramientas y Equipos. Saldara

Relidora

Herramienta Menor

Personal Supervisor (1)

Res. Interventora (1)

Res. Obra (1)

Topografo (1)

ESD (1)

Maestro (1)

Obreros (15)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Graya a la
3.00 AM donde se continua con la excavacion de
la zona inferior de las alcantarillas de este acueducto
se realiza el trabajo de desmontar y sustituir de

se realiza el trabajo de desmontar y sustituir de
se realiza el trabajo de desmontar y sustituir de
se realiza el trabajo de desmontar y sustituir de
se realiza el trabajo de desmontar y sustituir de

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja a las 7:00 AM, donde se continua con el relleno de relleno con compactacion de 20 cms. Se realiza instalacion de manguera de PE 1/2", con sus respectivos accesorios de collarin, registro, llave de Poso Adaptador macho 1/2", donde estubo siendo instalado a la red Principal de Acueducto. Se realiza retiro de material de escombros con montacargas manual y limpieza de obra.

Se solicita al contratista, empezar a priorizar el llenado de las excavaciones en la zona de obra. Para evitar accidentes de los peatonales y la

Respectiva Señalización

Paul Quir
Presidente Sintercom

Trabajo realizado el día 20 de Noviembre de 2021 (DOMINGO)

Trabajo realizado en la calle 28 la Granja

Se da inicio de obra en la calle 28 en la Granja
a las 9:00 Am, donde se continuo con el relleno
de relleno compactado con espesor de 20 cms,
Apisonado con saltarin

Se esta realizando el relleno sobre los andenes
los cuales fueron cortados con Pulidor para la
instalacion de los accesorios de la manguera Pz 42 de
Acia Datable

Retiro de material de escombros de manera manual
limpieza en la obra



Elaborado por: [Firma]
Revisado por: [Firma]

[Firma]
[Firma]

nde se
e se.
del di
on
na!

Día (Ss) - 22 Septiembre - 2001 (Miercoles)
Día Soleado

Herramienta y Equipos: Galvan
Pila

Herramienta Menor

- Personal Supervisor (1)
- Resistente de Intenmento (1)
- Resistente de Obra (1)
- Topografo (1)
- Suiza (1)
- Obreos (3)
- Maestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 23 la Granja a la
calle 24 donde se continua con la instalacion de
tranchidos de Aruedato, Rellena con Rechebo
con sus respectivas capas de 120 cms

Se realiza una visita tecnica del IIRAL para
conocer los
que se
con los

conect
se

Dia (64) - 28 Septiembre 2021 (JUEVES)

DIA SALADO

Herramientas y Equipos Salario
Pulidora Compressor
Motobomba
Herramientas Menor

Plano de Obra Superior (1)

Plano Interventoria (1)

Plano de Obra (1)

Topografía (1)

Plano (1)

Plano (1)

Plano (1)

El trabajo se realiza en la cañal de la Granadonse

El trabajo se realiza en las cañales de las rampas

El trabajo se realiza en las cañales de las rampas

El trabajo se realiza en las cañales de las rampas

El trabajo se realiza en las cañales de las rampas

El trabajo se realiza en las cañales de las rampas

El trabajo se realiza en las cañales de las rampas

El trabajo se realiza en las cañales de las rampas

El trabajo se realiza en las cañales de las rampas

El trabajo se realiza en las cañales de las rampas

El trabajo se realiza en las cañales de las rampas

Ave. Ambala

Durante el empalme se utilizaron los cotes Accesorios

entrada conjunto

X (3) valvulas pello elastico 3"

T (3) Tee 3" PVC

- (15) universales 3"

∩ (2) semicodos 3"

entrada intermedio "posterior"

Durante el empalme solo se comta con un retraso debido a que el empalme que se estaba realizando por la Ave. Ambala de tuberia se encontraba en otra direccion. Pero en el momento del P.M. y la intervencion se cancela la obra logrando

William...
...de...

Se denuncia de obra en la Calle 28 la Eranga y los 3 metros
 donde se continuaba con la conexión de las tuberías a la
 red Principal donde se realiza la verificación con Compañía
 de que todas las conexiones que han conectado, esta
 supervisión se realiza con la interventoría.
 Por otro lado se está realizando la excavación para
 cambiar la tubería del Simidara el cual se encuentra
 10" ya que por donde se realiza cambio de la tubería
 de la red de acueducto para el empalme se hace una
 curia de demolición a la cual se encontraba en tubería de
 tres.

Por mismo se realizan los respectivos selleros con codo
 en un tamaño de 20 cms cada uno respaldada con salterio.
 En la red Principal de Acueducto con el sistema de



Med
 1000000

Del (68) 20 Septiembre - 2021 (Lunes)

Del Silencio

Herramientas y equipos Herramientas Manos
Sollera

Personal Supervisor (1)

Res de Intervención (1)

Res de obra (1)

Topógrafo (1)

Excav (1)

Obreros (3)

Maestro (1)

Se detecta de obra en la calle 29 la Granga a lo
largo donde se trabaja con el arreglo de
cimientos donde en sus respectivos puntos por el
de realización de trabajos de las Aduanas
concreto de 2000 Pa
Se trabaja con el material de las Aduanas de
Kumbichu. El trabajo se realiza con el concreto

del material

del material

Personal Supervisor (1)
 Dir. Interventor (1)
 Ronda Obra (1)
 Topografía (1)
 S. 23 (1)
 Obreros (2)
 Maestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja a las
 9:00 Am. donde se realiza la instalación de la tubería
 de 10" para el sumidero, donde se le instala su
 cama de Anillo de 10 cm y se realiza su recubrimiento
 en concreto de 3000 Pst.


Se realiza la excavación para el Sardinero el cual se
 habrá de construir en la excavación de la calle Bancop 1.

Se realiza un nuevo Sardinero en la calle 28.

Se inicia trabajos en la calle es la Granja de la
3:00 Am donde se continua con la excavacion
donde se realizara el sardinel

Se realiza retiro de escombros de manera manual
Se termina con el arreglo de los andenes en
cantón de 2500 P.S. No se adelantaron mucho
debido a la fuertes lluvias que se vienen presentando
en la obra

Se realiza el impreso en la obra en general.



Juan P. VIVES SOTO
Ing. Responsable OBRAS

Verlquin
Ing. Responsable

Miércoles (30) - Septiembre 2021 (JUEVES)

Día: 30 LEAÑO

Trabajo: Reparación de pavimento Mayor
Calle: ...

Ubicación: ...

Observaciones: ...

... (faded text)

... (faded text)

... (faded text)

... (faded text)

... (faded text)

... (faded text)

... (faded text)

... (faded text)

... (faded text)

... (faded text)

... (faded text)

Granja
...
... y. Co
Sumido

Se realiza retiro de escombros de manera normal y pilares para realizar limpieza en la obra en



Mesa de trabajo de Soto
145 Puentes de Obra

Valquiza
Soy el presidente

CONTRATO N° 069 DEL
14 DE MAYO 2021

OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la Responsabilidad
de la ejecución de los trabajos de mantenimiento de la
seguridad del Sistema de la Secretaría de la
Presidencia de la República en la Secretaría de la
Presidencia de la República.

Día (01) - 16 - Septiembre - 2021 (JUEVES)

DIA LLUVIOSO
SOLERA

Herramienta y Equipos: Compresor.

Herramienta Menor

Materiales: Guadua

Polisombra

Personal: Supervisor (1)

Residente de Interventoria (1)

Residente de Obra (1)

Inspector de Interventoria (1)

Topógrafo (1)

Óseo (1)

Obieros (2)

Mantenimiento (1)

4
Día (02) - 13 - Septiembre - 2021 (VIERNES)

DIA: SOLEADO

Herramienta y equipo: Compresor:
Herramienta Menor

Materiales Polisombra

Guadua

Personal: Supervisor (1)

Res. Interventista (1)

Res de Obra (1)

Topografico (1)

GISO (1)

Obreros (2)

Maestro (1)

Se da inicio de obra en la Calle 31 y 32 cra 12 bis en el barrio Diviso donde se está haciendo la reforma de Pavimento migración al asfalto.

Se continúa con la instalación del pavimento desde la calle 31 hasta la calle 32 en el barrio Diviso y

Se da inicio de obra

Día (02) - 18 Septiembre - 2021 (SABADO)

Día: Soleado

Herramienta y Equipos: Compresor

Herramienta Menor

Personal: Supervisor (1)

Residente de Interventoria (1)

Residente de Obra (1)

Topografo (1)

Sisa (1)

Obreiros (2)

Maestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 31 y 32 Cra 12 bis en el barrio Alvaros, donde se continua con rotura de la vialidad por dia de las domiciliarios de Acueducto. Se continuo con la excavacion manual de la red Principal de Acueducto.

Se instalaron señalizaciones (2) inicio de obra y obra en progreso. Se continuo con el movimiento de la obra con el uso de la pala mecánica de 2 1/2

de bisel

DIA (04) - 20 - Septiembre 2021 (LUNES)

DIA: Soleado

Herramienta y Equipos: Herramienta Menor

Materiales: Arena

Tuberia 3"

Personal: Supervisor (1)

Residente de obra (1)

Residente de Interventoria (1)

Topografo (1)

Sico (1)

Obremos (2)

Maestro (1)

Señalización (2)

Se da inicio de obra en la calle 32 y 33 Cra 6 en el barrio viveros a las 7:00 Am, donde se continúa con la excavación de la red Principal de Acueducto

Se encuentra un dato de fuga de una de las viviendas el cual se informa al propietario y se toma las medidas necesarias para solucionar el problema. Se le informa al propietario que se le va a realizar el trabajo de reparación de la red de acueducto principal

- Personal Supervisor (1)
- Residente de Interventoras (1)
- Residente de Obra (1)
- Topografo (1)
- Siso (1)
- Obremos (2)
- Maestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 33 y 32 era 12 en el barrio Vivieros a las 7:00 Am, donde se continuo excavacion de la red Principal de Acueducto

Se inicia la instalacion de la tuberia de 3" de Acueducto, donde se instala cama de arena de espesor de 10 cms, asi como por encima de la tuberia se aplica arena de espesor de 10 cms.

Continua la Fuga de agua, la cual fue encontrada y reportada al IBAL, lo cual fue hoy un supervisor del IBAL a la revision de dicha Fuga.

Se realiza limpieza en la obra



Residente

Supervisor

Se da inicio de obra en la calle 22 y 23 con cruce de
viviendas a las 8:00 AM, donde se recibe visita técnica
del IBAI para realizar la reparación de la fuga de Agua
que se encuentra cuando se estaba realizando la
excavación de red Principal.
Se continúa con la excavación de los Acometidos de
Acueducto de las viviendas con ancho 0.50 x 1.0 m.
Se realiza retiro de escombros de manera manual de la obra
y así mismo limpieza general de la misma.

Inf.
Sr. Residente Obra

MARIBEL VARGAS SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA

DIA LAB = 23 Septiembre = 2021 (JUEVES)

DIA SOLTADO

Herramienta y Equipos: Herramienta Menor
Saltarina

Personal: Experto (1)
Res. Intermedia (1)
Res. Baja (1)
Tecnico (1)

10/25

Se continua con el rellenado de la red Principal de Aduedo, donde se dejan descubiertas las compañías para poder realizar la prueba hidrostática y así no evidenciar fugas de agua. Se realiza retiro de escombros de manera manual y limpieza general de la obra.

María Vanessa Soto
INSIDENTE DE OBRAS

Int:

Ing. Damián Soler

Día (Día) 24 Septiembre 2021 (VIERNES)

Día Soleado.

Herramientas y Equipos: Arazamiento Menor

En mano

General Superficie

10
 Día (09) - 25 - Septiembre 2021 (SABADO)
 Día Soleado

Herramientas y Equipos: Salfarin Pulidos
 Herramienta Menor

Personal: Supervisor (1)
 Res. Interventura (1)
 Res. de Obra (1)
 Topografo (1)
 Sista (1)
 Obreros (5)
 Maestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 32 y 32 con 12 bis - ciudad de
 2.00 m donde se continua con la excavacion de domiciliario
 con su respectiva rotura de pavimento por medio de manera
 manual para los Arandados.

Instalacion de Accesorios de los Arandados Asi como su
 respectiva diazoma de Arena y Refuerzo de Paredes de capas
 de 20 cms. compactadas con su respectiva

Asi mismo los respectivos cables de los Andenes con
 Silindros

Rotura de pavimento de la calle 32 y 32 con 12 bis - Ciudad de

DIA (VI) - 29-Septiembre-2021 (Lunes)

DIA SABBADO

Herramienta y equipos: Salfuria
Polidora
Herramienta Menor

Personal: Supervisor (1)
Res. Interventiva (1)
Res. de obra (1)
Topografo (1)
Eiso (1)
Obreros (5)
Maestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 39 y 32 Cra 12 bis Uveros
en las 2:00 PM donde se continuara el corte de Pulverizacion
Sobre las Andenes para instalacion de Acameticos y
Contadores

Se continuara con la rotura de Pavimento Rigido y Flexible
de manera manual para las Andenes desde Acameticos para
Instalacion de

Se continuara con la rotura de Pavimento Rigido y Flexible
de manera manual para las Andenes desde Acameticos para
Instalacion de

- Personal: Supervisor (1)
- Plumero (1)
- Res. de Interventoria (1)
- Trayectoria (1)
- Siso (1)
- Obreros (1)
- Maestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 33 y se cruzan las banquetas
 viernes a las 3:00 AM, donde se presenten. En este momento
 por tal motivo no se Avanza bastante en obra.
 Así se continúa con el corte con pulidor de los muros
 para instalar de Acometidas al conducto.
 Relevo con recepción de las Acometidas de An educto con
 respectivos de capas de 10 cms. Apisonados con salita.
 Retiro de escombros de mano manual y limpieza general
 de la obra.

[Faint handwritten signatures and notes, possibly including the name 'C. J. ...']

En la ciudad de Nueva York a los 3 días del mes de Agosto de 1932

Yo, el Sr. [Name], de la ciudad de Nueva York, en presencia de los señores [Names],

de la ciudad de Nueva York, quienes me asistieron y me aconsejaron, he firmado y sellado el presente instrumento de escritura de la forma siguiente:

Este es el contenido de la escritura que he firmado y sellado, y que he leído y comprendido, y que he firmado y sellado voluntariamente y sin fraude, dolo o violencia alguna.

En fe de lo cual he firmado y sellado el presente instrumento de escritura en la ciudad de Nueva York, a los 3 días del mes de Agosto de 1932.

Yo, el Sr. [Name]

En presencia de los señores [Names]

de la ciudad de Nueva York, quienes me asistieron y me aconsejaron.

Yo, el Sr. [Name]

de la ciudad de Nueva York, en presencia de los señores [Names]

de la ciudad de Nueva York, quienes me asistieron y me aconsejaron.

Yo, el Sr. [Name]

de la ciudad de Nueva York, en presencia de los señores [Names]

de la ciudad de Nueva York, quienes me asistieron y me aconsejaron.

Yo, el Sr. [Name]

de la ciudad de Nueva York, en presencia de los señores [Names]

→ Se Relleno con Mortero de Recibo y se compacto fondo de
MORTERO MORTERO con el PISON y posteriormente se monta
MORTERO con el JALONIN.


J.R.C.S.G.




01/09/2021 Ubicación: Carrera 100 entre calles 67 y 68 → Barrio Jordan 9

Clima: Mañana: Lluvia - Tarde: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 topógrafo
1 Maestro, 7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Máquina-GRUPO: Remecadora, URUGA, Herramienta de mano.

Actividades: Se continuo con la excavacion de la zona principal de
alcantarillado de P2-P3. y se realizo la instalacion de 1 tubo.


J.R.C.S.G.




01/09/2021 Ubicación: Carrera 11 entre 67 y 69 → Barrio Jordan 9

Clima: Mañana: Lluvioso - Tarde: Soleado.

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 topógrafo
1 Maestro, 7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Máquina-GRUPO: URUGA, Herramienta de mano.

Actividades: Se continuo con la excavacion de la Red Principal de alcantarillado
y se realizo la instalacion de 1 tubo, no se relleno pero se dejó
abandonado el tubo.


J.R.C.S.G.




02/09/2021 Ubicación: Carrera 100 entre calles 67 y 68 → Barrio Jordan 9

Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 topógrafo
1 Maestro, 7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Máquina-GRUPO: Herramienta de mano.

Actividades: Se finaliza la excavacion de la zona de la Red
Principal y se continuo con la actividad de excavacion
de cremas de alcantarillado.





10/9/21 Ubicación: Carrera 11 entre 67 y 68 → Jordan 9.

Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinador SST, 1 auxiliar SST, 1 topógrafo
1 Maestro, 7 oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Máquina-Equipo: URUGA, Herramienta de mano

Actividades: Se continúa excavando de manera Mecánica la zanja de
alcantarillado, instalación de tubos con sus correspondientes
accesorios para la acometida.



J.R.C.S.6




10/9/21 Ubicación: Carrera 10 D entre 67 y 68 → Jordan 9.

Clima: Soleado


Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinador SST, 1 auxiliar SST, 1 topógrafo
1 Maestro, 7 oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Máquina-Equipo: URUGA - Herramienta de mano - Retroexcavadora.

Actividades: Se continúa con las actividades de excavación de Red Principal y
de Acometidas.



J.R.C.S.6




10/9/21 Ubicación: Carrera 11 entre 67 y 68 → Jordan 9.

Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinador SST, 1 auxiliar SST, 1 topógrafo
1 Maestro, 7 oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Máquina-Equipo: URUGA - Retroexcavadora - Herramienta de mano

Actividades: Se continúa con las actividades de excavación de la Red
Principal de alcantarillado e instalación de tubería de 20"



J.R.C.S.6




10/9/21 Ubicación: Carrera 10 D entre 67 y 68 → Jordan 9.

Clima: Soleado


Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinador SST, 1 auxiliar SST, 1 topógrafo
1 Maestro, 7 oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Máquina-Equipo: URUGA, Retroexcavadora, Herramienta de mano.

Actividades: Excavación de zanja Principal de alcantarillado con
Acometida.



J.R.C.S.6




04/09/21 Ubicación: Carrera II entre 67 y 68 → Jordan 9.


Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topógrafo
1 Maestro, 7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquina-Equipo: URUGA - Retroexcavadora, Herramienta de mano.

Actividades: Ejecucion de zona Principal de alcantarillado y
completacion Mecanica.


I.R.C.S.6


Resid. INT


06/09/21 Ubicación: Carrera 100 67 y 68 → Jordan 9.


Clima: Mañana: Nublado - Tarde: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topógrafo
1 Maestro, 7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquina-Equipo: URUGA - Retroexcavadora - Herramienta de mano.

Actividades: Se realizan actividades de instalacion de cromelidas
y se completa de Manera Mecanica.


I.R.C.S.6


INT


06/09/21 Ubicación: Carrera II entre 67 y 68 → Jordan 9.


Clima: Mañana: Nublado - Tarde: Soleado.

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topógrafo
1 Maestro, 7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquina-Equipo: URUGA - Retroexcavadora, Herramienta de mano

Actividades: Se continua con la ejecucion de la Red Principal de
Alcantarillado


I.R.C.S.6


INT


07/09/21 Ubicación: Carrera 100 entre 67 y 68 → Jordan 9.

Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topógrafo
1 Maestro, 7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquina-Equipo: Herramienta de mano

Actividades: Se continua con la actividad con la instalacion de
cromelidas de alcantarillado


I.R.C.S.6




08/09/21 Ubicación: Carrera 11 entre 67 y 68 → Jordan 9.


Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topógrafo
1 Maestro, 7 oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquina-EQUIPO: Retroexcavadora - CRUGA - Herramienta de Mano.

Actividades: Se continua con la excavacion mecanica de la Red Principal de alcantarillado.


I.R.C.S.6


Z. L.


08/09/21 Ubicación: Carrera 10 A entre calles 67 y 68 → Jordan 9.

Clima: Mañana: lluviosa - Tarde: Soleado.

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topógrafo, 1 Maestro
7 oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquina-EQUIPO: Retroexcavadora - Soltaxin, Herramienta de Mano.

Actividades: Se continua realizando actividades de excavacion para acometidas de alcantarillado y simultaneamente se realiza actividad de Relleno y compactacion en Zanja principal de alcantarillado.


I.R.C.S.6


Res. L.


08/09/21 Ubicación: Carrera 11 entre calles 67 y 68 → Jordan 9.

Clima: Mañana: lluviosa, Tarde: Soleado.

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topógrafo, 1 Maestro
7 oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquina-EQUIPO: CRUGA, Herramienta de Mano.

Actividades: Se continua realizando actividades de excavacion de Zanja Principal de alcantarillado con sus respectivas Geometrias.


I.R.C.S.6


Resid. INT

10/09/21 Ubicación: Carrera 10 A entre calles 67 y 68 → Jordan 9.

Clima: Soleado.

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topógrafo, 1 Maestro
7 oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquina-EQUIPO: Herramienta de Mano - Soltaxin.

Actividades: Se continua con las actividades de excavacion para las acometidas de alcantarillado, Relleno y compactacion de acometidas ya iniciadas.





09/09/2021


Ubicacion: Carrera 11 entre calles 67 y 68

Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topografo, 1 Maestro
7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquina-Equipo: CUBA - Herramienta de mano

Actividades: Se continua con la actividad de Granuacion Mecanica
de la zona de Alcantarillado


I.R.C.S.6



10/09/2021


Ubicacion: Carrera 100 entre calles 67 y 68 -> Jordan 9.

Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topografo
1 Maestro, 7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquina-Equipo: Herramienta de mano

Actividades: Se continua con la actividad de excavacion, instalacion
de tuberia y relleno y compactacion de Cromelidas de
Alcantarillado


I.R.C.S.6



10/09/2021


Ubicacion: Carrera 11 entre calles 67 y 68 -> Jordan 9.

Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topografo
1 Maestro, 7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquina-Equipo: URUGUAY - Herramienta de mano

Actividades: Excavacion de Zanja de Red Pluvial de alcantarillado e
instalacion de tuberia.


I.R.C.S.6



11/09/2021


Ubicacion: Carrera 100 entre calles 67 y 68 -> Jordan 9.

Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topografo, 1 Maestro
7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquina-Equipo: Herramienta de mano

Actividades: Se continua con la actividad de Granuacion para Cromelidas
de alcantarillado de manera manual.



Ubicación: Carrera 11 entre calles 67 y 68 → Jordan 9
Clima: Soleado

Personal 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SIT, 1 auxiliar SIT, 1 topógrafo, 1 Maestro
7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT

Máquina - equipo: URUGUAY - Herramientas de mano

Actividades: Se continúa realizando la actividad de ejecución mermosa para
la zona de alambrado


E.P.E.S.6


Zuley

Ubicación: Carrera 10A entre calles 67 y 68 → Jordan 9


Clima: Soleado

Personal 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SIT, 1 auxiliar SIT, 1 topógrafo, 1 Maestro

7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT

Máquina - equipo: Herramientas de mano

Actividades: Se continúa realizando la actividad de alambrado de alambrado


E.P.E.S.6


Raul JN

Ubicación: Carrera 11 entre calles 67 y 68 → Jordan 9

Clima: Soleado

Personal 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SIT, 1 auxiliar SIT, 1 topógrafo, 1 Maestro

16 Ayudantes, 7 Oficiales, 1 Residente INT, 1 Inspector INT

Máquina - equipo: URUGUAY - Herramientas de mano

Actividades: Se continúa realizando la actividad de ejecución mermosa de la red

Principal y alambrado de alambrado


E.P.E.S.6


Raul JN

Ubicación: Carrera 10A entre calles 67 y 68 → Jordan 9

Clima: Soleado

Personal 2 Residentes de obra: 1 coordinadora SIT, 1 auxiliar SIT, 1 topógrafo, 1 Maestro,

7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT

Máquina - equipo: Herramientas de mano

Actividades: Se continúa con las actividades de instalación de alambrado de
alambrado


E.P.E.S.6


Raul JN

14/09/2021

Ubicacion: Carrera II entre calles 67 y 68 -> Jorden 9.

Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 Coordinadora SIT, 1 Auxiliar SST, 1 Topografo, 1 Maestro, 7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquina-Equipo: Oruga - Herramienta de Mano

Actividades: Se continua realizando excavacion mecanica de la Red Principal de alcantarillado. A su vez se realiza la actividad de excavacion Manual de las acometidas de alcantarillado.

 F.R.C.S.6

 F.510

15/09/2021


Ubicacion: Carrera II entre calles 67 y 68 -> Jorden 9.

Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 Coordinadora SIT, 1 Auxiliar SST, 1 Topografo, 1 Maestro, 7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquina-Equipo: Oruga - Herramienta de Mano.

Actividades: Se continua realizando la excavacion de la Red Principal de alcantarillado con sus correspondientes acometidas. Se termino la Instalacion de tuberia Principal de 20"

 F.R.C.S.6

 F.510

16/09/2021


Ubicacion: Carrera II entre calles 67 y 68 -> Jorden 9.

Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 Coordinadora SIT, 1 Auxiliar SST, 1 Topografo, 1 Maestro, 7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquina-Equipo: Herramienta de Mano

Actividades: Se continua realizando la actividad de excavacion Manual para las acometidas de alcantarillado. Se han instalado 7 acometidas.

 F.R.C.S.6

 F.510

07/2021

Ubicación: Carrera 11 entre calles 67 y 68 → Jordan 9

Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 Coordinador SST, 1 Auxiliar SST, 1 Topógrafo, 1 Maestro
7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT

Materiales: Equipo Herramienta de mano

Actividades: Se continúa con la actividad de excavación manual para la
Armedura de alacranillo.

07/2021

Ubicación: Carrera 11 entre calles 67 y 68 → Jordan 9

Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 Coordinador SST, 1 Auxiliar SST, 1 Topógrafo, 1 Maestro
7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT

Materiales: Equipo Herramienta de mano

Actividades: Se continúa con la excavación de armadura de alacranillo
de hormigón manual.

07/21

Ubicación: Carrera 11 entre calle 67 y 68 Jordan 9a

Clima: Soleado

Personal: Residente de obra, Coordinador SISO, 1 Auxiliar SISO, 1 topógrafo
1 maestro, 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 operador, 1 conductor,

1 topógrafa: 1 minicargador, 1 herramienta manual, 1 mezcladora.

Actividades: Se continúa con la excavación de las 4 comedidas Domici-
liarias en la leg T y la T y T de forma manual, se

termina de hacer los leños compactos del alacranillo en la
carrera 10D. (Mz U y T) que dando terminada esa actividad,

se inicia con la Fundida de las cajas de Inspección, se funden las
cajas de las casa 1-2 y 3 de la T y T, la 4 de la T y U, para realizar

por la actividad se debió realizar la prolongación de la 4 comen-
tidad Domiciliaria de cada casa (el tubo que sale de la casa de 4")


debido a que cuando se construyeron las casas se hicieron cajas
compartidas y ahora deben quedar independientes de acuerdo

a la RAS 2000 para lo cual se utilizaron Accesorios adicionales


caso #3 MgT un ripio de 45 cm de 4 y 2 uniones
caso #41 MgU un semicodo de 4"

La casa #1T no requiere accesorios.

Se continua con la actividad de llenos compactados en las
Acometidas Sanitarias en la MgT entre el caso 40 y 39



J.R.C.S.G.



Roldán

21/09/21


Ubicación carril y carril 100. entre calle 67 y 68 Jordan 9a
Clima: lluvias en la mañana, sol en la tarde.

Personal: oficiales 2, ayudantes 4, operador, coordinador SISO
Maestro, conductor, auxiliar SISO, topógrafo, Inglés


Equipo: Vibrador, Mezcladora, Canguro, Equipo Menor.

Actividades: Se continua con la fundida de las cajas
de inspección en las casas 38 MgU y 1 MgT.
Para la casa #5 MgT se utilizaron 50 cm de
"bodes" y 2 uniones de 4" para prolongar el tubo
de salida de la casa.

Se continua con los llenos compactados de las
Acometidas Sanitarias sobre los cotes de la
MgT #38 ala #35, se Retira material de excavación



J.R.C.S.G.



Roldán

22/09/21


Ubicación: carril y carril 100 entre calles 67 y 68 Jordan
Clima: soleado.

Personal: oficiales 3, ayudantes 4, operador, conductor
coordinador SISO, Auxiliar SISO, topógrafo, Inglés
Residente,

Maquinarios: Bobcat, Mezcladora, Canguro, Herramienta
Menor.

Actividades: Se continua con las excavaciones manuales
de las Acometidas Sanitarias en la MgT
y la Mg Y carril, se tira el

Se continua los llenos compactados en la tubería principal de 20" en la carrera 11 y los acometidos de las casas 33, 32. Alg T
Se continua con la fundida de cajas de Inspección en la carrera 100 en las casas 36 y 39. en la casa 39 se requirió Instalar un niple de 50cm y un codo para alargar el tubo de salida de la casa de 4"



7.15

Ubicación: Carrera 11 y Carrera 100. entre Calles 67 y 68. Jordan 9a.
Clima: lluvias en la mañana, tarde soleada.
Personal: oficiales 3, ayudantes 1, operador, conductor, Coordinador 3:50
Auxiliar SISO, topógrafo, Ing Residente

Maquinaria: Bobcat, Mezcladora, Cingulo, Herramienta Menor,

Actividades: Se continua con la Actividad de excavación Manual de Acometidos Sanitarias, se Instalan los Acometidos de las casas 22-23-24 y 25 de la Alg T y las casas 10-11 12-13-14 y 15 de la Alg Y en la carrera 21, se continua con los llenos compactados de la tubería principal de 20" y los Acometidos de las casas 29-30-31 Alg T.

Se Funden las cajas de Inspección de las casas 34-35 y 37 de la Alg U. sobre la carrera 100. y se corrren las Acometidos de agua de los casa 40-35 y 34 que no permitian la fundida de la caja de Inspección en la Alg U. En la casa 35 Alg U. se Instala un niple de 40cm y un codo de 4" para prolongar el tubo que sale de la casa para poder Fundir la caja de Inspección.




I. R. C. S. G.

Ubicación: Carrera 11 y Carrera 100. entre Calles 67 y 68. Jordan 9a E.
Clima: Soleado.
Personal: oficiales 3 (3), ayudantes (1), Operador, Conductor, Coordinador SISO, Auxiliar SISO, topógrafo, Ing Residente.
Maquinaria: Bobcat, Mezcladora, Cingulo, Compressor, Martillos Menor.

Actividades:

Se Continúa con las Excavaciones Manuales de las Acometidas Sanitarias en las Casas 2-3-4-5-6 y 7 Alz Y sobre la calle 11 Se Continúa con los llenos compactados sobre la tubería de 20" Las Acometidas de las casas 21-22- Mz T y las casas 44 y 45 Alz Y se Retrasan las Excavaciones Manuales debido a las Rocas que se presenten y que se debe de remover con compresor y martillo Se Funde el piso (Base) pozo AA sobre la calle 67 que no se había podido fundir por el manejo de aguas que se debía hacer por el gran caudal de aguas negras que circula en la Red de 20".

Se funde la caja de Inspección de la casa #33 Alz U, la casa 32 presenta la manguera del Gas por el centro de la excavación para la caja, No se pudo fundir hasta tanto Alcanos Realice la movida de dicha manguera. se trueden los contadores de las casas 32-33 y 39. pone darle cavida a las cajas de Inspección. pone la fundida de los cajos de las casas 32 y 33 se adicionaron 2 codos de 4" para poder llegar con el tubo de la casa hasta la cajas



25/09/21 Ubicación: Carrera 11 y carrera 100. entre calles 67 y 68 Jorda
clima: Soleado.

Personal: oficiales 3, Ayudantes 4, Operador, Conductor, coordinador SISO, Auxiliar SISO, Topografos, Ing. Residentes.

Maquinaria: Bobcat, Mezcladora, carguero, Herramientas Manuales

Actividades: Se Continúa con los llenos compactados sobre la calle 11, sobre el tramo de tubería principal de 20", se Continúa con la excavación de las Domiciliarias de las casas. 4 y 5 Alz Y. Se excavan las cajas de Inspección de las casas 30 y 31 de la Alz T y U. y se funde la caja de la casa 21.

Se Realiza Limpieza de la calle entre las Hls U y La T.

J. R. C. S. G.

9/09/21 Ubicación: Carretera 11 y 100. entre calles 67 y 68 Jordan 9a etapa
Clima: Soleado.

Personal: 2 oficiales, 4 ayudantes, conductor, operador, coordinador SISO, Auxiliar SISO, topógrafo, Ing Residente.

Maquinaria: Bobcat, Descartadora, Carguro, Herramienta Menor.

Actividades: Se continúa con el lleno compactado en la tubería principal de 20" sobre la carretera 11 y se llenan y compactan los acometidos de las casas 23-24 Hl T. y las casas 13 y 12 Hl Y, se continúa excavando manualmente los acometidos de las casas 6-7, 2 y 3 Hl Y.
Se funden las cajas de inspección de las casas 30 y 31 Hl U y se excavan la caja de la casa 6 Hl T. Se hace el retiro de 30 qts de tierra sobrante de excavación.

J. R. C. S. G.

9/09/21 Ubicación: Carretera 11 y 100. entre calle 67 y 68 Jordan 9. etapa.
Clima: Soleado.

Personal: 2 oficiales, 5 Ayudantes, conductor, operador, coordinador SISO, Auxiliar SISO, topógrafo, Ing Residente.

Maquinaria: Bobcat, Descartadora, Carguro, Compresor, barhillo Herramienta Menor.

Actividades: Se continúa con la excavación manual de los acometidos domiciliarios en la carretera 11 en las Hl Y casas 4 y 5 6 y 7. 8 y 9. Se instalan los acometidos de la casa 4 y 5 Hl Y y se continúa con el lleno compactado en la tubería principal de 20" y se llena y compacta los acometidos de las casas 13 y 12 Hl Y.

en la carrera 100. Se funden las cajas de las casas
30 y 31. Hg U. Se excavan las cajas de la casa 8 y 9
de la Hg T. En el proceso de excavación en la casa 8 y 9
se rompe el tubo de Asbesto de Agua Potable por una raiz
que se desprende y lo golpea, se suspende el agua y se
realiza la reparación correspondiente.




J.R.C.S.G.

29/09/21 Ubicación: carrera 11, 100 entre calle 67 y 68 Jordan 9a etapa
Clima: lluvias fuertes en la mañana, soleado en la tarde.
Personal: oficiales 3, Ayudantes 6, conductor, Operador
topógrafo, Coordinador SISO, Auxiliar SISO, Ins
Residentes.

Maquinaria: Bobcat, compresor, martillos, mezcladora
Congoro, Herramienta Menor.

Actividades: Se continúa con la excavación de las
Acuerdadas de las casas de la Hg Y sobre
la carrera 33, se continúa con los llenos
compactados en dichas Acuerdadas, se inicia la
excavación de las cajas de Inspección de las casas de
Hg T sobre la carrera 31 se excavan las cajas de las casa
36-37 - 40 - 41 Hg T.

Se funden las cajas de Inspección de las casas 8 y 9 Hg
y se excavan las cajas de las casas 12 y 13 Hg T. Sobre
carrera 100. Se retira todo el material de excavación
de las cajas sobre la carr 100.




J.R.C.S.G.




30/09/21 Ubicación: Carrera 11 y 100 entre calle 67 y 68 Jordan 9a etapa
Clima: lluvias en la mañana, soleado en la tarde.
Personal: oficiales 3, Ayudantes 6, conductor, Operador de maquinaria

Maquinaria: Bobcat, Mezcladora, Compressor, Martillos, Congoro, Herramienta Menor.

Actividades: Se Continúa con las Excavaciones Planas de los Acometidos Sanitarias, Se terminan de Excavar las casas 6-7 y la 8 y 9 Hg Y, Se Instalan las Domiciliarias de la 6 y 7 después de Demoler las Bocas que se Presentaron Impidiendo dicha colocación, se hace el lleno compactado al trazo de tubería de 20" y los Domiciliarias de las casas 6 y 7 Hg Y, así como al trazo de 20" frente a las Domiciliarias 24 y 25 Hg T y las casas 13 y 12 Hg Y, Sobre la carrera 11 sobre la carrera 100. se fundieron las Cajas de las casas 14 y 15 de la Hg T. Se continúa con la Excavación de Cajas de Inspección de las casas. 34-35-36 y 37 Hg T.



J.R.C.56



10/6/ Ubicación: Carrera 11 y 100, entre calles 67 y 68 Jordan 9a etapa.
clima: soleado.

Personal: Oficiales 3, Ayudantes 6, Conductor, Operador, Topógrafo
Coordinador SISO, Auxiliar SISO, Ing Residente.

Maquinaria: Bobcat, Mezcladora, Congoro, Herramienta Menor.

Actividades: se terminan todas las Excavaciones Planas de los Acometidos Sanitarias sobre la carrera 11. entre las Hg T y Y, se Instalan las Acometidos Sanitarias de las casas 8 y 9 Hg Y terminando dicha actividad, se continúa con las Excavaciones de las cajas de Inspección sobre las caras de la Hg T en la carrera 11. Se continúa con los llenos compactados en el trazo principal de 20" y los Acometidos Sanitarias, sobre la carrera 100, en las Hg T y T. se continúa con la Excavación de las cajas de Inspección en las casas 18 y 19, y se funden las cajas de las casas 16 y 17 Hg T.
se realiza Retiro de Material sobrante de las Excavaciones.




Libro de Bitácora

Contrato de obra 0062 del 2021

Objeto: Rehabilitación y/o Recuperación y/o Reparación de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendidos por el distrito hidraulico No. —, Ubicados dentro del perímetro hidrosuministro del IBAL SA ESP oficial en la ciudad de Bogotá

Contratista Consorcio Redes Hidráulicas 2021

NIT 401-478972-4
Representante legal: Juan Carlos Ramirez Ospina

Contrato de interventoría 063 del 2021

Objeto: Interventoría Técnica Administrativa y ambiental para las obras de rehabilitación y/o Recuperación y/o Reparación de las redes de acueducto y alcantarillado, para garantizar la continuidad del servicio en los distritos hidraulicos del perímetro hidrosuministro de IBAL SA ESP oficial en la ciudad de Bogotá

Contratista Consorcio Interventoría Exterior IBAL

NIT 901474007-6

Representante legal: Luis Francisco España Ramirez

Juan Carlos Salazar
Residente Interventoría

Fabra González
Residente Aux

Juan Carlos Ramirez
Director de obra

Fabra González

Diego Guen
Residente obra

Actividades: Excavacion de caja de inspeccion, fondo de caja de inspeccion
limpia con retroexcavadora, lleno y compactacion de zona de
recebo.

31/06/2021

Clima: Soleado Temperatura seco

Personal: Ing Residente Ing Aux Inspector tecnico Inspector SST
Residente de intervencion Inspector Int Topografo Int
1 maestro 6 Ayudantes 1 Operario Retroexcavadora 2 Operarios
de volquetes

Maquinaria y equipo: Retroexcavadora 2 volquetes, Herramienta mano, estructura
Soltur.

Actividades: Excavacion y aseo de pozos, demolicion de boca en
red principal, excavacion de manillas, limpieza con
retroexcavadora, lleno de zona principal con recebo.

01/07/2021

Clima: lluvioso Temperatura Humedo

Personal: Ing Residente Ing Aux Inspector tecnico Inspector SST
Residente Intervencion Inspector Int Topografo Int
1 maestro 6 Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta mano

Actividades: Excavacion de acorrelados, fondo de caja de inspeccion
Excavacion de red principal, construcion de pozos?

02/07/2021

Clima: Soleado Temperatura Humedo

Personal: Ing Residente Ing Aux Inspector tecnico Inspector SST
Residente Int Inspector Int Topografo Int
1 maestro 6 Ayudantes 1 Operario Retro 1 Operario volquete

Maquinaria y equipo: Herramienta mano Compactador tipo catrolin
Retroexcavadora volquete

Actividades: Instalacion de tuberia de red principal y demolicion
Relleno y compactacion de zona principal y demolicion
construcion de pozo 2, excavacion de cajas de inspeccion

03/09/2021

Clima: Soleado terreno húmedo

Personal: Ing Residente Ing Aux Inspector técnico Inspector SST
Residente int Ins int topógrafo int
1 maestro 6 Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta manij, pala mecánica

Actividades: Instalación de tubería de red principal, continua
construcción de pozo

04/09/2021

Clima: Soleado terreno seco

Personal: Ing Residente Ing Aux Inspector técnico Inspector SST
Residente int Ins int topógrafo int 1 maestro 6 Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta manij, pala mecánica, compactador
Retroexcavadora Valjeva

Actividades: Limpieza con retroexcavadora, excavación de caja de
inspección, construcción de pozo BA, instalación de tubería
doméstica, Retiro en recibo de excavación principal

06/09/2021

Clima: lluvioso terreno húmedo

Personal: Ins Residente Ing Aux Inspector tec Ins SST
Ing Residente Ing int topógrafo int 1 maestro 6 Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta manij, Retroexcavadora

Actividades: Construcción de pozo BA, llenado y compactación en
recibo de red principal, fundido de caja de inspección
instalación de tubería doméstica

observación: llueve fuertemente hasta las 11 am

07/09/2021

Clima: Soleado terreno húmedo

Personal: Ing Residente Ing Aux Inspector tec Ins SST
Residente int Inspector int topógrafo int 1 maestro
6 Ayudantes 1 Operario Retroexcavadora

Maquinaria y equipo: Herramienta manij, compactador tipo ballón
Retroexcavadora

Actividades: llenado y compactación en recibo de red principal,
fundido de caja de inspección, continua construcción

para 3A, limpieza con helicoverter

08/04/2021
Clima: lluvioso terreno Humedo
Personal: Ing Residente Ing Aux Inspector SST Ing tecnico
Residente int Ins Int topografo int 1 maestro 6 Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta menor, Compactador, tipo solbain
Actividades: llenar y compactacion de fondo principal, excavacion de
red domiciliaria e instalacion de tuberias
Observacion: lluvia hasta las 9:30 a.m. fuertemente

09/04/2021
Clima: lluvioso terreno Humedo
Personal: Ing Residente Ing Aux Inspector SST Ing tecnico
Residente int Inspector int topografo int 1 maestro 6 Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta menor
Actividades: Corte y acondicionamiento de placa para caja de inspeccion
fundido caja de inspeccion instalacion de tuberias
domiciliaria, fundido de reservorios en obra

10/04/2021
Clima: Soleado Terreno Seco
Personal: Ing Residente Ing Aux Inspector SST Inspector tecnico
Residente int Inspector int topografo int 1 maestro
6 Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta menor, Compactador, tipo solbain
Actividades: llenar y compactacion de red principal

11/04/2021
Clima: Soleado Terreno Humedo
Personal: Ing Residente Ing Aux Inspector SST Inspector tecnico
Residente int Inspector int topografo int 1 maestro
6 Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta menor, Compactador, tipo solbain
Actividades: limpieza, recuperacion de entubacion

13/04/2021

Clima: Soleado Terreno seco

Personal: Ing Residente, Ing Aux, Inspector SST, Inspector Técnico Residente INT, Inspector INT, Topógrafo INT, 4 Ayudantes & Maestros

Maquinaria y equipo: Herramientas manuales, carpentería, línea de alfileres, Alfileres, línea y carpintería de zona principal, excavación de zona para acueducto.

14/04/2021

Clima: Soleado Terreno seco

Personal: Ing Residente, Ing Aux, Inspector Técnico, Ing SST, Residente INT Inspector INT, Topógrafo INT, 5 Ayudantes, 1 Maestro maquinaria y equipo: Herramientas Manuales

Actividades: Continúa excavación para zona acueducto, se hace pruebas de densidades.

15/04/2021

Clima: Soleado Terreno seco

Personal: Ing Residente, Ing Aux, Inspector Técnico, Ing SST, Residente INT Inspector INT, Topógrafo INT, 5 Ayudantes, 1 Maestro. Maquinaria y equipo: Herramientas Manuales

Actividades: Continúa excavación de línea de acueducto

16/04/2021

Clima: Soleado Terreno seco

Personal: Ing Residente, Ing Aux, Inspector Técnico, Ing SST, Residente INT Inspector INT, Topógrafo INT, 5 Ayudantes, 1 Maestro. Maquinaria y equipo: Herramientas Manuales

Actividades: Continúa excavación de línea de acueducto

17/04/2021

Clima: Soleado terreno seco

Personal: Ing Residente, Ing Aux, Inspector tecnico, Ing SST, Residente INT, Inspector INT, topografo INT, 5 Ayudantes, 1 Maestro

Maquinaria y equipo: Herramienta Menor

Actividades: Excavacion de zanja para acueducto

Observaciones: Se identifica filtracion de agua proveniente de la casa 4, se hace visita de supervicion de acueducto del IBAL, y se determina hacer prueba de cloro

18/04/2021

Clima: Soleado Terreno seco

Personal: Ing Residente, Ing Aux, Inspector tecnico, Ing SST, Residente INT, Inspector INT, 5 Ayudantes, 1 Maestro

maquinaria y equipo: Herramienta Menor

Actividades: Control y excavacion de zanja para acueducto

20/04/2021

Clima

Personal: Ing Residente, Ing Aux, Inspector tecnico, Ing SST, Residente INT, Inspector INT, 5 Ayudantes, 1 Maestro

maquinaria y equipo: Herramienta Menor

Actividades: limpieza de area intervenida con el excavatorio, control excavacion de zanja para acueducto.

Observación: Al ejecutar la excavacion de linea de acueducto se identifica linea de drenamiento en mal estado, por consiguiente se determina por el supervisor del control intervenir en linea de drenamiento en mal estado y conectarla directamente al colectador 40"

21/09/2021

Clima: Soleado Terreno Humedo

Personal: Ing Residente, Ing Aux, Inspector tecnico, Residente INT, SSI
Inspector INT, 5 Ayudantes, 1 Maestro.

Maquinaria y equipo: Herramienta Menor

Actividades: Excavacion de red domiciliar y excavacion de
red para acueducto

22/09/2021

Clima: Soleado Terreno Seco

Personal: Ing Residente, Ing Aux, Inspector tecnico, Residente INT
Inspector INT, 5 Ayudantes, 1 Maestro

Maquinaria y equipo: Herramienta Menor

Actividades: Excavacion de red domiciliar y excavacion de
red para acueducto, instalacion de tuberia de 6"
excavacion para caja de inspeccion

23/09/2021

Clima: nubado Terreno Humedo

Personal: Ing Residente, Ing Aux, Inspector tecnico, Residente INT, SSI
Inspector INT, 5 Ayudantes, 1 Maestro

Maquinaria y equipo: Herramienta Menor

Actividades: Excavacion de red para acueducto, instalacion de
tuberia de 6", Fundido para caja de inspeccion
excavacion para caja de inspeccion

24/09/2021

Clima: Soleado Terreno Seco

Personal: Ing Residente, Ing Aux, Inspector tecnico, Ing SSI, Residente INT
Inspector INT, 5 Ayudantes, 1 Maestro

Maquinaria y equipo: Herramienta Menor, Huelobadora.

Actividades: Fundido de revestimiento para domiciliario
Fundido de caja de inspeccion

25/09/2021

Clima: Soleado Terreno Seco

maquinaria y equipo: Herramienta Menor
 Actividades: Furtida de cañetas, Furtida de revestimiento
 para tubería domiciliar, Continúa excavación para
 red de acueducto

27/09/2021

Clima = Soleado - terreno seco

Personal = Ing Residente, Ing Aux, Inspector técnico, un SST, Residente,
 Inspector INT, 5 Ayudantes, 1 Maestro

Maquinaria - equipo = Herramienta Menor

Actividades = Excavación zanja para acueducto, revestimiento de
 tubo de red domiciliar de alconchillado, apiques para empalme de
 acueducto, lleno y compactación de zanja de red domiciliar.

28/09/2021

Clima = Nublado - terreno seco

Personal = Ing Residente, Ing Aux, Inspector técnico, un SST, Residente,
 Inspector INT, 5 Ayudantes y Maestro

Maquinaria - equipo = Herramienta Menor

Actividades = Continúa excavación para red domiciliar, apique
 para localizar mangeras de domiciliarias, continuo lleno
 y compactación de zanja de red domiciliar.

29/09/2021

Clima = lluvioso - terreno húmedo

Personal = Ing Residente, Ing Aux, Inspector técnico, un SST, Residente,
 Inspector INT, 5 Ayudantes, 1 Maestro

Maquinaria - equipo = Herramienta Menor

Actividades = lleno y compactación con resero en zanja de
 red domiciliar (con Sillarín), Continúa apique para localizar
 de mangeras de domiciliarias; excavación de zanja para mangera
 domiciliar, continua excavación de zanja de acueducto,
 buscando el empalme del acueducto.

Observación: De 7:00 am a 8:00 pm no se realizó actividad
 por motivo de lluvia.

30/09/2021

Clima = nublado - Terreno llano

Personal =

Maquinaria - equipo =

Actividades = Inicia excavación para localizar empalme de ~~des~~ que acueducto, continúa excavación de zanja para mangeras domiciliarias e inicia relleno de zanja de mangera, también se instalan las mangeras domiciliarias.

Observaciones: NO se encuentran empalmes de acueducto principal.

[Handwritten signatures]

01/10/2021

Clima =

Personal =

Mo

Maquinaria - equipo =

Actividades =

Billetes de obra

Contrato de obra 0062 del 2021

Objeto: Rehabilitación y/o recuperación y/o reparación de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en las zonas comprendidas por el distrito hidrológico de IBAL 1004 ubicada dentro del perímetro hidrográfico del IBAL SAESP oficial en la ciudad de Ibagué

Contralista: Construcción redes hidráulicas 2021

NIT 901 478 972-4

Representante legal: Juan Carlos Ramirez Ospina

Contrato de intervención 063 de 2021

Objeto: Intervención Técnica administrativa y ambiental para las obras de rehabilitación y/o recuperación y/o reparación de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los distritos hidrológicos del perímetro hidrográfico del IBAL SAESP oficial en la ciudad de Ibagué

Contralista: Construcción intervenciones externas IBAL


NIT: 901 479 007-6

Representante legal: Luis Francisco Espasa Ramirez



Pablo Gonzalez
Ing. Aux

Juan Carlos Ramirez
Director de obra



Diego Fernando Giron
Residente

Juan Carlos Sabido
Residente Intervención



Inspector Intervención

Carrera 8A Entre Calle 138 y 141 Barrio Ceiba Norte

18/09/2021

Clima: Soleado Terreno Seco

Personal: Residente 100 Aux 100 SST Residente int 100 int
1 maestro 4 Ayudantes

Maquinaria y equipo:

Actividades: Realización de obras de vericidad y nivelación del proyecto

20/09/2021

Clima: Soleado Terreno seco

Personal: Residente 100 Aux 100 SST Residente int 100 int

Maquinaria y equipo: Estación de precisión; Herramienta man

Actividades: Continuar actividades de obras de vericidad y nivelación del proyecto, investigación y levantamiento topográfico del sector

21/09/2021

Clima: Nubado Terreno Humedo

Personal: Residente 100 Aux 100 SST Residente int 100 int
Integrado Integrado int

Maquinaria y equipo: Estación de precisión, Herramienta man

Actividades: Investigación y levantamiento topográfico del terreno

22/09/2021

Clima: Soleado Terreno seco

Personal: Residente 100 Aux 100 SST Residente int 100 int
1 maestro 4 Ayudantes

Maquinaria y equipo

Actividades: Inicio de obra con cerramiento perimetral en polsombria

23/09/2021

Clima: Nubado Humedo

Personal: Residente 100 Aux 100 SST Residente int 100 int

1 maestro 4 Operador Retro 2 Operadores volquetes

maquinaria y equipo

Actividades: Cambios de eje para excavación en las partes ()
excavación manual en zona de excavación




  

24/09/2011 Clima Soleado Terreno seco

Personal: Residente 100 Aux 100 SST Residente 100 100 100
1 maestro 4 Ayudantes

maquinaria y equipo

Actividades: Instalación de tubería en grava e instalación de tubería 12"
excavación en las excavaciones y zona de nivel de sitio




  

25/09/2011 Clima Soleado Terreno seco

Personal: Residente 100 Aux 100 SST Residente 100 100 100
1 maestro 4 Ayudantes

maquinaria y equipo

Actividades: Continua instalación de tubería en grava, instalación de tubería
obliga de tubería.




  

27/09/2011 Clima Soleado Terreno seco

Personal: Residente 100 Aux 100 SST Residente 100 100 100
1 maestro 4 Ayudantes

maquinaria y equipo

Actividades: continua instalación de tubería, y limpieza de zona
llena y compactación de red principal




  

28/09/2011 Clima Soleado Terreno seco

Personal: Residente 100 Aux 100 SST Residente 100 100 100
1 maestro 4 Ayudantes

maquinaria y equipo


Actividades: Se identifican zonas de inspección, instalación de tubería
llena y compactación en recepción de zona principal

29/09/2011 Clima: Mucho viento - horas de la mañana
 Personal: Residente y Aux los son Residente y los son
 1 maestro 4 Ayudantes

maquinaria y equipo


Actividades: Demolicion de placa para ceps de cooperacion



30/09/2011 Clima: Mucho - Terreno húmedo
 Personal

maquinaria y equipo

Actividades: llenar y compactacion en rectoria, matricion de liberos en
 12" Lempes en retroexcavacion material proveniente de
 la excavacion.



BIMONIA De obra

CONTRATO de obra - 0062 Del 2021

Objeto: Rehabilitación y/o Recuperación y/o Reposición de las redes de Acueducto y Alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendidos para el Distrito Hidráulico Del IBAL No 7 ubicada Dentro del Perimetro Hidrosanitario Del IBAL SA ESP Oficial en la Ciudad de Ibagué

Contratista: Consorcio Redes Hidráulicas 2021

NIT: 901 478 972 - 4

Representante Legal: Juan Carlos Ramirez Ospina

CONTRATO DE INTERVENCIÓN 063 del 2021

Objeto: Intervención Técnica Administrativa y Ambiental para las obras de Rehabilitación y/o Recuperación y/o Reposición de las Redes de Acueducto y Alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los Distritos Hidráulicos del Perimetro Hidrosanitario del IBAL SAESP Oficial en la Ciudad de Ibagué.

Contratista: Consorcio Intervención Externa IBAL

NIT: 901 479 007 - 6

Representante Legal: Luis Pineda Ospina Ramírez



PABLO ESTEBAN GONZÁLEZ

ING AUXILIAR CONSORCIO REDES HIDRÁULICAS 2021



JUAN CARLOS RAMÍREZ

RESIDENTE INTERVENCIÓN


DIEGO FERNANDO GIRON S.

ING RESIDENTE

CONSORCIO ~~Redes Hidráulicas~~ 2021


INSPECTOR INTERVENCIÓN

JUAN CARLOS R. OSPINA

Director de obra

5-10/21 Actividades: Realización de ACTAS de VERDAD y SUSCRIPCIÓN DEL PROYECTO y TRAMO A INTERVENIR.

07/09/21 Actividades: investigación y levantamiento TOPOGRÁFICO del TRAMO A INTERVENIR.

08/09/21 Actividades: continuación investigación y levantamiento TOPOGRÁFICO.

09/09/2021 (LIMA: soleado) PERSONAL: (1) RESIDENTE, (1) TOPOGRAFO, (1) CUDENARO, (1) ING AUXILIAR, (1) INSPECTOR TECNICO; (1) INSPECTOR SST

MAQUINARIA - EQUIPO: ESTACION TOPOGRAFICA, NIVEL DE PRECISION, RETRO EXCAVADORA, VOLQUETA

Actividades: inicio de obra con el cerramiento perimetral en polsombra, replanteo TOPOGRAFICO PARA localización de pozos EXISTENTES. inicio de EXCAVACION MECANICA PARA CAJEO y ZANJA DE TUBERIA desde el pozo de Alcantarillado PEG HASTA PET.

10/09/21 Clima: soleado

VIERNES PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 TOPOGrafo, 1 CUDENARO, 1 ING AUXILIAR, 1 INSPECTOR SST, 1 INSPECTOR TECNICO.

MAQUINARIA - EQUIPO: ESTACION TOPOGRAFICA, NIVEL PRECISION, RETROEXCAVADORA, VOLQUETA

Actividades: continuación de CAJEO y ZANJA DE TUBERIA desde el pozo PEG A PET. RETRO de Alcantarillado EXISTENTE.

11/09/21 Clima: soleado

sabado PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 TOPOGRAFO, 1 CUDENARO, 1 ING AUXILIAR, 1 INSPECTOR SST, 1 INSPECTOR TECNICO.

MAQUINARIA - EQUIPO: ESTACION TOPOGRAFICA, Nivel de precisión, RETROEXCAVADORA, VOLQUETA.

Actividades: continuación de CAJEO y ZANJA DE TUBERIA desde el pozo de Alcantarillado PEG A PET.

13/09/21

Clima: Soleado

Lunes

PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 TOPOGRAFIA, 1 CUDENCERO, 1 INY AUXILIAR,
1 INSPECTOR TECNICO, 1 INSPECTOR SST

Actividades: CHEQUEO de NIVELES de EXCAVACION mediante TOPOGRAFIA, INSTALACION de 2 TUBOS de 6m CLV de 10" PARA TUBERIA de ALIMENTACION NUEVO. TAMBIEN se realiza PROCESO de ENTUBADO PARA SEGURIDAD de los TRABAJADORES.

14/09/21

Clima: Soleado

Martes

PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 TOPOGRAFIA, 1 CUDENCERO, 1 INY AUXILIAR,
1 INSPECTOR TECNICO, 1 INSPECTOR SST

Actividades: se continua con el RETIRO de MATERIAL de EXCAVACION, TAMBIEN se procede a DAR inicio de LLENO y COMPACTADO en recebo PARA el CAJON y ZANJA de los 2 TUBOS iniciales instalados. TAMBIEN se realiza la instalacion de SILLAS T y TUBERIA de 6" para la domiciliante de LA CASA ubicada en la direccion CARRETERA 86 # 145-18

15/09/21


Clima: soleado

PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 TOPOGRAFIA, 1 CUDENCERO, 1 INY AUXILIAR,
1 INSPECTOR TECNICO, 1 INSPECTOR SST

Actividades: CONTINUACION de EXCAVACION PARA CAJON y ZANJA de TUBERIA NUEVA, SE procede a instalar 2 TUBOS MAS de 6m de longitud CLV y 10" de diametro, TAMBIEN se realiza instalacion de 2 SILLAS T con TUBERIA de 6" CLV. se continua con el LLENO en recebo compactado con MORTARON, para LA TUBERIA instalada.


16/09/21
viernes
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente, 1 Topógrafo, 1 Cadenero, 1 Ing Auxiliar
1 Inspector Técnico, 1 Inspector SST.

Actividades: - continuación de excavación para cajón y
Zanja de tubería nueva.
- continuación de lleno en recebo compactado
con Sulfurita
- Retiro de material proveniente de excavación
y demolición. - excavación manual para
Requisito Apiques y Encuentro cajas existentes.




17/09/21
viernes
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente, 1 Topógrafo, 1 Cadenero, 1 Ing Auxiliar
1 Inspector Técnico, 1 Inspector SST

Actividades: - Excavación para cajón superior hasta el pozo
PE 7. - continuación de lleno en recebo compactado.
- instalación de 2 tubos de 6m de longitud de 10" de Ø
- cama de muredo para tubería. - instalación de
tubería de 6" para silla Tec.




18/09/21
sábado
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente, 1 Topógrafo, 1 Cadenero, 1 Ing Auxiliar
1 Inspector Técnico, 1 Inspector SST

Actividades: El día de hoy se realizan solo actividades de
lleno y compactación de recebo con Sulfurita, hasta las
12 del medio día.




10/09/21 Clima: Soleado
 Lunes personal: 1 residente, 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 iny auxiliar, 1 inspector técnico
 1 inspector SST.

Actividades: - EXCAVACION PARA CAJEO SUPERIOR desde el POZO EXISTENTE
 7 HASTA POZO EXISTENTE 8. - CONTINUACION de RELLENO
 EN RECEBO COMPACTADO CON SALTAREN. - INSTALACION de
 TUBERIA PARA RED CENTRAL.




11/09/21 Clima: nublado con lluvia.
 martes personal: 1 residente, 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 iny auxiliar, 1 inspector
 1 inspector SST.

Actividades: - EXCAVACIONES MANUALES PARA TUBERIAS DOMICILIARIAS
 - Actividades de Relleno en recebo compactado PARA
 RED CENTRAL.



12/09/21 Clima: Soleado
 Miércoles personal: 1 residente, 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 iny auxiliar, 1 inspector
 técnico, 1 inspector SST.

Actividades: EXCAVACION de CAJEO superior y BOMBA PARA RED
 CENTRAL. - CONTINUACION de RELLENO EN RECEBO COMPACTADO.
 - CONTINUACION EXCAVACION PARA RED DOMICILIARIA.



13/09/21 Clima: nublado con lluvia
 jueves personal: 1 residente, 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 iny auxiliar, 1 inspector
 1 inspector SST.

Actividades: - EXCAVACION de CAJEO superior y BOMBA PARA RED CENTRAL
 - CONTINUACION de RELLENO EN RECEBO COMPACTADO
 - INSTALACION de redes domiciliarias
 - INSTALACION de TUBERIA PARA RED CENTRAL



24/09/20

Viernes

Clima: Soleado

personal: 1 residente, 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 ing auxiliar
1 inspector técnico, 1 inspector SST.

Actividades: - continuación de lleno en recebo compactado para red central. - continuación de excavaciones manual para red domiciliaria - continuación de excavación mecánica para cajón superior y zanjas de red central.

25/09/21

Sábado

Clima: Soleado

personal: 1 residente, 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 ing Auxiliar,
1 inspector técnico, 1 inspector SST.

Actividades: - continuación de excavación para red domiciliaria.
- continuación de lleno en recebo compactado con sultura para red central.
- excavación de cajón superior entre pozo 2 y pozo 9 para red central.

26/09/21

Lunes

Clima: Soleado


personal: 1 residente, 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 ing Auxiliar,
1 inspector técnico, 1 inspector SST

Actividades: - instalación de tubería para redes domiciliarias
- continuación de lleno en recebo compactado con sultura para red central.
- excavación manual para cajas de inspección domiciliarias.

28/09/21
Personal

Clima: Soleado
Personal: 1 Residente, 1 Topógrafo, 1 Cadenero, 1 Ing Auxiliar
1 Inspector Técnico, 1 Inspector SST

- Actividades:
- Continuation de excavaciones manuales para Red Domiciliaria y cajas de inspección
 - Continuation de lleno en Recebo Compuerudo con Sulfura para Red Central.
 - Instalacion de tuberia de 6" para Reder Domiciliaria
 - Lleno en Recebo Compuerudo con Sulfura para Reder Domiciliarias.



29/09/21
Personal

Clima: Nublado con Llovizna
Personal: 1 Residente, 1 Topógrafo, 1 Cadenero, 1 Ing Auxiliar
1 Inspector Técnico, 1 Inspector SST


- Actividades:
- Continuation de excavaciones para Red Domiciliaria y cajas de inspección
 - Continuation de lleno en Recebo Compuerudo con Sulfura para Red Central.
 - Instalacion de tuberia de 6" para Red Domiciliaria.
 - Lleno en Recebo Compuerudo para Domiciliarias.
 - perdida de cajas de inspección



30/09/21

Clima
Personal: 1 Residente, 1 Topógrafo, 1 Cadenero, 1 Ing Auxiliar
1 Inspector Técnico, 1 Inspector SST

- Actividades:
- Continuation de lleno en Recebo Compuerudo para Red Central. y Red Domiciliaria
 - Fundida de Cajas de inspección
 - Excavacion manual para Cajas de inspección.
 - Corte y Demolicion de Placa en Concreto



libro de bitácora de obra

Control de obra 0062 del 2021

Objeto: Rehabilitación y/o Recuperación y/o Reparación de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio de los Servicios Comunitarios para el distrito hidráulico del IBAL N°7 ubicado dentro del perímetro hidrozonario de IBAL SAESP oficial en la ciudad de Ibagué.

Controlista: Construcción Redes Hidráulicas 2021

NIT: 901 478 972-4

Representante legal: Juan Carlos Ramirez Ospina

Control de intervención 003 del 2021

Objeto: Intervención técnica administrativa y ambiental con las obras de rehabilitación y/o Recuperación y/o Reparación de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los distritos hidráulicos del perímetro hidrozonario de IBAL SAESP oficial en la ciudad de Ibagué.

Controlista: Construcción Intervención externa, IBAL

NIT: 901 479 007-6

Representante legal: Luis Francisco Escobar Ramirez

Pablo Esteban Gonzalez
Ingeniero Auxiliar

Diego Fernando Giron
Ingeniero Residente

Juan Carlos Ramirez
Directora de obra

Juan Carlos Ramirez
Presidente Interventoría

Juan Carlos Ramirez
Interventoría



31/08/2021

Clima: Seleccionado Terreno seco

Personal: Ing Residente, Ing Aux, Inspector tecnico, IUS SST, Presidente INT, Inspector INT, topografo INT, y Ayudantes, 1 Inspector.

Maquinaria y equipo: Herramienta Menor.

Actividades: Muestreo de tuberia por parte de la topografia, ventilacion de eje, Continúa excavacion de red domiciliaria.





01/09/2021

Clima: nubado terreno Humedo

Personal: Ing Residente, Ing Aux, Inspector tecnico, IUS SST, Presidente INT, Inspector INT, Topografo INT, y Auxiliares, 1 Inspector.

Maquinaria y equipo: Herramienta Menor.

Actividades: línea entubada en excavacion de campo principal, tambien apique para localizar tuberia de red domiciliaria, Continúa excavacion de domiciliares.




02/09/2021

Clima: Seleccionado Terreno seco

Personal: Ing Residente, Ing Aux, Inspector tecnico, IUS SST, Presidente INT, Inspector INT, topografo INT, topografo, y Ayudantes, 1 Inspector.

Maquinaria y equipo: Herramienta Menor.

Actividades: Continúan apique para localizacion de tuberia domiciliaria, Continúa excavacion de red domiciliaria.



03/09/2021


Clima: Seleccionado Terreno Seco

Personal: Ing Residente, Ing Aux, Inspector tecnico, IUS SST, Presidente INT, Inspector INT, Topografo INT, y Ayudantes, 1 Inspector.

Maquinaria y equipo: Herramienta Menor.

Actividades: Continúan apiques y excavaciones para localizacion de red domiciliaria.

Observacion: Hasta la fecha no se ha encontrado 2 redes domiciliares, continúan apiques a la sombra de los viviendas sobre faja de señal en oblato.





04/09/2021

Clima: Soleado Terreno Seco

Personal: Ing Residente, Ing Aux, Inspector Técnico, Ins SST, Residente INT, Inspector INT, Topógrafo INT, 4 Ayudantes, 1 Inspector.

Maquinaria y equipo: Herramienta Menor.

Actividades: Continúan excavaciones y opeques para localizar tubería, Se inicia instalación de sillones YEE e instalación de tubería de 6"



06/09/2021



Clima: lluvioso Terreno Húmedo

Personal: Ing Residente, Ing Aux, Inspector Técnico, Ins SST, Residente INT, Inspector INT, Topógrafo INT, 4 Ayudantes, 1 Inspector.

Maquinaria y equipo: Herramienta Menor.

Actividades: Limpieza de zona principal, limpieza de tubería de 14" con el vector, instalación de acueducto de 6"

Observaciones: En la limpieza de tubería de 14" se halla obstrucción a los 230 m y desde la caja de inspección hasta el pozo se hace limpieza completa, llave (velocidad: 11100 rpm)



07/09/2021



Clima: Soleado Terreno Húmedo

Personal: Ing Residente, Ing Aux, Inspector Técnico, Ins SST, Residente INT, Inspector INT, Topógrafo INT, 4 Ayudantes, 1 Inspector.

Maquinaria y equipo: Herramienta Menor.

Actividades: Continúa excavación de zona domiciliar, continúa opeques para busca de red domiciliar.

Observación: la tubería de acueducto se intercepta con la nueva red de alcantarillado, Se inicia trabajos de recalibrato



08/09/2021

Clima: nubado Terreno Húmedo

Personal: Ing Residente, Ing Aux, Inspector Técnico, Ins SST, Residente INT, Inspector INT, Topógrafo INT, 4 Ayudantes, 1 Inspector.

Maquinaria y equipo: Herramienta Menor, Sillones.

excavaciones (suavemente a los orizontes del tubo, fillación de agua potable, en la inspección diaria de fresas se hizo tapamiento, requiriendo limpieza del vacio. Continúa actividades de llenar y compactación.

Observación: Se requiere ~~después~~ de liberación para verificar estado del descaño de tubería de 8" y 14"

09/09/2021

Clima: Soleado Terreno Húmedo

Personal: Ing Residente, Ing Aux, Inspector Técnico, Ins SST, Residente INT, Inspector INT, topógrafo INT, 4 Ayudantes, 1 Inspector

Maquinaria y equipo: Herramienta Mano, saltarin

Actividades: Continúa excavación de oquies, continúa llenar y compactación de domiciliarios en redes

10/09/2021

Clima: Soleado Terreno seco

Personal: Ing Residente, Ing Aux, Inspector Técnico, Ins SST, Residente INT, Inspector INT, topógrafo INT, 4 Ayudantes, 1 Inspector

Maquinaria y equipo: Herramienta Mano, saltarin

Actividades: Rellenar y compactación de zona pirafesal y domiciliaria, se inicia oquie para ubica valvula de red de acueducto, continúa actividad de oquie para localizar punto intermedio de colectores.

11/09/2021

Clima: Soleado Terreno Húmedo

Personal: Ing Residente, Ing Aux, Inspector Técnico, Ins SST, Residente INT, Inspector INT, topógrafo INT, 4 Ayudantes, 1 Inspector

Maquinaria y equipo: Herramienta Mano, saltarin

Actividades: Limpieza con retroexcavadora de material proveniente de la excavación, continúa excavación para tapamiento de valvula de acueducto.

13/09/2021

Clima: Sobado terreno seco

Personal: Ing Residente, Ing Aux, Inspector Técnico, Inspector SST, Residente INT, Inspector INT, Topógrafo INT, 4 Ayudantes, 1 Inspector y 2 operadores.

Maquinaria y equipo: Retroexcavadora, Volguta, Herramienta Menor

Actividades: Excavación manual para empalme de red de acueducto, Excavación de cajas domiciliarias, Nivelación de red principal.

14/09/2021

Clima: Sobado terreno seco

Personal: Ing Residente, Ing Aux, Inspector Técnico, Ins SST, Residente Aux, Inspector INT, topógrafo INT, 4 Ayudante, 1 Inspector

Maquinaria y equipo: Herramienta Menor.

Actividades: Instalación de tubería 8" red principal, instalación de formeta para fundir cajas de inspección, fundido de cajas,

15/09/2021

Clima: Sobado terreno seco

Personal: Ing Residente, Ing Aux, Inspector Técnico, Ins SST, Residente INT, Inspector INT, topógrafo INT, 4 Ayudantes, 1 Inspector

Maquinaria y equipo: Herramienta Menor

Actividades: Retiro en red principal con trazo compactado, Excavación para cajas inspección, apiques para red domiciliarias

Observación: se recibe visita por parte de IBAL con vector para la tala de tubería de 8" x 14" presentando tubería colapsada.

16/09/2021

Clima: Soleado terreno seco

Personal: Ing Residente, Ing Aux, Inspector tecnico, Ins SST, Residente Int Inspector, Ins, topografo int, 4 Ayudantes, 1 Inspector.

Maquinaria y Equipo: Herramienta Menor.

Actividades: Instalacion de concreto en cajon de inspeccion
Cadena en zanja principal

17/09/2021

Clima: Soleado terreno seco

Personal- Ing Residente, Ing Aux, Inspector tecnico, Ins SST, Residente Int, Inspector Int, Topografo Int, Ayudante, 1 Inspector

Maquinaria y Equipo = Herramienta Menor

Actividades = Instalacion tuberia 8" Para Red Principal, Lleno y Compactacion.

Observaciones- Se Realizan Actividades hasta Medio dia
Por Cambio de Subcontratista.

18/09/2021

Clima- Soleado terreno seco

Personal- Ing Residente, Ing Aux, Inspector tecnico, Ins SST, Residente Int Inspector, Int Topografo, Int Ayudante y Inspector

Maquinaria y equipo = herramienta Menor.

Actividades- Continuidad Lleno y Compactacion Zanja Red Principal, Acabado de Cajon Inspeccion.

20/09/2021

Clima = Soleado terreno seco

Personal = Ing Residente, Ing Aux, Inspector tecnico, Ins SST, Residente Int Inspector, Int Topografo, Int Ayudante y Inspector

Maquinaria y equipo = herramienta Menor


Actividades - Nivelacion de Red Principal, Relleno Cajon Inspeccion.

21/09/2021

Clima = Nublado - terreno húmedo

Personal = Ing Residente, Ing Aux, Inspector técnico, Ing Sst, Residente
Int. Inspector Int, topógrafo Int, 5 Ayudantes, 1 Inspector

Maquinaria y equipo = Herramienta Menor

Actividades = Relleno y Compactación Zanja Red Principal,
Instalación tubería 8"


22/09/2021


Clima = Nublado - terreno húmedo

Personal = Ing Residente, Ing Aux, Inspector técnico, Ing Sst, Residente
Int Inspector, Int topógrafo Int, 5 Ayudantes, 1 Inspector

Maquinaria y equipo = Herramienta Menor, Férrea conidora

Actividades = Nivelación Red Principal, Instalación Tubería

Relleno Compactación Red Principal, Apique Para domiciliarios



23/09/2021

Clima = Nublado - terreno húmedo

Personal = Ing Residente, Ing Aux, Inspector técnico, Ing Sst, Residente
Int Inspector, Int topógrafo 5 Ayudantes, 1 Inspector

Maquinaria = Nivelación = Herramienta Menor

Actividades = Continuidad Compactación Zanja Red Principal
Tubería 8"


24/09/2021

Clima = Soleado - terreno húmedo

Personal = Ing Residente, Ing Aux, Inspector técnico, Ing Sst, Residente
Int Inspector, Int topógrafo 5 Ayudantes, 1 Inspector

Maquinaria y equipos = Herramienta Menor

Actividades = Relleno Compactación Red Principal, Instalación
cables yee para conexión Acomodadas


25/09/2021

Clima: Soleado - terreno seco

Personal - Ing Residente, Ing Aux, Inspector tecnico, Ing SST, Residente Int, Inspector Interventoria, Topografo Interventoria, 5 Ayudantes + Inspector

Maquinaria - equipo = Herramienta Mayor

Actividades = Retiro Compactacion Red Arcondillado

27/09/2021

Clima: Soleado - terreno seco

Personal = (1) Residente INT, Ing Auxiliar, Ing Aux, Inspector tecnico Ing SST, Topografo INT, Inspector INT, 5 Ayudantes, 1 Maestro

Maquinaria - equipo: Herramienta Mayor, Seltarn.

Actividades = Lleno y compactacion con recebo para Zanja de red Principal, Excavacion de Zanja para red domestica, excavacion de Zanja para Caja de inspeccion. Resane para caja de inspeccion, recuperacion de arden.

28/09/2021

Clima = Nublado - terreno seco

Personal = Ing Residente, Ing Aux, Inspector tecnico, Ing SST, Residente Int, Inspector INT, topografo INT, 5 Ayudantes, 1 Maestro, Maquinaria =

Actividades = Limpieza de terreno con retro excavadora, continua excavacion de red domestica y Zanja para caja de inspeccion, formateo para caja de inspeccion, relleno con recebo en Zanja de red domestica, instalacion de tubo 6" para red domestica conectado desde tubo principal de 8" a caja de inspeccion

29/09/2021

Clima = lluvioso - terreno humedo

Personal = Ing Residente, Ing Aux, Inspector tecnico, Ing SST, Residente Int, Inspector INT, topografo INT, 5 Ayudantes, 1 Maestro, Maquinaria =

Actividades =

de red domiciliaria, Continuo excavación de red domiciliaria,
 fundición de caja de inspección. Cortes y demolición para
 cajas de inspección, limpieza del terreno de manera mecánica.
 Instalación de tubería 6" para red de alcantarillado domiciliaria.
 Observaciones - De 7:00 am a 8:00 am se presenta lluvia lo
 cual no permitió la realización de actividades.

[Handwritten signature]

30/09/2021 -
 Clima - nublado - terreno húmedo
 Personal -

Maquinaria - equipo -
 Actividades = Limpieza de sumidero de aguas lluvias, Continuo
 excavación y corte de cajas de inspección, continuo fundición
 de cajas de inspección, fundieron lospo para cajas de inspección,
 Excavación de zanja para red de alcantarillado domiciliaria, llevo
 y completación de recepción para zanja de domiciliaria de
 alcantarillado.

[Handwritten signature]

01/10/2021

Libro de bitácora de Obras

Contrato de obra: 0062 del 2021

Objeto: Rehabilitación y/o Reparación y/o Reposición de las redes de acueducto y desbarrilado para garantizar la continuidad del servicio de los sectores comprendidos para el distrito hidrológico N° 1, Ubicados dentro del perímetro hidrozonario del IBAL SAESP oficial en la ciudad de Ibagué.

Contratista: Consorcio Redes Hidráulicas 2021

Nit: 901-4189472-4

Representante legal: Juan Carlos Ramirez Ospina

Contrato de interventoría 063 del 2021

Objeto: Interventoría técnica administrativa y ambiental para las obras de rehabilitación y/o Reparación y/o Reposición de las redes de acueducto y desbarrilado para garantizar la continuidad del servicio en los distritos hidrológicos de cuencas hidrozonario del IBAL SAESP oficial en la ciudad de Ibagué

Contratista: Consorcio Interventoría Externa IBAL

Nit: 901479007-6

Representante legal: Luis Francisco Ramirez

Juan Carlos Salazar
Residente Interventoría

Pablo Gonzalez
Residente Aux

Juan Carlos Ramirez
Directa de obra

Inspector Interventoría

Diego Giron

Observación: Interventoria solicita que sean agilizados los formatos de entrega de domiciliarios para de este modo tapar cuanto antes los huecos de las cajas ya terminadas con cañuelas y de este modo evitar vacíos en el área de transeuntes para controlar accidentes y malos olores.

31/08/2021

Clima: Nublado

Personal: Ing. Residente, Insp. técnico, Insp. SST, residente interventor, topógrafo interventor, 1 maestro 2 ayudantes.

Equipo - maquinaria: Sattaria - Herramienta menor - Cortadora

Actividad: Se realiza fundida de cañuelas para terminación de 3 cajas de inspección, se realiza corte de tramo nuevo de vía, para demoler pavimento e iniciar con excavación para zanja de acometida principal y conectar con el pozo adyacente.

Observación: Interventoria solicita que sean tapados los vacíos provisionalmente con camillas ya que representan un riesgo.

1/09/2021

Clima = Soleado

Personal: Ing. Residente, Insp. técnico, Insp. SST, aux. residente, interventoria residente, topógrafo interventor, 1 maestro, 2 ayudantes.

Equipo - maquinaria: Herramienta menor

Actividad = Se realiza demolición y excavación zanja alveo, excavación zanjas domiciliarias correspondientes a alcantarillado, instalación tuberías fundición de cajas.

2/09/2021

Clima =

Personal = lng residente, aux residente, insp tecnico, insp est, residente interventoria,

topografo interventoria, inspector interventoria, maestro ayudantes.

Equipo y maquinaria = Cortadora, mezcladora, herramienta menor.

Actividades = Se continua con demolición y excavación para acueducto,

Se continua con excavación correspondientes a domiciliarias de alcantarillado.

3/09/2021

Clima =

Personal = lng residente, aux residente, insp tecnico, insp est, residente interventoria,

topografo interventoria, inspector interventoria, maestro ayudantes.

Equipo y maquinaria = Cortadoras, herramienta menor.

Actividades = Se realiza corte para ved de acueducto, excavación y demolición para zanjas domiciliarias, fundición de cajas de inspección.

4/09/2021

Clima =

Personal = lng residente, aux residente, insp tecnico, insp est, residente interventoria,

topografo interventoria, inspector interventoria, maestro ayudantes.

Equipo y maquinaria = Herramienta menor.

Actividades = Instalación tubería para acometidas domiciliarias, se continua

excavación para zanjas domiciliarias de manera manual, se funden tapas

para cajas de inspección, demolición y excavación para la realización de cajas

de inspección.

6/09/2021

Clima =

Personal = lng residente, aux residente, insp tecnico, insp est, residente interventoria,

topografo interventoria, inspector interventoria, maestro ayudantes.

Equipo y maquinaria = Herramienta menor,

Actividades = Demolición de andén para cajas de inspección, excavación manual

zanjas domiciliarias, excavación para cajas de inspección, demolición correspondiente

a la capa asfáltica. Zanja principal acueducto, excavación de la misma.

31/09/2021

Clima:

Personal = lng residente, insp tecnico, aux residente, insp est, residente interventoria, topografo interventoria, maestro ayudantes.

Maquinaria y equipo = Herramienta menor, mezcladora.

Actividades = Instalación tubería alcantarillado domiciliarias, revestimiento de tubería, nivelación de tubería principal de alcantarillado, realización de oqujes para la limpieza de cajas de inspección antiguas, excavación red acueducto.



01/09/2021

Clima = Lluvioso

Personal = lng residente, insp tecnico, aux residente, insp est, residente interventoria, topografo interventoria, maestro ayudantes.

Maquinaria y equipo =

Actividades = Se continuo excavación zanja principal de acueducto, excavación domiciliarias.



09/09/2021

Clima:

Personal = lng residente, insp tecnico, aux residente, insp est, residente interventoria, topografo interventoria, maestro ayudantes.

Maquinaria y equipo = Soltarin, herramienta menor.

Actividades = Retiro y compactación con recibo zanja principal alcantarillado, fundida caja de inspección, excavación zanja para acometidos domiciliarias, se continuo excavación correspondiente a acueducto, se instalación de tubería.




10/09/2021

Clima:

Personal = lng residente, insp tecnico, aux residente, insp est, residente interventoria, topografo interventoria, maestro ayudantes.

Maquinaria y equipo = Mezcladora, herramienta menor.

Actividades = Se realiza revestimiento correspondiente a la tubería principal de acueducto, se funda topas para cajas de inspección, instalación tubería acueducto, revestimiento tubería domiciliarias alcantarillado, excavación zanjas domiciliarias.




11/09/2021

Clima=

Personal = lng residente, insp tecnico, aux residente, insp sst, residente interventoria, topografo interventoria, maestro, ayudantes.

Maquinaria y equipo = Herramienta menor.

Actividades = Excavación domiciliarias de acueducto, fundido de cajas de inspección, excavación para cajas de inspección, demolición de acueducto, (asfalto y concreto)




13/09/2021

Clima=

Personal = lng residente, insp tecnico, aux residente, insp sst, residente interventoria, topografo interventoria, maestro, ayudantes.

Maquinaria y equipo = Mezcladora, herramienta menor.

Actividades = Se continua excavación domiciliarias, demolición y excavación acueducto, fundido cajas de inspección.




14/09/2021

Clima=

Personal = lng residente, insp tecnico, aux residente, insp sst, residente interventoria, topografo interventoria, maestro, ayudantes.

Maquinaria y equipo = Mezcladora, herramienta menor.

Actividades = Instalación y revestimiento tubería alcantarillado, excavación domiciliarias acueducto, cortes para cajas de inspección, se realizan pruebas de densidades del terreno anteriormente compactado, excavación domiciliarias alcantarillado.




15/09/2021

Clima=

Personal = lng residente, insp tecnico, aux residente, insp sst, residente interventoria, topografo interventoria, maestro, ayudantes.

Maquinaria y equipo = Soltarin, herramienta menor.

Actividades = Excavación domiciliarias acueducto, relleno zanja y acometidas acueducto, relleno zanja principal alcantarillado, compactación con saltarin de lo relleno anteriormente de alcantarillado.



16/09/2021

Clima =

Personal = Ing residente, insp tecnico, aux residente, insp sst, residente interventoria, topografo interventoria, maestro, ayudantes.

Maquinaria y equipo = Herramienta menor.

Actividades = Realización de cañueles para cajas de inspección, instalación y revestimiento de tubería para domiciliarias, se realiza relleno para zanja de acometidas de acueducto con recebo.

17/09/2021

Clima =

Personal = Ing residente, insp tecnico, aux residente, insp sst, residente interventoria, topografo, maestro, ayudantes.

Maquinaria y equipo = Herramienta menor.

Actividades = Funda de cañueles y cajas de inspección.

18/09/2021

Clima =

Personal = Ing residente, insp tecnico, aux residente, insp sst, residente interventoria, topografo, maestro, ayudantes, operador, conductor.

Maquinaria y equipo = Retroexcavadora, volquete, herramienta menor.

Actividades = Limpieza de material proveniente de la excavación por medio mecánico, relleno en recebo para alcantarillado, limpieza de la obra.

20/09/2021

Clima =

Personal = Ing residente, insp tecnico, aux residente, insp sst, residente interventoria, topografo interventoria, maestro, ayudantes.

Maquinaria y equipo = Cortadora, Saltavin, Herramienta menor.

Actividades = Corte, excavación y demolición para zanja de acometida principal de acueducto, relleno y compactación en recebo para alcantarillado.

21/09/2021

Clima=

Personal= Ing residente, insp tecnico, aux residente, insp sst, residente interventoria, topografo interventoria, maestro, ayudantes.

Maquinaria y equipo= herramienta menor.

Actividades= Se realiza fundido de cañuelas para finalizar cajas de inspección, corte, demolición y excavación red acueducto, se realiza fundido cajas de inspección.

22/09/2021

Clima=

Personal= Ing residente, insp tecnico, aux residente, insp sst, residente interventoria, topografo interventoria, maestro, ayudantes.

Maquinaria y equipo= Saltarin, herramienta menor, retroexcavadora, volquetas.

Actividades= Instalación tapas correspondientes a cajas de inspección, excavación domiciliarias alcantarillado, demolición y excavación para cajas de inspección, fundido de cañuelas, se inicia relleno y compactación red alcantarillado con recebo, demolición y excavación red acueducto, limpieza material proveniente de la excavación por medio mecánico.

23/09/2021

Clima=

Personal= Ing residente, insp tecnico, aux residente, insp sst, residente interventoria, topografo interventoria, maestro, ayudantes.

Maquinario y equipo= Mezcladora y herramienta menor.

Actividades= Se continua excavación domiciliarias alcantarillado, se realiza instalación y revestimiento de tubería, excavación y demolición para acueducto.

24/09/2021

Clima=

Personal= Ing residente, insp tecnico, aux residente, insp sst, residente interventoria, topografo interventoria, maestro, ayudantes.

Maquinaria y equipo= Herramienta menor.

Actividades= Se continua excavación y demolición acueducto, excavación domiciliarias, se inician llenos para cajas de inspección, se realiza instalación de

26/09/2021

Clima=

Personal = Ing residente, insp tecnico, aux residente, insp sst, residente interventoria,
topografo interventoria, maestro, ayudantes.

Maquinaria y equipo = Saltarin, herramienta menor.

Actividades = se realiza compactación pendiente de la red de acueducto,
se realiza instalación y revestimiento de tubería para domiciliarias alcantarillado,
se realiza fundida de cajas de inspección y de cañuelas.

27/09/2021

Clima=

Personal = Ing residente, insp tecnico, aux residente, insp sst, residente interventoria,
topografo interventoria, maestro, ayudantes, operador, conductor

Maquinaria y equipo = Saltarin, mezcladora, retroexcavadora, volquete, herramienta menor.

Actividades = Revestimiento red acueducto, instalación tubería principal acueducto,
excavación para cajas de inspección, limpieza de material proveniente de
la excavación por medio mecánico, relleno y compactación cajas alcantarillado,
instalación tapas para cajas de inspección.

28/09/2021

Clima=

Personal = Ing residente, insp tecnico, aux residente, insp sst, residente interventoria,
topografo interventoria, maestro, ayudantes, operador, conductor.

Maquinaria y equipo = Retroexcavadora, mezcladora, herramienta menor, volquete

Actividades = limpieza de material proveniente de la excavación por medio mecánico
resaneos y cortes cajas de inspección, fundida de cañuelas y cajas de inspección,
excavación cajas de inspección, demolición y excavación acueducto.

29/09/2021

Clima=

Personal = Ing residente, insp tecnico, aux residente, insp sst, residente
interventoria, topografo interventoria, maestro, ayudantes, conductor, operador

Maquinaria y equipo = herramienta menor, retroexcavadora, volquete

Actividades = Corte, demolición y excavación acueducto lim 1000 c/cambros

30/09/2021

Clima =

Personal = Ing residente, aux residente, nsp tecnica, nsp srt, residente interventoria, topografo interventoria maestro ayudantes.

Maquinaria y equipo = Mezcladora y herramienta menor.

Actividades = Corte, demolición y excavación zanja aludotto, se realiza fundida de caja de inspección.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Libro de bitácora de Obra

Cerchete de obra 0002 del 2021

Objeto: Rehabilitación y/o Recuperación y/o Reparación de las Redes de
acueductos y alcantarillado para garantizar la continuidad del
servicio en los sectores comprendidos por: el distrito
hidráulico del IBAI N° 7, ubicado dentro del perímetro
hidrosanitario del IBAI SAESP oficial en la ciudad de Itaque

Cerchete: Contrato Redes Hidráulicas 2021

NIT 901 479 942-4


Representante legal: Francisco Romero Capera


Cerchete de intervención 063 de 2021

Objeto: trabajos técnicos administrativo y ambiental
para la obra de rehabilitación y/o recuperación y/o
reparación de las redes de acueducto y alcantarillado
para garantizar la continuidad del servicio en los
distritos hidráulicos del perímetro hidrosanitario
del IBAI SAESP oficial en la ciudad de Itaque


Cerchete: Contrato Intervención externa IBAI



NIT: 901 479 007-6


Representante legal: Luis Francisco Espinoza 


Pablo Esteban González

José Aux


Diego Fernando Giron
Residente


Juan Carlos Riquelme
Directo de obra

Juan Carlos Sobza
Residente Intervención


Inspector Intervención

Calle 145 con carreras 81 Barrio el Sabdo

01-09-2021 Clima: Nuboso Tierra húmeda
 Personal: Residente Ing Aux INS tec INS SST Residente int
 INS INT

Máquinas y equipo:

Actividades: Realización de obras de vialidad y socialización del proyecto.

02-09-2021 Clima: Soleado Tierra seca
 Personal: Residente Ing Aux INS tecnico INS SST Residente int
 INS INT Topografos.

Máquinas y equipo: Nivel de precisión - Estación

Actividades: Investigación y levantamiento topográfico del terreno a intervenir.

03-09-2021 Clima: Soleado Tierra seca
 Personal: Residente Ing Aux INS tecnico INS SST Residente int
 INS INT 0 Retroexcavadora 0 volqueta 1 maestro 3 Ayudantes

Máquinas y equipo: Herramienta menor Retroexcavadora

Actividades: Excavación para gradas, instalación de solisombra, Corte de estiba para zona principal, Derrocham de señal para dar continuidad al flujo vehicular por el otro carril.

04-09-2021 Clima: Soleado Tierra seca
 Personal: Residente Ing Aux INS SST INS tecnico Residente int
 INS INT: 0 Retro excavadora 2 0 volquetas 1 maestro 3 Ayu

Máquinas y equipo: Retro excavadora - Herramienta menor

Actividades: Inicio excavación con retroexcavadora para zona principal

06-09-2021

Clima: Lluvioso Terreno Húmedo

Personal: Residente Ing Aux INS SST INS tecnico Residente int
no int. 1 maestro 3 Ayudantes 1 O. Betio 2 O. volquete.

Maquinaria y equipo: Retroexcavadora - Herramienta menor

Actividades: Continúa cante de asfalto para zona principal
Continúa excavación de retroexcavadora en zona principal

Observaciones: Lluve fuertemente hasta las 11:00 am retirando actividades

07-09-2021

Clima: Soleado Terreno Húmedo

Personal: Residente - Ing Aux no tec INS SST Residente int
no int 1 maestro 3 Ayudantes 2 Topografos

Maquinaria y equipo: Herramienta menor

Actividades: Continúa excavación de retroexcavadora en zona principal, inicia demolicion de estalla para zona obrerilicia, Continúa demolicion de asfalto para zona de excavación principal, verificación de profundidad con nivel de precisión

08-09-2021

Clima: Nublado Terreno Húmedo

Personal: Residente - Ing Aux no tec INS SST Residente int
no int 1 maestro 3 Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta menor

Actividades: Inicia actividades de llero y compactacion en receba en zona principal, instalacion de tuberia de 10", colocacion de tubo del agua en excavacion domiciliaria

07-01-2021

Clima Soleado Terreno Humedo

Personal: Residente Ing Aux Ins SST Ins tecnico Residente mt
 Ins mt 1 maestro 3 Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta mano - compactador tipo solbrin

Actividades: Continúa instalación de tubería de 10" para
 zona principal, continúan actividades de lleno y
 compactación en recebo, se inicia instalación de
 Sillas YEE Para domiciliarias

12-04-2021

Clima Soleado Terreno Seco

Personal Residente Ing Aux Ins SST Ins tecnico Residente mt
 Ins mt 1 maestro 3 Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta mano. nivel de precisión

Actividades: Se hace instalación de lotes en grava, se hace
 verificación de nivel en tubería de 10", continúan
 actividades de lleno y compactación en recebo de
 excavación principal, continúan demolición de cimientos
 para domiciliarias

-09-30-2021

Clima Soleado Terreno Humedo

Personal: Residente Ing Aux Ins SST Ins tec Residente mt
 Ins mt 1 maestro 3 Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta mano - Compactador

Actividades: Instalación de tubería de 10", continúan actividades
 de demolición de cimientos para domiciliarias,
 verificación de niveles para tubería, continúan
 actividades de lleno y compactación en recebo.

3-09-2021

Clima Soleado Terreno Seco

Personal Residente Ing Aux Ins Tec Ins SST Residente mt
 Ins mt 1 maestro 3 Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta mano - Mezcladora

Actividades: Finales de revestimiento para tubería de 10"
Continuar actividades de llenado y compactación

14-09-2011 Clima Soleado Terreno seco

Personal: Residente Ing. A. Ins. SST Ins. T. Residente Int.
Ins. Int. 1 maestro 3 Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta mano - compactador

Actividades: Continuar actividades de compactación, instalación
de silbo YEE

15-09-2011 Clima Soleado Terreno seco

Personal: Residente Ing. A. Ins. SST Ins. T. Residente Int.
Ins. Int. 1 maestro 3 Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta mano - Mezcladora

Actividades: instalación de silbo YEE, instalación de tubería de
6" para domiciliaria, finales de revestimiento para
red domiciliaria, Finales de revestimiento en red
principal, excavación manual para domiciliaria.

16-09-2011 Clima Soleado Terreno seco

Personal: Residente Ing. A. Ins. SST Ins. T. Residente Int.
Ins. Int. 1 maestro 3 Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta mano - Compactador.

Actividades: pruebas de densidades en Abanicos ()
Continua excavación para domiciliaria, continúan
actividades de llenado y compactación

07/04/2011

Clima: Soleado Terreno seco

Personal: Residente Ing Aux no SST Residente int no int

1 maestro 4 Ayudantes

Máquinas y equipo: Herramienta menor

Actividades: Excavación de red domiciliaria, excavación para caja de inspección

08/04/2011

Clima: Soleado Terreno seco

Personal: Ing Aux Residente no SST Residente int no int

1 maestro 4 Ayudantes

Máquinas y equipo: Herramienta menor

Actividades: Continuar actividades de excavación de red domiciliaria

20/04/2011

Clima: Soleado Terreno seco

Personal: Residente Ing Aux no SST Residente int no int

1 maestro 4 Ayudantes

Máquinas y equipo: Herramienta menor, medidora

Actividades: Excavación de red domiciliaria, Fondo de caja de inspección
Excavación para caja de inspección

21/04/2011

Clima: Nublado Terreno Humedo

Personal: Residente Ing Aux no SST Residente int no int

1 maestro 4 Ayudantes

Máquinas y equipo: Herramienta menor: Compactadora tipo sellado

Actividades: Excavación para caja de inspección, Actividades de llenado y compactación, excavación para red domiciliaria
Arreglo de cables para fondo de inspección

22/04/2011

Clima: Soleado Terreno seco

Personal: Residente Ing Aux no SST Residente int no int

1 maestro 4 Ayudantes

1 operario tele 2 operarios valvula

maquinaria y equipo: Herramienta menor, mezcladora, retroexcavadora, volquetes
 Actividades: Lleno y compactación en recepción de red domiciliaria
 instalación de tubería de 6" y finalida de revestimiento,
 excavación mecánica con retroexcavadora para red
 principal, Fendido de lepro para cajas de inspección

23/04/2021

Clima: Nublado lluvioso

Fuerza: Residente Ing Aux 103 551 Residente int 103 int: 103 (int)
 1 maestro 4 Ayudantes

Maquinaria y equipo: Nivel de precisión, Herramienta menor

Actividades: Nivelación de tubería con nivel de precisión
 excavación para red domiciliaria

24/04/2021

Clima: Soleado Temperatura seca

Fuerza: Residente Ing Aux 103 551 Residente int 103 int
 1 maestro 4 Ayudantes

maquinaria y equipo: Herramienta menor, compactadora tipo galbano

Actividades: Excavación manual de red principal, Lleno y compactación
 de red domiciliaria en recepción, excavación de red
 domiciliaria

25/04/2021

Clima: Soleado Temperatura seca


Fuerza: Residente Ing Aux 103 551 Residente int 103 int
 1 maestro 4 Ayudantes

maquinaria y equipo: Herramienta menor, mezcladora

Actividades: Fendido de revestimiento para tubería principal
 excavación para red domiciliaria

27/09/2021 Clima: Soleado Tierra seca
 Personal: Residente Ing Aux los 301 Residente int los 101
 1 maestro 4 Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta manual, compactador tipo saltiro
 Actividades: Continuar llamo y compactación en relleno de
 red principal, excavación manual de red principal
 y red domiciliar



28/09/2021 Clima: Soleado Tierra seca
 Personal: Residente Ing Aux los 301 Residente int los 101
 1 maestro 4 Ayudantes


Maquinaria y equipo: Herramienta manual, compactador tipo saltiro
 Actividades: Continuar excavación manual de red principal y
 se demuestran trabajos realizados de parte de
 la visit. Continúa llamo y compactación en relleno
 de red principal, Continúa excavación de red
 domiciliar

Observaciones: En la excavación manual de la red principal
 se localiza para que intercepta al borde
 de la tubería de 10", se espas indicaciones
 por parte del contratista y equipo de trabajo
 para solucionar dicha situación



29/09/2021 Clima: nuboso lluvioso: horas de la mañana
 Personal: Residente Ing Aux los 301 Residente int los 101
 1 maestro 4 Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta manual, Mezcladora
 Actividades: Continúa excavación para zanja domiciliar, excavación
 manual de zanja principal, fundido de revestimiento para
 red principal 10"



3/12/2021 L. H. H.

Financiamiento: Residencia Ing. Ar. los 554 Residencia ml no ml
1 estudio 4 Ayudantes

Materiales y equipo:

Actividades: Continúa excavación de red secundaria y excavación
normal de red principal, Dirección de fiscal de
obra para este día controlada a red de 10"

[Handwritten signature]

Libro de Bitácora de obras

Carácter de obra: obra del 2021

Objeto: Rehabilitación y/o recuperación y/o reparación de los techos de acueducto y alcantarillas para garantizar la continuidad de servicio en los sectores comandados por el Distrito Hidráulico del IBAL NO 7, Ubicados dentro del perímetro hidrográfico del IBAL SAESP Oficial en la ciudad de Ibagué

Contratista: Consorcio Redes Hidráulicas 2021

NIT 901478976-4

Representante legal: Juan Carlos Ramirez Osorio

Carácter de intervención: Obra del 2021

Objeto: Intervención Técnica Administrativa y Ambiental por los obras de rehabilitación y/o recuperación y/o reparación de los techos de acueducto y alcantarillas para garantizar la continuidad del servicio en los distritos hidráulicos del perímetro hidrográfico del IBAL SAESP Oficial en la ciudad de Ibagué

Contratista: Consorcio Interventoría Exterior IBAL

NIT: 901479007-6

Representante legal: Luis Francisco Espada Ramirez

Pablo Esteban Corrales
INGENIERO AUXILIAR




Juan Carlos Ramirez
DIRECTOR DE OBRA

Diego Gran
INGENIERO RESIDENTE

Juan Carlos Salazar
RESIDENTE INTERVENTORIA

Director Interventoría

instalacion de techo en grutas e instalacion de tuberias.




01/09/2021

Clima: Subeada Terreno Humedo

Personal: Residente Ing Aux Ins Tecnicos Ins SST Residente Topografo
Ins Int. 1 maestro 4 Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta menor

Actividades: Instalacion de techo en grutas, instalacion de
tuberias 8" y colocacion de br. mampara, demolicion de
placa para cajas de inspeccion, excavacion de caja




02/09/2021

Clima: Subeada Terreno Humedo

Personal: Residente Ing Aux Ins Tecnicos Ins SST Residente Topografo
Ins Int. 1 maestro 4 Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta menor

Actividades: finaliza de revestimiento para tuberia principal
excavaciones para cajas de inspeccion, demolicion
de estalita en demoliciones




03/09/2021

Clima: Subeada Terreno seco

Personal: Residente Ing Aux Inspectores Tec Ins SST Residente Int.
Inspector Int. 1 maestro 4 Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta menor

Actividades: Excavaciones para cajas demoliciones

04/09/2021

Clima: Subeada Terreno seco

Personal: Residente Ing Aux Ins Tecnicos Ins SST Residente Int.
Inspector Int. 1 maestro 4 Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta menor

Actividades: Continuar excavaciones para cajas demoliciones
limpieza de excavacion de cajas de inspeccion

08/04/2021
 Clima: lluvioso Terreno Húmedo
 Personal: Residente Ing Aux Inspector Técnico Residente Int
 Ins Int 1 maestro 4 Ayudantes
 Maquinaria y equipo: Herramienta menor
 Actividades: Instalación de tubería de 6" para domiciliarios,
 conexión de costilla para zona domiciliaria
 Observaciones: llave fuertemente hasta la llave con

04/09/2021
 Clima: Soleado Terreno seco
 Personal: Residente Ing Aux Inspector Técnico Residente Int
 Inspector Int 1 maestro 4 Ayudantes
 Maquinaria y equipo
 Actividades: Continuar actividades de excavación para zonas
 domiciliarias, finción de caja de inspección

08/09/2021
 Clima: nubado Terreno Húmedo
 Personal: Residente Ing Aux Ins Tec Ins Bor Residente Int
 Ins Int 1 maestro 4 Ayudantes
 Maquinaria y equipo: Herramienta menor
 Actividades: Instalación de tubería de 6", finción de caja de
 inspección

09/09/2021
 Clima: Soleado Terreno Húmedo
 Personal: Residente Ing Aux Ins Tec Ins Bor Residente Int
 Ins Int 1 maestro 4 Ayudantes
 Maquinaria y equipo:
 Actividades: Instalación de tubería de 6", finción de veredas para
 para domiciliarios


10-01-2021

Clima: Soleado Terreno seco

Personal: Residente Ing Aux INSTEC INS SST Residente int
no int 1 maestro 4 Ayudantes

Maquinaría y equipo: Herramienta menor - compactador tipo salbrin

Actividades: Lleno y compactación de recibo de red principal y
distributivas, instalación de tapas para cajas de inspección
y fundido de cañales




11-09-2021

Clima: Soleado Terreno Humedo

Personal: Residente Ing Aux INSTEC INS SST Residente int
no int 1 maestro 4 Ayudantes

Maquinaría y equipo:

Actividades: Continuar actividades de lleno y compactación de recibo
en zona principal y distributivas




13-01-2021

Clima: Soleado Terreno seco

Personal: Residente Ing Aux INS SST Residente int no int
1 maestro 4 Ayudantes

Maquinaría y equipo: Herramienta de mano, compactador tipo coguin

Actividades: Lleno y compactación de zona principal y distributiva
en recibo a rasante de via, lleno en recibo
para cajas de inspección



14-01-2021

Clima: Soleado Terreno seco

Personal: Residente Ing Aux INS SST Residente int no int
1 maestro 4 Ayudantes, Operario Pelto Operario volquete

Maquinaría y equipo: Retroexcavadora volquete Herramienta menor

Actividades: Fundido de recobros para cajas de inspección y
reparación de moldes, transporte de materiales
en estacionamiento, Impreso de material de sitio en

MIERCOLES 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023

- Salvo que se tenga un representante del contrato mientras se realicen actividades laborales. Se requiere instalador polizonal para nueva obra a que se realice el pago con materiales nuevos. Incluir puntal de los Tuya G.

- Se solicita verificar la data con el personal de obra, y la instalación de la valla del contrato firmado en el sitio establecido.

Interventor: J. J. J. J.
 Supervisor: J. J. J. J.

[Signature]

Interventor

[Signature]

Condiciones climáticas: Lluvia intensa de 01:00 am - 11:30 am

Personal en obra: Residente contratista, topógrafo contratista, SISO contratista, inspector interventor, mano de obra, ayudantes 10.

Máquina y/o equipo: Estación topográfica, nivel, mezcladora, herramienta mano, conguero.

Posterior de los Tuya: Se continúa realizando el cerramiento y señalización en obra.

América para 3A-3A-3A: Se continúa con excavación manual para posterior construcción de domicilios (perfilado de cajas). Instalación de tuberías de 8", lleno compacto con recibo.

Se realizó protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

[Signature]
 Interventor

[Signature]

VIERNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Condiciones climáticas favorables

Personal en obra: Residente de obra contratista, director de obra, topógrafo contratista, residente interurbana, inspector interurbano, SISO contratista, SISO ambiental contratista, maestro 1, ayudantes 9.

Maquinaria y/o equipos: Mezcladora, Nivel, herramienta menor, conguero, cotadora de pavimento

Se realiza comité de obra (Ver comité de obra si y).

Plan de las Tallas: Marcación sobre vía y corte de pavimento.

América Pasa 3A-4A-7A. Se continúa con excavación manual, perfilado para ejes domiciliarias, instalación de formateo e instalación de tubería de 6".

Se realizan protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

Tallas Pasa 1-2, 3-4: Se realiza inspección de tubería por medio de robot perteneciente al ISAL, se encontró todo según condiciones y normas requeridas.

[Firma]

[Firma]

VIERNES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Condiciones climáticas favorables

Personal en obra: Residente de obra contratista, Topógrafo contratista, SISO contratista, director de obra contratista, inspector interurbano, maestro 1, ayudantes 9, operador.

Maquinaria y/o equipos Mezcladora, Nivel, herramienta menor, conguero, cotadora de pavimento, compresor.

Plan de las Tallas: se finaliza con el corte de pavimento y se inicia actividad de rotura del mismo.

América Pasa 3A-4A-5A: Se continúa con fundido de ejes domiciliarias, lleno con triturado e instalación de tubería de 6".

Se realizan todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

[Firma]

[Firma]

SABADO 04 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Condiciones climáticas: variables
 Personal en obra: Residente de obra contratista, SISA CONTRATISTA, topografía contratista, inspector interventoría, maestro 1, ayudantes 3, operario.
 Pautal de los Tuzos. Se finaliza con la raturo de pavimento sobre el vía.
 Amercos Pozo 1A-2A-3A. Se realiza lleno completo con recibo.
 Amercos Pozo 3A-4A-5A. Lleno completo con recibo, instalación de tubería PVC 6".
 Se realizan protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LUNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Condiciones climáticas: Lluvia intensa de 07:00-11:30 am
 a la fecha no se tomaron densidades del 90% y el llenado en un 90%. Interventoría de Amercos Lluvia PESA a PESA
 Personal en obra Residente de obra contratista, SISA CONTRATISTA, topografía contratista, SISA ambiental contratista, inspector de interventoría, maestro 1, ayudantes 9.
 Debido a las condiciones climáticas se no depositado la toma de muestras para resultado de densidades ya que por las fuertes lluvias el material permanece saturado. Se programó toma de muestras para el día 07 de septiembre (sueto a clima).
 Maquinaria y/o equipos: Medidora, ranquero, herramienta menor, nivel.
 Arrambaje: Se realiza socialización de tramo en compañía del residente y la interventoría.
 Amercos Pozo 3A-4A-5A: Se continúa con la excavación manual, desechos de cura, lleno con material, instalación de tubería de 6" y lleno completo con recibo.
 Todo el material proveniente de la excavación tanto mecánica como manual es retirado por medio de urdimas.

preparación de seguridad y higiene en obra.

Miércoles 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Condiciones climáticas: favorables
Personal en obra: Residente de obra, seis contratista, topógrafo, controlista, inspector, interventor, maestro 1, ayudante 3, maquinista y/o equipos. Herramienta mano, nivel, conguo, martillo, escarificación, rebarrador.
Actividad: 07:00 - 08:00. Se continuo con la excavación manual, eliminación de formales en madera y fundido de espar, luego compacto con rodillo sobre línea principal (10") y demoliciones fundido de placa en concreto sobre arden.

Por la tarde: 1-2. Se inicia actividades de excavación mecánica, después de excavar 0.80 m de profundidad que se rellenan con concreto para lo cual es necesario realizar demolición. Se realizan tomas de muestras en las zonas de: Tumbos pozos 1-3 y 3-4 al 70% del lleno (recibo), Alimento: POZO 1A-2A y 2A al 70% del lleno, Alimento: 1A-2A, 3A-4A al 50% y al 70%.

Se realizan todos los preparos de seguridad y salud en obra.

Miércoles 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Condiciones climáticas: Luvia intensa de 07:00 - 09:00, lluvia moderada 11:00
Personal en obra: Residente de obra contratista, seis contratista, topógrafo contratista, inspector, interventor, maestro 1, ayudante 3, operario.

Maquinaria y/o equipos: Herramienta mano, nivel, conguo, martillo, compresor, tlad o punta.
Por la tarde: 1-2. Se realiza excavación mecánica, cido a resquebrajamiento de tuberías existentes en concreto se excava la altura del mismo, se inicia actividad de altura.

del mismo.
 Portal de las Tunas Pozo 2-3 Excavación mecánica.
 Aterrazo Pozo 3A-4A-5A. Se continúa con actividades de
 fundido de cajas, lleno completo con relleno y limpieza de
 arbores.
 Se realizan todos los procedimientos de seguridad y bioseguridad
 en obra.

Al momento de realizar la excavación mecánica en el Portal
 de las Tunas la retroexcavadora con las mangas PE de
 110" los cuales se están maximizando nuevamente evitando así
 dejar a los usuarios sin agua.

[Signature]

[Signature]

JUEVES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Condiciones climáticas: Lluvia intensa de 07:00 - 9:00
 Personal en obra: Residente de obra, siso combatista, director
 de obra, topógrafo contratista, siso ambiental combatista,
 marcho 1, oficiales 1, ayudantes 9, inspector interventoría.
 Maquinaria y/o equipos: Herramienta menor, retroexcavadora,
 nivel, curvatura topográfica, mezcladora, conguo, compresor
 Se realiza comité de obra (Ver comité # 5).

Portal de las Tunas Pozo 1-2-3. Se continúa con la rotura
 de pavimento de las demarcaciones y red principal, al momento
 de realizar la excavación manual se nota la aparición de
 tubería perteneciente a la red de aguas lluvias la cual es
 paralela a la red principal, se observa y se hace conocer a
 interventoría que el tubo que se instalará nuevo de PVC de
 4" debe ir por encima de la tubería de aguas lluvias
 por lo cual la misma obligó en que la caja no
 sea de 1 m de profundidad sino menor.

Aterrazo Pozo 3A-4A-5A. Se continúa con la fundido de
 concretos para orden, lleno completo con relleno, limpieza y
 retiro de escombros. Se realizan todos los procedimientos de bioseguridad.

[Signature]

DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Condiciones climáticas: Lluvia intensa 07:00-09:00, lluvia moderada 10:00-12:00

Personal en obra: Residente de obra, contratista, topógrafo, carbanista, 02 ayudantes carbanista, 02 SO carbanista, inspector interviniente, maestro x1, ayudantes 9, operario

Mantenimiento de equipos: Herramienta menor, retroexcavadora, nivel, congreto, mezcladora, congreto

Accidentes: Se realizó nueva señalización en sitio debido a que la contratista presentaba muchos dudas e inquietudes

Obra de los tanques F010 1-2: Se continúa realizando actividades de excavación manual para demoliciones, limpieza y retiro de escombros

América F010 30-31: Fundido de placas en concreto para andén. Limpieza y retiro de escombros

Se realizan protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

[Firma]

[Firma]

DIAS 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Condiciones climáticas: parciales

Personal en obra: Residente contratista, inspector interviniente, SO carbanista, topógrafo carbanista, maestro x1, ayudantes 9, operario

Mantenimiento de equipos: Compresor- taladro, herramienta menor, mezcladora, congreto, Nivel

América F010 30-31-32: Fundido de placas en concreto y retiro de escombros

Obra de los tanques F010 1-2-3: Retiro de pavimento rígido, retiro y limpieza de escombros

Se continúa con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra

[Firma]

[Firma]

MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Condiciones climáticas: Lluvia moderada de 10:00 - 11:00 am

Personal en obra: Residentes de obra contratista 2, siso contratista, topógrafo contratista, maestro 1, oficial 1, ayudantes 10.

Maquinaria y/o equipos: Herramienta menor, nivel, cascavil, mezcladora

Arrecambios: Se continúa con instalación de señales fijas e instalación de polsombra.

Portal de las Tunjas: Se continúa con excavación manual en cajas y domiciliarios, lleno con bituminado, fundido de concreto para recubrimiento de tubería de 6" y 8", lleno compacto con material (recibo).

Se realizan todos los protocolos de bioseguridad y seguridad en obra.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Condiciones climáticas: favorables

Personal en obra: Residente de obra, siso contratista, topógrafo contratista, maestro, ayudantes 9, inspecto de obra.

Maquinaria y/o equipos: Herramienta menor, nivel, cascavil, mezcladora.

Arrecambios: Se continúa registro en bitarzo #2 a solicitud de supervisión e intervención debida a la lejanía de los ramos.

Portal de las Tunjas: Se continúa con excavación manual para cajas y domiciliarios, lleno con bituminado, fundido de concreto para recubrimiento de tubería de 6" y 8", lleno compacto con recibo. Se funden cajas domiciliarias, se realiza fundido de platos en concreto para andenes.

Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad.

Se realiza revisión de obra #1 en compañía de intervención (topógrafo)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Condiciones climáticas favorables

Personal en obra: Residente de obra, suu combatista,
Ingeniero combatista, maestro, inspector interventor,
ayudantes B, socio-ambiental.

Maquinaria y/o equipos: Herramienta menor, conguia,
nivel, mezcladora.

Portal de los Tunjos. Se continúa con excavaciones manuales
para domos y cajas, lleno con triturado, instalación
de tubería de 8" y 6", fundida de concreto de 3000
psi para recubrimiento de tuberías, fundida de
cajas en concreto y plomo para andenes.

Se realizan todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en
obra.

[Firma]

[Firma]

SABADO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Condiciones climáticas favorables

Personal en obra: Residente de obra, suu combatista,
maestro, ayudantes B.

Maquinaria y/o equipos: Herramienta menor, conguia,
nivel, mezcladora.

Portal de los Tunjos. Se realiza excavación manual para
domos y cajas, lleno con triturado, instalación
de tubería de 8" y 6", recubrimiento en concreto
de 3000 psi, fundida de cajas en concreto.

Se realizan todos los protocolos de seguridad y
bioseguridad en obra.

[Firma]

[Firma]


lunes 20 de Septiembre de 2021.

Condiciones Climáticas favorables

Personal en obra Residente de obra, Topógrafo, Maestro, Ayudantes 8
Maquinaria y/o equipos: Herramienta menor, Nivel, Salvarín.

Postal de las tuberías: Se realiza excavación manual para domiciliarias y
Cajas, se instala el lecho de grava para la tubería, seguidamente
se procede a instalar la tubería de la red principal de alcantarillado
en 8" y las domiciliarias en 6", así mismo se realiza el recubrimiento
de la tubería en concreto de 3000 psi, finalmente se realiza la
limpieza a la zona de trabajo cumpliendo con los protocolos de
Seguridad y Bioseguridad en la obra.


Residente de obra


Inspector Interventor


Martes 21 De Septiembre de 2021

Condiciones Climáticas favorables

Personal en obra Residente de obra, Topógrafo, Maestro, Ayudantes 7
Maquinaria y/o equipos: Herramienta menor, Nivel.

Postal de las tuberías: Se reanuda las excavaciones manuales para
las domiciliarias de alcantarillado y se continúa con
la instalación de la tubería de la red principal de alcantarillado en
8" y sus respectivas subinye donde correspondan, siguiente a eso
se procede a instalar la tubería de las domiciliarias en 6",
Así mismo se procede a realizar el recubrimiento de la tubería
de red principal de alcantarillado en concreto de 3000 psi en
el tramo entre pozos 2 y 3, finalmente se procede a realizar
el asfo correspondiente a la zona de trabajo donde cumpliremos
a los protocolos de Seguridad y Bioseguridad en la obra.


Residente de obra


Inspector Interventor

Miércoles 27 de Septiembre 2021

Día: Sábado

Personal en obra: Residente de obra, Topógrafo, Maestro, Ayudantes
Herramientas y equipo: Herramienta menor, Nivel
Materiales: Arena, Grava, Tubera 8"

Portal de los Juegos: Se recorren las excavaciones minuciosas para las
domiciliarias. Seguidamente se procede a instalar la tubería
sobre la red principal de alcantarillado en PVC de 8" sucesivamente
se realiza el revestimiento de la tubería instalada entre pozos
2 y 3. Finalmente se procede a realizar el asfo correspondiente
a la zona de trabajo para dar cumplimiento a las condiciones
de seguridad y bioseguridad en la obra.

Residente de obra

Inspector Interventoria

Jueves 23 de Septiembre 2021

Día: Sábado

Herramienta y equipo: Herramienta menor, Sillera
Materiales: Grava, Tubera 8"
Personal en obra: Residente de obra, Ayudantes (2)

Portal de los Juegos: Se inicia el día cobrando con el personal
mencionado siendo las 07:00 am donde se procede a instalar
la tubería para las domiciliarias ante se realizan las excavaciones,
seguidamente procedemos a llenar con grava entre el tramo de pozos
2 y 3 y compactarla. Asimismo se llenan y compactan las excavaciones
de las domiciliarias realizadas en el tramo mencionado anteriormente
ya finalizada esta actividad se inicia el llenado con grava entre
el tramo de pozos 2 a 3. Finalmente se realiza el asfo
correspondiente en el área intervenida, dando el cumplimiento
a los protocolos de Seguridad y bioseguridad en la obra
por su respectiva cerramiento y señalización de las excavaciones

Residente de obra

Inspector Interventoria

Viernes 24 de Septiembre 2021


Dia: Solado


Herramienta y equipo: Herramienta manas

Materiales: Arena, Trilvado, Cemento, recoba

Personal en obra: Residente de obra Ayudantes (3), Inspector de Interventoria

Portal de los Tunjos: Se inicia el dia Contando con el personal mencionado anteriormente, siendo las 07:00 am donde se hacen labores limpiando las cajas de inspeccion a los domiciliarios donde se instala la tubería, igualmente se procede a fundir en concreto de 3000 PSI para un total de 4 Cajas de inspeccion; lo mismo se recanuda el llenar con recoba a la altura de la red principal de alcantarillado mientras se encuentran retirado el escombros y materiales sobrantes dando así cumplimiento a los protocolos de seguridad y bio seguridad en la obra; finalmente se realiza el respectivo cercamiento y señalización en el area intervenida.


Residente de obra


Inspector de Interventoria

Sabado 25 de Septiembre 2021


Dia: Solado


Herramienta y equipo: Herramienta manas

Materiales: Arena, Trilvado, Cemento

Personal en obra: Residente de obra Ayudantes (3), Inspector de Interventoria

Portal de los Tunjos: Se inicia el dia siendo las 07:00 am donde se reanuda las actividades de retiro de escombros en el cual se realizan 3 viajes en volquetes con capacidad de 8 m3 sucesivamente se realizan las cubiertas de las cajas de inspeccion fundidas en dia anterior ya terminado esto se instalan las tapas a las Cajas de inspeccion siguiente se instala una capa de recoba y finalmente se procede a fundir el anden en concreto de 3000 PSI dando así por terminadas las actividades domiciliarias de alcantarillado a las viviendas intervenidas a momento.


Residente de obra


Inspector de Interventoria

Jueves 27 Septiembre 2021

Día Soleado

Herramienta y equipo: Herramientas manuales, Sillarín.

Materiales: Techo, Tubería 6"

Personal: Residente de Obra, Ayudantes (4), Inspector interventoria

Postal de los Tunjos: Se inicia el día contando con el personal antes mencionado donde se reanuda la excavación para la domiciliación de los casos 13 y 14. Tarea la cual finaliza y se procede a instalar la tubería para así continuar con el terraplenamiento en concreto de 3000 ps; así mismo se procedió a fijar el acero para las tapas de las cajas de inspección y hundidas para darle el tragado necesario para su instalación finalmente se realiza el aseo y cerramiento correspondiente a la obra para dar cumplimiento a los protocolos de Seguridad y Bioseguridad.

Martes 28 Septiembre 2021

Día: Soleado

Herramienta y equipo: Herramientas manuales, Sillarín

Materiales: Techo, Cemento, arena, Triluzado

Personal: Residente de Obra, Ayudantes (4), Inspector interventoria


Postal los Tunjos: Siendo las 07:00 am iniciamos labores donde continuamos con la excavación para las cajas de inspección de los casos 13 y 14. Simultáneamente iniciamos la excavación para las domiciliaciones de alcantarillado de los casos 28 y 29; luego se reanuda las actividades de llenado y compactación con respecto a la excavación de la red principal de alcantarillado y la excavación de la acometida de los casos 13 y 14 finalmente se realiza el aseo y cerramiento correspondiente a la obra.

Miércoles 29 Septiembre 2021

Día Sábado

Herramienta y equipo. Herramienta Menos, Salario
Materiales Recebo, Cemento, arena, Triturado.
Personal residente de obra, Ayudantes (3), inspector interventoria.

Portal los Tunjos: Cuando las 07:00 am iniciamos labores con el personal mencionado, donde reanudamos la excavación para las domiciliarias de las casas 28 y 29, así mismo procedemos a formalizar y fundir las cajas de inspección de las casas 13 y 14, donde se instala la tubería faltante incluyendo la de los cricotes, posteriormente se realiza el retiro de escombros con cargue a pala donde se retira M.M. Aproximadamente finalmente se realiza el respectivo cerramiento de la obra.





Jueves 30 Septiembre 2021


Día Sábado

Herramienta y equipo. Herramienta menos, Salario.
Materiales recebo, Cemento, arena, triturado.
Personal: Res. de obra, Ayudantes (4), inspector interventoria.

Portal los Tunjos: Se inicia el día con el siguiente personal donde procedemos a desformatear las cajas fundidas y siguiente a eso realizar la base cancheta de estas con el resaca de las paredes dejando con un acabado esmaltado estas, siguiente a esto procedemos a instalar las tapas a las cajas y finalmente se funde el orden en concreto para las casas 9, 10, 13 y 14, así mismo se procede a excavar las cajas para las casas 28 y 29 para realizar la instalación de la tubería correspondiente, siguiente a esto se procede a llenar y compactar con recebo dejando el terreno a nivel de rasante, para finalizar el día se realiza el cerramiento respectivo al área intervenida.



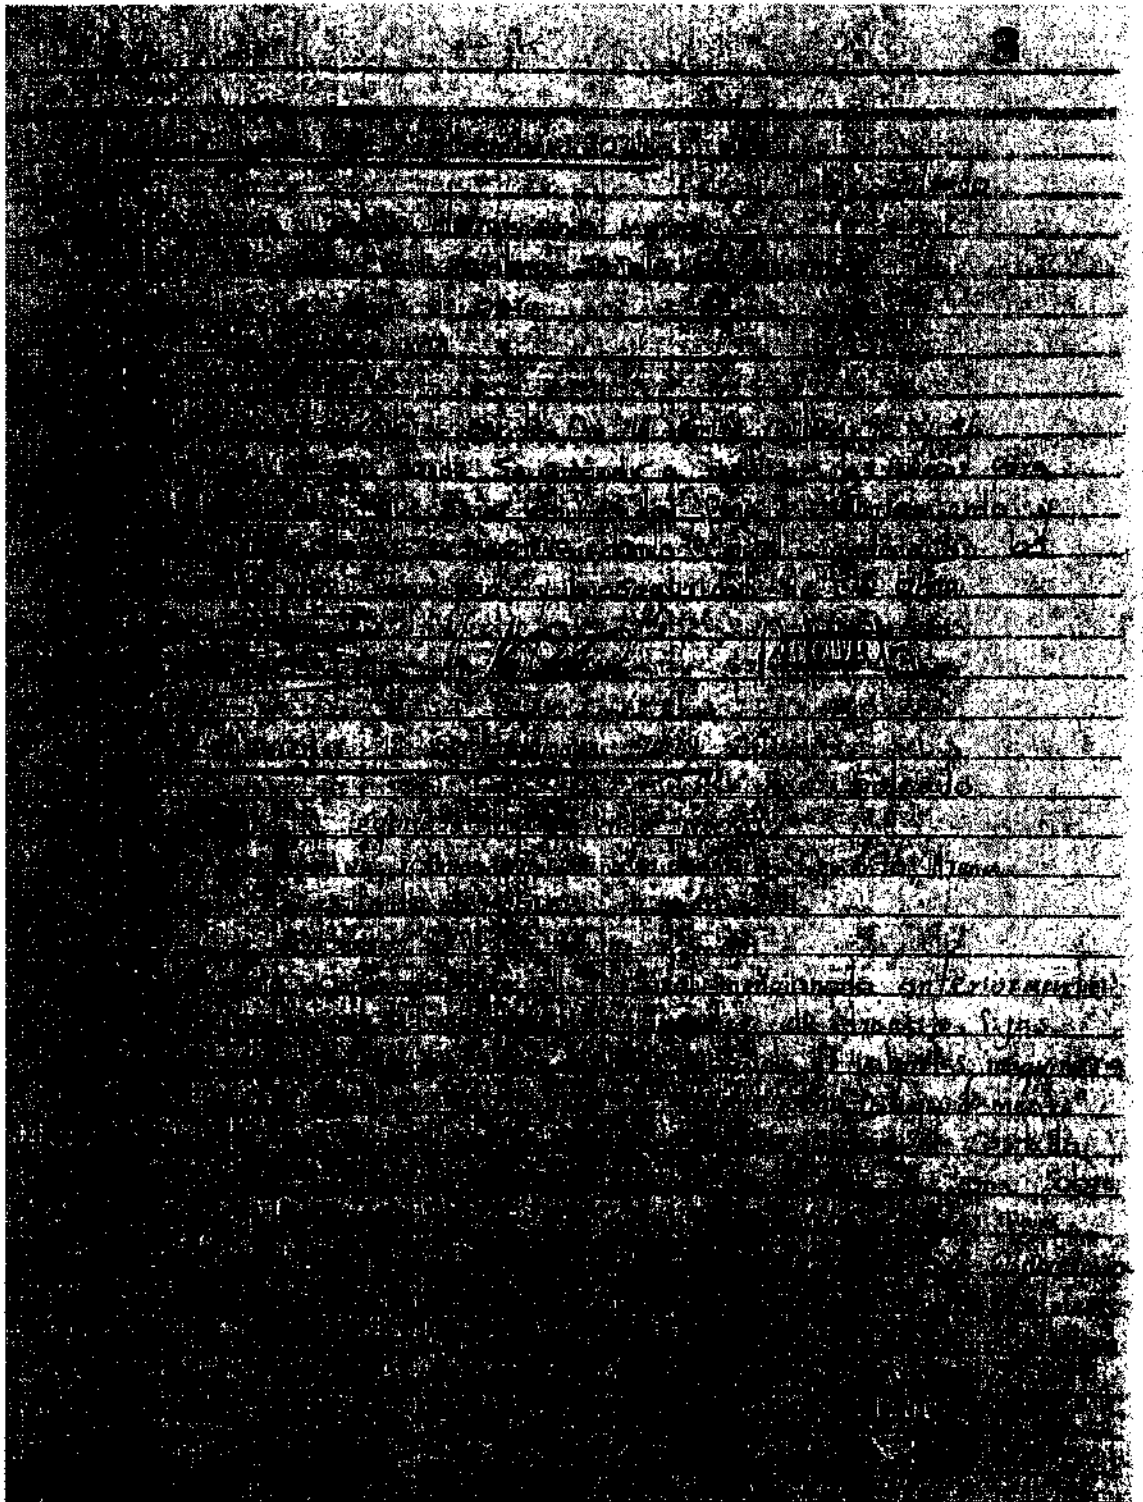

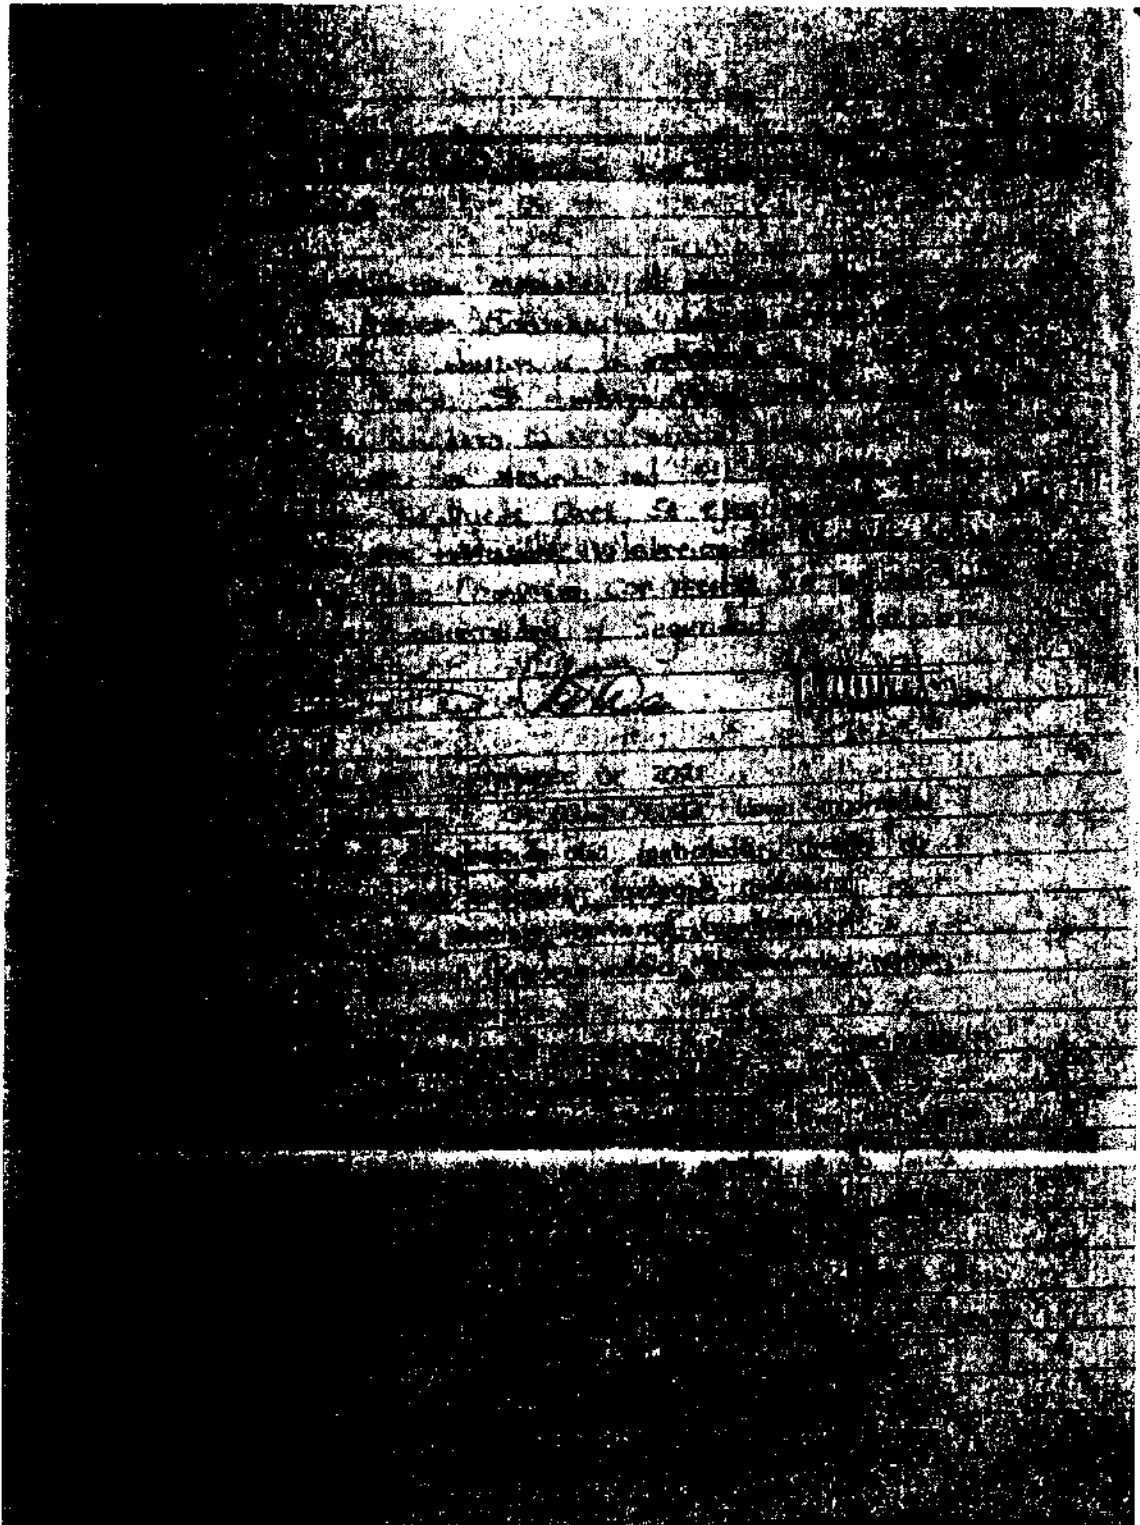

[The page contains several lines of extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the paper. The text is too dark and blurry to transcribe accurately.]

Experiment 9

Object

To determine

the value of

Fig. 1



PLATE


on

control

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

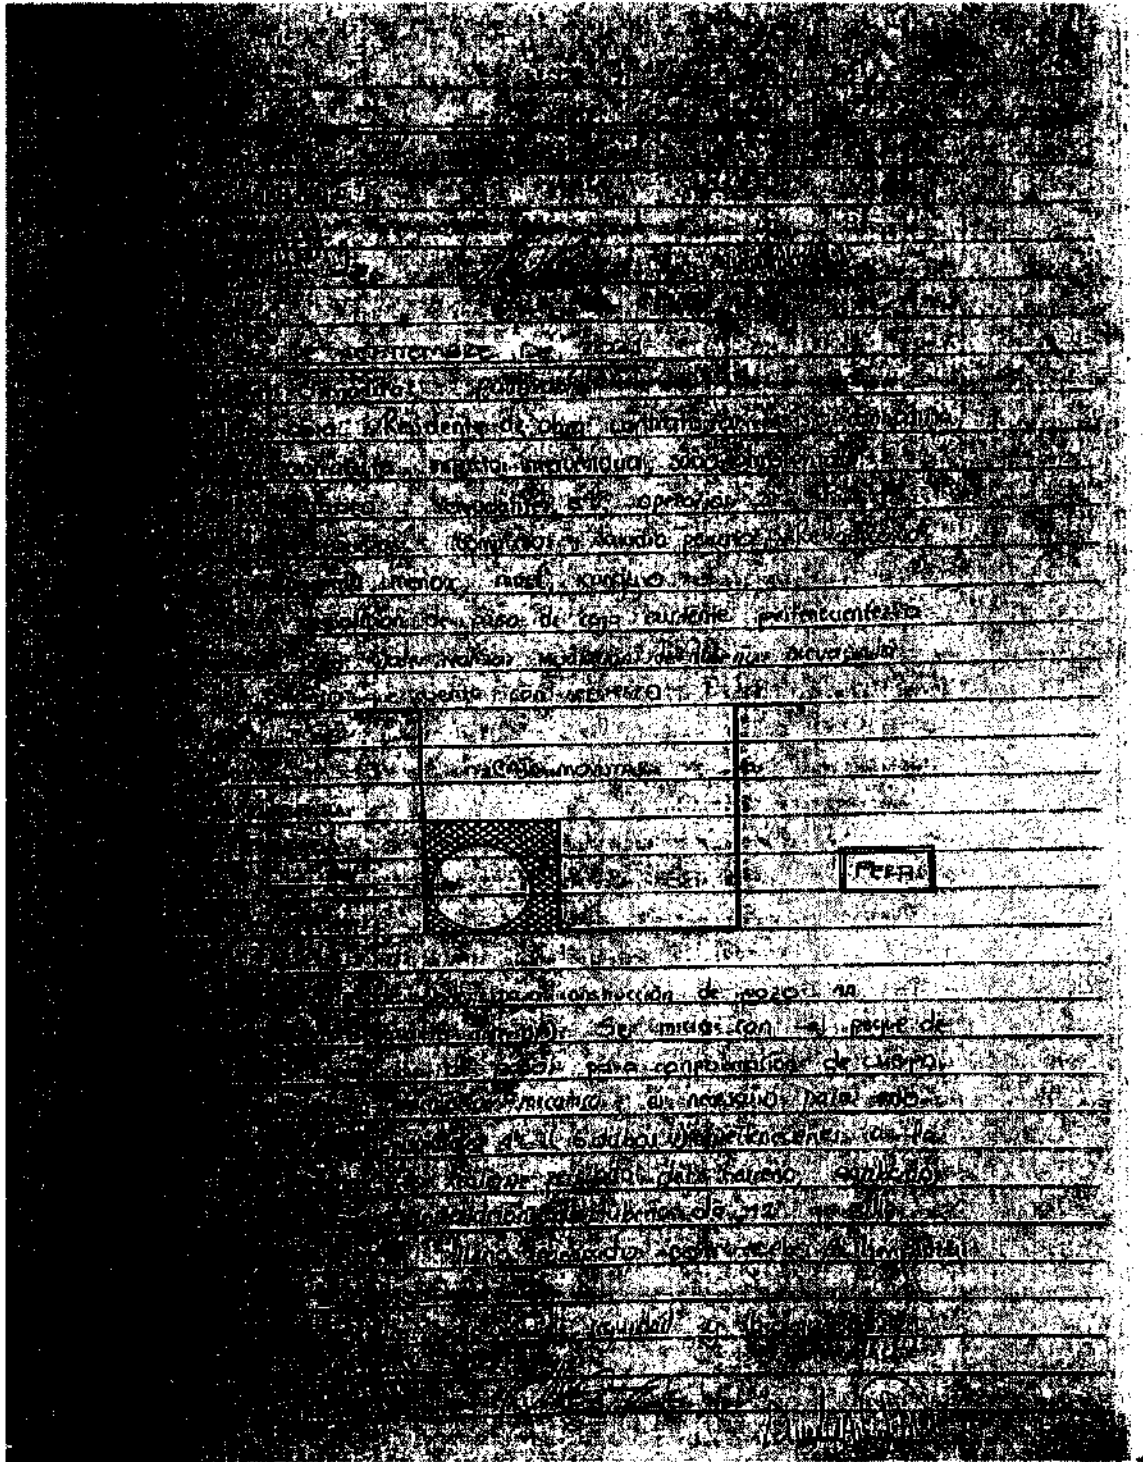



INTERVENTORIA EXTERNA IBAL

CORRESPONDENCIA

2021



IBAGUÉ VIBRA
Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Poia
– Pbx: (8)2756000 – Fax: (8) 2618982
P.Q.R: Carrera 5 No. 41-16 edificio F25 Piso 2
CANALES DE ATENCIÓN (116) Ibagué – Tolima /
www.ibal.gov.co – ventanilla.unica@ibal.gov.co

Of. 200 - 545 del 02 de Septiembre de 2021
Ibagué Tolima

Señores
UNION TEMPORAL AGUAS 2021
Av. Ambala No.69-80 of.305
Correo electrónico: gerencia@asfaltemos.co
Ibagué, Tolima

CONSORCIO INTERVENTORÍA EXTERNA IBAL
Calle 73 No17-100 Cerro Azul
Correo electrónico: ing.franciscoespana@gmail.com
Ibagué, Tolima

Asunto: Plan de Manejo de Transito (contraflujo) del Frente de Las Ferias calle 24 entre Cra 1 y 2 sur.

Respetados Ingenieros,

Conforme al asunto de la referencia y teniendo en cuenta que en este sector se están adelantando obras que son parte del contrato N°0041 del 07 de Abril de 2021 y cuyo objeto es: "REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO N°3 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A. E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE", solicitamos que sea implementado de manera urgente el Plan de Manejo de Trafico (contraflujo) en este sector, pues según lo acordado en la reunión del día miércoles 25 de agosto a las 7 am en la cual se solicitó formalmente el manejo de contraflujo, y se estableció como compromiso que el día lunes 30 de agosto se iba a implementar el contraflujo, este debe ser implementado a más tardar el día de mañana 03 de Septiembre; de no ser así nos vemos en la obligación de suspender el frente de trabajo de la calle 24 entre Cra 1 y 2 sur, hasta la fábrica de licores, el día de mañana 03 de septiembre, cabe mencionar que se viene solicitando esta medida por parte de la secretaria de movilidad municipal desde el 06 de agosto, y ha sido transmitida a ustedes desde la misma fecha, pero al día de hoy no se ha implementado la medida mencionada.

Agradecemos su colaboración.

Atentamente,



MATEO CASAS MIRANDA

Ing. Supervisor Contrato
Planeación IBAL
Anexo: Copia aseguradora.





IBAGUÉ VIBRA
Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola
– Pbx: (8)2756000 – Fax: (8) 2618982
P.Q.R: Carrera 5 No. 41-16 edificio F25 Piso 2
CANALES DE ATENCIÓN (116) Ibagué – Tolima /
www.ibal.gov.co – ventanilla.unica@ibal.gov.co

Of. 200 - 546 del 02 de Septiembre de 2021
Ibagué Tolima

Señores
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Calle 33 No.6B – 24 PISOS 1-2 Y 3
Correo electrónico: riesgostecnicos@segurosmondial.com.co
mondial@segurosmondial.com.co
Bogotá D.C

Asunto: Posible incumplimiento ante solicitud de implementación del PMT (contraflujo) calle 24 entre Cra 1 y 2 sur.


Respetados señores,

Conforme al asunto de la referencia y teniendo en cuenta que en este sector se están adelantando obras que son parte del contrato N°0041 del 07 de Abril de 2021 y cuyo objeto es: "REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO N°3 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ", del cual se suscribieron las pólizas No. 1-10000436 y 1-100001109, es necesario exponer la situación que se presenta en uno de los frentes de trabajo del contrato, donde hemos solicitado desde el 06 de agosto la implementación del contraflujo en la vía 25 entre Cra 1 y 2 sur para evitar volcamientos de los vehículos de carga pesada en la vía por donde se desvían actualmente, sin embargo y aunque el compromiso del contratista fue implementar esta medida desde el día 30 de agosto de 2021, compromiso adquirido mediante reunión realizada el miércoles 25 de agosto, no se ha implementado el contraflujo al día de hoy.

Agradecemos su colaboración

Atentamente,

MATEO CASAS MIRANDA
Ing. Supervisor Contrato
Planeación IBAL
Anexo: oficio remitido a contratista e interventoría.





UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021

NIT: 901471171-1

OFI-UTA 50-09-2021

Ibagué, septiembre 20 de 2021

Señores:
CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
Representante Legal
Centro comercial Arroyuelos, local 106
Ibagué

Referencia: Contrato No. 0041 del 7 de abril de 2021 **"REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 3 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SAESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE"**.

Asunto: Robos permanente señalización temporal de obra contraflujo calle 25 entre carrera 1 - 3 sur y atracos auxiliares de transito

Respetado Ingeniero:


Desde el día 8 de septiembre de 2021 que se implementó la señalización temporal de obra para dar inicio al contraflujo de la calle 25 entre carrera 1 y 3 sur, venimos siendo víctimas de hurtos, a la señalización temporal de obra y atracos a los auxiliares de tránsito por parte de la delincuencia común que opera en este sector poniendo en riesgo la integridad física de nuestro personal.

Para la implementación del contraflujo de la calle 25 entre carrera 1 y 3 sur se implementaron 17 señales temporales de obra y 90 delineadores tubulares, 2 pasacalles, **de los cuales al día de hoy se han robado 13 señales temporales de obra y 11 delineadores tubulares, generado un sobre costo para el proyecto.**

Por las razones antes mencionadas les solicitamos nos definan quien va a asumir estos sobrecostos y les solicitamos gestión ante las autoridades competentes para que nos presten apoyo por parte de la policía de vigilancia.

Av Ambala No. 69-80 C.C. PLAZAS DEL BOSQUE OFICINAS 305 – 306
Teléfonos: 2755412 – 2755410
Ibagué- Tolima

Recibí
Carolina García
Fecha: 21/09/2021
A Hora: 15:16.





UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021

NIT: 901471171-1

SEPTIEMBRE 8 DE 2021

**INSTALACION INICIAL SEÑALIZACION TEMPORAL DE OBRA –
DELINEADORES TUBULARES CONTRAFLUJO CALLE 25 ENTRE CRA 1 Y 3
SUR**

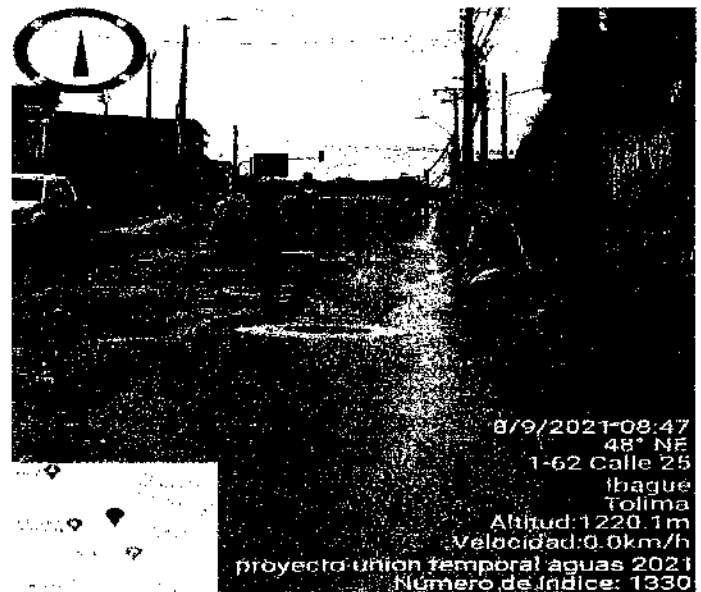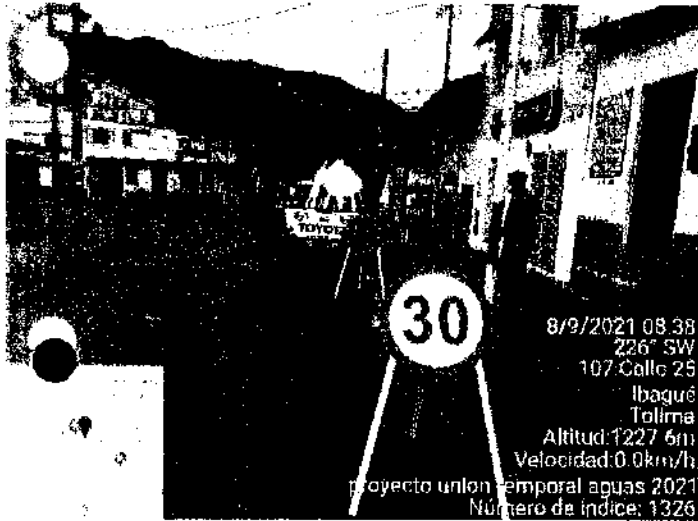

Av Ambala No. 69-80 C.C. PLAZAS DEL BOSQUE OFICINAS 305 – 306

Teléfonos: 2755412 – 2755410




Ibagué- Tolima

4



UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021

NIT: 901471171-1

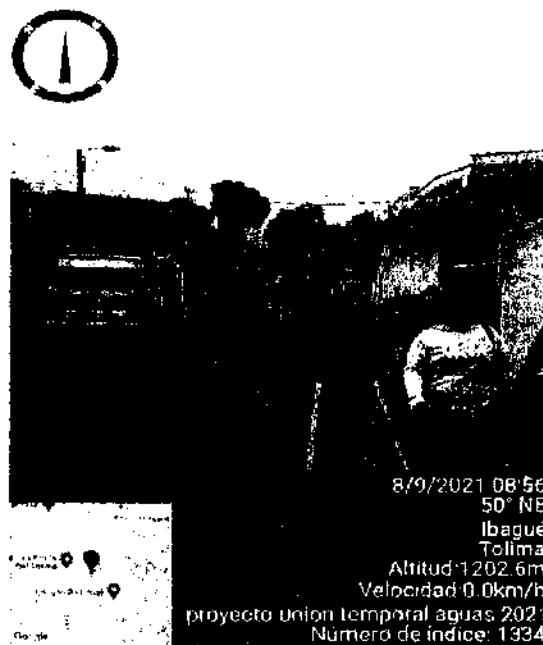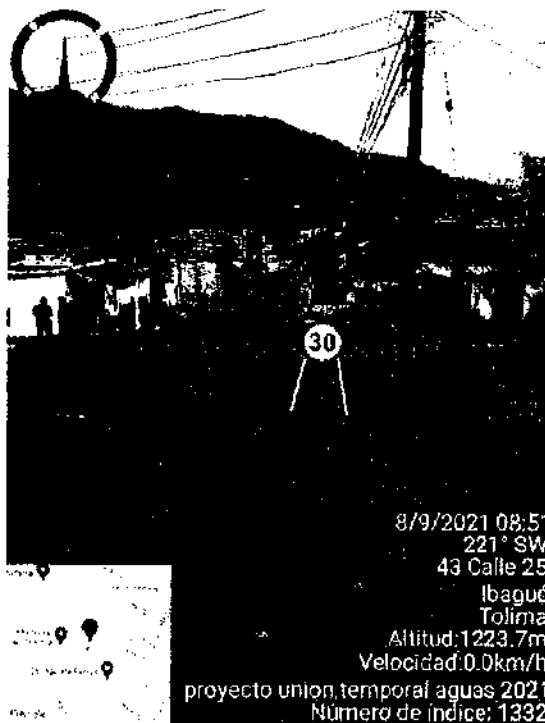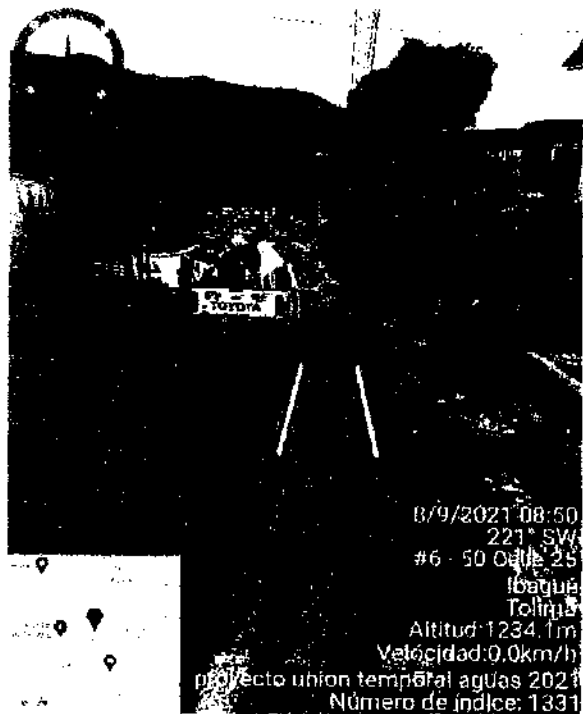

Av Ambala No. 69-80 C.C. PLAZAS DEL BOSQUE OFICINAS 305 – 306
Teléfonos: 2755412 – 2755410
Ibagué- Tolima

A



UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021

NIT: 901471171-1



8/9/2021 08:59

218° SW

2-31 Calle 25

Ibagué

Tolima

Altitud: 1220.7m

Velocidad: 0.0km/h

proyecto union temporal aguas 2021

Número de índice: 1336



8/9/2021 09:26

40° NE

343 Calle 25

Ibagué

Tolima

Altitud: 1208.2m

Velocidad: 0.5km/h

proyecto union temporal aguas 2021

Número de índice: 1339

Av Ambala No. 69-80 C.C. PLAZAS DEL BOSQUE OFICINAS 305 – 306

Teléfonos: 2755412 – 2755410

Ibagué- Tolima



R



UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021

NIT: 901471171-1

SEPTIEMBRE 17 DE 2021
SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE OBRA ACTUAL (4 SEÑALES)
CONTRAFLUJO CALLE 25 ENTRE CRA 1 Y 3 SUR

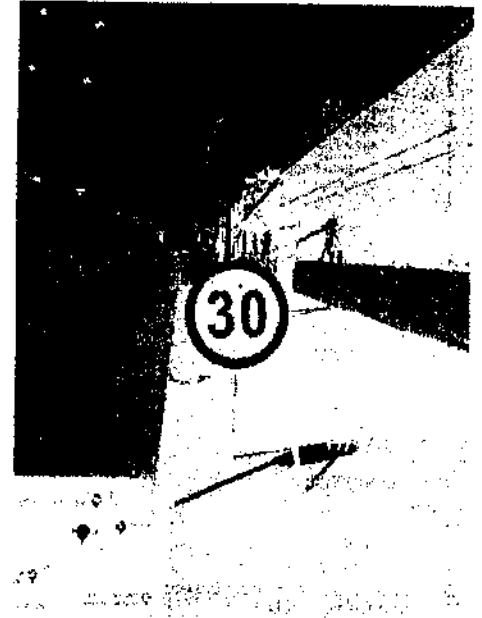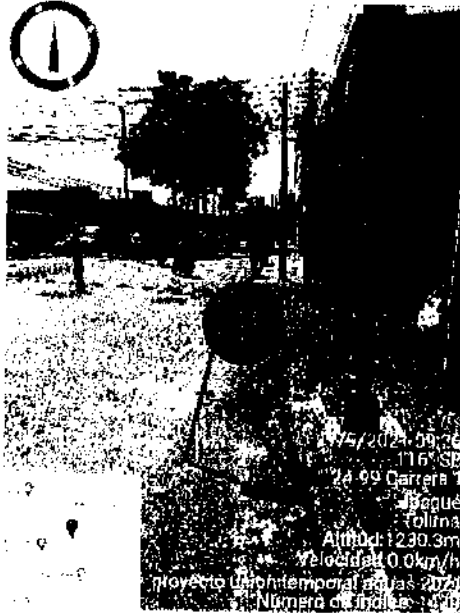

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO TRIANA TRUJILLO
Residente de Obra
Unión Temporal Aguas 2021

Proyectó : German Eduardo Guiza- Profesional Sisoma
Revisó : Juan Sebastián Borrego- Residente de obra

CC : Archivo

Av Ambala No. 69-80 C.C. PLAZAS DEL BOSQUE OFICINAS 305 – 306
Teléfonos: 2755412 – 2755410
Ibagué- Tolima



UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021

NIT: 901471171-1

OFI-UTA 46-09-2021

Ibagué, septiembre 20 de 2021

Señores:
CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
Representante Legal
Ibagué

Referencia: Contrato No. 0041 del 7 de abril de 2021 **"REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 3 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SAESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE"**.

Asunto: Reposición, mantenimiento cerramiento perimetral por daños y hurtos ocasionado por la comunidad.

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente le manifestamos que, en los distintos tramos intervenidos durante la ejecución del contrato de referencia, se vienen presentando daños y robos continuos al cerramiento perimetral por parte de la comunidad vecina en los frentes de Villa Claudia, Ferias, Ricaurte y Villa Luces, estos hechos nos han generado costos adicionales, por lo anterior le solicitamos amablemente se estudie la viabilidad de reconocer estos gatos adicionales generados por factores externos al libre desarrollo de la obra.

Para la reposición y mantenimiento del cerramiento perimetral se han utilizado 8 rollos de polisombra, 6 rollos de varillon, y 2 libras de puntilla.

Av Ambala No. 69-80 C.C. PLAZAS DEL BOSQUE OFICINAS 305 – 306

Teléfonos: 2755412 – 2755410



Ibagué- Tolima

Recibi:
Carolina Gora
Fecha: 15:18.
21/09/2021.



UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021

NIT: 901471171-1

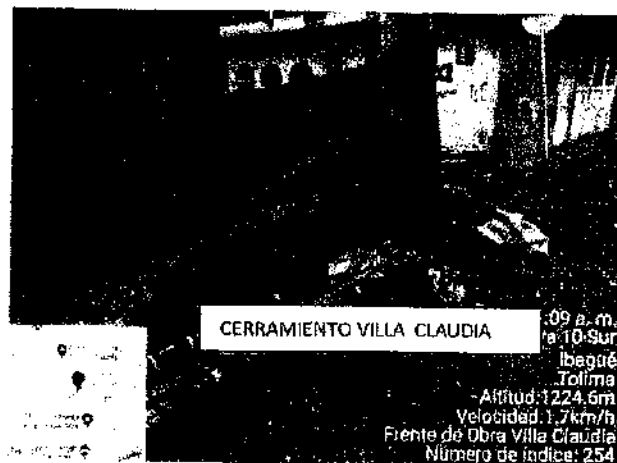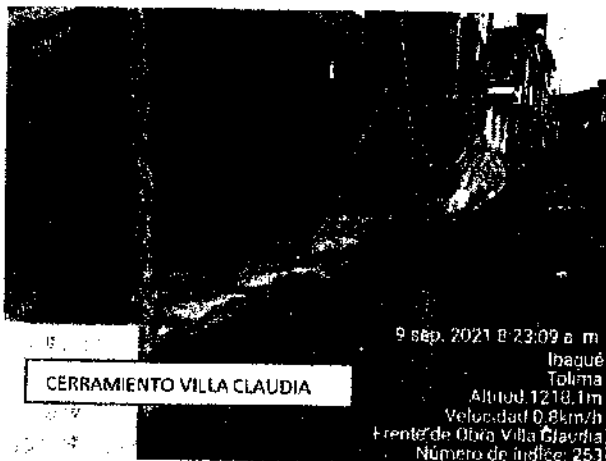

Av Ambala No. 69-80 C.C. PLAZAS DEL BOSQUE OFICINAS 305 – 306
Teléfonos: 2755412 – 2755410
Ibagué- Tolima

de



UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021

NIT: 901471171-1



Cordialmente,

CARLOS ALBERTO TRIANA TRUJILLO
Residente de Obra
Unión Temporal Aguas 2021

Proyectó : German Eduardo Guiza- Profesional Sisoma
Revisó : Juan Sebastián Borrego- Residente de obra
CC : Archivo

Av Ambala No. 69-80 C.C. PLAZAS DEL BOSQUE OFICINAS 305 – 306
Teléfonos: 2755412 – 2755410
Ibagué- Tolima



UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021

NT: 901471171-1

OFI-UTA 47-09-2021

Ibagué, 14 de septiembre de 2021

Señor

ING. LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA DEL IBAL
Centro comercial Arroyuelos, local 106
Ibagué

Referencia: Contrato No. 0041 del 7 de abril de 2021 *"REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 3 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SAESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE"*.

Asunto: REITERACION TRAMO A INTERVENIR BARRIO YULDAIMA

Reciba un Cordial saludo,

La Unión Temporal Aguas 2021 encargada de las labores de *"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 3 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SAESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE"*, por medio del presente nos permitimos hacer reiteración sobre el oficio **OFI-UTA 34-08-2021** radicado en su oficina el día 06 de agosto del año en curso, en el solicitamos aclaración respecto a la intervención en el barrio Yuldaima, por tal motivo solicitamos amablemente se nos indique si las obras proyectadas para este tramo se van a ejecutar o no, lo anterior con el propósito de evaluar las necesidades en este tramo y poder dar cumplimiento a la programación del contrato de referencia en los términos establecidos.

Agradecemos la atención prestada, atentamente,

Ing. Carlos Alberto Triana Trujillo
Residente de Obra

Anexos: oficio OFI-UTA 34-08-2021

Recibi
Carolina García
Fecha: 17/09/2021.

Av Ambala No. 69-80 C.C. PLAZAS DEL BOSQUE OFICINAS 305 – 306
Teléfonos: 2755412 – 2755410
Ibagué- Tolima



OFI-UTA 34-08-2021

Ibagué, 06 de agosto de 2021

Señor
ING. LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA DEL IDAL
Centro comercial Arroyuelos, local 106
Ibagué


Referencia: Contrato No. 0041 del 7 de abril de 2021 *"REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 3 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SAESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE"*.


Asunto: **DEFINIR TRAMOS YULDAIMA**

Reciba un Cordial saludo,

La Unión Temporal Aguas 2021 encargada de las labores de *"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 3 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SAESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE"*, por medio del presente nos permitimos solicitar aclaración de los tramos a intervenir en el barrio Yuldaima, lo anterior con el propósito de iniciar actividades en este frente de obra lo mas pronto posible y así poder cumplir con los plazos establecidos.

Agradecemos la atención prestada, atentamente,


Ing. Carlos Alberto Triana Trujillo
Residente de Obra
Anexos:


06-08-21

Av. Ambala No. 69-80 C.C. PLAZAS DEL BOSQUE OFICINAS 305 - 306
Teléfonos: 2755412 - 2755410
Ibagué- Tolima



UNIÓN TEMPORAL

AGUAS 2021

NIT: 901471171-1

OFI-UTA 58-09-2021

Ibagué, septiembre 27 de 2021


Señores
CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
Representante Legal
Centro comercial Arroyuelos, local 106
Ibagué

Referencia: Contrato No. 0041 del 7 de abril de 2021 **"REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITIO HIDRAULICO No. 3 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SAESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE"**.

Asunto: Huecos Calle 25 entre carrera 1 y tercera sur

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente les informamos que en el contraflujo de la calle 25 No. 1-15 y 1-48 sur, sentido norte- sur, hay 2 huecos generados por una acometida mal compactada y una socavación que están afectando la movilidad y generando peligro para los usuarios que transitan por esta vía; por lo anterior solicitamos su gestión ante la entidad competente para que intervenga y arregle este sector.


28-09-2021

Av Ambala No. 69-80 C.C. PLAZAS DEL BOSQUE OFICINAS 305 – 306
Teléfonos: 2755412 – 2755410
Ibagué- Tolima

h





UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021

NIT: 901471171-1



Socavación

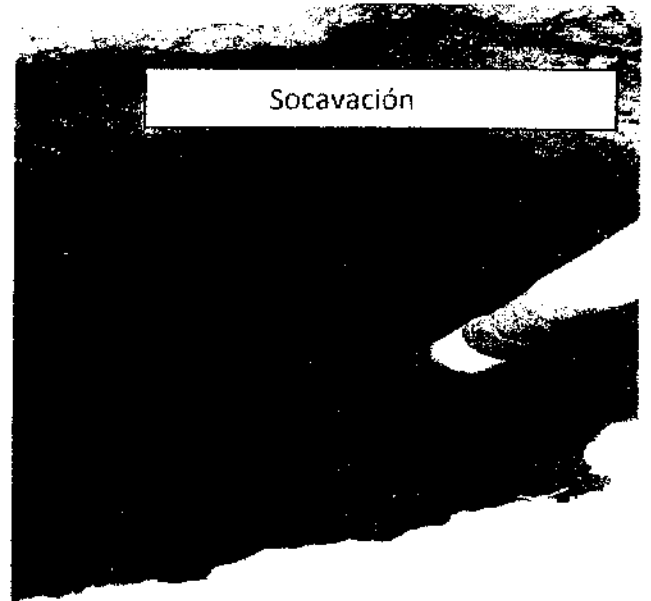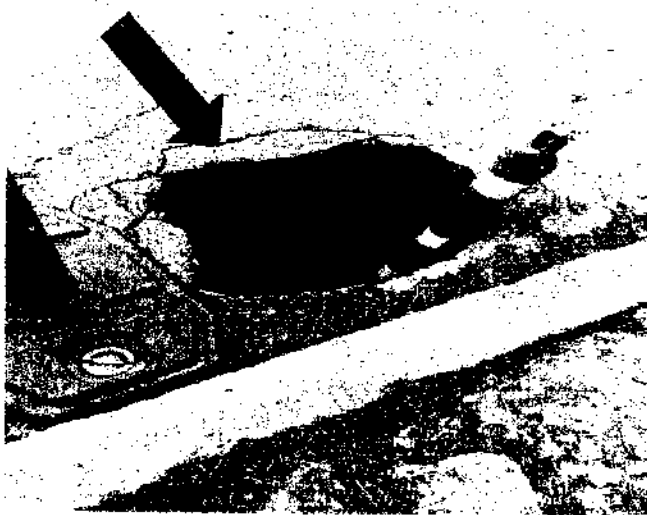

Socavación

Agradecemos la atención prestada, cordialmente,

CAH

CARLOS ALBERTO TRIANA TRUJILLO
Residente de Obra
Unión Temporal Aguas 2021

Proyectó : German Eduardo Guiza- Profesional Sisoma
Revisó : Juan Sebastián Borrego- Residente de obra
CC : Archivo

Av Ambala No. 69-80 C.C. PLAZAS DEL BOSQUE OFICINAS 305 – 306
Teléfonos: 2755412 – 2755410
Ibagué- Tolima

Ibagué, septiembre 27 de 2021

Señor

ING. LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA DEL IBAL
Centro comercial los Arroyuelos, local 106
Ibagué

Referencia: Contrato No. 0041 del 7 de abril de 2021 "*REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 3 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SAESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE*".

Asunto: *INFORME DE FENOMENOS PRESENCIADOS EN OBRA QUE COMPROMETIERON LOS CRONOGRAMAS DE EJECUCION MES JULIO - AGOSTO.*

Reciba un Cordial saludo,

La Unión Temporal Aguas 2021 encargada de las labores de "*REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 3 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SAESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE*", por medio del presente se permite poner en conocimiento los periodos de precipitaciones presentados en obra durante el tiempo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de agosto del año 2021, los cuales comprometieron el cronograma de las actividades constructivas y administrativas de la obra.

Durante el mes de julio y agosto se presentaron lluvias intermitentes de mediana duración en las áreas de influencia del proyecto, las cuales afectaron directamente el desarrollo constructivo, cabe aclarar que la información suministrada se encuentra almacenada por el IDEAM, en el sistema de Información para la gestión de datos Hidrológicos y Meteorológicos – DHIME. Producto de ello se perdieron días laborables como se relaciona en la tabla expuesta a continuación:

UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021
CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA DEL IBAL
Centro comercial los Arroyuelos, local 106
Ibagué, Tolima


A

UNION TEMPORAL AGUAS 2021

JULIO

| Días de lluvia en el me | Valor precipitación (mm) |
|-------------------------|--------------------------|
| 10-jul | 26,3 |
| 11-jul | 0,2 |
| 14-jul | 0,4 |
| 17-jul | 10,8 |
| 18-jul | 0,4 |
| 22-jul | 11,6 |
| 25-jul | 0,1 |
| 26-jul | 17,5 |
| 27-jul | 9,5 |
| 28-jul | 6,8 |
| Total (mm) | 26,3 |


PRECIPITACION DIARIA MENSUAL ESTACION AEROPUERTO PERALES

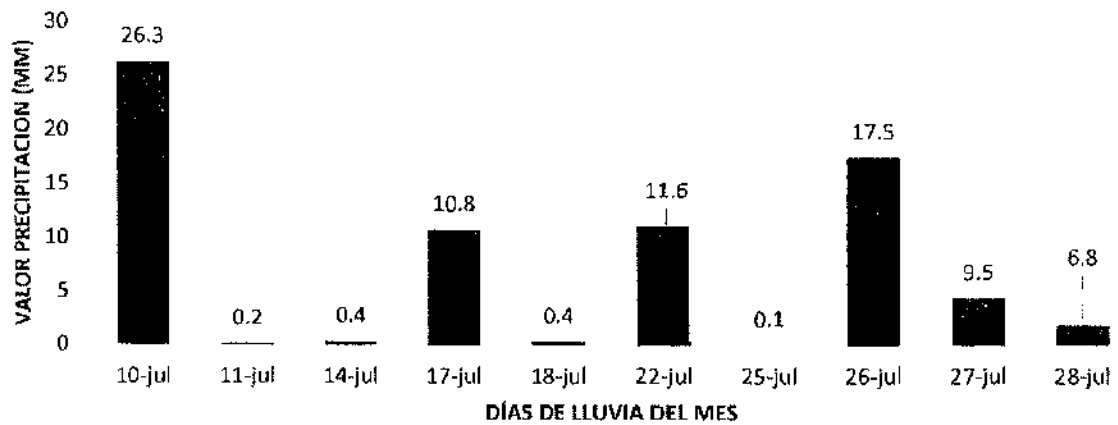

AGOSTO

| Días de lluvia en el me | Valor precipitación (mm) |
|-------------------------|--------------------------|
| 7-ago | 0,2 |
| 8-ago | 8,5 |
| 11-ago | 13,2 |
| 12-ago | 11,8 |
| 13-ago | 31,2 |
| 14-ago | 20,8 |
| 15-ago | 15,5 |
| 16-ago | 27,1 |
| 17-ago | 3,3 |
| 18-ago | 1,4 |
| 19-ago | 9,1 |
| 20-ago | 30,8 |
| 21-ago | 4,2 |
| 23-ago | 16,4 |
| 24-ago | 3,5 |
| 25-ago | 17,7 |
| 26-ago | 9,7 |
| Total (mm) | 31,2 |

PRECIPITACION DIARIA MENSUAL ESTACION AEROPUERTO PERALES

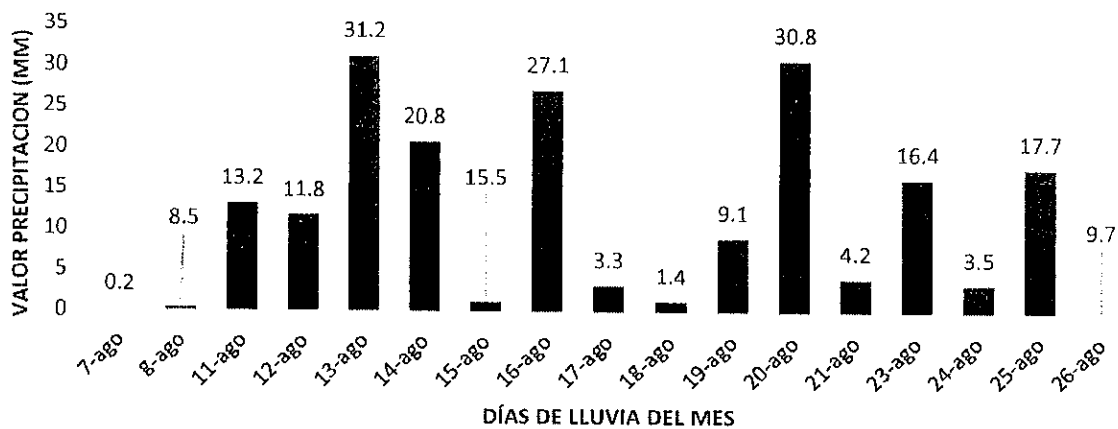

a


UNION TEMPORAL AGUAS 2021

| MES | DÍAS DE LLUVIAS INTENSAS |
|--------------|--------------------------|
| Julio | 6 |
| Agosto | 12 |
| Total | 18 |

Como se evidencia en la tabla anterior durante los meses de julio y agosto, se han presentado días con lluvias con alta intensidad en los distintos frentes de obra, dando un total de (18) días perdidos a causa de los efectos climáticos, desde el día 01 de julio al 31 de agosto del año en curso.

Por otro lado, en la siguiente gráfica se evidencia que para los meses de mayo y junio la precipitación media total mensual, en la estación pluviométrica aeropuerto Perales, correspondió a 182,4 y 305,4 mm respectivamente y en el mes de agosto fue de 192,2 mm. La menor precipitación se presentó en el mes de julio con un valor de 62,6 mm, configurándose de esta manera un comportamiento bimodal a lo largo del año, iniciando a partir de agosto el segundo periodo de lluvias del año. Como resultado de este análisis, se puede observar que la región de estudio se configura claramente como un régimen bimodal a lo largo del año, concluyendo que es posible que durante los meses que vienen el rendimiento en obra se vea perjudicado por las lluvias y consecuencias que genera este fenómeno.

Precipitación media Total mensual estación Apto. Perales

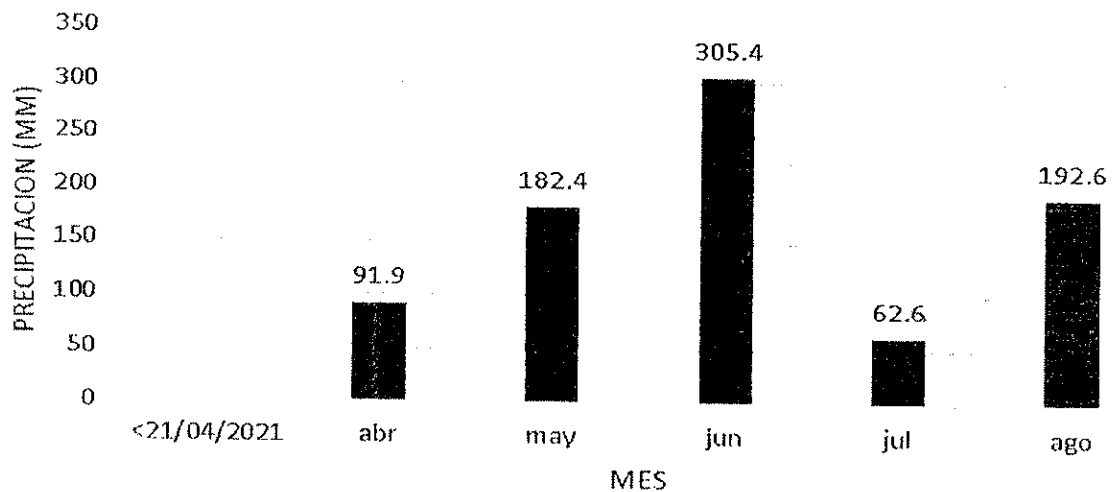

UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021

En virtud de lo anterior, manifestamos que la presencia de lluvias ocasiono una reducción considerable en el rendimiento y en el desarrollo de la obra. Por tal motivo, solicitamos sean consideradas, ya que son retrasos ajenos al desarrollo de la obra.

En ese sentido, se solicita amablemente a su despacho, se tengan en cuenta estos eventos de lluvias en este periodo de estudio comprendido para julio y agosto, al momento de revisar el cronograma de ejecución de la obra y los posteriores tiempos de entrega de las actividades contractuales de la obra.

Agradecemos la atención prestada, cordialmente,



Ing. Carlos Alberto Triana Trujillo
Residente de Obra

Unión Temporal Aguas 2021

Anexos: Dato del IDEAM – estación aeropuerto Perales, Ibagué.



**CONSORCIO
SECTOR 6**

NIT: 901.490.124-1

DISTRITO HIDRAULICO N° 6

Ibagué, 01 de septiembre de 2021

Oficio 009 - C.S.6

Señores:

CONSORCIO

INTERVENTORIA EXTERNA IBAL

R.L. LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMÍREZ

CC ARROYUELOS LOCAL 6

Interventor contrato de obra N° 0089 del 18 de junio de 2021

Ciudad

Asunto: INICIO OBRAS BARRIO CALARCA

Cordial saludo,

Como es sabido de su parte el municipio mediante la secretaria de infraestructura procedió a realizar el respetivo cajeo de la vía en el barrio CALARCA (Cra 8 entre calles 44 y 46) para su posterior pavimentación, requiriéndose la debida reposición de las redes de acueducto en dicho sector, tal como lo tiene previsto el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL; por tal motivo ponemos bajo su conocimiento que el CONSORCIO SECTOR 6 a partir del lunes 06 de septiembre del año en curso , inciara la ejecución de obras en dicho sector , no sin antes dejar constancia que el sector ya ha sido intervenido de manera previa por un contratista del municipio, ajeno al consorcio y que cualquier daño o situación surgida por dicha intervención o acción , no es responsabilidad del CONSORCIO SECTOR 6 debido a las circunstancias anteriormente descritas.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

CONSORCIO SECTOR 6

R.L. ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO

C.C. N° 79.474.136 DE BOGOTÁ

Recibi:
Carolina García
08/09/2021



**CONSORCIO
SECTOR 6**

DISTRITO HIDRAULICO N° 6

NIT: 901.490.124-1

Ibagué, 01 de septiembre de 2021

Oficio 007 - C.S.6

Señores:

CONSORCIO

INTERVENTORIA EXTERNA IBAL

R.L. LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMÍREZ

CC ARROYUELOS LOCAL 6

Interventor contrato de obra N° 0089 del 18 de junio de 2021

Ciudad

Asunto: ITEMS NO PREVISTOS

Cordial saludo,

De acuerdo con la evolución de la obra y realizando una revisión de los ítems del presupuesto de la misma, se hace necesario por la complejidad y particularidad del proyecto; la incorporación de ítems no previstos, los cuales permitan ejecutar las obras de manera adecuada desde el punto de vista constructivo y técnico, que reflejen la realidad de las obras acometer en cada calle o sector a intervenir y que permitan dar la solución ingenieril más acorde a las situaciones que se encuentran, en el día a día de las intervenciones citadas.

Por lo anterior y con el ánimo de socializar los mismos, se relacionan a continuación dichos ítems:

| ACUEDUCTO | | | |
|-----------|------------------------------------|--------|--------------|
| ITEM | ACTIVIDADES | UNIDAD | VR.UNITARIO |
| | ITEMS NUEVOS | | |
| 1 | PRELIMINARES | | |
| 1,12 | Acarreo interno en obra 50 mts | m3 | \$ 16.231,00 |
| 1,14 | Localización y replanteo manual | m | \$ 3.564,00 |
| | EXCAVACIONES A MANO | | |
| | De 0 a 2 mts en seco | | |
| 3,2 | Excavaciones en conglomerado | m3 | \$36.781,00 |
| 3,3 | Excavaciones en roca | m3 | \$73.147,00 |
| 3,16 | Excavaciones en roca con explosivo | m3 | \$223.573,00 |

Recibi:
Carolina García,
08/09/2021
14:32

Carrera 5 N° 11 - 24 . Ed Torre Empresarial - Of 401 . (8) 261 79 60
Ibagué - Tolima

Página 1 de 1



CONSORCIO SECTOR 6

NIT: 001.490.124-1

DISTRITO HIDRAULICO N° 6

| | | | |
|--------|--|-----|----------------|
| | De 0 a 2 mts Bajo Agua | | |
| 3,5 | Excavaciones en conglomerado | m3 | \$45.429,00 |
| 3,6 | Excavaciones en roca | m3 | \$83.087,00 |
| | EXCAVACIONES A MAQUINA | | |
| | De 0-2 mts en seco | | |
| 4,2 | Excavaciones en roca | m3 | \$49.871,00 |
| | De 0-2 mts Bajo agua | | |
| 4,3 | Excavaciones en material común y Conglomerado | m3 | \$40.455,00 |
| 4,4 | Excavaciones en roca | m3 | \$88.663,00 |
| 5,0 | CONCRETOS | | |
| 5,2 | Instalación y suministro de concreto de 17,2 Mpa (2.500 Psi) | m3 | \$565.241,00 |
| 5,13 | Anden en concreto de 2500 PSI e=0,10 (incluye alistado y nivelación) | m2 | \$82.323,00 |
| 5,14 | Sardinela en concreto de 2500 PSI fundido en sitio seccion trapezoidal de (0,15 -0,20) h=0,40m | m | \$56.144,00 |
| 5,17 | Anclaje en concreto F'c = 21 Mpa para accesorios 3" | Und | \$255.710,00 |
| 6 | OBRAS DE PAVIMENTACIÓN | | |
| 6,21 | Rotura de Pavimento Flexible | m3 | \$103.640,00 |
| 20 | OTROS | | |
| 20,42 | Utilizacion de Motobomba | dia | \$69.605,00 |
| 20,55 | Prueba hidrostática | Und | \$1.221.040,00 |
| 20,56 | Reparacion en pvc daños en red acueducto 3". Incluye excavacion manual | Und | \$987.607,00 |
| 20,57 | Reparacion en manguera polietileno 1/2" acometidas acueducto. Incluye excavacion manual | Und | \$69.805,00 |
| 20,58 | Reparacion daños en red gas pealpe 1/2"-3/4". Incluye excavacion manual | Und | \$254.796,00 |
| 20,59 | Reparacion daños en red gas pealpe 1 1/4" -2". Incluye excavacion manual | Und | \$1.969.105,00 |
| 20,60 | Reparacion daños en red gas PE 80 3". Incluye excavacion manual | Und | \$2.613.456,00 |
| 20,66 | Reparacion en manguera polietileno 3/4" acometidas acueducto. Incluye excavacion manual | Und | \$102.009,00 |
| 22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS | | |
| 22,52 | Suministro e Instalacion curva presion 11.25 RDE 21 3" | Und | \$89.919,00 |
| 22,53 | Suministro e instalacion curva presion 22.5 RDE 21 3" | Und | \$95.350,00 |
| 22,54 | Suministro e instalacion curva presion 45 RDE 21 3" | Und | \$130.910,00 |
| 22,55 | Suministro e instalacion tee reduc 3"x2"x3" | Und | \$145.476,00 |
| 24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PRESION RDE 21 | | |
| 24.1 | De 0,00 a 2,00 Mts | | |
| 23,1,1 | De Diámetro 2" | m | \$26.605,00 |



**CONSORCIO
SECTOR 6**

DISTRITO HIDRAULICO N° 8

NIT: 901.490.124-1

| ALCANTARILLADO | | | |
|----------------|---|--------|--------------|
| ITEM | ACTIVIDADES | UNIDAD | VR.UNITARIO |
| | ITEMS NUEVOS | | |
| 1 | PRELIMINARES | | |
| 1,14 | Localización y replanteo manual | m | \$3.564,00 |
| | EXCAVACIONES A MANO | | |
| | De 0 a 2 mts en seco | | |
| 3,3 | Excavaciones en roca | m3 | \$73.147,00 |
| 3,16 | Excavaciones en roca con explosivo | m3 | \$223.573,00 |
| | De 2 a 4 mts en seco | | |
| 3,9 | Excavaciones en roca | m3 | \$107.346,00 |
| 3,17 | Excavaciones en roca con explosivo | m3 | \$273.084,00 |
| | De 0 a 2 mts Bajo Agua | | |
| 3,5 | Excavaciones en conglomerado | m3 | \$45.419,00 |
| 3,6 | Excavaciones en roca | m3 | \$83.087,00 |
| | De 2 a 4 mts Bajo Agua | | |
| 3,11 | Excavaciones en conglomerado | m3 | \$67.527,00 |
| 3,12 | Excavaciones en roca | m3 | \$135.204,00 |
| | EXCAVACIONES A MAQUINA | | |
| | De 0-2 mts en seco | | |
| 4,2 | Excavaciones en roca | m3 | \$49.871,00 |
| | De 0 a 2 mts Bajo Agua | | |
| 4,3 | Excavaciones en material común y Conglomerado | m3 | \$40.455,00 |
| 4,4 | Excavaciones en roca | m3 | \$88.663,00 |
| | De 2-4 mts en seco | | |
| 4,6 | Excavaciones en roca | m3 | \$85.034,00 |
| | De 2 a 4 mts Bajo Agua | | |
| 4,7 | Excavaciones en material común y Conglomerado | m3 | \$41.332,00 |
| 4,8 | Excavaciones en roca | m3 | \$108.769,00 |
| 5.0 | CONCRETOS | | |
| 5,2 | Instalación y suministro de concreto de 17,2 Mpa (2.500 Psi) | m3 | \$565.241,00 |
| 5,13 | Anden en concreto de 2500 PSI e=0,10 (incluye alistado y nivelación) | m2 | \$82.323,00 |
| 5,14 | Sardinel en concreto de 2500 PSI fundido en sitio seccion trapezoidal de (0,15 -0,20) h=0,40m | m | \$56.419,00 |
| 6 | OBRAS DE PAVIMENTACIÓN | | |
| 6,21 | Rotura de Pavimento Flexible | m3 | \$103.640,00 |
| 19 | CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION | | |
| 19,1 | DIAMETRO 1.20 Mts | | |
| 19.1.1 | Base y cañuela en concreto de 3.000 PSI e = 0,30 Mts | und | \$503.936,00 |
| 19.1.2 | Pañete interior | m | \$112.733,00 |
| 19.1.3 | Cilindro en ladrillo e = 0,30 Mts | m | \$486.740,00 |

Carrera 5 N° 11 - 24 . Ed Torre Empresarial - Of 401 . (8) 261 79 60
Ibagué - Tolima



CONSORCIO SECTOR 6

NIT: 901.490.124-1

DISTRITO HIDRAULICO N° 6

| ITEM | ACTIVIDADES | UNIDAD | VR.UNITARIO |
|---------|--|--------|----------------|
| 19.1.4 | Cono de reducción H = 0,65 Mts | und | \$452.067,00 |
| 19.1.5 | Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo C/40 cm | und | \$19.664,00 |
| 19.1.6 | Suministro e instalación de Arotapa Completa Vibrocompactada | und | \$765.434,00 |
| 19.1.11 | Sumidero en concreto 3.000 PSI (Incluye rejilla vibro compactada de 1,05x0,46) | und | \$855.441,00 |
| 19.1.16 | Suministro e instalación rejilla vibro compactada de 1,05x0,46 | und | \$668.164,00 |
| 20 | OTROS | | |
| 20.12 | Suministro e instalación de silla yee 20x6" pvc Incluye agarraderas caucho y adherencia | und | \$594.393,00 |
| 20.42 | Utilización de Motobomba | dia | \$69.605,00 |
| 20.48 | Entibado Tipo 1A (Discontinuo en Madera) | m2 | \$27.627,00 |
| 20.56 | Reparación en pvc daños en red acueducto 3". Incluye excavación manual | Und | \$987.607,00 |
| 20.57 | Reparación en manguera polietileno 1/2" acometidas acueducto. Incluye excavación manual | | \$69.805,00 |
| 20.58 | Reparación daños en red gas pealpe 1/2"-3/4". Incluye excavación manual | Und | \$254.796,00 |
| 20.59 | Reparación daños en red gas pealpe 1 1/4" -2". Incluye excavación manual | Und | \$1.969.105,00 |
| 20.60 | Reparación daños en red gas PE 80 3". Incluye excavación manual | Und | \$2.613.456,00 |
| 20.61 | Manejo de aguas 24 horas continuas grado de dificultad maximo | dia | \$794.364,00 |
| 20.62 | Plataforma en madera provisional para circulación peatonal barrio eden. Incluye armado y desmonte diario | m | \$281.970,00 |
| 20.63 | Limpieza manual fondo de zanja material contaminante | m | \$16.542,00 |
| 20.64 | Codo 6" alcantarillado TDP | und | \$115.276,00 |
| 20.65 | Demolición y retiro de tubería al existente | m | \$46.364,00 |
| 20.67 | Demolición pozos existentes | m | \$543.324,00 |

NOTA: LOS VALORES YA INCLUYEN AIU DEL 25%

A su vez se adjuntan los respectivos análisis de precios unitarios (APU) de cada ítem relacionado.

Es de tener en cuenta, que estos ítems no previstos son complementarios y que no están dentro de la propuesta económica presentada inicialmente por el consorcio al IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, siendo estos de necesaria ejecución para poder cumplir a cabalidad con el objeto del contrato y suplir de manera integral con las necesidades de cada sector; y la carencia de ellos implicaría la no ejecución de obras relevantes, quedando varias actividades importantes



**CONSORCIO
SECTOR 6**

NIT: 901.490.124-1

DISTRITO HIDRAULICO N° 6

sin ejecutar , inconclusas o inadecuadamente terminadas para garantizar su debido funcionamiento y/o calidad de las mismas.

También es importante aclarar que tal como fue concebido el presupuesto original, se detectó que hay ítems que aparecen en la parte de alcantarillado que también son requeridos en la parte de acueducto y que no quedaron incluidos y viceversa; por lo anterior se realiza su debida inclusión para subsanar dichas inconsistencias y no generar inconvenientes a la hora de registrar debidamente las obras y cantidades ejecutadas, surgidas individualmente por cada capítulo.

Atentamente,

CONSORCIO SECTOR 6
R.L. ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
C.C. N° 79.474.136 DE BOGOTÁ

ANEXOS: Se incluye los APU (51) de cada ítems con su respectiva firma

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIORO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

PRELIMINARES:

ITEM: ACARREO INTERNO EN OBRA 50m

ESPECIFICACIÓN: 1,12

UNIDAD : m³

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|-------------------|------|--------|-------------|-------------|----------|
| HERRAMIENTA MENOR | | | | 1.473,08 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 1.473,08 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|------------------|--------|--------------|----------|-------------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
| AYUDANTE (4) | 256.467,47 | 171% | 437.472,81 | 0,02 | 8.749,45 | |
| OFICIALES (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,02 | 2.761,92 | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 11.511,37 | |

Total Costo Directo


12.984,45

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 1.947,67 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 649,22 | |
| UTILIDAD | 5% | 649,22 | |
| Sub-Total | | 3.246,11 | |

Precio unitario total aproximado al peso

16.231,00


ING. JHONAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

(Handwritten mark)

**"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6
UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"**

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUEREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

PRELIMINARES:

ESPECIFICACIÓN: 1,14

ITEM: LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL

UNIDAD : m

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa Jornal | Rendimiento | Valor-Unif. | |
|------------------|------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| HERRAMENTA MENOR | | | | 178,4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 178,42 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unif. | Cantidad | Valor-Unif. | |
|-------------------------------------|--------|--------------|----------|-------------|---------------|
| MADERA MEDIO CERCO (ESTACAS) | ML | 1.500 | 0,10 | 150,00 | |
| PUNTILLA PROMEDIO (2", 2" 1/2", 3") | LB | 3.132 | 0,22 | 689,03 | |
| PINTURA ESMALTE | GAL | 59.435 | 0,001 | 49,33 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 888,36 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Cantidad | M3-Km | Tarifa | Valor-Unif. | |
|------------------|-------------------|----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unif. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|--|
| AYUDANTE (2) | 128.233,73 | 171% | 218.736,31 | 0,005 | 1.093,68 | |
| OFICIALES (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,005 | 690,48 | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 1.784,16 | |

Total Costo Directo


2.050,93

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|---------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 427,64 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 142,55 | |
| UTILIDAD | 5% | 142,56 | |
| | | | |
| Sub-Total | | 712,73 | |

Precio unitario total aproximado al peso

3.584,00


ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
M.P. No. 25202- 46597CND
R.L. CONSORCIO SECTOR 6



"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

EXCAVACIONES A MANO DE 0 A 2 MTS EN SECO:
 ITEM: EXCAVACIONES EN CONGLOMERADO

ESPECIFICACIÓN: 3,2
 UNIDAD : m³

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|-------------------|------|--------|-------------|-------------|----------|
| HERRAMIENTA MENOR | | | | 1.623,97 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 1.623,97 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|------------------|--------|--------------|----------|-------------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
| AYUDANTE (1) | 64.116,87 | 171% | 109.368,15 | 0,2520 | 27.560,77 | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 27.560,77 | |

Total Costo Directo


29.184,75

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 4.377,71 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 1.459,24 | |
| UTILIDAD | 5% | 1.459,24 | |
| Sub-Total | | 7.296,19 | |

Precio unitario total aproximado al paso

36.481,00


ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6



"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUEREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

EXCAVACIONES A MANO DE 0 A 2 MTS EN SECO:
 ITEM: EXCAVACIONES ROCA

ESPECIFICACIÓN: 3,3
 UNIDAD : m³

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|-------------------|------|---------|-------------|-------------|------------------|
| HERRAMIENTA MENOR | | | | 2.605,50 | |
| COMPRESOR | dia | 900.000 | 0,033 | 29.700,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 32.305,50 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|------------------|--------|--------------|----------|-------------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|-------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | | 0,00 |

IV. MANO DE OBRA


| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| AYUDANTE (1) | 64.116,87 | 171% | 109.368,15 | 0,239 | 26.138,99 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | | 26.138,99 |

Total Costo Directo **58.444,49**

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|------------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 8.766,67 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 2.922,22 | |
| UTILIDAD | 5% | 2.922,22 | |
| Sub-Total | | | 14.611,12 |

Precio unitario total aproximado al peso **73.056,00**


ING. JONHAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTA D.C.
 M.P. No. 25202-46597CND
 R.I. CONSORCIO SECTOR 6



"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

EXCAVACIONES A MANO DE 0 A 2 MTS BAJO AGUA:
 ITEM: EXCAVACIONES EN CONGLOMERADO

ESPECIFICACIÓN: 3,5
 UNIDAD : m³

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. |
|-------------------------------------|------|--------|-------------|-------------|
| HERRAMIENTA MENOR | | | | 2.406,10 |
| MOTOBOMBA SUMERGIBLE 3" CON MAGUERA | dia | 82.233 | 0,120 | 9.867,96 |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub-Total | | | | 12.274,06 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. |
|------------------|--------|--------------|----------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub-Total | | | | 0,00 |

III. TRANSPDRTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| AYUDANTE (2) | 128.233,73 | 171% | 218.736,31 | 0,1100 | 24.060,99 |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 24.060,99 |

Total Costo Directo


36.335,06

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total |
|------------------|------------|-------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 5.450,28 |
| IMPREVISTOS | 5% | 1.816,75 |
| UTILIDAD | 5% | 1.816,75 |
| Sub-Total | | 9.083,78 |

Precio unitario total aproximado al peso

45.419,00


ING. MONJAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTA D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6



"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

EXCAVACIONES A MANO DE 0 A 2 MTS BAJO AGUA:
 ITEM: EXCAVACIONES ROCA

ESPECIFICACIÓN: 3,6
 UNIDAD : m³

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Uni. |
|-------------------------------------|------|---------|-------------|------------------|
| HERRAMIENTA MENOR | | | | 4.899,69 |
| COMPRESOR | día | 900.000 | 0,0128 | 11.520,00 |
| MOTOBOMBA SUMERGIBLE 3" CON MAGUERA | día | 82.233 | 0,0128 | 1.052,58 |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub-Total | | | | 17.472,28 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Uni. | Cantidad | Valor-Uni. |
|------------------|--------|-------------|----------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub-Total | | | | 0,00 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Uni. |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Uni. |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------------|
| AYUDANTE (2) | 128.233,73 | 171% | 218.736,31 | 0,224 | 48.996,93 |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 48.996,93 |

Total Costo Directo


66.469,21

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total |
|------------------|------------|------------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 9.970,38 |
| IMPREVISTOS | 5% | 3.323,46 |
| UTILIDAD | 5% | 3.323,46 |
| Sub-Total | | 16.617,30 |

Precio unitario total aproximado al peso

83.087,00



ING. THOM JAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
 M.P. No. 25202-46597CND
 R.I. CONSORCIO SECTOR 6



"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

EXCAVACIONES A MANO DE 0 A 2 MTS EN SECO:
 ITEM: EXCAVACIONES ROCA CON EXPLOSIVOS

ESPECIFICACIÓN: 3,18
 UNIDAD : m³

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|-------------------|------|---------|-------------|-------------|------------------|
| HERRAMIENTA MENOR | | | | 3.250,00 | |
| COMPRESOR | día | 900.000 | 0,027 | 24.300,00 | |
| PLANTA ELECTRICA | día | 69.900 | 0,080 | 5.592,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 33.142,00 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|----------------------------|--------|--------------|----------|-------------|------------------|
| Clorato de potasio y otros | Kg | 150.000 | 0,4 | 52.500,00 | |
| Cable detonante | Mf | 700 | 20,0 | 14.000,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 66.500,00 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cantl. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|--------------------|-----------|-------|--------|-------------|-------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | | 0,00 |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| AYUDANTE (2) | 126.233,73 | 171% | 216.736,31 | 0,222 | 46.559,46 | |
| OFICIALES (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,222 | 30.657,30 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | | 79.216,76 |

Total Costo Directo


178.858,76

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|------------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 26.828,81 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 8.942,94 | |
| UTILIDAD | 5% | 8.942,94 | |
| Sub-Total | | | 44.714,69 |

Precio unitario total aproximado al peso

223.573,00


ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R.I. CONSORCIO SECTOR 6

X

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
IBAL S.A E.S.P OFICIAL

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EXCAVACIONES A MAQUINA DE 0 A 2 MTS EN SECO:
ITEM: EXCAVACIONES EN ROCA

ESPECIFICACIÓN: 4,2
UNIDAD : m³

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------|---------|-------------|-------------|------------------|
| RETROCARGADOR | dia | 915.570 | 0,039 | 35.521,82 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 35.521,82 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|------------------|--------|--------------|----------|-------------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|--|
| AYUDANTE (2) | 128.233,73 | 171% | 218.736,31 | 0,020 | 4.374,73 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 4.374,73 | |

Total Costo Directo


39.896,54

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-----------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 5.984,48 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 1.994,83 | |
| UTILIDAD | 5% | 1.994,83 | |
| Sub-Total | | 9.974,14 | |

Precio unitario total aproximado al peso

49.871,00


ING. JHONAIRO PEÑA SERRATO
C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTA D.C.
M.P. No. 25202-46597CND
R.L. CONSORCIO SECTOR 6



"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

EXCAVACIONES A MAQUINA DE 0 A 2 MTS BAJO AGUA:
 ITEM: EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO

ESPECIFICACIÓN: 4,3
 UNIDAD : m³

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|-------------------------------------|------|---------|-------------|-------------|------------------|
| RETROCARGADOR | dia | 915.570 | 0,025 | 22.889,24 | |
| MOTOBOMBA SUMERGIBLE 3" CON MAGUERA | dia | 82.233 | 0,025 | 2.055,83 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 24.945,07 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|------------------|--------|--------------|----------|-------------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|-------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | | 0,00 |

IV. MANO DE OBRA


| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| AYUDANTE (2) | 128.233,73 | 171% | 218.736,31 | 0,034 | 7.418,77 | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | | 7.418,77 |

Total Costo Directo 32.363,84

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|-----------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 4.854,58 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 1.618,19 | |
| UTILIDAD | 5% | 1.618,19 | |
| Sub-Total | | | 8.090,96 |

Precio unitario total aproximado al peso 40.455,00


ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
 M.P. No. 25202-46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

X

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

CONCRETOS

ESPECIFICACIÓN: 5,2

ITEM: INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO DE 17,2 Mpa (2.500 PSI)

UNIDAD : UND M3

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|----------------------------------|------|---------|-------------|-------------|------------------|
| HERRAMIENTA MENOR (10%MO) | | | | 10.961,41 | |
| VIBRADOR GASOLINA | DIA | 41.457 | 0,14 | 5.803,98 | |
| MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) | HR | 322.134 | 0,09 | 28.992,06 | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 45.757,45 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|--|--------|--------------|----------|-------------|-------------------|
| CONCRETO SIMPLE DE 2500 PSI | M3 | 281.533 | 1,050 | 295.609,65 | |
| TABLA PARA FORMALETA DE 1" X 10" X 2,9 M | M | 1.583 | 0,220 | 348,33 | |
| PUNTILLA (PROMEDIO) | LB | 3.132 | 0,120 | 375,84 | |
| CUARTÓN DE SAJO 2" X 4" X 2,9 M | M | 1.392 | 0,4 | 487,20 | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 296.821,02 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|-------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | | 0,00 |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|
| AYUDANTES (5) | 384.701,20 | 171% | 656.208,92 | 0,138 | 90.556,83 | |
| OFICIAL (1) | 84.785,76 | 153% | 138.085,93 | 0,138 | 19.057,24 | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | | 108.614,07 |

Total Costo Directo


452.192,54

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|-------------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 67.828,88 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 22.609,63 | |
| UTILIDAD | 5% | 22.609,63 | |
| Sub-Total | | | 113.048,13 |

Precio unitario total aproximado al peso

585.241,00


ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

CONCRETOS

ITEM: ANDEN EN CONCRETO e=0,10 (INCLUYE ALISTADO Y NIVELACION)

ESPECIFICACIÓN: 5,13

UNIDAD : m²

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarif | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|----------------------------------|------|-----------|-------------|-------------|-----------------|
| HERRAMIENTA MENOR | | | | 1.445,00 | |
| MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) | HR | 322.134 | 0,02 | 4.652,81 | |
| RANA | dia | 40.267,00 | 0,04 | 1.610,68 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 7.708,49 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|--|--------|--------------|----------|-------------|------------------|
| CONCRETO SIMPLE DE 2500 PSI | M3 | 281.533 | 0,105 | 29.560,97 | |
| RECEBO | M3 | 29.825 | 0,10 | 2.982,50 | |
| TABLA PARA FORMALETA DE 1" X 10" X 2,9 M | M | 1.583 | 1,020 | 1.615,00 | |
| PUNTILLA (PROMEDIO) | LB | 3.132 | 0,050 | 158,60 | |
| CUARTÓN DE SAJO 2" X 4" X 2,9 M | M | 1.392 | 0,5 | 896,00 | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 35.011,07 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------------|--|
| AYUDANTES (8) | 384.701,20 | 171% | 656.208,92 | 0,030 | 19.685,27 | |
| OFICIAL (1) | 84.796,76 | 163% | 138.095,93 | 0,025 | 3.452,40 | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 23.138,67 | |

Total Costo Directo


65.858,22

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|------------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 9.876,73 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 3.292,91 | |
| UTILIDAD | 5% | 3.292,91 | |
| Sub-Total | | | 18.464,58 |

Precio unitario total aproximado al peso

82.323,00


ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUEREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

CONCRETOS

ESPECIFICACIÓN: 5,14

ITEM: Sardinel en concreto de 2600 PSI fundido en sitio sección trapezoidal de (0,16 -0,20) h=0,40m UNIDAD : m

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarif | Rendimiento | Valor-Unil. | |
|----------------------------------|------|---------|-------------|-------------|----------|
| HERRAMIENTA MENOR | | | | 1.244,00 | |
| MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) | HR | 322.134 | 0,00 | 1.208,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 2.452,00 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unil. | Cantidad | Valor-Unil. | |
|-----------------------------|--------|--------------|----------|-------------|-----------|
| CONCRETO SIMPLE DE 2500 PSI | M3 | 281.533 | 0,070 | 19.707,31 | |
| FORMALETA METALICA | MI | 1.392 | 3,1 | 4.328,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| Sub-Total | | | | | 24.035,31 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unil. | |
|-----------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unil. | |
|---------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
| AYUDANTES (6) | 364.701,20 | 171% | 656.208,92 | 0,023 | 15.224,05 | |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 136.095,93 | 0,023 | 3.203,83 | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 18.427,87 | |

Total Costo Directo


44.915,18

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|----------------|------------|-------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 6.737,28 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 2.248,76 | |
| UTILIDAD | 5% | 2.248,76 | |
| Sub-Total | | 11.226,80 | |

Precio unitario total aproximado al peso

56.144,00


ING. JONHAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

CONCRETOS

ITEM: Anclaje en concreto F'c = 21 Mpa para accesorios 3"

ESPECIFICACIÓN: 6.17

UNIDAD : Und

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarif | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|----------------------------------|------|---------|-------------|-------------|------------------|
| HERRAMIENTA MENOR | | | | 11.914,57 | |
| MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) | HR | 322.134 | 0,05 | 16.106,70 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 28.021,27 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unk. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|--|--------|-------------|----------|-------------|------------------|
| CONCRETO SIMPLE DE 2500 PSI | M3 | 281.533 | 0,200 | 56.306,60 | |
| TABLA PARA FORMALETA DE 1" X 10" X 2,9 M | M | 1.583 | 0,50 | 791,67 | |
| PUNTILLA (PROMEDIO) | LB | 3.132 | 0,03 | 93,96 | |
| CUARTÓN DE SAJO 2" X 4" X 2,9 M | M | 1.392 | 0,15 | 208,80 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 57.401,03 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cantl. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|--------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|--|
| AYUDANTES (6) | 384.701,20 | 171% | 656.208,92 | 0,150 | 98.431,34 | |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,150 | 20.714,39 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 119.145,73 | |

Total Costo Directo


204.568,03

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|------------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 30.685,20 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 10.228,40 | |
| UTILIDAD | 5% | 10.228,40 | |
| | | | |
| Sub-Total | | | 51.142,01 |

Precio unitario total aproximado al peso

255.710,00


 ING. JHON JARRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
 M.P. No. 25202-46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

OBRAS DE PAVIMENTACION
 ITEM: Rotura de Pavimento Flexible

ESPECIFICACIÓN: 8,21
 UNIDAD : m³

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|-------------------|------|---------|-------------|-------------|-----------|
| HERRAMIENTA MENOR | | | | 656,00 | |
| COMPRESOR | dia | 900.000 | 0,030 | 26.655,03 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 27.311,03 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|------------------|--------|--------------|----------|-------------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Ostancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
| AYUDANTE (6) | 384.701,20 | 171% | 656.208,92 | 0,070 | 45.934,62 | |
| OFICIALES (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,070 | 9.666,72 | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 55.601,34 | |

Total Costo Directo


82.912,37

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 12.436,96 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 4.145,62 | |
| UTILIDAD | 5% | 4.145,62 | |
| Sub-Total | | 20.728,08 | |

Precio unitario total aproximado al peso

103.640,00


ING. JHON AIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79.474.136 DE BOGOTÁ D.C.
 M.P. No. 25202-46597CND
 R.I. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

20 OTROS

ITEM: Utilizacion de Motobomba

ESPECIFICACIÓN: 20,42

UNIDAD : dia

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|-------------------------------------|------|--------|-------------|-------------|------------------|
| MOTOBOMBA SUMERGIBLE 3" CON MAGUERA | dia | 82.233 | 0,350 | 28.781,55 | |
| Herramienta menor | Glb | 654 | | 654,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 29.435,55 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|------------------|--------|--------------|----------|-------------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------------|--|
| AYUDANTE (2) | 128.233,73 | 171% | 218.736,31 | 0,120 | 26.248,36 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 26.248,36 | |

Total Costo Directo


55.683,91

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|------------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 8.352,59 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 2.784,20 | |
| UTILIDAD | 5% | 2.784,20 | |
| Sub-Total | | 13.920,99 | |

Precio unitario total aproximado al peso

69.605,00


ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTA D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

29 OTROS
 ITEM: PRUEBA HIDROSTATICA

ESPECIFICACIÓN: 20,85
 UNIDAD : Und

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarif | Randimiento | Valor-Unit. | |
|------------------------------|--------|---------|-------------|-------------|-------------------|
| HERRAMIENTA MENOR | | 50.000 | 1,0 | 50.000,00 | |
| BOMBA DE EMBOLO Y ACCESORIOS | Manual | 450.000 | 1,0 | 450.000,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 500.000,00 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|------------------------|--------|--------------|----------|-------------|-------------------|
| ACCESORIOS PVC Y OTROS | Gib | 120.000 | 1,0 | 120.000,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 120.000,00 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA


| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|--|
| AYUDANTES (2) | 128.233,73 | 171% | 218.736,31 | 1,000 | 218.736,31 | |
| OFICIAL (1) | 84.795,78 | 163% | 138.095,93 | 1,000 | 138.095,93 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 356.832,24 | |

Total Costo Directo 976.832,24

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|-------------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 146.524,84 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 48.841,61 | |
| UTILIDAD | 5% | 48.841,61 | |
| Sub-Total | | | 244.208,06 |

Precio unitario total aproximado al peso 1.221.040,00


ING. JON JAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTA D.C.
 M.P. No. 25202-46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

**"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6
UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"**

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO I. S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

20 OTROS

ITEM: Reparacion en manguera polietileno 1/2" acometidas acueducto. Incluye excavacion manual

ESPECIFICACIÓN: 20,57

UNIDAD : Und

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------------|-----------|--------|-------------|-------------|-----------------|
| SIEMENSA MENOR (10%MO) | | | | 3.568 | |
| PULIDORA | Electrica | 25.000 | 0,04 | 1.000,00 | |
| PLANTA ELECTRICA | Gasolina | 69.900 | 0,04 | 2.796,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 7.364,32 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|-------------------|--------|--------------|----------|-------------|------------------|
| MANGUERA P.F 1/2" | M | 2.250 | 1,50 | 3.375,38 | |
| UNION P.F DE 1/2" | UND | 4.230 | 2,0 | 8.459,26 | |
| SOLDADURA | UND | 17.454 | 0,02 | 349,07 | |
| LIMPIADOR | UND | 15.181 | 0,02 | 303,62 | |
| CINTA DE TEFLON | UND | 7.726 | 0,04 | 309,05 | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 12.796,39 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------------|--|
| AYUDANTE (2) | 128.233,73 | 171% | 218.736,31 | 0,10 | 21.873,63 | |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,10 | 13.809,59 | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 35.683,22 | |

Total Costo Directo


55.843,93

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|------------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 8.376,59 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 2.792,20 | |
| UTILIDAD | 5% | 2.792,20 | |
| Sub-Total | | | 13.960,98 |

Precio unitario total aproximado al peso

69.805,00


ING. THON JAIRO PEÑA SERRATO
C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
M.P. No. 25202-46597CND
R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAI S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO I.S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

20 OTROS

ESPECIFICACIÓN: 20,68

ITEM: Reparacion daños en red gas pe al pe 1/2" 3/4"

UNIDAD : Und

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---------------------------|------|--------|-------------|-------------|------------------|
| HERRAMIENTA MENOR (10%MO) | | | | 16.085 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 16.085,17 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|-----------------------------------|--------|--------------|----------|-------------|------------------|
| MANGUERA PE AL PE 16 (0,5"-0,75") | ML | 3.100,00 | 1,0 | 3.100,00 | |
| UNIONES PE AL PE 16 | Und | 2 | 11.900,0 | 23.800,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 26.900,00 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------------|--|
| AYUDANTE (1) | 64.116,87 | 171% | 109.368,15 | 0,65 | 71.089,30 | |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,65 | 89.762,35 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 160.851,65 | |

Total Costo Directo


203.836,82

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|------------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 30.575,52 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 10.191,84 | |
| UTILIDAD | 5% | 10.191,84 | |
| Sub-Total | | 50.959,20 | |

Precio unitario total aproximado al peso

254.796,00



ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
M.P. No. 25202-46597CND
R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAI S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO I.S.A.E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

20 OTROS

ITEM: Reparacion daños en red gas pe al pe 1,25"-2"

ESPECIFICACIÓN: 20,59

UNIDAD : Und

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---------------------------|------|--------|-------------|-------------|-------------------|
| HERRAMIENTA MENOR (10%MO) | | | | 136.105 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 136.105,25 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|--------------------------------|--------|--------------|----------|-------------|------------------|
| TUBERIA PE AL PE 16 (1,25"-2") | ML | 15.105,00 | 1,2 | 18.126,00 | |
| UNIONES PE AL PE 16 | Und | 2 | 30.000,0 | 60.000,00 | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 78.126,00 |

III. TRANSPORTES

| Materiel | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------------|--|
| AYUDANTE (1) | 64.116,87 | 171% | 109.368,15 | 5,50 | 601.524,84 | |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 5,50 | 759.527,61 | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 1.361.052,45 | |

Total Costo Directo


1.575.283,70

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 236.292,55 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 78.764,18 | |
| UTILIDAD | 5% | 78.764,18 | |
| Sub-Total | | 393.820,92 | |

Precio unitario total aproximado al peso

1.969.105,00


ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
 M.P. No. 25202-46597CND
 R.I. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

20 OTROS

ITEM: Reparacion daños en red gas PE 80 3"

ESPECIFICACIÓN: 20,60

UNIDAD : Und

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. |
|---------------------------|------|--------|-------------|-------------------|
| HERRAMIENTA MENDR (10%MO) | | | | 185.598 |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub-Total | | | | 185.598,06 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. |
|--------------------|--------|--------------|----------|------------------|
| TUBERIA PE 80 (3") | ML | 32.791,00 | 1,5 | 49.186,50 |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub-Total | | | | 49.186,50 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. |
|------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------------|
| AYUDANTE (1) | 64.116,87 | 171% | 109.368,15 | 7,50 | 820.261,15 |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 7,50 | 1.035.719,47 |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 1.855.980,62 |

Total Costo Directo

2.090.765,18

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total |
|------------------|------------|-------------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 313.614,78 |
| IMPREVISTOS | 5% | 104.538,26 |
| UTILIDAD | 5% | 104.538,26 |
| Sub-Total | | 522.691,30 |

Precio unitario total aproximado al peso

2.613.456,00



ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTA D.C.
M.P. No. 25202- 46597CND
R.I. CONSORCIO SECTOR 6

**"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6
UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"**

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

20 OTROS

ESPECIFICACIÓN: 20,66

ITEM: Reparacion en manguera polietileno 3/4" acometidas acueducto. Incluye excavacion manual UNIDAD : Und

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|----------------------|-----------|--------|-------------|-------------|-----------------|
| BIENIA MENOR (10%MO) | | | | 3.568 | |
| PULIDORA | Electrica | 25.000 | 0,04 | 1.000,00 | |
| PLANTA ELECTRICA | Gasolina | 69.900 | 0,04 | 2.796,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 7.364,32 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|-------------------|--------|--------------|----------|-------------|------------------|
| MANGUERA P.F 3/4" | M | 4.512 | 1,50 | 6.768,00 | |
| UNION P.F DE 3/4" | UND | 15.415 | 2,0 | 30.830,00 | |
| SOLDADURA | UND | 17.454 | 0,02 | 349,07 | |
| LIMPIADOR | UND | 15.181 | 0,02 | 303,62 | |
| CINTA DE TEFLON | UND | 7.726 | 0,04 | 309,05 | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 38.569,75 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cent. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------------|--|
| AYUDANTE (2) | 128.233,73 | 171% | 218.736,31 | 0,10 | 21.873,63 | |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,10 | 13.809,59 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 35.683,22 | |

Total Costo Directo


81.607,29

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|------------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 12.241,09 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 4.080,36 | |
| UTILIDAD | 5% | 4.080,36 | |
| | | | |
| Sub-Total | | 20.401,82 | |

Precio unitario total aproximado al peso

102.009,00


ING. JONAIRO PEÑA SERRATO
C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTA D.C.
M.P. No. 25202- 46597CND
R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS

ESPECIFICACIÓN: 22,52

ITEM: Suministro e instalación curva presión 22.5 RDE 21 3"

UNIDAD : Und

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---------------------------|------|--------|-------------|-------------|-----------------|
| HERRAMIENTA MENOR (10%MO) | | | | 2.475 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 2.474,64 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|-------------------------------|--------|--------------|----------|-------------|------------------|
| Curva presión 22.25 RDE 21 3" | Und | 44.714,25 | 1,0 | 44.714,25 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 44.714,25 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|------------------|--|
| AYUDANTE (1) | 64.116,87 | 171% | 109.368,15 | 0,10 | 10.936,82 | |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,10 | 13.809,59 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 24.746,41 | |

Total Costo Directo


71.935,30

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|------------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 10.790,29 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 3.596,76 | |
| UTILIDAD | 5% | 3.596,76 | |
| Sub-Total | | 17.983,82 | |

Precio unitario total aproximado al peso

89.919,00


ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTA D.C.
 M.P. No. 25202-46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

**"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6
UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"**

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS

ESPECIFICACIÓN: 22,53

ITEM: Suministro e instalación curva presión 22.5 RDE 21 3"

UNIDAD : Und

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---------------------------|------|--------|-------------|-------------|-----------------|
| HERRAMIENTA MENDR (10%MO) | | | | 2.475 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 2.474,54 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|------------------------------|--------|--------------|----------|-------------|------------------|
| Curva presión 22.5 RDE 21 3" | Und | 49.058,94 | 1,0 | 49.058,94 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 49.058,94 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|------------------|--|
| AYUDANTE (1) | 84.116,87 | 171% | 109.368,15 | 0,10 | 10.936,82 | |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,10 | 13.809,59 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 24.746,41 | |

Total Costo Directo


76.279,99

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|------------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 11.442,00 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 3.814,00 | |
| UTILIDAD | 5% | 3.814,00 | |
| | | | |
| Sub-Total | | | 19.070,00 |

Precio unitario total aproximado al peso

95.350,00


ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
C.C. No. 79'474.136 DE BDGOTA D.C.
M.P. No. 25202- 46597CND
R.L. CONSORCIO SECTOR 6

**"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6
UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"**

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS

ESPECIFICACIÓN: 22,54

ITEM: Suministro e instalacion curva presion 45 RDE 21 3"

UNIDAD : Und

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---------------------------|------|--------|-------------|-------------|-----------------|
| HERRAMIENTA MENOR (10%MO) | | | | 2.475 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 2.474,64 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|-------------------------------|--------|--------------|----------|-------------|------------------|
| Curva presion 11.25 RDE 21 3" | Und | 77.507,08 | 1,0 | 77.507,08 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 77.507,08 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|------------------|--|
| AYUDANTE (1) | 84.116,87 | 171% | 109.368,15 | 0,10 | 10.936,82 | |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,10 | 13.809,59 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 24.746,41 | |

Total Costo Directo


104.728,13

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|------------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 15.709,22 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 5.236,41 | |
| UTILIDAD | 5% | 5.236,41 | |
| Sub-Total | | 26.182,03 | |

Precio unitario total aproximado al peso

130.910,00


ING. JONHAIRO PEÑA SERRATO
C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTA D.C.
M.P. No. 25202- 46597CND
R.L. CONSORCIO SECTOR 6

**"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6
UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"**

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS
ITEM: Suministro e Instalacion tee reduc 3"x2"x3"

ESPECIFICACIÓN: 22,55
UNIDAD : Und

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---------------------------|------|--------|-------------|-------------|-----------------|
| HERRAMIENTA MENOR (10%MO) | | | | 2.475 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 2.474,84 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|----------------------|--------|--------------|----------|-------------|------------------|
| TEE PRESION 3"x3"x2" | UND | 87.854 | 1,00 | 87.854,00 | |
| SOLDADURA | UND | 17.454 | 0,04 | 698,15 | |
| LIMPIADOR | UND | 15.181 | 0,04 | 607,24 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 69.159,39 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|------------------|--|
| AYUDANTE (1) | 64.116,87 | 171% | 109.368,15 | 0,10 | 10.936,82 | |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,10 | 13.809,59 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 24.746,41 | |

Total Costo Directo


116.380,44

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|------------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 17.457,07 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 5.819,02 | |
| UTILIDAD | 5% | 5.819,02 | |
| | | | |
| Sub-Total | | 29.095,11 | |

Precio unitario total aproximado al peso

145.476,00


ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTA D.C.
M.P. No. 25202- 46597CND
R.L. CONSORCIO SECTOR 6

**"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6
UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"**

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PRESION RDE 21 (DE 0 A 2 MTS)

ESPECIFICACIÓN: 23,1,1

ITEM: DE DIÁMETRO 2"

UNIDAD : m

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|----------------------|------|--------|-------------|-------------|---------------|
| BIENTA MENOR (10%MO) | | | | 748 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 748,24 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|------------------------------------|--------|--------------|----------|-------------|------------------|
| TUBERIA PVC PRESION DE 2" RDE21 | ML | 10.234 | 1,0 | 10.234,00 | |
| ACCESORIOS PVC PRESIÓN (% Tubería) | 5% Tub | 2.559 | 1,0 | 2.558,50 | |
| SOLDADURA | UND | 17.454 | 0,008 | 139,63 | |
| LIMPIADOR | UND | 15.181 | 0,008 | 121,45 | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 13.053,58 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|--|
| AYUDANTE (4) | 256.467,47 | 171% | 437.472,61 | 0,0130 | 5.687,14 | |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,0130 | 1.795,25 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 7.482,39 | |

Total Costo Directo


21.284,21

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-----------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 3.192,63 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 1.064,21 | |
| UTILIDAD | 5% | 1.064,21 | |
| | | | |
| Sub-Total | | 5.321,05 | |

Precio unitario total aproximado al peso

26.605,00


ING. HONORIO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
 M.P. No. 25202-46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

EXCAVACIONES A MAND DE 2 A 4 MTS EN SECO:
 ITEM: EXCAVACIONES ROCA

ESPECIFICACIÓN: 3,9
 UNIDAD : m³

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|-------------------|------|---------|-------------|-------------|------------------|
| HERRAMIENTA MENOR | | | | 3,085,50 | |
| COMPRESOR | dia | 900.000 | 0,048 | 43,200,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 46.285,50 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|------------------|--------|--------------|----------|-------------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|-------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | | 0,00 |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| AYUDANTE (2) | 128.233,73 | 171% | 218.736,31 | 0,181 | 39.591,27 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | | 39.591,27 |

Total Costo Directo


85.876,77

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|------------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 12.881,52 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 4.293,84 | |
| UTILIDAD | 5% | 4.293,84 | |
| Sub-Total | | | 21.469,19 |

Precio unitario total aproximado al peso

107.346,00


ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No: 79'474.136 DE BDGOTA D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R I CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

EXCAVACIONES A MANO DE 2 A 4 MTS EN SECO:
ITEM: EXCAVACIONES ROCA CON EXPLOSIVOS

ESPECIFICACIÓN: 3,17
UNIDAD : m³

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|-------------------|------|---------|-------------|-------------|-----------|
| HERRAMIENTA MENOR | | | | 3.250,00 | |
| COMPRESOR | día | 900.000 | 0,027 | 24.300,00 | |
| PLANTA ELECTRICA | día | 69.900 | 0,080 | 5.592,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 33.142,00 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|----------------------------|--------|--------------|----------|-------------|-----------|
| Clorato de potasio y otros | Kg | 150.000 | 0,35 | 52.500,00 | |
| Cable detonante | Ml | 700 | 20,0 | 14.000,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 66.500,00 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | | 0,00 |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| AYUDANTE (2) | 128.233,73 | 171% | 218.736,31 | 0,333 | 72.839,19 | |
| OFICIALES (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,333 | 45.985,94 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | | 116.825,13 |

Total Costo Directo


218.467,13

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|-----------|
| ADMINISTRACION | 15% | 32.770,07 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 10.923,36 | |
| UTILIDAD | 5% | 10.923,36 | |
| Sub-Total | | | 54.616,79 |

Precio unitario total aproximado al peso

273.084,00


ING. HONORARIO PEÑA SERRATO
C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
M.P. No. 25202- 46597CND
R.I. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

EXCAVACIONES A MANO DE 2 A 4 MTS BAJO AGUA: ESPECIFICACIÓN: 3,11
 ÍTEM: EXCAVACIONES EN CONGLOMERADO UNIDAD : m³

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|-------------------------------------|------|--------|-------------|-------------|------------------|
| HERRAMIENTA MENOR | | | | 3.565,40 | |
| MOTOBOMBA SUMERGIBLE 3" CON MAGUERA | da | 82.233 | 0,180 | 14.801,94 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 18.367,34 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|------------------|--------|--------------|----------|-------------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA


| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------------|--|
| AYUDANTE (2) | 128.233,73 | 171% | 218.736,31 | 0,163 | 35.654,02 | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 35.654,02 | |

Total Costo Directo **54.021,36**

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|------------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 8.103,20 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 2.701,07 | |
| UTILIDAD | 5% | 2.701,07 | |
| Sub-Total | | 13.505,34 | |

Precio unitario total aproximado al peso **67.527,00**


ING. JONHAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ O.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A.E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

EXCAVACIONES A MANO DE 2 A 4 MTS BAJO AGUA:
 ITEM: EXCAVACIONES ROCA

ESPECIFICACIÓN: 3,12
 UNIDAD : m³

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|-------------------------------------|------|---------|-------------|-------------|------------------|
| HERRAMIENTA MENOR | | | | 5.993,37 | |
| COMPRESOR | dia | 900.000 | 0,043 | 38.700,00 | |
| MOTOBOMBA SUMERGIBLE 3" CON MAGUERA | dia | 82.233 | 0,043 | 3.536,02 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 48.229,39 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|------------------|--------|--------------|----------|-------------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------------|--|
| AYUDANTE (2) | 128.233,73 | 171% | 218.736,31 | 0,2740 | 59.933,75 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 59.933,75 | |

Total Costo Directo

108.163,14

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|------------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 16.224,47 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 5.408,18 | |
| UTILIDAD | 5% | 5.408,16 | |
| Sub-Total | | | 27.040,79 |

Precio unitario total aproximado al peso

135.204,00



ING. IVÁN JAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
 M.P. No. 25202-46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

EXCAVACIONES A MAQUINA DE 2 A 4 MTS EN SECO:
 ITEM: EXCAVACIONES EN ROCA

ESPECIFICACIÓN: 4,6
 UNIDAD : m³

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------|---------|-------------|-------------|------------------|
| RETROCARGADOR | dia | 915.570 | 0,070 | 64.089,88 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 64.089,88 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|------------------|--------|--------------|----------|-------------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|-------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | | 0,00 |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| AYUDANTE (2) | 128.233,73 | 171% | 218.736,31 | 0,018 | 3.937,25 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | | 3.937,25 |

Total Costo Directo


68.027,13

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|------------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 10.204,07 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 3.401,36 | |
| UTILIDAD | 5% | 3.401,36 | |
| Sub-Total | | | 17.006,78 |

Precio unitario total aproximado al peso

85.034,00


ING. JHON AIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

EXCAVACIONES A MAQUINA DE 0 A 2 MTS BAJO AGUA:
 ITEM: EXCAVACIONES EN ROCA

ESPECIFICACIÓN: 4,8
 UNIDAD : m³

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|-------------------------------------|------|---------|-------------|-------------|------------------|
| RETROCARGADOR | dia | 915.570 | 0,078 | 71.414,44 | |
| MOTOBOMBA SUMERGIBLE 3" CON MAGUERA | dia | 82.233 | 0,078 | 6.414,17 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 77.828,61 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|------------------|--------|--------------|----------|-------------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|-------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | | 0,00 |

IV. MANO DE OBRA


| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| AYUDANTE (2) | 128.233,73 | 171% | 218.736,31 | 0,042 | 9.186,92 | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | | 9.186,92 |

Total Costo Directo **87.015,54**

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|------------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 13.052,33 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 4.350,78 | |
| UTILIDAD | 5% | 4.350,78 | |
| Sub-Total | | | 21.753,88 |

Precio unitario total aproximado al peso **108.769,00**


ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79.474.136 DE BOGOTÁ D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R.L. CONSDRCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES CDMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUEREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION (DIAMETRO 1.20 Mts)
ITEM: Base y cañuela en concreto de 3.000 PSI e = 0,30 Mts

ESPECIFICACIÓN: 19,1,1
UNIDAD : UNO

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|----------------------|------|--------|-------------|-------------|-----------|
| PIENTA MENOR (10%MO) | | | | 15.828 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 15.828,13 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|-----------------------------|--------|--------------|----------|-------------|------------|
| CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI | M3 | 297.454 | 0,770 | 229.039,58 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 229.039,58 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
| AYUDANTES (4) | 256.467,47 | 171% | 437.472,61 | 0,275 | 120.304,97 | |
| OFICIAL (1) | 84.796,76 | 163% | 138.095,93 | 0,275 | 37.976,38 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 158.281,35 | |

Total Costo Directo


403.149,06

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 60.472,36 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 20.157,45 | |
| UTILIDAD | 5% | 20.157,45 | |
| | | | |
| Sub-Total | | 100.787,27 | |

Precio unitario total aproximado al peso

503.936,00


ING. JHONAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CNO
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION (DIAMETRO 1,20 Mts)
PAÑETE INTERIOR

ESPECIFICACIÓN: 19,1,2
UNIDAD : m

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. |
|--------------------------|------|--------|-------------|-----------------|
| SIEMPIENTE MENOR (10%MO) | | | | 5,549 |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub-Total | | | | 5,548,74 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. |
|------------------|--------|--------------|----------|------------------|
| MORTERO 1:3 | M3 | 255,000 | 0,11 | 29,150,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub-Total | | | | 29,150,00 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------------|
| AYUDANTES (2) | 128.233,73 | 171% | 218.736,31 | 0,156 | 34.013,50 |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,156 | 21.473,92 |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 55,487,41 |

Total Costo Directo


90,186,15

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total |
|------------------|------------|------------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 13,527,92 |
| IMPREVISTOS | 5% | 4,509,31 |
| UTILIDAD | 5% | 4,509,31 |
| Sub-Total | | 22,546,54 |

Precio unitario total aproximado al peso

112,733,00


ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTA D.C.
M.P. No. 25202- 46597CND

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION (DIAMETRO 1.20 Mts)
ITEM: Base y cañuela en concreto de 3.000 PSI e = 0,30 Mts

ESPECIFICACIÓN: 19,1,1
UNIDAD : UND

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. |
|----------------------|------|--------|-------------|-------------|
| PIPILO MENOR (10%MO) | | | | 15.828 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub-Total | | | | 15.828,13 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. |
|-----------------------------|--------|--------------|----------|-------------|
| CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI | M3 | 297.454 | 0,770 | 229.039,58 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub-Total | | | | 229.039,58 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| AYUDANTES (4) | 256.487,47 | 171% | 437.472,61 | 0,275 | 120.304,97 |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,275 | 37.976,38 |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 158.281,35 |

Total Costo Directo


403.149,06

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total |
|------------------|------------|-------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 60.472,36 |
| IMPREVISTOS | 5% | 20.157,45 |
| UTILIDAD | 5% | 20.157,45 |
| Sub-Total | | 100.787,27 |

Precio unitario total aproximado al peso

503.936,00


ING. JHON JAIRO PENA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTA D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A.E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION (DIAMETRO 1,20 Mts)
ITEM: CILINDRO EN LADRILLO e=0,30 Mts

ESPECIFICACIÓN: 19,1,3
UNIDAD : ML

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---------------------------|------|-------------|-------------|-------------|----------|
| HERRAMIENTA MENOR (10%MO) | | | | 6.280 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 6.280,25 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|-----------------------|--------|--------------|----------|-------------|------------|
| LADRILLO TOLETE COMUN | UND | 561 | 400,0 | 224.400,00 | |
| MORTERO 1:4 | M3 | 276.395 | 0,347 | 95.909,07 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 320.309,07 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
| AYUDANTES (2) | 128.233,73 | 171% | 216.738,31 | 0,176 | 36.497,59 | |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,176 | 24.304,88 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 62.802,47 | |

Total Costo Directo


389.391,79

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|-----------|
| ADMINISTRACION | 15% | 58.408,77 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 19.469,59 | |
| UTILIDAD | 5% | 19.469,59 | |
| | | | |
| Sub-Total | | | 97.347,95 |

Precio unitario total aproximado al peso

486.740,00


ING. JHON JAIRÓ PEÑA SERRATO
C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
M.P. No. 28202- 46597CND
R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION (DIAMETRO 1.20 Mts)
ITEM: CONO DE REDUCCION H=0,85 Mts

ESPECIFICACIÓN: 18,1,4
UNIDAD : UND

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---------------------------|------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| HERRAMIENTA MENOR (10%MO) | | | | 15.594 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 15.593,57 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|-----------------------|--------|--------------|----------|-------------|-------------------|
| LADRILLO TOLETE COMUN | UND | 561 | 265,0 | 148.665,00 | |
| MORTERO 1:4 | M3 | 276.395 | 0,15 | 41.459,25 | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 190.124,25 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|--|
| AYUDANTES (2) | 128.233,73 | 171% | 218.738,31 | 0,437 | 95.587,77 | |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,437 | 60.347,92 | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 155.935,69 | |

Total Costo Directo


361.653,51

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|------------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 54.248,03 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 18.082,68 | |
| UTILIDAD | 5% | 18.082,68 | |
| Sub-Total | | | 90.413,38 |

Precio unitario total aproximado al peso

452.067,00


ING. JUAN CARLOS PEÑA SERRATO
C.C. No. 79.474.136 DE BOGOTÁ D.C.
M.P. No. 25202-46597CND
R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION (DIAMETRO 1.20 Mts)
ITEM: PASOS EN HIERRO DE 3/4" CON ANTICORROSIVO C/40 Cm

ESPECIFICACIÓN: 19,1.5
UNIDAD : UNO

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unid. |
|----------------------|------|-------------|-------------|---------------|
| SIEMTA MENOR (10%MO) | | | | 831 |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub-Total | | | | 831,42 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unid. | Cantidad | Valor-Unid. |
|---|--------|--------------|----------|-----------------|
| ACERO DE REFUERZO (cortado, figurado e instalado) | KG | 2.927 | 2,25 | 6.585,75 |
| | | | | |
| Sub-Total | | | | 6.585,75 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unid. |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unid. |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| AYUDANTES (2) | 126.233,73 | 171% | 218.736,31 | 0,0233 | 5.096,56 |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,0233 | 3.217,64 |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 8.314,19 |

Total Costo Directo


15.731,36

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total |
|------------------|------------|-----------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 2.359,70 |
| IMPREVISTOS | 5% | 786,57 |
| UTILIDAD | 5% | 786,57 |
| Sub-Total | | 3.932,84 |

Precio unitario total aproximado al peso

19.664,00


ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTA D.C.
M.P. No. 25202- 46597CNO
R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION (DIAMETRO 1.20 Mts)

ESPECIFICACIÓN: 19,1,6

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION AEROTAPA COMPLETA VIBROCOMPACTADA

UNIDAD : UND

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa/hora | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|----------------------|------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| BIENTA MENOR (10%MO) | | | | 4.282 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 4.281,99 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|-----------------------------------|--------|--------------|----------|-------------|-------------------|
| CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI | M3 | 297.454 | 0,10 | 29.745,40 | |
| AEROTAPA COMPLETA VIBROCOMPACTADA | und | 535.500 | 1,0 | 535.500,00 | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 565.245,40 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------------|--|
| AYUDANTES (2) | 128.233,73 | 171% | 218.736,31 | 0,12 | 26.248,36 | |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,12 | 16.571,51 | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 42.819,87 | |

Total Costo Directo

612.347,26

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|-------------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 91.852,09 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 30.617,36 | |
| UTILIDAD | 5% | 30.617,36 | |
| Sub-Total | | | 153.086,81 |

Precio unitario total aproximado al peso

765.434,00



ING. JOHN JAIRD PEÑA SERRATO
C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTA D.C.
M.P. No. 25202- 46597CND
R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION (DIAMETRO 1.20 Mts)

ESPECIFICACIÓN: 19,1,11

Sumidero en concreto 3.000 PSI (Incluye rejilla vibro compactada de 1,06x0,46)

UNIDAD : UND

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unif. | |
|----------------------|------|--------|-------------|-------------|-----------------|
| BIENTA MENOR (10%MO) | | | | 8.386 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 8.385,58 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unif. | Cantidad | Valor-Unif. | |
|---|--------|--------------|----------|-------------|-------------------|
| CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI | M3 | 297.454 | 0,400 | 118.981,60 | |
| PUNTILLA (PROMEDIO) | LB | 3.132 | 1,5 | 4.698,00 | |
| TABLA PARA FORMALETA DE 1' X 10' X 2,9 M | M | 1.583 | 3,5 | 5.540,50 | |
| VARILLON SAJD | M | 1.392 | 3,5 | 4.872,00 | |
| ALAMBRE NEGRO | KG | 6.176 | 0,30 | 1.852,80 | |
| REJILLA VIBRO COMPACTADA (1,05*0,46*0,12) | UND | 456.167 | 1,00 | 456.167,00 | |
| Sub-Total | | | | | 592.111,90 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unif. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unif. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------------|--|
| AYUDANTES (2) | 126.233,73 | 171% | 218.736,31 | 0,235 | 51.403,03 | |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,235 | 32.452,54 | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 83.855,58 | |

Total Costo Directo


684.353,03

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|-------------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 102.652,95 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 34.217,65 | |
| UTILIDAD | 5% | 34.217,65 | |
| Sub-Total | | | 171.088,26 |

Precio unitario total aproximado al peso

855.441,00



ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
C.E. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
M.P. No. 25202-46597CND
R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAI S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A.E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION (OTROS) ESPECIFICACIÓN: 20,12
 ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE 24x6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO UNIDAD : UND

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit. |
|----------------------|------|-------------|-------------|-----------------|
| SIENNA MENOR (10%MO) | | | | 5.791 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub-Total | | | | 5.790,68 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. |
|--|--------|--------------|----------|-------------------|
| SILLA YEE 20x6" PVC (Incluye caucho) | UND | 400.388 | 1,0 | 400.388,87 |
| Adhesivo para tubería de pared estructural | und | 50.000 | 0,2 | 10.000,00 |
| LIMPIADOR PVC 12 ONZAS | UND | 15.181 | 0,09 | 1.366 |
| ALAMBRE GALVANIZADO CAL 12 | KG | 4.167 | 0,015 | 62,50 |
| | | | | |
| Sub-Total | | | | 411.817,46 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. |
|------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|------------------|
| AYUDANTES (1) | 64.116,87 | 171% | 109.368,15 | 0,234 | 26.592,15 |
| OFICIAL (1) | 64.785,78 | 183% | 138.085,93 | 0,234 | 32.314,45 |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 57.906,60 |

Total Costo Directo


475.514,71

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total |
|------------------|------------|-------------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 71.327,21 |
| IMPREVISTOS | 5% | 23.775,74 |
| UTILIDAD | 5% | 23.775,74 |
| Sub-Total | | 118.878,69 |

Precio unitario total aproximado al peso

594.393,00


 ING. JHONAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTA D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A.E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

ITEM: ENTIBADO TIPO 1A (DISCONTINUO EN MADERA)

ESPECIFICACIÓN: 20,48

UNIDAD : M²

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---------------------|------|-------------|-------------|-------------|--------|
| PISTA MENOR (10%MO) | | | | 821 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 820,71 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|------------------------------------|----------------|--------------|----------|-------------|-----------|
| TABLERO DE 0.7* 1,4 EN TABLA CHAPA | M ² | 75.000 | 0,1 | 7.500,00 | |
| MADERA ROLLIZA (VARA) | ML | 12.500 | 0,21 | 2.625,00 | |
| TABLA BURRA ORDINARIA DE 25 cms | ML | 3.763 | 0,400 | 1.505,20 | |
| PUNTILLA PROMEDIO | LB | 3.132 | 0,461 | 1.443,70 | |
| Sub-Total | | | | | 13.073,90 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|-----------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
| AYUDANTES (2) | 128.233,73 | 171% | 218.736,31 | 0,023 | 5.080,94 | |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,63 | 0,023 | 3.176,21 | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 8.207,14 | |

Total Costo Directo


22.101,76

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|----------------|------------|-------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 3.315,26 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 1.105,09 | |
| UTILIDAD | 5% | 1.105,09 | |
| Sub-Total | | 5.525,44 | |

Precio unitario total aproximado al peso

27.627,00


 ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAI S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

ITEM: Manejo de aguas 24 horas continuas grado de dificultad maximo

ESPECIFICACIÓN: 29,81

UNIDAD : Día

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit. |
|---|-----------|-------------|-------------|-------------------|
| HERRAMIENTA MENOR | | | | 48,640 |
| MOTOBOMBA SUMERGIBLE 3" CON MAGUERA (2) (24 Hrs) | Electrica | 82.233 | 1,250 | 102.791 |
| Planta electrica disasel (24 Hrs) | Disasel | 15.825 | 16,00 | 250.000 |
| | | | | |
| Sub-Total | | | | 401.431,26 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. |
|---------------------------|--------|--------------|----------|------------------|
| Fibras | Und | 400 | 5,3 | 2.132,00 |
| Arena para relleno fibras | M3 | 35.000 | 1,33 | 46.375,00 |
| | | | | |
| Sub-Total | | | | 48.507,00 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|
| AYUDANTES (2) | 128.233,73 | 171% | 218.736,31 | 0,52 | 113.742,88 |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 183% | 138.085,93 | 0,52 | 71.809,88 |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 185.552,76 |

Total Costo Directo


635.491,01

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total |
|------------------|------------|-------------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 95.323,65 |
| IMPREVISTOS | 5% | 31.774,55 |
| UTILIDAD | 5% | 31.774,55 |
| Sub-Total | | 158.872,75 |

Precio unitario total aproximado al peso

794.364,00


ING. JOHN JAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
 M.P. No. 25202-46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPROMISOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6

UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A.E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

OTROS

ITEM: Plataforma en madera provisional para circulación peatonal barrio eden incluye armado y desmonte diario
 ESPECIFICACIÓN: 20,62
 UNIDAD : UND m

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unid. |
|----------------------------|------|--------|-------------|-------------|
| HERRAMIENTA MENOR (10%/MO) | | | | 19.063,32 |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub-Total | | | | 19.063,32 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unif. | Cantidad | Valor-Unif. |
|--|--------|--------------|----------|-------------|
| TABLA PARA FORMALETA DE 1" X 10" X 2,9 M | M | 1.583 | 0,30 | 475,00 |
| PUNTILLA (PROMEDIO) | LB | 3.132 | 0,85 | 2.662,20 |
| CUARTÓN DE SAJO 2" X 4" X 2,9 M | M | 1.392 | 0,60 | 835,20 |
| TABLERO 1,40X 0,70 | Und | 28.350 | 0,42 | 11.907,00 |
| | | | | |
| Sub-Total | | | | 15.879,40 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unif. |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unif. |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| AYUDANTES (6) | 384.701,20 | 171% | 656.208,92 | 0,240 | 157.490,14 |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,240 | 33.143,02 |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 190.633,16 |

Total Costo Directo


225.575,86

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total |
|------------------|------------|-------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 33.838,38 |
| IMPREVISTOS | 5% | 11.278,79 |
| UTILIDAD | 5% | 11.278,79 |
| Sub-Total | | 56.393,97 |

Precio unitario total aproximado al peso

281.970,00


ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
 M.P. No. 252D2-46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/D RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL I.B.A.L.S.A.E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO I.B.A.E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

OTROS

ITEM: Limpieza manual fondo de zanja material contaminante

ESPECIFICACIÓN: 20,83

UNIDAD : M

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit. |
|---------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| HERRAMIENTA MENOR (10%MO) | | | | 1,203 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub-Total | | | | 1,203,05 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. |
|------------------|--------|--------------|----------|-------------|
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| Sub-Total | | | | 0,00 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| AYUDANTES (2) | 128.233,73 | 171% | 218.736,31 | 0,055 | 12.030,50 |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 12.030,50 |

Total Costo Directo


13,233,55

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total |
|------------------|------------|-------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 1.985,03 |
| IMPREVISTOS | 5% | 661,68 |
| UTILIDAD | 5% | 661,68 |
| Sub-Total | | 3.308,39 |

Precio unitario total aproximado al peso

16,542,00


ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R.I. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A.E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

OTROS

ITEM: Codo 6" alcantarillado TDP

ESPECIFICACIÓN: 20,64

UNIDAD : UND

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unif. | |
|---------------------------|------|-------------|-------------|-------------|----------|
| HERRAMIENTA MENOR (10%MO) | | | | 2.475 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 2.474,64 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unif. | Cantidad | Valor-Unif. | |
|----------------------------|--------|--------------|----------|-------------|-----------|
| Codo 6" alcantarillado TDP | UND | 45.000 | 1,0 | 45.000,00 | |
| Sellos de caucho | UND | 10.000 | 2,0 | 20.000,00 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0,00 | |
| Sub-Total | | | | | 65.000,00 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unif. | |
|-----------|------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unif. | |
|---------------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
| AYUDANTES (1) | 64.116,87 | 171% | 108.368,15 | 0,100 | 10.836,82 | |
| OFICIAL (1) | 64.795,76 | 163% | 138.085,93 | 0,100 | 13.809,59 | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 24.746,41 | |

Total Costo Directo

92.221,05

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|----------------|------------|-------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 13.833,16 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 4.611,05 | |
| UTILIDAD | 5% | 4.611,05 | |
| Sub-Total | | 23.056,26 | |

Precio unitario total aproximado al peso

115.276,00



ING. JUAN JAIRO PEÑA SERRATO
C.C. No. 79'474.196 DE BOGOTÁ D.C.
M.P. No. 25202-46597CND
R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A.E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

OTROS

ITEM: Demolicion y retiro de tuberia al existente

ESPECIFICACIÓN: 20,65

UNIDAD : M

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit. |
|---------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| HERRAMIENTA MENOR (10%MO) | | | | 875 |
| RETROCARGADOR | dia | 915.570 | 0,030 | 27.467,09 |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub-Total | | | | 28.342,04 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. |
|-------------|--------|--------------|----------|-------------|
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| Sub-Total | | | | 0,00 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. |
|-----------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. |
|---------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| AYUDANTES (2) | 128.233,73 | 171% | 218.736,31 | 0,040 | 8.749,45 |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 8.749,45 |

Total Costo Directo


37.091,49

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total |
|----------------|------------|-------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 5.563,72 |
| IMPREVISTOS | 5% | 1.854,57 |
| UTILIDAD | 5% | 1.854,57 |
| Sub-Total | | 9.272,87 |

Precio unitario total aproximado al peso

46.364,00


 ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTA D.C.
 M.P. No. 25202-46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

OTROS

ESPECIFICACIÓN: 20,87

ITEM: DEMOLICION POZOS EXISTENTES

UNIDAD : m

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|-------------------|------|---------|-------------|-------------|-------------------|
| HERRAMIENTA MENOR | | | | 20.695,27 | |
| COMPRESOR | dia | 900.000 | 0,230 | 207.000,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 227.696,27 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|------------------|--------|--------------|----------|-------------|-------------|
| | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cent. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|--|
| AYUDANTE (2) | 128.233,73 | 171% | 218.736,91 | 0,580 | 126.867,06 | |
| OFICIALES (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,580 | 80.095,64 | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 208.962,70 | |

Total Gasto Directo


434.658,97

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|-------------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 65.198,84 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 21.732,98 | |
| UTILIDAD | 5% | 21.732,95 | |
| Sub-Total | | | 108.664,74 |

Precio unitario total aproximado al peso

543.324,00


ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6



**CONSORCIO
SECTOR 6**

NIT: 901.490.124-1

DISTRITO HIDRAULICO N° 6

Ibagué, 22 de septiembre de 2021

Oficio 012 - C.S.6

Señores:

CONSORCIO

INTERVENTORIA EXTERNA IBAL

R.L. LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMÍREZ

CC ARROYUELOS LOCAL 6

Interventor contrato de obra N° 0089 del 18 de junio de 2021

Ciudad

ASUNTO: ACTAS DE VECINDAD SECTOR HPP CALLE 52-JORDAN 7 MZ 67

La presente es con el motivo de hacerle entrega para su respectiva firma, de las actas de vecindad en **ORIGINAL FIRMADO** debidamente diligenciadas a la fecha (**19 actas – 38 folios**), correspondientes a las viviendas del sector barrio calle 52 Mz A de Hacienda Piedra pintada y Jordán 7 Etapa, donde se realizará la reposición de las redes correspondientes.

HACIENDA PIEDRA PINTADA CALLE 52 Mz A

- Calle 52 Mz A (**8 actas -16 folios**)

JORDAN 7 ETAPA

- Mz 67 (**11 actas -22 folios**)

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


CONSORCIO SECTOR 6

R.L. ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO

C.C. N° 79.474.136 DE BOGOTÁ

Carrera 5 N° 11 – 24 . Ed Torre Empresarial - Of 401 . (8) 261 79 60
Ibagué - Tolima



**CONSORCIO
SECTOR 6**

NIT: 901.400.124-1

DISTRITO HIDRAULICO Nº 6

Ibagué, 22 de septiembre de 2021

Oficio 010 - C.S.6

Señores:

CONSORCIO

INTERVENTORIA EXTERNA IBAL

R.L. LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMÍREZ

CC ARROYUELOS LOCAL 6

Interventor contrato de obra N° 0089 del 18 de junio de 2021

Ciudad

Asunto: AJUSTES ITEMS NO PREVISTOS

Cordial saludo,

Según las conclusiones y directrices acordadas en reunión sostenida de manera presencial en su oficina el viernes 17 de septiembre de 2021; nos permitimos hacerle entrega de la relación de ITEMS NO PREVISTOS con sus respectivos análisis de precio unitarios (APU) y con las modificaciones y sugerencias pactadas de mutuo acuerdo; con el propósito que se lleven a cabo las instancias pertinentes para su debida inclusión y legalización contractual.

Por lo anterior y con el ánimo de socializar los mismos, se relacionan a continuación los ítems en consideración:

| ACUEDUCTO | | | |
|------------------|--------------------------------|---------------|--------------------|
| ITEM | ACTIVIDADES | UNIDAD | VR.UNITARIO |
| | ITEMS NUEVOS | | |
| 1 | PRELIMINARES | | |
| 1,12 | Acarreo interno en obra 50 mts | m3 | \$ 16.231,00 |
| 3 | EXCAVACIONES A MANO | | |
| | De 0 a 2 mts en seco | | |
| 3,2 | Excavaciones en coglomerado | m3 | \$36.481,00 |
| 3,3 | Excavaciones en roca | m3 | \$73.056,00 |
| | EXCAVACIONES A MAQUINA | | |
| | De 0-2 mts en seco | | |
| 4,2 | Excavaciones en roca | m3 | \$49.871,00 |

Carrera 5 N° 11 - 24, Ed Torre Empresarial - Of 401 . (8) 261 79 60

Ibagué - Tolima





**CONSORCIO
SECTOR 6**

DISTRITO HIDRAULICO N° 8

NIT: 901.490.124-1

| ACUEDUCTO | | | |
|-----------------------|---|---------------|--------------------|
| ITEM | ACTIVIDADES | UNIDAD | VR.UNITARIO |
| 5,0 | CONCRETOS | | |
| 5,2 | Instalación y suministro de concreto de 17,2 Mpa (2.500 Psi) | m3 | \$565.241,00 |
| 5,13 | Anden en concreto de 2500 PSI e=0,10 (incluye alistado y nivelación) | m2 | \$82.323,00 |
| 5,14 | Sardinel en concreto de 2500 PSI fundido en sitio seccion trapezoidal de (0,15 -0,20) h=0,40m | m | \$56.144,00 |
| 5,17 | Anclaje en concreto F'c = 17,5 Mpa para accesorios 3" | Und | \$255.710,00 |
| 6 | OBRAS DE PAVIMENTACIÓN | | |
| 6,21 | Rotura de Pavimento Flexible | m3 | \$103.640,00 |
| 20 | OTROS | | |
| 20,56 | Reparación en pvc daños en red acueducto 3". Incluye excavacion manual | Und | \$987.607,00 |
| 20,57 | Reparacion en manguera polietileno 1/2" acometidas acueducto. Incluye excavacion manual | Und | \$69.805,00 |
| 20,58 | Reparacion daños en red gas pealpe 1/2"-3/4". Incluye excavacion manual | Und | \$254.796,00 |
| 20,59 | Reparacion daños en red gas pealpe 1 1/4" -2". Incluye excavacion manual | Und | \$1.969.105,00 |
| 20,60 | Reparacion daños en red gas PE 80 3". Incluye excavacion manual | Und | \$2.613.456,00 |
| 20,61 | Reparacion en manguera polietileno 3/4" acometidas acueducto. Incluye excavacion manual | Und | \$102.009,00 |
| 22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS | | |
| 22,21 | Suministro e Instalacion de Collar de Derivacion en PVC de 4" X 1/2" | Und | \$52.273,00 |
| 22,52 | Suministro e instalacion curva presion 11.25 RDE 21 3" | Und | \$89.919,00 |
| 22,53 | Suministro e instalacion curva presion 22.5 RDE 21 3" | Und | \$95.350,00 |
| 22,54 | Suministro e instalacion curva presion 45 RDE 21 3" | Und | \$130.910,00 |
| 22,55 | Suministro e Instalacion tee reduc 3"x2"x3" | Und | \$145.476,00 |
| 24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PRESION RDE 21 | | |
| 24.1 | De 0,00 a 2.00 Mts | | |
| 23,1,1 | De Diámetro 2" | m | \$26.605,00 |
| 23,1,3 | De Diámetro 4" | m | \$69.326,00 |
| ALCANTARILLADO | | | |
| ITEM | ACTIVIDADES | UNIDAD | VR.UNITARIO |
| | ITEMS NUEVOS | | |
| 2 | DEMOLICIONES | | |
| 2,2 | Demolición Muro doble E=0,25 | m2 | \$22.968,00 |
| 2,5 | Demolición Estructura Concreto Reforzado (Medio mecanico) | m3 | \$ 141.267,00 |

Carrera 5 N° 11 - 24 . Ed Torre Empresarial - Of 401 . (8) 261 79 60
Ibagué - Tolima



**CONSORCIO
SECTOR 6**

NIT: 901.490.124-1

DISTRITO HIDRAULICO N° 6

| ALCANTARILLADO | | | |
|-----------------------|--|---------------|--------------------|
| ITEM | ACTIVIDADES | UNIDAD | VR.UNITARIO |
| 3 | EXCAVACIONES A MANO | | |
| | De 0 a 2 mts en seco | | |
| 3,3 | Excavaciones en roca | m3 | \$73.056,00 |
| | De 2 a 4 mts en seco | | |
| 3,9 | Excavaciones en roca | m3 | \$107.346,00 |
| | EXCAVACIONES A MAQUINA | | |
| | De 0-2 mts en seco | | |
| 4,2 | Excavaciones en roca | m3 | \$49.871,00 |
| | De 2-4 mts en seco | | |
| 4,6 | Excavaciones en roca | m3 | \$85.034,00 |
| 5,0 | CONCRETOS | | |
| 5,2 | Instalación y suministro de concreto de 17,2 Mpa (2.500 Psi) | m3 | \$565.241,00 |
| 5,13 | Anden en concreto de 2500 PSI e=0,10 (incluye alistado y nivelación) | m2 | \$82.323,00 |
| 5,14 | Sardinel en concreto de 2500 PSI fundido en sitio seccion trapezoidal de (0,15 -0,20) h=0,40m | m | \$56.419,00 |
| 6 | OBRAS DE PAVIMENTACIÓN | | |
| 6,21 | Rotura de Pavimento Flexible | m3 | \$103.640,00 |
| 18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA Norma Técnica Colombiana 5070 y Norma Técnica Colombiana 4764 (100% de Ermeticidad) | | |
| 18,1,4 | De 2,00 a 4,00 Mts | | |
| | De Diametro 33" | m | \$1.044.341,00 |
| 19 | CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION | | |
| 19,1 | DIAMETRO 1,20 Mts | | |
| 19.1.1 | Base y cañuela en concreto de 3.000 PSI e = 0,30 Mts | und | \$503.936,00 |
| 19.1.2 | Pañete interior | m | \$112.733,00 |
| 19.1.3 | Cilindro en ladrillo e = 0,30 Mts | m | \$486.740,00 |
| 19.1.4 | Cono de reducción H = 0,65 Mts | und | \$452.067,00 |
| 19.1.5 | Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo C/40 cm | und | \$19.664,00 |
| 19.1.6 | Suministro e instalación de Arotapa Completa Vibrocompactada | und | \$765.434,00 |
| 19.1.11 | Sumidero en concreto 3.000 PSI (Incluye rejilla vibro compactada de 1,05x0,46) | und | \$855.441,00 |
| 19.1.16 | Suministro e instalacion rejilla vibro compactada de 1,05x0,46 | und | \$668.164,00 |
| 20 | OTROS | | |
| 20,12 | Suministro e instalación de silla yee 20x6" pvc Incluye agarraderas caucho y adherencia | und | \$594.393,00 |
| 20,48 | Entibado Tipo 1A (Discontinuo en Madera) | m2 | \$27.627,00 |
| 20,56 | Reparacion en pvc daños en red acueducto 3". Incluye excavacion manual | Und | \$987.607,00 |

Carrera 5 N° 11 - 24 . Ed Torre Empresarial - Of 401 . (5) 261 79 60
Ibagué - Tolima



**CONSORCIO
SECTOR 6**

NIT: 901.490.124-1


DISTRITO HIDRAULICO N° 8

| ALCANTARILLADO | | | |
|-----------------------|--|---------------|--------------------|
| ITEM | ACTIVIDADES | UNIDAD | VR.UNITARIO |
| 20,57 | Reparacion en manguera polietileno 1/2" acometidas acueducto. Incluye excavacion manual | | \$69.805,00 |
| 20,58 | Reparacion daños en red gas pealpe 1/2"-3/4". Incluye excavacion manual | Und | \$254.796,00 |
| 20,59 | Reparacion daños en red gas pealpe 1 1/4" -2". Incluye excavacion manual | Und | \$1.969.105,00 |
| 20,60 | Reparacion daños en red gas PE 80 3". Incluye excavacion manual | Und | \$2.613.456,00 |
| 20,61 | Reparacion en manguera polietileno 3/4" acometidas acueducto. Incluye excavacion manual | Und | \$102.009,00 |
| 20,62 | Plataforma en madera provisional para circulacion peatonal barrio eden. Incluye armado y desmonte diario | m | \$281.970,00 |
| 20,63 | Codo 6" alcantarillado TDP | und | \$115.276,00 |
| 20,64 | Desmonte y reubicacion de medidor de agua | und | \$478.409,00 |
| 20,65 | Suministro e instalacion de silla yee 650x160 MM pvc Incluye agarraderas caucho y adherencia | und | \$753.931,00 |
| 20,66 | Suministro e instalacion de tuberia sanitaria 4" | und | \$35.046,00 |
| 20,67 | Suministro e instalacion de codo sanitario 4" | und | \$31.372,00 |
| 20,68 | Suministro e instalacion de semicodo sanitario 4" | und | \$35.122,00 |
| 20,69 | Suministro e instalacion de union sanitaria 4" | und | \$20.077,00 |

NOTA: LOS VALORES YA INCLUYEN AIU DEL 25%

Agradeciendo la atención prestada y su diligencia al respecto.

Atentamente,


CONSORCIO SECTOR 6
R.L. ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
C.C. N° 79.474.136 DE BOGOTÁ

ANEXOS: Se incluye los APU (44) de cada ítem con su respectiva firma

Carrera 5 N° 11 - 24 . Ed Torre Empresarial - Of 401 . (8) 261 79 60
Ibagué - Tolima

Empresarial

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

PRELIMINARES:

ITEM: ACARREO INTERNO EN OBRA 50m

ESPECIFICACIÓN: 1,12 ✓

UNIDAD : m³

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|-------------------|------|--------|-------------|-------------|----------|
| HERRAMIENTA MENOR | | | | 1.473,08 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 1.473,08 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|------------------|--------|--------------|----------|-------------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
| AYUDANTE (4) | 256.467,47 | 171% | 437.472,61 | 0,02 | 8.749,46 | |
| OFICIALES (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,02 | 2.761,92 | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 11.511,37 | |

Total Costo Directo


12.984,45

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 1.947,67 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 649,22 | |
| UTILIDAD | 5% | 649,22 | |
| Sub-Total | | 3.246,11 | |

Precio unitario total aproximado al peso

16.231,00



ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
 M.F. No. 25202- 46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

EXCAVACIONES A MANO DE 0 A 2 MTS EN SECO:
 ITEM: EXCAVACIONES EN CONGLOMERADO

ESPECIFICACIÓN: 3,2 /
 UNIDAD : m³

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|-------------------|------|--------|-------------|-------------|-----------------|
| HERRAMIENTA MENOR | | | | 1.623,97 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 1.623,97 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|------------------|--------|--------------|----------|-------------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA


| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|------------------|--|
| AYUDANTE (1) | 64.116,87 | 171% | 109.368,15 | 0,2520 | 27.560,77 | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 27.560,77 | |

Total Costo Directo 29.184,75

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-----------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 4.377,71 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 1.459,24 | |
| UTILIDAD | 5% | 1.459,24 | |
| Sub-Total | | 7.296,19 | |

Precio unitario total aproximado al peso 36.481,00


ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A.E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUEREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

EXCAVACIONES A MANO DE 0 A 2 MTS EN SECO:
 ITEM: EXCAVACIONES ROCA

ESPECIFICACIÓN: 3,3 /
 UNIDAD : m³

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|-------------------|------|---------|-------------|-------------|------------------|
| HERRAMIENTA MENOR | | | | 2.605,50 | |
| COMPRESOR | dia | 900.000 | 0,033 | 29.700,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 32.305,50 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|------------------|--------|--------------|----------|-------------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA


| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|------------------|--|
| AYUDANTE (1) | 64.116,97 | 171% | 109.368,15 | 0,239 | 26.138,99 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 26.138,99 | |

Total Costo Directo **58.444,49**

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|------------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 8.766,67 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 2.922,22 | |
| UTILIDAD | 5% | 2.922,22 | |
| Sub-Total | | 14.611,12 | |

Precio unitario total aproximado al peso **73.056,00**


 ING. JONAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTA D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

EXCAVACIONES A MAQUINA DE 0 A 2 MTS EN SECO:
 ITEM: EXCAVACIONES EN ROCA

ESPECIFICACIÓN: 4,2
 UNIDAD : m³

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------|---------|-------------|-------------|-----------|
| RETROCARGADOR | dia | 915.570 | 0,039 | 35.521,82 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 35.521,82 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|------------------|--------|--------------|----------|-------------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
| AYUDANTE (2) | 128.233,73 | 171% | 218.736,31 | 0,020 | 4.374,73 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 4.374,73 | |

Total Costo Directo


39.896,54

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 5.984,48 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 1.994,83 | |
| UTILIDAD | 5% | 1.994,83 | |
| Sub-Total | | 9.974,14 | |

Precio unitario total aproximado al peso

49.871,00


ING. JHONAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTA D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

CONCRETOS

ESPECIFICACIÓN: 5,2

ITEM: INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO DE 17,2 Mpa (2.500 PSI)

UNIDAD : UND M3

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unif. |
|----------------------------------|------|---------|-------------|-------------|
| HERRAMIENTA MENOR (10%MO) | | | | 10.961,41 |
| VIBRADOR GASOLINA | DIA | 41.457 | 0,14 | 5.803,98 |
| MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) | HR | 322.134 | 0,09 | 28.992,66 |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub-Total | | | | 45.757,45 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unif. | Cantidad | Valor-Unif. |
|--|--------|--------------|----------|-------------|
| CONCRETO SIMPLE DE 2500 PSI | M3 | 281.533 | 1,050 | 295.609,65 |
| TABLA PARA FORMALETA DE 1" X 10" X 2,9 M | M | 1.563 | 0,220 | 348,33 |
| PUNTILLA (PROMEDIO) | LB | 3.132 | 0,120 | 375,84 |
| CUARTÓN DE SAJO 2" X 4" X 2,9 M | M | 1.392 | 0,4 | 487,20 |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub-Total | | | | 296.821,02 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unif. |
|-----------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unif. |
|---------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| AYUDANTES (6) | 384.701,20 | 171% | 656.208,92 | 0,138 | 90.556,83 |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.085,93 | 0,138 | 19.057,24 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 109.614,07 |

Total Costo Directo


452.192,54

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total |
|----------------|------------|-------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 67.828,88 |
| IMPREVISTOS | 5% | 22.609,63 |
| UTILIDAD | 5% | 22.609,63 |
| Sub-Total | | 113.048,13 |

Precio unitario total aproximado al peso

565.241,00


ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
 M.P. No. 25202-46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

CONCRETOS

ITEM: ANDEN EN CONCRETO e=0,10 (NCLUYE ALISTADO Y NIVELACION)

ESPECIFICACIÓN: 6,13

UNIDAD : m²

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarif | Rendimiento | Valor-Unit. |
|----------------------------------|------|-----------|-------------|-------------|
| HERRAMIENTA MENOR | | | | 1.445,00 |
| MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) | HR | 322.134 | 0,02 | 4.652,81 |
| RANA | dia | 40.267,00 | 0,04 | 1.610,68 |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub-Total | | | | 7.708,49 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. |
|--|--------|--------------|----------|-------------|
| CONCRETO SIMPLE DE 2500 PSI | M3 | 281.533 | 0,105 | 29.560,97 |
| RECEBO | M3 | 29.625 | 0,10 | 2.982,50 |
| TABLA PARA FORMALETA DE 1' X 10' X 2,9 M | M | 1.583 | 1,020 | 1.615,00 |
| PUNTILLA (PROMEDIO) | LB | 3.132 | 0,050 | 156,60 |
| CUARTÓN DE SAJO 2' X 4' X 2,9 M | M | 1.392 | 0,5 | 896,00 |
| | | | | |
| Sub-Total | | | | 35.011,07 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cantl. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. |
|-----------|--------------------|-----------|-------|--------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. |
|---------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| AYUDANTES (6) | 384.701,20 | 171% | 656.208,92 | 0,030 | 19.686,27 |
| OFICIAL (1) | 84.796,76 | 163% | 138.095,93 | 0,025 | 3.452,40 |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 23.138,67 |

Total Costo Directo


65.658,22

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total |
|----------------|------------|-------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 9.878,73 |
| IMPREVISTOS | 5% | 3.292,91 |
| UTILIDAD | 5% | 3.292,91 |
| Sub-Total | | 16.464,56 |

Precio unitario total aproximado al peso

82.323,00


ING. JHONAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

CONCRETOS

ESPECIFICACIÓN: 5,14 ✓

ITEM: Sardinel en concreto de 2500 PSI fundido en sitio seccion trapezoidal de (0,15 -0,20) h=0,40m UNIDAD : m

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarif | Rendimiento | Valor-Unit. |
|----------------------------------|------|---------|-------------|-----------------|
| HERRAMIENTA MENOR | | | | 1.244,00 |
| MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) | HR | 322.134 | 0,00 | 1.208,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub-Total | | | | 2.452,00 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. |
|-----------------------------|--------|--------------|----------|------------------|
| CONCRETO SIMPLE DE 2500 PSI | M3 | 281.533 | 0,070 | 19.707,31 |
| FORMALETA METALICA | Ml | 1.392 | 3,1 | 4.328,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| Sub-Total | | | | 24.035,31 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------------|
| AYUDANTES (6) | 384.701,20 | 171% | 656.208,92 | 0,023 | 15.224,05 |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,023 | 3.203,83 |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 18.427,87 |

Total Costo Directo


44.915,19

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total |
|------------------|------------|------------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 6.737,28 |
| IMPREVISTOS | 5% | 2.245,76 |
| UTILIDAD | 5% | 2.245,76 |
| Sub-Total | | 11.228,80 |

Precio unitario total aproximado al peso

56.144,00


ING. JHONAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.138 DE BOGOTÁ D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

CONCRETOS

ESPECIFICACIÓN: 6.17

ITEM: Anclaje en concreto F'c = 17,5 Mpa para accesorios 3"

UNIDAD : Und

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarif | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|----------------------------------|------|---------|-------------|-------------|------------------|
| HERRAMIENTA MENOR | | | | 11.914,57 | |
| MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) | HR | 322.134 | 0,05 | 15.106,70 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 28.021,27 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|--|--------|--------------|----------|-------------|------------------|
| CONCRETO SIMPLE DE 2500 PSI | M3 | 281.533 | 0,200 | 56.306,60 | |
| TABLA PARA FORMALETA DE 1" X 10" X 2,9 M | M | 1.563 | 0,50 | 791,67 | |
| PUNTILLA (PROMEDIO) | LB | 3.132 | 0,03 | 93,96 | |
| CUARTÓN DE SAJO 2" X 4" X 2,9 M | M | 1.392 | 0,15 | 208,80 | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 57.401,03 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|--|
| AYUDANTES (e) | 384.701,20 | 171% | 656.208,92 | 0,150 | 98.431,34 | |
| OFICIAL (t) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,150 | 20.714,39 | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 119.145,73 | |

Total Costo Directo

204.568,03

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|------------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 30.685,20 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 10.228,40 | |
| UTILIDAD | 5% | 10.228,40 | |
| Sub-Total | | | 51.142,01 |

Precio unitario total aproximado al peso

256.710,00

ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
M.P. No. 25202- 46597CND
R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A.E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

OBRAS DE PAVIMENTACION
 ITEM: Rotura de Pavimento Flexible

ESPECIFICACIÓN: 6,21 /
 UNIDAD : m³

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|-------------------|------|---------|-------------|-------------|------------------|
| HERRAMIENTA MENDR | | | | 656,00 | |
| COMPRESOR | dia | 900.000 | 0,030 | 28.655,03 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 27.311,03 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|------------------|--------|--------------|----------|-------------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

III. TRANSPORTES

| Materia | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA


| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------------|--|
| AYUDANTE (6) | 384.701,20 | 171% | 656.208,92 | 0,070 | 45.934,62 | |
| OFICIALES (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,070 | 9.666,72 | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 55.601,34 | |

Total Costo Directo 82.912,37

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|------------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 12.436,86 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 4.145,62 | |
| UTILIDAD | 5% | 4.145,62 | |
| Sub-Total | | 20.728,09 | |

Precio unitario total aproximado al peso 103.640,00


 ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTA D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

20 OTROS

ITEM: Reparacion en pvc daños en red acueducto 3". Incluye excavacion manual

ESPECIFICACIÓN: 20,56 /

UNIDAD : Und

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. |
|----------------------|-----------|--------|-------------|-------------|
| MIENTA MENDR (10%MO) | | | | 34,970 |
| PULIDRA | Electrica | 25.000 | 2,00 | 50.000,00 |
| PLANTA ELECTRICA | Gasolina | 69.900 | 1,00 | 69.900,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub-Total | | | | 154.869,56 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. |
|------------------------------------|--------|--------------|----------|-------------|
| TUBERIA PVC PRESION DE 3" RDE21 | ML | 22.552,65 | 1,5 | 33.828,98 |
| ACCESORIOS PVC PRESIÓN (% Tubería) | 5%Tub | 1.691 | 1,0 | 1.691,45 |
| UNION DRESSER 3" | Und | 125.000 | 2,0 | 250.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub-Total | | | | 285.520,42 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| AYUDANTE (2) | 128.233,73 | 171% | 218.736,31 | 0,98 | 214.361,58 |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 183% | 138.095,93 | 0,98 | 135.334,01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 349.695,59 |

Total Costo Directo


790.085,57

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total |
|------------------|------------|-------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 118.512,84 |
| IMPREVISTOS | 5% | 39.504,28 |
| UTILIDAD | 5% | 39.504,28 |
| Sub-Total | | 197.521,39 |

Precio unitario total aproximado al peso

987.607,00


ING. JONAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTA D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

**"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6
UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDA D DE IBAGUÉ"**

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO I.S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

20 OTROS

ITEM: Reparacion en manguera polietileno 1/2" acometidas acueducto. Incluye excavacion manual

ESPECIFICACIÓN: 20,57 ✓

UNIDAD : Und

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|----------------------|-----------|--------|-------------|-------------|-----------------|
| MIENTA MENOR (10%MO) | | | | 3.558 | |
| PULIDORA | Electrica | 25.000 | 0,04 | 1.000,00 | |
| PLANTA ELECTRICA | Gasolina | 69.900 | 0,04 | 2.796,00 | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 7.364,32 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|-------------------|--------|--------------|----------|-------------|------------------|
| MANGUERA P.F 1/2" | M | 2.250 | 1,50 | 3.375,38 | |
| UNION P.F DE 1/2" | UND | 4.230 | 2,0 | 8.459,26 | |
| SOLDADURA | UND | 17.454 | 0,02 | 349,07 | |
| LIMPIADOR | UND | 15.181 | 0,02 | 303,62 | |
| CINTA DE TEFLON | UND | 7.728 | 0,04 | 309,05 | |
| Sub-Total | | | | | 12.796,39 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------------|--|
| AYUDANTE (2) | 128.233,73 | 171% | 218.736,31 | 0,10 | 21.873,63 | |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,10 | 13.809,59 | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 35.683,22 | |

Total Costo Directo


55.843,93

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|------------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 8.376,59 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 2.792,20 | |
| UTILIDAD | 5% | 2.792,20 | |
| Sub-Total | | | 13.960,98 |

Precio unitario total aproximado al peso

69.805,00


ING. HON JAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTA D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

**"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6
UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"**

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

20 OTROS

ESPECIFICACIÓN: 20,58

ITEM: Reparacion daños en red gas pe al pe 1/2"-3/4". Incluye excavacion manual

UNIDAD : Und

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---------------------------|------|--------|-------------|-------------|-----------|
| HERRAMIENTA MENOR (10%MO) | | | | 16,085 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 16.085,17 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|-----------------------------------|--------|--------------|----------|-------------|-----------|
| MANGUERA PE AL PE 16 (0,5"-0,75") | ML | 3.100,00 | 1,0 | 3.100,00 | |
| UNIDNES PE AL PE 16 | Und | 2 | 11.900,0 | 23.800,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 26.900,00 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
| AYUDANTE (1) | 84.116,87 | 171% | 109.368,15 | 0,65 | 71.089,30 | |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,65 | 89.762,35 | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 160.851,65 | |

Total Costo Directo


203.836,82

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 30.575,52 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 10.191,84 | |
| UTILIDAD | 5% | 10.191,84 | |
| Sub-Total | | 50.959,20 | |

Precio unitario total aproximado al peso

254.796,00


ING. JHON JAIRD PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R I CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

20 OTROS

ITEM: Reparacion daños en red gas pa al pe 1,25"-2". incluye excavacion manual

ESPECIFICACIÓN: 20,59

UNIDAD : Und

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---------------------------|------|--------|-------------|-------------|-------------------|
| HERRAMIENTA MENOR (10%MO) | | | | 136.105 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 136.105,25 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|--------------------------------|--------|--------------|----------|-------------|------------------|
| TUBERIA PE AL PE 16 (1,25"-2') | ML | 15.105,00 | 1,2 | 18.126,00 | |
| UNIONES PE AL PE 16 | Und | 2 | 30.000,0 | 60.000,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 78.126,00 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------------|--|
| AYUDANTE (1) | 64.116,87 | 171% | 109.368,15 | 5,50 | 601.524,84 | |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 5,50 | 759.527,61 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 1.361.052,45 | |

Total Costo Directo


1.575.283,70

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 236.292,55 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 78.764,18 | |
| UTILIDAD | 5% | 78.764,18 | |
| | | | |
| Sub-Total | | 393.820,92 | |

Precio unitario total aproximado al peso

1.969.105,00


ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTA D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO I.S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

20 OTROS

ITEM: Reparacion daños en red gas PE 80 3". Incluye excavacion manual

ESPECIFICACIÓN: 20,60

UNIDAD : Und

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---------------------------|------|--------|-------------|-------------|-------------------|
| HERRAMIENTA MENOR (10%MO) | | | | 185.598 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 185.598,06 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|--------------------|--------|--------------|----------|-------------|------------------|
| TUBERIA PE 80 (3") | ML | 32.791,00 | 1,5 | 49.186,50 | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 49.186,50 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------------|--|
| AYUDANTE (1) | 64.116,87 | 171% | 109.368,15 | 7,50 | 820.261,15 | |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 7,50 | 1.036.719,47 | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 1.855.980,62 | |

Total Costo Directo


2.090.765,18

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|-------------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 313.614,78 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 104.538,26 | |
| UTILIDAD | 5% | 104.538,26 | |
| Sub-Total | | | 522.691,30 |

Precio unitario total aproximado al peso

2.613.456,00


ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTA D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO I.S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

20 OTROS

ITEM: Reparacion en manguera polietileno 3/4" acometidas acueducto. Incluye excavación manual

ESPECIFICACIÓN: 20,61

UNIDAD : Und

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|-------------------------|-----------|--------|-------------|-------------|----------|
| PISTONETA MENOR (10%MO) | | | | 3.568 | |
| PULIDORA | Electrica | 25.000 | 0,04 | 1.000,00 | |
| PLANTA ELECTRICA | Gasolina | 69.900 | 0,04 | 2.796,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 7.364,32 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|-------------------|--------|--------------|----------|-------------|-----------|
| MANGUERA P.F 3/4" | M | 4.512 | 1,50 | 6.768,00 | |
| UNION P.F DE 3/4" | UND | 15.415 | 2,0 | 30.830,00 | |
| SOLDADURA | UND | 17.454 | 0,02 | 349,07 | |
| LIMPIADOR | UND | 15.181 | 0,02 | 303,62 | |
| CINTA DE TEFLON | UND | 7.726 | 0,04 | 309,05 | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 38.559,75 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
| AYUDANTE (2) | 128.233,73 | 171% | 218.736,31 | 0,10 | 21.873,63 | |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 153% | 138.095,93 | 0,10 | 13.809,59 | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 35.683,22 | |

Total Costo Directo


81.607,29

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|-----------|
| ADMINISTRACION | 15% | 12.241,09 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 4.080,36 | |
| UTILIDAD | 5% | 4.080,36 | |
| | | | |
| Sub-Total | | | 20.401,82 |

Precio unitario total aproximado al peso

102.009,00


ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
 e.c. No. 79'474.136 DE BOGOTA D.C.
 M.P. No. 25202-46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLAR DE DERIVACION EN PVC DE 4" X1/2"

ESPECIFICACIÓN: 22.21 /
UNIDAD : und

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| HERRAMIENTA MENOR (10%MO) | | | | 2.079 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 2.078,70 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|-------------------------------------|--------|--------------|----------|-------------|------------------|
| COLLAR DE DERIVACION EN PVC 4"X1/2" | UND | 18.953 | 1,0 | 18.952,67 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 18.952,67 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Paso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|------------------|--|
| AYUDANTES (1) | 64.116,87 | 171% | 109.368,15 | 0,084 | 9.186,92 | |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.085,93 | 0,084 | 11.600,06 | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 20.786,98 | |

Total Costo Directo


41.818,35

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|------------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 6.272,75 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 2.090,92 | |
| UTILIDAD | 5% | 2.090,92 | |
| Sub-Total | | 10.454,59 | |

Precio unitario total aproximado al peso

52.273,00


ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R.I. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA
 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6
 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAI S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO I. S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS

ESPECIFICACIÓN: 22,62

ITEM: Suministro e instalación curva presión 11.25 RDE 21 3"

UNIDAD : Und

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---------------------------|------|--------|-------------|-------------|----------|
| HERRAMIENTA MENOR (10%MO) | | | | 2.475 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 2.474,64 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|-------------------------------|--------|--------------|----------|-------------|-----------|
| Curva presión 11.25 RDE 21 3" | Und | 44.714,25 | 1,0 | 44.714,25 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 44.714,25 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
| AYUDANTE (1) | 84.118,87 | 171% | 109.368,15 | 0,10 | 10.936,82 | |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,10 | 13.809,59 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 24.746,41 | |

Total Costo Directo


71.935,30

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 10.790,29 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 3.596,76 | |
| UTILIDAD | 5% | 3.596,76 | |
| Sub-Total | | 17.983,82 | |

Precio unitario total aproximado al peso

89.919,00


 ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
 M.P. No. 25202-46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS
ITEM: Suministro e Instalacion curva presion 22.5 RDE 21 3"

ESPECIFICACIÓN: 22,53
UNIDAD : Und

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---------------------------|------|--------|-------------|-------------|-----------------|
| HERRAMIENTA MENOR (10%MO) | | | | 2.475 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 2.474,64 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|------------------------------|--------|--------------|----------|-------------|------------------|
| Curva presion 22.5 RDE 21 3" | Und | 49.058,94 | 1,0 | 49.058,94 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 49.058,94 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|------------------|--|
| AYUDANTE (1) | 64.116,87 | 171% | 109.368,15 | 0,10 | 10.936,82 | |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,10 | 13.809,59 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 24.746,41 | |

Total Costo Directo


76.279,99

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|------------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 11.442,00 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 3.814,00 | |
| UTILIDAD | 5% | 3.814,00 | |
| Sub-Total | | 19.070,00 | |

Precio unitario total aproximado al peso

95.350,00


ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
M.P. No. 25202-46597CND
R.L. CONSORCIO SECTOR 6

**"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6
UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"**

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A E.S.P OFICIAL. | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS

ESPECIFICACIÓN: 22,64

ITEM: Suministro e instalacion curva presion 45 RDE 21 3"

UNIDAD : Und

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---------------------------|------|--------|-------------|-------------|----------|
| HERRAMIENTA MENDR (10%MO) | | | | 2.475 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 2.474,64 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|----------------------------|--------|--------------|----------|-------------|-----------|
| Curva presion 45 RDE 21 3" | Und | 77.507,08 | 1,0 | 77.507,08 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 77.507,08 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
| AYUDANTE (1) | 64.116,87 | 171% | 109.368,15 | 0,10 | 10.936,82 | |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,10 | 13.809,59 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 24.746,41 | |

Total Costo Directo


104.728,13

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 15.709,22 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 5.236,41 | |
| UTILIDAD | 5% | 5.236,41 | |
| | | | |
| Sub-Total | | 26.182,03 | |

Precio unitario total aproximado al paso

130.910,00


ING. JHONAIRO PEÑA SERRATO
C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTA D.C.
M.P. No. 25202-46597CND
R.I. CONSORCIO SECTOR 6

**"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6
UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"**

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A.E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PRESION RDE 21 (DE 0 A 2 MTS)
ITEM: DE DIÁMETRO 2"

ESPECIFICACIÓN: 23,1,1 ✓
UNIDAD : m

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---------------------|------|--------|-------------|-------------|--------|
| MENTA MENOR (10%MO) | | | | 748 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 748,24 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|------------------------------------|--------|--------------|----------|-------------|-----------|
| TUBERIA PVC PRESION DE 2" RDE21 | ML | 10.234 | 1,0 | 10.234,00 | |
| ACCESORIOS PVC PRESIÓN (% Tubería) | 5%Tub | 2.559 | 1,0 | 2.558,50 | |
| SOLDADURA | UND | 17.454 | 0,008 | 139,63 | |
| LIMPIADOR | UND | 15.181 | 0,008 | 121,45 | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 13.053,58 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
| AYUDANTE (4) | 268.487,47 | 171% | 437.472,61 | 0,0130 | 5.887,14 | |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,0130 | 1.795,25 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 7.482,39 | |

Total Costo Directo


21.284,21

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 3.192,63 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 1.064,21 | |
| UTILIDAD | 5% | 1.064,21 | |
| | | | |
| Sub-Total | | 5.321,05 | |

Precio unitario total aproximado al peso

26.605,00


ING. JOHN JAIRO PEÑA SERRATO
C.C. No. 75474.136 DE BOGOTA D.C.
M.P. No. 25202-46597CND
R.L. CONSORCIO SECTOR 6

**"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6
UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"**

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PRESION RDE 21 (DE 0 A 2 MTS)

ESPECIFICACIÓN: 24,13 ✓

ITEM: DE DIÁMETRO 4"

UNIDAD : m

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. |
|----------------------|------|--------|-------------|-----------------|
| BIENTA MENOR (10%MO) | | | | 1.491 |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub-Total | | | | 1.490,72 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. |
|------------------------------------|--------|--------------|----------|------------------|
| TUBERIA PVC PRESION DE 4" RDE 21 | ML | 36.954 | 1,0 | 36.954,00 |
| ACCESORIOS PVC PRESIÓN (% Tubería) | 5%Tub | 1.848 | 1,0 | 1.847,70 |
| SOLDADURA | UND | 17.454 | 0,008 | 139,63 |
| LIMPIADOR | UND | 15.181 | 0,008 | 121,45 |
| | | | | |
| Sub-Total | | | | 39.062,78 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------------|
| AYUDANTE (4) | 256.467,47 | 171% | 437.472,61 | 0,0259 | 11.330,54 |
| OFICIAL (1) | 64.785,76 | 163% | 136.095,93 | 0,0259 | 3.576,66 |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 14.907,23 |

Total Costo Directo


55.460,73

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total |
|------------------|------------|------------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 8.319,11 |
| IMPREVISTOS | 5% | 2.773,04 |
| UTILIDAD | 5% | 2.773,04 |
| Sub-Total | | 13.865,18 |

Precio unitario total aproximado al peso

69.326,00


ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
 C.E. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
 M.P. No. 25202-46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

DEMOLICIONES:
 ITEM: DEMOLICION MURO DOBLE E=0,25

ESPECIFICACIÓN: 2.2 ✓
 UNIDAD : m²

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|-------------------|------|--------|-------------|-------------|-----------------|
| HERRAMIENTA MENOR | | | | 1.670,38 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 1.670,38 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|------------------|--------|--------------|----------|-------------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA


| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|------------------|--|
| AYUDANTE (1) | 64.116,87 | 171% | 109.368,15 | 0,068 | 7.382,35 | |
| OFICIALES (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,068 | 9.321,48 | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 16.703,83 | |

Total Costo Directo **18.374,21**

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-----------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 2.756,13 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 918,71 | |
| UTILIDAD | 5% | 918,71 | |
| Sub-Total | | 4.593,55 | |

Precio unitario total aproximado al peso **22.968,00**


ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R.L. CONSDRCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

DEMOLICIONES:
 ITEM: DEMOLICION ESTRUCTURA CONCRETO REFORZADD (MEDIO MECANICO)

ESPECIFICACIÓN: 2,6
 UNIDAD : m³

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|-------------------|------|---------|-------------|-------------|-----------|
| HERRAMIENTA MENOR | | | | 7.655,77 | |
| COMPRESOR | dia | 900.000 | 0,032 | 28.800,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 36.455,77 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|------------------|--------|--------------|----------|-------------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Caril. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|--------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA


| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
| AYUDANTE (2) | 128.233,73 | 171% | 218.736,31 | 0,350 | 76.557,71 | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 76.557,71 | |

Total Costo Directo 113.013,48

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 16.952,02 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 5.650,67 | |
| UTILIDAD | 5% | 5.650,67 | |
| Sub-Total | | 28.253,37 | |

Precio unitario total aproximado al peso 141.267,00


ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUEREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

EXCAVACIONES A MANO DE 2 A 4 MTS EN SECO:
 ITEM: EXCAVACIONES ROCA

ESPECIFICACIÓN: 3,9
 UNIDAD : m³

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|-------------------|------|---------|-------------|-------------|------------------|
| HERRAMIENTA MENOR | | | | 3.085,50 | |
| COMPRESOR | día | 900.000 | 0,048 | 43.200,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 46.285,50 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|------------------|--------|--------------|----------|-------------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------------|--|
| AYUDANTE (2) | 128.233,73 | 171% | 218.736,31 | 0,181 | 39.591,27 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 39.591,27 | |

Total Costo Directo


85.876,77

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|------------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 12.881,52 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 4.293,84 | |
| UTILIDAD | 5% | 4.293,84 | |
| Sub-Total | | 21.469,19 | |

Precio unitario total aproximado al peso

107.346,00


 ING. JUAN AIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
 M.P. No. 25202-46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

EXCAVACIONES A MAQUINA DE 2 A 4 MTS EN SECO:
 ITEM: EXCAVACIONES EN ROCA

ESPECIFICACIÓN: 4,6 ✓
 UNIDAD : m³

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------|---------|-------------|-------------|-----------|
| RETROCARGADOR | día | 915.570 | 0,070 | 64.089,88 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 64.089,88 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|------------------|--------|--------------|----------|-------------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

III. TRANSPORTES

| Materiel | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | | 0,00 |

IV. MANO DE OBRA


| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------|
| AYUDANTE (2) | 128.233,73 | 171% | 218.736,31 | 0,018 | 3.937,25 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | | 3.937,25 |

Total Costo Directo 68.027,13

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|-----------|
| ADMINISTRACION | 15% | 10.204,07 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 3.401,38 | |
| UTILIDAD | 5% | 3.401,38 | |
| Sub-Total | | | 17.006,78 |

Precio unitario total aproximado al peso 85.034,00


ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTA D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A. E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA NTC 5070 Y NTC 4784 (100% DE HEF ESPECIFICACIÓN: 18,1,4
ITEM: DE 2 A 4 MTS DE DIAMETRO 33" UNIDAD : m

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---------------------------|------|-------------|-------------|-------------|----------|
| HERRAMIENTA MENOR (10%MO) | | | | 8.520,58 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 8.520,58 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|---------------------|--------|--------------|----------|-------------|------------|
| TUBO PLASTICO D=33" | ML | 741.746 | 1,0 | 741.746,10 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 741.746,10 |

III. TRANSPORTES

| Materia | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Randimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
| AYUDANTES (3) | 192.350,60 | 171% | 328.104,46 | 0,14 | 46.262,73 | |
| OFICIAL (2) | 169.691,52 | 163% | 276.191,86 | 0,14 | 38.943,05 | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 85.205,78 | |

Total Costo Directo


835.472,46

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 125.320,87 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 41.773,62 | |
| UTILIDAD | 5% | 41.773,62 | |
| Sub-Total | | 208.868,12 | |

Precio unitario total aproximado al peso

1.044.341,00



ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
C.C. No. 79474.136 DE BOGOTA D.C.
M.P. No. 25202-46597CND
R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO I. S. A E. S. P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION (DIAMETRO 1.20 Mts)
ITEM: Base y cañuela en concreto de 3.000 PSI e = 0,30 Mts

ESPECIFICACIÓN: 19,1,1
UNIDAD : UND

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|----------------------|------|--------|-------------|-------------|------------------|
| HIENTA MENDR (10%MO) | | | | 15.829 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 15.829,13 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|-----------------------------|--------|--------------|----------|-------------|-------------------|
| CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI | M3 | 297.454 | 0,770 | 229.039,58 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 229.039,58 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|--|
| AYUDANTES (4) | 256.467,47 | 171% | 437.472,61 | 0,275 | 120.304,97 | |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,275 | 37.976,38 | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 158.281,35 | |

Total Costo Directo


403.149,06

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 60.472,36 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 20.157,45 | |
| UTILIDAD | 5% | 20.157,45 | |
| Sub-Total | | 100.787,27 | |

Precio unitario total aproximado al peso

503.936,00


ING. JHONAIRO PEÑA SERRATO
C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
M.P. No. 25202-46597CND
R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION (DIAMETRO 1.20 Mts)
PAÑETE INTERIOR

ESPECIFICACIÓN: 19,1,2 ✓
UNIDAD : m

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|----------------------|------|--------|-------------|-------------|-----------------|
| BIENTA MENOR (10%MO) | | | | 5.549 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 5.549,74 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|------------------|--------|--------------|----------|-------------|------------------|
| MORTERO 1:3 | M3 | 265.000 | 0,11 | 29.150,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 29.150,00 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|-------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | | 0,00 |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| AYUDANTES (2) | 128.233,73 | 171% | 218.736,31 | 0,156 | 34.013,50 | |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,156 | 21.473,92 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | | 55.487,41 |

Total Costo Directo


90.186,15

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|------------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 13.527,92 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 4.509,31 | |
| UTILIDAD | 5% | 4.509,31 | |
| Sub-Total | | | 22.546,54 |

Precio unitario total aproximado al peso

112.733,00


ING. JHONAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79.474.136 DE BOGOTÁ D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION (DIAMETRO 1.20 Mts)
ITEM: CILINDRO EN LADRILLO e=0,30 Mts

ESPECIFICACIÓN: 19,1,3
UNIDAD : ML

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---------------------------|------|-------------|-------------|-------------|----------|
| HERRAMIENTA MENOR (10%MO) | | | | 6.280 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 6.280,25 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|-----------------------|--------|--------------|----------|-------------|------------|
| LADRILLO TOLETE COMUN | UND | 561 | 400,0 | 224.400,00 | |
| MORTERO 1:4 | M3 | 276.395 | 0,347 | 95.909,07 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 320.309,07 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
| AYUDANTES (2) | 128.233,73 | 171% | 218.738,31 | 0,178 | 38.497,69 | |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,176 | 24.304,88 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 62.802,47 | |

Total Costo Directo


389.391,79

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 58.408,77 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 19.469,58 | |
| UTILIDAD | 5% | 19.469,58 | |
| | | | |
| Sub-Total | | 97.347,93 | |

Precio unitario total aproximado al peso

486.740,00


ING. JHON AIRO PEÑA SERRATO
C.C. No. 79 474.136 DE BOGOTÁ D.C.
M.P. No. 25202- 46597CND
R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION (DIAMETRO 1.20 Mts)
ITEM: CONO DE REDUCCION H=0,85 Mts

ESPECIFICACIÓN: 19,1,4
UNIDAD : UND

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---------------------------|------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| HERRAMIENTA MENOR (10%MO) | | | | 15.594 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 15.593,57 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unid. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|-----------------------|--------|--------------|----------|-------------|-------------------|
| LADRILLO TOLETE COMUN | UND | 561 | 265,0 | 148.665,00 | |
| MORTERO 1:4 | M3 | 276.395 | 0,15 | 41.459,25 | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 190.124,25 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|--|
| AYUDANTES (2) | 128.233,73 | 171% | 218.736,31 | 0,437 | 95.587,77 | |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,437 | 60.347,92 | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 155.935,69 | |

Total Costo Directo


361.653,51

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|------------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 54.248,03 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 18.082,68 | |
| UTILIDAD | 5% | 18.082,68 | |
| Sub-Total | | 90.413,38 | |

Precio unitario total aproximado al peso

452.067,00


ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
C.C. No. 75'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
M.P. No. 25202- 46597CND
R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A.E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION (DIAMETRO 1.20 Mts)
ITEM: PASOS EN HIERRO DE 3/4" CON ANTICORROSIVO C/M 0 Cm

ESPECIFICACIÓN: 19,1.6 ✓
UNIDAD : UND

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit. |
|----------------------|------|-------------|-------------|---------------|
| SIEMTA MENOR (10%MO) | | | | 831 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub-Total | | | | 831,42 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. |
|---|--------|--------------|----------|-----------------|
| ACERO DE REFUERZO (cortado, figurado e instalado) | KG | 2.927 | 2,25 | 6.585,75 |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub-Total | | | | 6.585,75 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| AYUDANTES (2) | 126.233,73 | 171% | 218.738,31 | 0,0233 | 5.096,56 |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,0233 | 3.217,64 |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 8.314,19 |

Total Costo Directo

15.731,36

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total |
|------------------|------------|-----------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 2.359,70 |
| IMPREVISTOS | 5% | 786,57 |
| UTILIDAD | 5% | 786,57 |
| Sub-Total | | 3.932,84 |

Precio unitario total aproximado al peso

19.664,00



ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
M.P. No. 25202- 46597CND
R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION (DIAMÉTRO 1.20 Mts)
ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION AEROTAPA COMPLETA VIBROCOMPACTADA

ESPECIFICACIÓN: 19,1,6
UNIDAD : UND ✓

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa/hora | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|----------------------|------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| BIENTA MENOR (10%MO) | | | | 4,282 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 4,281,99 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|-----------------------------------|--------|--------------|----------|-------------|-------------------|
| CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI | M3 | 297,454 | 0,10 | 29,745,40 | |
| AEROTAPA COMPLETA VIBROCOMPACTADA | und | 535,500 | 1,0 | 535,500,00 | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 565,245,40 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------------|--|
| AYUDANTES (2) | 128,233,73 | 171% | 218,736,31 | 0,12 | 26,248,36 | |
| OFICIAL (1) | 84,795,76 | 163% | 138,095,93 | 0,12 | 16,571,51 | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 42,819,87 | |

Total Costo Directo


612,347,26

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 91,852,09 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 30,617,36 | |
| UTILIDAD | 5% | 30,617,36 | |
| Sub-Total | | 153,086,81 | |

Precio unitario total aproximado al peso

765,434,00



ING. MONJAIRO PEÑA SERRATO
C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
M.P. No. 25202-46597CND
R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|-------------------------------|
| EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|-------------------------------|

CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION (DIAMETRO 1.20 Mts)

ESPECIFICACIÓN: 10,1,11 ✓

Sumidero en concreto 3,000 PSI (Incluye rejilla vibro compactada de 1,06x0,46)

UNIDAD : UND

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. |
|---------------------|------|--------|-------------|-----------------|
| RENTA MENOR (10%MD) | | | | 8,386 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub-Total | | | | 8,385,56 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. |
|---|--------|--------------|----------|-------------------|
| CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI | M3 | 297,454 | 0,400 | 118,981,60 |
| PUNTILLA (PROMEDIO) | LB | 3,132 | 1,5 | 4,698,00 |
| TABLA PARA FORMALETA DE 1" X 10" X 2,9 M | M | 1,583 | 3,5 | 5,540,50 |
| VARILLON SAJO | M | 1,392 | 3,5 | 4,872,00 |
| ALAMBRE NEGRD | KG | 6,176 | 0,30 | 1,852,80 |
| REJILLA VIBRO COMPACTADA (1.05*0,46*0,12) | UND | 456,167 | 1,00 | 456,167,00 |
| Sub-Total | | | | 592,111,00 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------------|
| AYUDANTES (2) | 128,233,73 | 171% | 218,736,31 | 0,235 | 51,403,03 |
| OFICIAL (1) | 84,795,76 | 163% | 138,095,93 | 0,235 | 32,452,54 |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 83,855,56 |

Total Costo Directo


684,353,03

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total |
|------------------|------------|-------------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 102,652,95 |
| IMPREVISTOS | 5% | 34,217,65 |
| UTILIDAD | 5% | 34,217,65 |
| Sub-Total | | 171,088,26 |

Precio unitario total aproximado al peso

855,441,00


ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTA D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION (DIAMETRO 1,20 Mts)
Suministro e instalacion de rejilla vibro compactada de 1,05x0,46

ESPECIFICACIÓN: 19,1,18 ✓
UNIDAD : UNO

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. |
|----------------------|------|--------|-------------|-----------------|
| PIENTA MENOR (10%MO) | | | | 5.197 |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub-Total | | | | 5.196,75 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. |
|---|--------|--------------|----------|-------------------|
| REJILLA VIBRO COMPACTADA (1,05*0,46*0,12) | UND | 456.167 | 1,00 | 456.167,00 |
| MORTERO 1:3 | M3 | 265.000 | 0,06 | 21.200,00 |
| | | | | |
| Sub-Total | | | | 477.367,00 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. |
|------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|------------------|
| AYUDANTES (1) | 64.116,87 | 171% | 109.368,15 | 0,210 | 22.967,31 |
| OFICIAL (1) | 64.795,76 | 163% | 136.095,93 | 0,210 | 29.000,15 |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 51.967,46 |

Total Costo Directo


534.531,20

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total |
|------------------|------------|-------------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 60.179,68 |
| IMPREVISTOS | 5% | 26.726,56 |
| UTILIDAD | 5% | 26.726,56 |
| Sub-Total | | 133.632,80 |

Precio unitario total aproximado al peso

668.164,00


ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
M.P. No. 25202- 46597CND
R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUEREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

OTROS

ESPECIFICACIÓN: 20,12 ✓

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE 20x6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO UNIDAD : UND

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---------------------|------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| SIENA MENOR (10%MO) | | | | 5,791 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 5,790,66 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|--|--------|--------------|----------|-------------|-------------------|
| SILLA YEE 20x6" PVC (incluye caucho) | UND | 400.389 | 1,0 | 400.388,67 | |
| Adhesivo para tubería de pared estructural | und | 50.000 | 0,2 | 10.000,00 | |
| LIMPIADDR PVC 12 ONZAS | UND | 15.181 | 0,09 | 1.366 | |
| ALAMBRE GALVANIZADO CAL 12 | KG | 4.167 | 0,015 | 62,50 | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 411.817,46 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MAND DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|------------------|--|
| AYUDANTES (1) | 64.116,87 | 171% | 109.368,15 | 0,234 | 25.592,15 | |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.085,93 | 0,234 | 32.314,46 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 57.906,60 | |

Total Costo Directo


475.514,71

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 71.327,21 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 23.775,74 | |
| UTILIDAD | 5% | 23.775,74 | |
| | | | |
| Sub-Total | | 118.878,69 | |

Precio unitario total aproximado al peso

594.393,00


ING. JHONAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

ITEM: ENTIBADO TIPO 1A (DISCONTINUO EN MADERA)

ESPECIFICACIÓN: 20,4B

UNIDAD : M²

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|----------------------|------|-------------|-------------|-------------|--------|
| PIENSA MENOR (10%MO) | | | | 821 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 820,71 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|------------------------------------|----------------|--------------|----------|-------------|-----------|
| TABLERO DE 0.7* 1,4 EN TABLA CHAPA | M ² | 75.000 | 0,1 | 7.500,00 | |
| MADERA ROLLIZA (VARA) | ML | 12.500 | 0,21 | 2.625,00 | |
| TABLA BURRA ORDINARIA DE 25 cms | ML | 3.763 | 0,400 | 1.505,20 | |
| PUNTILLA PROMEDIO | LB | 3.132 | 0,461 | 1.443,70 | |
| Sub-Total | | | | | 13.073,90 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|-----------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornel | Prestaciones | Jornel Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
| AYUDANTES (2) | 128.233,73 | 171% | 218.738,31 | 0,023 | 5.030,94 | |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,023 | 3.176,21 | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 8.207,14 | |

Total Costo Directo


22.101,76

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|----------------|------------|-------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 3.315,26 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 1.105,09 | |
| UTILIDAD | 5% | 1.105,09 | |
| Sub-Total | | 5.525,44 | |

Precio unitario total aproximado al peso

27.627,00


ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
 M.P. No. 25202-46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6

UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

OTROS

ESPECIFICACIÓN: 20,82

ITEM: Plataforma en madera provisional para circulación peatonal barrio eden incluye armado y desmonte UNIDAD : UND m

diario

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---------------------------|------|--------|-------------|-------------|------------------|
| HERRAMIENTA MENOR (10%MO) | | | | 19.063,32 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 19.063,32 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|--|--------|--------------|----------|-------------|------------------|
| TABLA PARA FORMALETA DE 1" X 10" X 2,9 M | M | 1.683 | 0,30 | 475,00 | |
| PUNTIILLA (PROMEDIO) | LB | 3.132 | 0,85 | 2.662,20 | |
| CUARTÓN DE SAJO 2" X 4" X 2,9 M | M | 1.392 | 0,60 | 835,20 | |
| TABLERO 1,40X 0,70 | Und | 28.350 | 0,42 | 11.907,00 | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 15.879,40 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|--|
| AYUDANTES (6) | 394.701,20 | 171% | 656.208,92 | 0,240 | 157.480,14 | |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,240 | 33.143,02 | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 190.633,16 | |

Total Costo Directo


225.575,88

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|------------------|--|
| ADMINISTRACION | 15% | 33.836,38 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 11.278,79 | |
| UTILIDAD | 5% | 11.278,79 | |
| Sub-Total | | 56.393,97 | |

Precio unitario total aproximado al peso

281.970,00



ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
M.P. No. 25202-46597CND
R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

DTROS

ITEM: Codo 6" alcantarillado TDP

ESPECIFICACIÓN: 20,63

UNIDAD : UND

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit. |
|---------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| HERRAMIENTA MENOR (10%MO) | | | | 2.475 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub-Total | | | | 2.474,84 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. |
|----------------------------|--------|--------------|----------|-------------|
| Codo 6" alcantarillado TDP | UND | 45.000 | 1,0 | 45.000,00 |
| Sellos de caucho | UND | 10.000 | 2,0 | 20.000,00 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0,00 |
| Sub-Total | | | | 65.000,00 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. |
|-----------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. |
|---------------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| AYUDANTES (1) | 64.116,87 | 171% | 109.368,15 | 0,100 | 10.936,82 |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,100 | 13.809,59 |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 24.746,41 |

Total Costo Directo


92.221,05

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total |
|----------------|------------|-------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 13.833,16 |
| IMPREVISTOS | 5% | 4.611,05 |
| UTILIDAD | 5% | 4.611,05 |
| Sub-Total | | 23.055,26 |

Precio unitario total aproximado al peso

115.276,00


ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

OTROS

ITEM: Desmonte y reubicación de medidor de agua

ESPECIFICACIÓN: 20,64 ✓

UNIDAD : Und

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa Jornal | Rendimiento | Valor-Unif. | |
|-------------------|------|---------------|-------------|-------------|------------------|
| HERRAMIENTA MENOR | | | | 22.159,3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 22.159,28 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unif. | Cantidad | Valor-Unif. | |
|--|--------|--------------|-----------|-------------|-------------------|
| Tubería RDE 13,5 1/2" | M | 2.650 | 1,50 | 3.975,00 | |
| Accesorios de media (codos adaptadores macho , adaptadores hembra, unines , teflon, limpiador, soldadura, conectores de bronce etc | Glb | 1,00 | 1,00 | 50.000,00 | |
| Caja para medidor acuabox | Und | 1,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | |
| Sub-Total | | | | | 138.975,00 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Cantidad | M3-Km | Tarifa | Valor-Unif. | |
|------------------|-------------------|----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unif. | |
|------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|--|
| AYUDANTE (2) | 128.233,73 | 171% | 218.736,31 | 0,62 | 135.835,25 | |
| OFICIALES (1) | 84.785,76 | 163% | 138.095,93 | 0,62 | 85.757,57 | |
| Sub-Total | | | | | 221.592,82 | |

Total Costo Directo

362.727,10

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|------------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 57.409,07 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 19.136,36 | |
| UTILIDAD | 5% | 19.136,36 | |
| Sub-Total | | | 95.681,78 |

Precio unitario total aproximado al peso

478.409,00



ING. JHON LAIRO PEÑA SERRATO
C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
M.P. No. 25202- 46597CND
R.L. CONSORCIO SECTOR 6



AF&C

SOLUCIONES S.A.S.
ASESORIA, FERRETERIA & CONSTRUCCIONES

Nit: 900698792-5 IVA - Regimen Común
 AV AMBALA 32 - 38 IBAGUE TOLIMA Tel. 5157890

COTIZACION No: CT1 - 12452

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|--------|------------------|-----|--|
| Cliente: CONSORCIO SECTOR 6 Nit/C.C: 901490124-4 Tel: 2617960 Dir: CR 5 N° 11-24 OFICINA 401. ED TORRE EMPRESARIAL | Fecha | Vencimiento | Plazo | Forma de pago | | |
| | Sep-22-2021 | Sep-22-2021 | 0 Días | CUENTAS X COBRAR | | |
| | Vendedor: SOLANO JULIAN MAURICIO | | | Elaboró | Pág | |
| | Contacto: 3232316985 | | | JULIAN SOLANO | 1/1 | |

| Codigo | Detalle | Cantidad | Vr/Unit | Vr/Total | Iva |
|---------|--|----------|------------|------------|-----|
| 2031402 | SILLA YEE ALCANTARILLADO F949 650X160 MM UND Peso : 3.20 kg | 1.00 | 403,161.15 | 403,161.15 | 19 |
| | | 1 | | | |

Son: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS mcte.
AF&C SOLUCIONES LO INVITA A VERIFICAR Y CONFIRMAR QUE LA COTIZACION ESTE ACORDE A SU SOLICITUD.

| | |
|--------------|----------------|
| SubTotal | 403,161.15 |
| Iva | 76,600.62 |
| Total | 479,761 |

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|--------------------------------------|

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4"

ESPECIFICACIÓN: 20.86

UNIDAD : m

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|-------------------|------|--------|-------------|-------------|---------------|
| herramienta menor | | | | 508 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 507,63 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|-------------------|--------|--------------|----------|-------------|------------------|
| TUBO SANITARIO 4" | M | 18.317 | 1,0 | 18.317,00 | |
| SOLDADURA | UND | 17.454 | 0,15 | 2.618,06 | |
| LIMPIADOR | UND | 15.181 | 0,10 | 1.518,10 | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 22.453,16 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|-----------------|--|
| AYUDANTE (1) | 64.118,87 | 171% | 109.368,15 | 0,030 | 3.281,04 | |
| OFICIAL (1) | 84.795,78 | 183% | 138.085,93 | 0,013 | 1.795,25 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 5.076,29 | |

Total Costo Directo


28.037,08

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|-----------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 4.205,56 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 1.401,85 | |
| UTILIDAD | 5% | 1.401,85 | |
| | | | |
| Sub-Total | | | 7.009,27 |

Precio unitario total aproximado al peso

35.046,00


ING. JOHN JAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTA D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|-------------------------------|
| EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A.E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|-------------------------------|

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO 4"

ESPECIFICACIÓN: 20,67

UNIDAD : Und

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|-------------------|------|--------|-------------|-------------|--------|
| HERRAMIENTA MENOR | | | | 990 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 989,86 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|-------------------|--------|--------------|----------|-------------|-----------|
| CODO SANITARIO 4" | UND | 10.900 | 1,0 | 10.900,00 | |
| SOLDADURA | UND | 17.454 | 0,12 | 2.094,45 | |
| LIMPIADOR | UND | 15.181 | 0,08 | 1.214,48 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 14.208,93 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | | 0,00 |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------|
| AYUDANTE (1) | 64.118,87 | 171% | 109.368,15 | 0,040 | 4.374,73 | |
| OFICIAL (1) | 84.795,76 | 163% | 138.095,93 | 0,040 | 5.523,84 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | | 9.898,56 |

Total Costo Directo


25.097,35

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|----------|
| ADMINISTRACION | 15% | 3.764,50 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 1.254,87 | |
| UTILIDAD | 5% | 1.254,87 | |
| Sub-Total | | | 8.274,34 |

Precio unitario total aproximado al peso

31.372,00


ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTA D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|---|-------------------------------|
| EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|-------------------------------|

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION SEMICODO SANITARIO 4"

ESPECIFICACIÓN: 20,68

UNIDAD : Und

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. |
|-------------------|------|--------|-------------|-------------|
| HERRAMIENTA MENOR | | | | 890 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub-Total | | | | 890,86 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. |
|-----------------------|--------|--------------|----------|-------------|
| SEMICODO SANITARIO 4" | UND | 13.900 | 1,0 | 13.900,00 |
| SOLDADURA | UND | 17.454 | 0,12 | 2.094,45 |
| LIMPIADOR | UND | 15.181 | 0,08 | 1.214,48 |
| | | | | |
| Sub-Total | | | | 17.208,93 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Paso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. |
|-----------|-------------------|-----------|-------|--------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. |
|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| AYUDANTE (1) | 64.116,87 | 171% | 109.368,15 | 0,040 | 4.374,73 |
| OFICIAL (1) | 84.796,76 | 163% | 138.095,93 | 0,040 | 5.523,84 |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 9.898,56 |

Total Costo Directo


28.097,35

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total |
|----------------|------------|-------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 4.214,80 |
| IMPREVISTOS | 5% | 1.404,87 |
| UTILIDAD | 5% | 1.404,87 |
| | | |
| Sub-Total | | 7.024,54 |

Precio unitario total aproximado al peso

35.122,00



ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTÁ D.C.
N.P. No. 25202- 46597CND
R.L. CONSORCIO SECTOR 6

"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

| | |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESA IBAGUEREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO L.S.A E.S.P OFICIAL | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|--|--------------------------------------|

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION UNION SANITARIA 4"

ESPECIFICACIÓN: 20,68

UNIDAD : Und

I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|-------------------|------|--------|-------------|-------------|---------------|
| HERRAMIENTA MENOR | | | | 619 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 618,66 |

II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|--------------------|--------|--------------|----------|-------------|-----------------|
| UNION SANITARIO 4" | UND | 6.600 | 1,0 | 6.600,00 | |
| SOLDADURA | UNO | 17.454 | 0,10 | 1.745,37 | |
| LIMPIADOR | UND | 15.181 | 0,06 | 910,66 | |
| | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 9.256,23 |

III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Caril. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|------------------|--------------------|-----------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 0,00 | |

IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornel | Prestaciones | Jornel Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|-----------------|--|
| AYUDANTE (1) | 64.116,87 | 171% | 109.368,15 | 0,025 | 2.734,20 | |
| OFICIAL (1) | 84.795,78 | 163% | 138.095,93 | 0,025 | 3.452,40 | |
| | | | | | | |
| Sub-Total | | | | | 6.188,60 | |

Total Costo Directo


18.061,50

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|------------------|------------|-------------|-----------------|
| ADMINISTRACION | 15% | 2.409,22 | |
| IMPREVISTOS | 5% | 803,07 | |
| UTILIDAD | 5% | 803,07 | |
| | | | |
| Sub-Total | | | 4.015,37 |

Precio unitario total aproximado al peso

20.077,00


ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
 C.C. No. 79'474.136 DE BOGOTA D.C.
 M.P. No. 25202- 46597CND
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6

CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL

NIT. 901.479.007-6

Ibagué, 15 de Octubre de 2021.

Ingeniera
DILEY VANESSA BARRERO OLAYA
Supervisora Contrato
Consortio Interventoría Externa IBAL
Contrato 0063 de 06 mayo 2021


Asunto: Solicitud empalme y resultado de prueba Hidrostática

Estimada Ingeniera:

Por medio del presente nos permitimos solicitar el empalme de la CARRERA 8ª ENTRE CALLES 44 Y 46 DEL BARRIO CALARCÁ Y EN LA CALLE 59 ENTRE CARRERA 2 Y CALLE 60 DEL BARRIO LA FLORESTA. Ya habiendo cumplido con la entrega del protocolo de la prueba hidrostática por parte del Contratista Consorcio Distrito 6.

Se anexan resultados de la prueba hidrostática.

Atentamente,



LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
Contrato 0063 de 06 de mayo de 2021



FORMATO PRUEBA HIDROSTATICA


6
SECTOR 6
DE TUBERIA

FECHA: 12/10/2021 PRUEBA No. 3

DATOS LOCALIZACION

UBICACION: Calle 59 entre Cra 2 y calle 60
PUNTO DE LOCALIZACION PRUEBA: Parte baja calle 59 - Cra 1a
DISTRITO HIDRAULICO IBAL No. 1 Seta (06)
SECTOR Y/O BARRIO: Floresta

INFORMACION LOCALIZACION

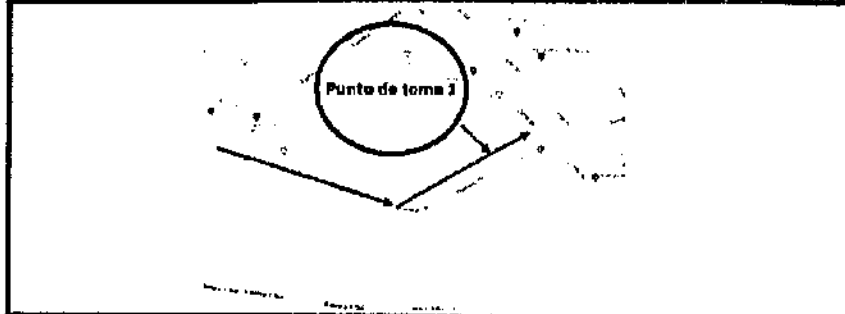

| COORDENADAS GEOGRAFICAS | |
|-------------------------|-------------|
| PUNTO DE TOMA No. 1 | |
| NORTE | OESTE (W) |
| 4°25'57.5" | 75°12'01.0" |
| PUNTO DE TOMA No. 2 | |
| NORTE | OESTE (W) |
| | |

INFORMACION TECNICA TUBERIA

MARCA: Dorman
MATERIAL: Pvc
TIPO: Union mecanica snap RDE 21
DIAMETRO Ø: 3"
PROVEEDOR LOCAL: AF&C Soluciones s.a.s

DESCRIPCION MATERIAL Y ACCESORIOS UTILIZADOS PARA LA PRUEBA HIDROSTATICA

Agua 0,62 M3, (02) tapones 3" pvc presion, (01) Bomba de prueba manual, manometro marca astro 300 PSI y accesorios de acople galvanizados, (01) semicodo presion 3", (01) llave paso rapido 1/2", buje presion 3"x 1", (02) Adaptadores macho 1", (02) tapones presion roscados 1", (01) tubo 1" pvc RDE 21 x 6,00 mts, acople plastico (01) botanque 1000 lts, caneca plastica 20 lts.

CONTRATISTA: CONSORCIO SECTOR 6
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA EXTREMA IBAL
PERSONAL A CARGO PRUEBA: (01) Ing residente, (01) Plomero o fontanero, (01) Oficial, (01) Ayudante

PROTOCOLO Y RESULTADO PRUEBA HIDROSTATICA

| | |
|---------------------------------------|--|
| TIPO DE PRUEBA: | Hidrostatica |
| DIAMETRO (Ø) TUBERIA A PROBAR: | Ø 3" |
| LONGITUD TRAMO DE TUBERIA A PROBAR: | 136 mts |
| USO: | Residencial-Comercial |
| PRESION DE TRABAJO SECTOR Y/O BARRIO: | 67 PSI = 47,11 mca (Suministrado por IBAL) |
| TIEMPO DE DURACION PRUEBA: | Dos (02) Horas |
| HORA DE INICIO TOMA: | 04:00 p. m. |
| HORA DE TERMINACION TOMA: | 06:00 p. m. |
| PRESION DE PRUEBA MAX: | 100 PSI |
| PORCENTAJE DE MAYORACION (%): | 1,49% |
| PRESION DE PRUEBA MIN: | 100 PSI |
| PORCENTAJE DE MAYORACION (%): | 1,49% |
| RESULTADO PRUEBA: | Favorable |

OBSERVACIONES: Con los datos de presion de servicio suministrados y confirmados por el IBAL (67 PSI = 47,11 mca) del sector, se procedio a inyectar presion mediante bomba manual, hasta alcanzar (100 PSI) siendo este 1,5 veces mayor a la de trabajo habitual del sector y/o barrio; durante un lapso de 2 Hrs aproximadamente; No presentandose caida de presion o fuga alguna; sosteniendose la presion inicial inducida sin ningun tipo de variacion durante la totalidad del tiempo de la prueba.

NOTA: La metodologia utilizada esta descrita en la "NORMA DE CONSTRUCCION PARA PRUEBA DE PRESION HIDROSTATICA EN REDES DE AGUA POTABLE", norma y especificacion general de construccion NEQC-704-04 "Prueba hidrostatica de tuberias"

RESPONSABLES:

[Signature]
CONTRATISTA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO SECTOR 6
ING. JHON CAMILO BERMUDEZ MORALES

[Signature]
INTERVENTORIA
Vo. Ro.
CONSORCIO INTERVENTORIA EXTREMA IBAL
Andres Villanave, Residente Tuberias

[Signature]
TECNICO QUE EJECUTO LA PRUEBA
JHON PIERNAGORDA VILLARRAGA
C.C. 1.118.491.098 de Itague



PRESION INDUCIDA INICIAL 100 PSI TOMA 1
4:00 pm. Floresta 12-10-2021.



PRESION FINAL 100 PSI TOMA 1
6:00 pm. Floresta 12-10-2021.



Edificio Torre Empresarial Cra 5 No. 11-24 Oficina 401 Tel 2 61 79 69
e-mail: consorciosector6@gmail.com



FORMATO PRUEBA HIDROSTATICA



FECHA: 1/10/2021 PRUEBA No. 1

DATOS LOCALIZACION
 UBICACION: Cra 8va entre calles No. 44 y No. 46
 PUNTO DE LOCALIZACION PRUEBA: Parte baja calle 46 (Pto hidraulico mas bajo)
 DISTRITO HIDRAULICO IBAL No.: Sels (06) SECTOR Y/O BARRIO: Calarca

INFORMACION LOCALIZACION

COORDENADAS GEOGRAFICAS
 PUNTO DE TOMA No. 1
 NORTE: 4°26'24.1" ESTE (W): 75°12'34"
 PUNTO DE TOMA No. 2
 NORTE: ESTE (W):

INFORMACION TECNICA TUBERIA
 MARCA: Durman
 MATERIAL: Pvc
 TIPO: Union mecanica snap RDE 21
 DIAMETRO Ø: 5"
 PROVEEDOR LOCAL: AF&C Soluciones s.a.s

DESCRIPCION MATERIAL Y ACCESORIOS UTILIZADOS PARA LA PRUEBA HIDROSTATICA
 Agua 0,8/5 M3, (04) tapones 3" pvc presion, (01) Bomba de prueba manual, manometro marca astro 300 Psi y accesorios de acople galvanizados, (01) semicodo presion 3", (01) llave paso rapido 1/2", buje presion 3"x 1", (02) Adaptadores macho 1", (02) tapones presion roscados 1", (01) tubo 1" pvc RDE 21 x 6.00 mts, acople plastico (01) Isotankue 1000 lts, caneca plastica 20 Lts.

CONTRATISTA: INTERVENTOR: PERSONAL A CARGO PRUEBA: CONSORCIO SECTOR 6 CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL (01) Ing residente, (01) Plomero o fontanero, (01) Oficial, (01) Ayudante

PROTOCOLO Y RESULTADO PRUEBA HIDROSTATICA
 TIPO DE PRUEBA: Hidrostatica
 DIAMETRO (Ø) TUBERIA A PROBAR: Ø 3"
 USO: Domestico residencial
 PRESION DE TRABAJO SECTOR Y/O BARRIO: 70 PSI (Suministrado por IBAL)
 TIEMPO DE DURACION PRUEBA: Dos (02) Horas
 HORA DE INICIO TOMA: 10:00 a.m.
 HORA DE TERMINACION TOMA: 12:00 p.m.
 PRESION DE PRUEBA MAX: 100 PSI
 PORCENTAJE DE MAYORACION (%): 1,43%
 PRESION DE PRUEBA MIN: 98 PSI
 PORCENTAJE DE MAYORACION (%): 1,40%
 RESULTADO PRUEBA: Favorable

OBSERVACIONES: Con los datos de presion de servicio suministrados y confirmados por el IBAL (70 PSI) del sector, se procedio a inyectar presion mediante bombe manual, hasta alcanzar (100 PSI) siendo esta 1,4 veces mayor a la de trabajo habitual del sector y/o barrio; durante un lapso de 2 Hrs aproximadamente; presentandose caida de presion minima de (2 PSI), arrojando como presion al final de la prueba 98 PSI, la cual se encuentra dentro de los rangos admitidos para este tipo de pruebas.
 NOTA: La metodologia utilizada esta descrita en la "NORMA DE CONSTRUCCION PARA PRUEBA DE PRESION HIDROSTATICA EN REDES DE AGUA POTABLE", norma y especificacion general de construccion NEGC-704-04 "Prueba hidrostatica de tuberias"



RESPONSABLES:
 Ing. Camilo Hernandez Morales (CONTRATISTA)
 Ing. Villanueva (INTERVENTORIA)
 Ingeniero Piernagorda Villarraga (TECNICO QUE EJECUTO LA PRUEBA)
 CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
 C.C. 1.110.491.098 de Ibaguè



PRESION INDUCIDA INICIAL 100 PSI TOMA 1
10:00 am. Calarcá 01-10-2021.



PRESION FINAL 98-96 PSI TOMA 1
12:00 pm. Calarcá 01-10-2021.

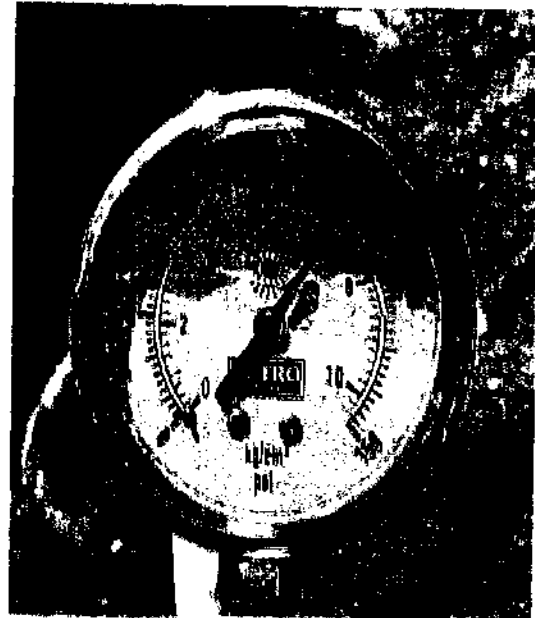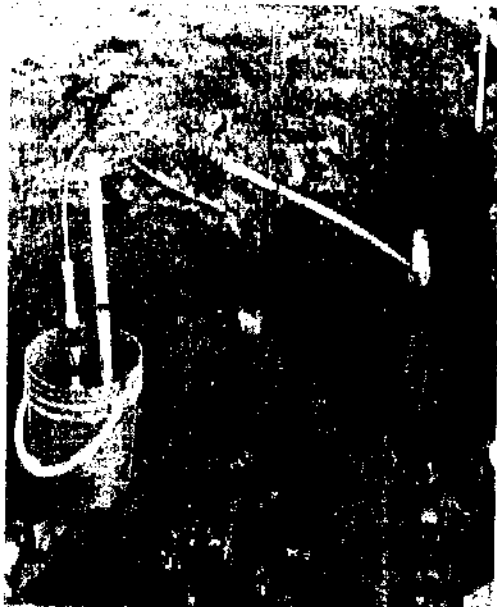



FORMATO PRUEBA HIDROSTATICA

SECRETARIA DE SALUD

FECHA: 2/10/2021 PRUEBA No. 2

DATOS LOCALIZACION

UBICACION: Cra 8va entre calles No. 44 y No. 46
PUNTO DE LOCALIZACION PRUEBA: Parte baja calle 46 (Pto hidraulico mas bajo)
DISTRITO HIDRAULICO IBAL No.: Seis (06) SECTOR Y/O BARRIO: Calarca

INFORMACION LOCALIZACION

Diagram showing 'Punto de toma 2' and coordinate tables for 'PUNTO DE TOMA No. 1' and 'PUNTO DE TOMA No. 2' with North and East coordinates.

INFORMACION TECNICA TUBERIA

MARCA: Durman
MATERIAL: Pvc
TIPO: Union mecanica snap RDE 21
DIAMETRO Ø: 3"
PROVEEDOR LOCAL: AF&C Soluciones s.a.s

DESCRIPCION MATERIAL Y ACCESORIOS UTILIZADOS PARA LA PRUEBA HIDROSTATICA

Agua 0,875 M3,(04) tapones 3" pvc presion, (D1) Bomba de prueba manual, manometro marca astro 500 PSI y accesorios de acople galvanizados, (01) semicodo presion 3", (01) llave paso rapido 1/2", buje presion 3"x 1", (D2) Adaptadores macho 1", (D2) tapones presion roscados 1", (01) tubo 1" pvc RDE 21 x 6,00 mts, acople plastio (01) Isotankue 1000 lts. caneca plastica 20 Lts.

CONTRATISTA:
INTERVENTOR:
PERSONAL A CARGO PRUEBA:
CONSORCIO SECTOR 6
CONSORCIO INTERVENTORIA EXTREMA IBAL
(01) Ing residente, (01) Plomero o fontanero, (01) Oficial, (01) Ayudante

PROTOCOLO Y RESULTADO PRUEBA HIDROSTATICA

Table with columns for 'TIPO DE PRUEBA', 'DIAMETRO (Ø) TUBERIA A PROBAR', 'USO', 'PRESION DE TRABAJO SECTOR Y/O BARRIO', 'TIEMPO DE DURACION PRUEBA', 'HORA DE INICIO TOMA', 'PRESION DE PRUEBA MAX', 'PRESION DE PRUEBA MIN', 'RESULTADO PRUEBA' and corresponding values.

OBSERVACIONES: Con los datos de presion de servicio suministrados y confirmados por el IBAL (70 PSI), se procedio a inyectar presion mediante bomba manual, hasta alcanzar (100 PSI) siendo esta 1,4 veces mayor a la de trabajo habitual del sector y/o barrio; la cual se mantuvo durante el tiempo de duracion de la prueba, el cual fue de 2 Hrs aproximadamente; no presentandose caidas de presion considerables ni fugas la respecto, arrojando como presion al final de la prueba 100 PSI.

NOTA: La metodologia utilizada esta descrita en la "NORMA DE CONSTRUCCION PARA PRUEBA DE PRESION HIDROSTATICA EN REDES DE AGUA POTABLE", norma y especificacion general de construccion NEGC-704-04 "Prueba hidrostatica de tuberias"


RESPONSABLES:

CONTRATISTA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO SECTOR 6


INTERVENTORIA
Vo. Bo.
CONSORCIO INTERVENTORIA EXTREMA IBAL

TECNICO QUE EJECUTA LA PRUEBA
JHON PIERNAGORDA VILLARAGA
C.C. 1.110.491.098 de Ibaguè


Ing. JHON CAMILO URBANO DE Z. MOREL

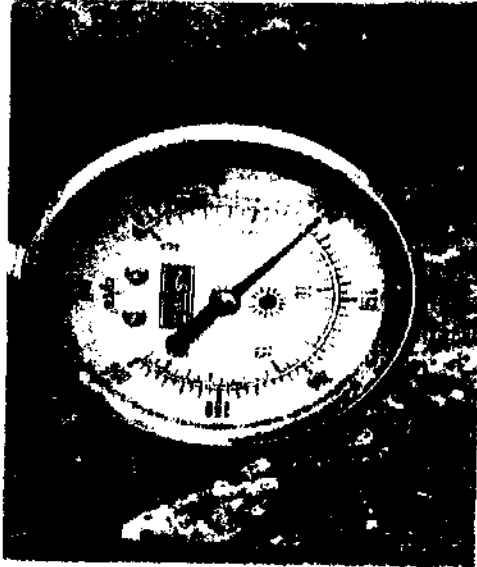

PRESION INDUCIDA INICIAL 100 PSI TOMA 2
9:30 am. Calarcá 02-10-2021.

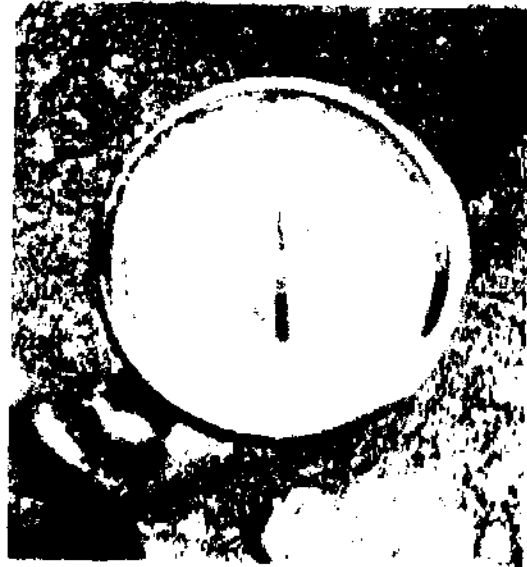

PRESION FINAL 100 PSI TOMA 2
11:30 am. Calarcá 02-10-2021.

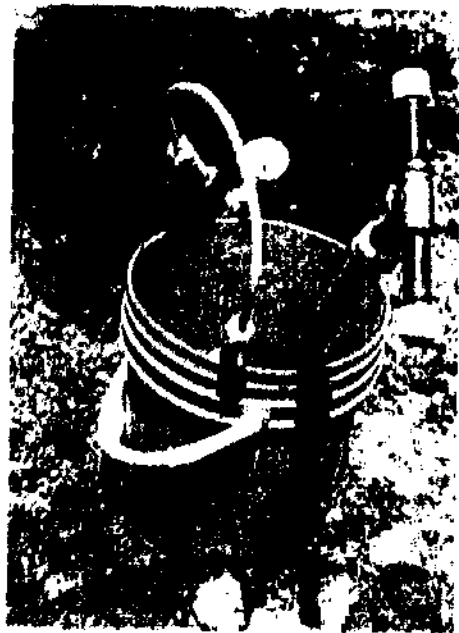

CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021

Ibagué, 13 de septiembre de 2021

SEÑORES
CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL.
INGENIERO LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
Ibagué

REFERENCIA: CONTRATO No. 062 DEL 06 DE MAYO DE 2021 "REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULCO No. 7 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ".

Asunto: Solicitud de Equipos y Personal Operativo Ibal.

Respetado ingeniero:

De acuerdo al orden cronológico de las actividades del contrato de la referencia, me permito hacer un breve resumen de los eventos que se vienen presentando en el transcurso de la obra, los cuales han afectado la programación de las diferentes actividades y normal desarrollo del contrato de la referencia:

1. El 01 de junio de 2021, se da inicio a las obras de la referencia, con la realización de la topografía en el sector de la Carrera 13 entre 115 y 120 La Cabaña - Cantabria para la intervención de red central de alcantarillado, se encontró un sistema de alcantarillado paralelo al de la red de 24" a intervenir, se le pidió al supervisor del contrato el apoyo con la presencia del video robot y vactor de la empresa, se presentaron dificultades para la prestación de estos equipos afectando la programación de obra.
Cabe anotar que la línea existente de 24" alcantarillado sanitario en un sector en específico se encontraba en los antejardines siendo necesaria la programación del video robot, para identificar la salida de las domiciliarias del sistema que se encontraba dañado, por este motivo se demoró la definición por donde se podía cambiar la línea de la red principal de este sistema.

CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021

2. En la semana del 07 de junio se dio apertura al tramo de la Calle 115 entre 17 y 20 Tierra Firme, se solicitó la ubicación y el diámetro de la tubería de la red central del acueducto, se evidencio una vez iniciada la excavación del sistema de alcantarillado, que la tubería de acueducto se encuentra ubicada por la misma zanja de la excavación, ocasionando inconvenientes con el proceso constructivo, se presentaron retrasos en las actividades por la demora en el cambio de sitio de la red de acueducto por parte del personal operativo del Ibal.

Por otra parte se evidencio diferentes diámetros en la línea de acueducto 3" y 4".

En este frente se realizaron varios apiques para la ubicación de la red de acueducto en los tramos siguientes por intervenir.

3. En la semana del 15 de junio se da por iniciado el tramo de acueducto en el sector de la Carrera 13 entre 115 y 120 La Cabaña – Cantabria, presentando diferencias en los tramos de redes entregados por el Ibal mediante la aplicación collector en cuanto al trazado de las redes, presentándose daños en el sector cuando se ejecutaba la actividad de excavación manual de la red principal de la tubería de 3" de acueducto.

En este sector se retrasaron las actividades debido a la demora en la aprobación de las medidas para revestimiento tanto en acueducto red principal, como en redes domiciliarias de alcantarillado.

4. Hasta el mes de julio se presentó la aprobación de los pozos de Inspección en el tramo de la Carrera 13 entre 115 y 120 La Cabaña – Cantabria necesarios para retirar las redes de alcantarillado de los antejardines.

Se encontró una fuga antigua en la red de acueducto del sector de Cantabria, la cual tenía saturado el terreno cercano a la excavación, de la red principal de 24" ocasionando derrumbes y sobre anchos en este tramo, la programación del geófono para identificar la fue muy demorada.

CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021


5. En el tramo del cementerio la milagrosa Carrera 13 A entre Calles 125 y 126 o MZ C y el cementerio barrio Alberto Lleras Camargo en el mes de julio, al identificar los tramos a intervenir no se encontraron las aro tapas de los pozos de inspección siendo necesaria la programación de visita del video robot con retardos en dicha programación por encontrarse en reparación.
6. En el mes de agosto se realiza la topografía del tramo de la CALLE 120 ENTRE CARRERAS 9 Y 10 PEDRO IGNACIO VILLA MARIN, en donde se solicite apoyo nuevamente de los equipos de vector y video robot, y una vez transcurrido un mes de intervención en esta zona, no se ha contado con estos equipos para determinar que intervención realizar evidenciándose la red de acueducto de 3" en asbesto cemento y la tubería de 10" del sistema de aguas lluvias ubicada en la vía en las mismas zanjas de excavación, sin que esta estuviera en el presupuesto inicial de este sector.
7. En el tramo del Carrera 8 B entre Calles 147 -148 y 145 Mirador de los Alpes los pozos tienen una profundidad aproximada de 4.5 a 5,0 m se encontraban colmatadas las roscas de las tapas de los pozos de inspección para poder identificar diámetros de tubería y líneas existentes de los sistemas de aguas negras como de aguas lluvias. Cabe mencionar que no ha sido fácil identificar líneas de Celisa en el sector encontrándose que en la vía que atraviesa por el eje de la misma un sistema subterráneo de la red de energía que alimenta a los conjuntos del sector el sistema se encuentra localizado por el eje de la vía complicándose la ejecución de los sistemas de aguas lluvias y residuales por posibles cruces de redes. A la fecha no se tiene respuesta de la empresa de energía Celisa para la revisión en conjunto del sistema existente en el tramo a intervenir.
8. Se ha presentado dificultad con la suscripción de las actas de liquidación de alcantarillado y acueducto, con los usuarios de los predios que son habitados por arrendatarios, este trabajo ha sido traumático y retrasa los trabajos en cuanto a programación y ejecución de estas actividades.

CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021

9. En los tramos intervenidos en la carrera 15 entre 121 y 122 Praderas del norte y Carrera 19 entre 115 y 120 La Cabaña = Cantabria por ser predios que tienen cajas de inspección compartidas, se deben definir las entregas de estas cajas de inspección, actividad que ha sido dispendiosa y traumática por encontrarse estas ubicadas en los antejardines, siendo las ejecuciones de dichas cajas de inspección que deberían estar en los andenes respectivos de cada predio.
10. Para identificar la línea a intervenir en el tramo de la Ceiba Norte desde el mes de julio se localizó la línea a intervenir en dicho sector siendo necesario la presencia del video robot para identificar los pozos iniciales, sin que al momento contemos con el apoyo de dicho equipo.

En vista a estos sucesos en donde el CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021 depende de decisiones directas de la parte operativa del IBAL en cuanto a la programación de equipos y del personal operativo de la empresa para solucionar y poder avanzar de manera eficiente en cada sector intervenido, lo que representa atrasos en la programación y normal desarrollo de las actividades de obra.

De acuerdo a las actividades adelantadas en el contrato de la referencia, como son las de reposición de redes de alcantarillado y reposición de redes de acueducto, en sitios previamente identificados como de alta necesidad y teniendo en cuenta la fecha de terminación actual que tiene el contrato que es hasta el 28 de noviembre de 2021, la complejidad de las actividades para este tipo de intervención debido al proceso constructivo, se solicita muy respetuosamente que se trate con celeridad estos eventos en donde se solicita apoyo constante de los equipos y personal técnico de la Empresa, para cumplir con la ejecución del 100% de las actividades actualmente en ejecución.


JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA
C.C/79.262.433 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021
NIT 901.478.972 - 4

CC INGENIERO MATEO CASAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO
IBAL S.A. E. S. P.

CRA 7 N° 60-21 EDIFICIO DISTRITO 60 APTO 509
EMAIL: licitacionesjyh@gmail.com
Celular: 3114847660 - 3138512527
IBAGUE - TOLIMA

CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL

NIT. 901.479.007-6

Ibagué, 22 de septiembre de 2021.

Ingeniero
MATEO CASAS MIRANDA
Supervisor Contrato
IBAL S.A E.S.P OFICIAL
Ibagué


Asunto: Remisión de Informe Variantes realizadas Barrio La Floresta- -Villa Cindy

Reciba un cordial saludo,


Por medio del presente me permito remitir Informe 01 de las variantes realizadas del Barrio La Floresta y Barrio La Floresta – Villa Cindy, correspondiente al distrito N° 07.

Se anexa Informe 01.

Atentamente



LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
Contrato 0063 de 06 de mayo de 2021



CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL

NIT. 901.479.007-6

Señores,
Consortio redes hidráulicas
Ing. Residente Diego Girón

Cc: Mateo Casas Miranda
Supervisor distrito 7 contrato 062-

2021 19/08/2021

Referencia: Contrato de obra 062 de 2021.

Objeto: **DISTRITO 7** "rehabilitación y/o recuperación y/o reposición de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendidos para el distrito hidráulico nro.7 ubicado dentro del perímetro hidrosanitario del IBAL oficial en la ciudad de Ibagué"


Asunto: Solicitud de avance de obra.

Por medio de la presente se informa, una vez realizado recorrido de obra y evaluando el estado actual de la ejecución y el avance del proyecto que se encuentran actividades sin culminar que presentan atraso, por lo que se solicita que se intervengan a la brevedad posible los frentes para finalizar actividades ya iniciadas antes de continuar aperturando nuevos tramos de ejecución.

Se solicita finalizar trabajos en el tramo de la Calle 115 a 116 con cra 13 en el sector la cabaña y calle 117 y 119 con cra 13 sector Cantabria, se encuentra pendiente la entrega de acometidas domiciliarias que no se han realizado a la fecha en el costado de la manzana 15, se requiere también fundir tapas de pozos y cajas de inspección para cerrar los mismos y así controlar los problemas ambientales que se están presentando ya que los olores son muy fuertes e incómodos para la comunidad, por otra parte se solicita que el material descargado sea cubierto al finalizar la obra dado que se están presentando lluvias fuertes en la noches que alteran la composición del recebo. Se debe concluir los trabajos mencionados pues ha solicitado por escrito en bitácora y verbalmente en repetidas ocasiones sin solución a la fecha.

Atentamente,


LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
Cto. 063 de 2021


Pablo Gonzalez.



INTERVENTORIA EXTERNA IBAL

PRUEBAS DE LABORATORIO

2021

CONSORCIO DISTRITO 4 2021

Ibagué, 04 de octubre de 2021

020-2021

Señores

CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL 2021

RL. FRANCISCO ESPAÑA

Asunto: ENSAYOS DE DENSIDADES Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO.

Referencia: CONTRATO DE OBRA NO. 069 DEL 2021 CON OBJETO "REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO NO. 4 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ".

Cordial Saludo;

Por medio del presente correo, y conforme al cumplimiento del contrato de la referencia, me permito anexar los ensayos de densidades y peso unitario del suelo en el terreno por el método del cono y arena INV E-161-13, realizados para las siguientes calles:

- CALLE 22 CON Cra 4
- CALLE 22 CON Cra 7 y 8
- CALLE 39 CON Cra 5

Agradezco la atención prestada y quedamos atentos a lo pertinente.

Cordialmente:




David Fernando Martínez

Ingeniero Civil

CC. 1.110.571.936

R.L Consorcio Distrito 4 2021

CC: ING. JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO- PROFESIONAL EN MANEJO DE CATASTRO Y REDES- IBAL SA ESP- SUPERVISOR CTO 069-2021



Informe de Ensayo:
DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y
ARENA, INV E - 161 - 13

Fecha de Actualización:
2018-10-02

RECONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE AQUECIMIENTO Y AL CANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 4 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL BAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE EN LA CALLE 22 CADA CARRERA 4 TALLERES.

REVISADO POR:
INGECTON S.A.S.
LABORATORIO DE ENSAYOS

Investigado en: **COMISIÓN DISTRITO 4** Atmósfera: **ING. JAZMIN GOMEZ**
 Teléfono Contacto: **22-22663** Edificación Construida: **CL. 2A F. 2 C. 35 URB. CIUDAD SATELITE AP 03 (SUCRE - SANGELILO)**
 Identificación: **ENSAYOS REALIZADOS AL MATERIAL DE LA REDEBERA LA ESMERALDA UTILIZADO COMO TERRAPLÉN**
 Fecha Ensayo: **2021-09-25** Fecha Informe: **2021-09-26** Orden Servicio: **OS-17165** Código Obra: **CO-2487**
 Equipo Densidades N°: **L-020** Director de Laboratorio: **Jerson Castró M.**

| Ensayo N° | Localización Atmósfera | Carga | Peso arena húmeda (g) | Peso arena y frasco y arena resistente (g) | Peso arena total usada (g) | Compartes (g) | Peso arena en el frasco (g) | Densidad de la arena (g/cm³) | Volumen del hueco (cm³) | Peso material extraído húmedo (g) | % Humedad (denomina do INV- 150-13) | % Humedad Corregida Horno | Peso material seco (g) | Peso Unitario material seco (g/cm3) | Peso Unitario máximo laboratorio (g/cm3) | % Humedad optima laboratorio | % de compactación terreno |
|-----------|---------------------------------|-------|-----------------------|--|----------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|
| 4 | Calle 22 con Cra 4 K.0+000 | Única | 5077 | 2542 | 3475 | 1448 | 2027 | 1,328 | 1528 | 3250 | 7,5 | 8,4 | 2998 | 1,954 | 2,063 | 8,9 | 98,2% |
| 5 | Calle 22 con Cra 4 K.0+000 | Única | 5071 | 2505 | 3516 | 1448 | 2058 | 1,328 | 1550 | 3220 | 5 | 5,5 | 3052 | 1,970 | 2,063 | 8,9 | 98,5% |
| 6 | Calle 22 con Cra 4 K.0+030 | Única | 5068 | 2490 | 3558 | 1448 | 2120 | 1,328 | 1598 | 3358 | 6,2 | 6,9 | 3141 | 1,988 | 2,063 | 8,9 | 98,4% |
| 7 | Calle 22 con Cra 4 K.0+041,50 | Única | 5068 | 2408 | 3590 | 1448 | 2132 | 1,328 | 1605 | 3299 | 5,8 | 6,2 | 3106 | 1,936 | 2,063 | 8,8 | 93,8% |
| 8 | Calle 22 entre 7 y 8 K.0+036 | Única | 5067 | 2550 | 3417 | 1448 | 1898 | 1,328 | 1483 | 3115 | 6,1 | 6,8 | 2917 | 1,967 | 2,063 | 8,9 | 98,4% |
| 9 | Calle 22 entre 7 y 8 K.0+071,70 | Única | 5050 | 2505 | 3442 | 1448 | 1994 | 1,328 | 1502 | 3232 | 7,1 | 7,9 | 2965 | 1,995 | 2,063 | 8,9 | 98,7% |
| 10 | Calle 22 entre 7 y 8 K.0+026 | Única | 5042 | 2475 | 3467 | 1448 | 2019 | 1,328 | 1520 | 3219 | 6,3 | 7 | 3008 | 1,979 | 2,063 | 8,9 | 98,9% |
| 11 | Calle 22 entre 7 y 8 K.0+040 | Única | 5070 | 2365 | 3505 | 1448 | 2057 | 1,328 | 1549 | 3315 | 6,8 | 7,6 | 3081 | 1,889 | 2,063 | 8,9 | 96,4% |

Los resultados de este informe son válidos para el uso que se le da en el momento de su emisión. Este informe no puede ser reproducido sin el consentimiento escrito de Ingecton S.A.S. Este informe no es válido si se modifica el contenido de los datos. Este informe no es válido si se modifica el contenido de los datos.

**Informe de Ensayo:
DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL MÉTODO DEL CONO Y
ARENA, UN E - 161 - 13**

Fecha de Actualización:
2018-10-02

REHABILITACION Y/O RECONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUAS RESIDUALES Y ALICATORILLADO PARA CERRILLOS Y LA
CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPROMETIDOS PARA EL DISTRITO HISTRALIZADO NO 4 UBICADO CENTRO DEL PERIMETRO
HIDRO SANITARIO DEL DSNL SA ESP. OFICIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LA CALLE 38 SUR DE CALLES CARRETERAS S Y 48

INGEOCONSULTORES SAS
CENTRO DE BORTORIO

CONSORCIO DISTRITO 4
Atención: ING. JUAN GOMEZ
Equipo Operativo N°: 5-057

Teléfono Contacto: 2723859
Dirección: Calle 20 con Cra 5 - 41

Descripción: ENSAYOS REALIZADOS AL MATERIAL DE LA RECEBERIA LA ESPERANZA UTILIZANDO CONO Y ARENA

Fecha Ensayo: 2021-09-25
Fecha Informe: 2021-09-28
Código Obra: 06-77184
Código Obra: 00-2489
Emplazamiento: 1-020
Ejecutor de Laboratorio: S-1874
Ejecutor de Laboratorio: S-1874

Observaciones

| Ensayo N° | Localización: Abcissas Cota | Cantidad ocultado | Capo | Peso arena líquido (kg) | Peso arena y material líquido (kg) | Peso arena total (kg) | Comparto concreto (m³) | Peso concreto (kg) | Densidad del concreto (kg/m³) | Volumen del concreto (m³) | Peso material extraído del concreto (kg) | % humedad del material extraído (%) | Humedad del material extraído (%) | Peso material seco (kg) | Peso material seco (kg) | Peso material seco (kg) | % de humedad del material seco (%) | % de humedad del material seco (%) |
|-----------|---------------------------------------|----------------------|-------|-------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|---|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| 3 | Calle 39 con Cra 5 - 41 K.0-042,60 | Requisito | Única | 67157 | 25778 | 35779 | 14448 | 27031 | 13388 | 18015 | 3055 | 5 | 5,5 | 37180 | 13982 | 21063 | 8,9 | 96,1% |
| 4 | Calle 39 con Cra 5 - 41 K.0-017,50 | Requisito | Única | 67140 | 25804 | 35805 | 14448 | 27058 | 13388 | 18015 | 3402 | 7,9 | 8,7 | 37180 | 13991 | 21063 | 8,9 | 96,5% |
| 5 | Calle 39 con Cra 5 - 41 K.0-018,50 | Derecho | Única | 67128 | 25795 | 35796 | 14448 | 27045 | 13328 | 18015 | 3025 | 5,3 | 7 | 37178 | 13964 | 21063 | 8,9 | 96,2% |
| 6 | Calle 39 con Cra 5 - 41 K.0-033,30 | Derecho | Única | 67019 | 25710 | 35710 | 14448 | 27032 | 13328 | 18015 | 3050 | 5,6 | 6,4 | 37186 | 13951 | 21063 | 8,9 | 96,1% |

Los resultados pertenecen únicamente a las muestras enviadas. El laboratorio no es responsable de los errores de interpretación de los resultados. El cliente debe proporcionar toda la información necesaria para la realización de los ensayos. El laboratorio no es responsable de los errores de interpretación de los resultados. El cliente debe proporcionar toda la información necesaria para la realización de los ensayos.

-Fin Informe-



LABORATORIO DE SUELOS
Concretos, Pavimentos y Estudios de Suelos
Leonardo Valderrama

WZB-161

DENSIDAD EN EL TERRENO

Distrib
9/3/20
P. 10/20

Obr: REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRÁULICOS N°. 9 Y 10 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DE IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGÜE.

Remitente: UNIÓN TEMPORAL JPO 19

07 de Septiembre de 2021

NIT: 801.495.529-6

| Abscisas | SUPER MANZANA 11 - MANZANA 6 - CASA 3 | SUPER MANZANA 11 - MANZANA 4 - CASA 8 | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Profundidad metros | 0.15 | 0.15 | | | |
| Material | RECEBO | RECEBO | | | |
| Peso frasco y arena inicial (Grs.) | 6.312 | 6.248 | | | |
| Peso frasco y arena restante (Grs.) | 3.189 | 3.121 | | | |
| Peso arena total usada | 3.123 | 3.127 | | | |
| Constante del cono | 1.525 | 1.525 | | | |
| Peso arena en el hueco | 1.598 | 1.602 | | | |
| Densidad de la arena | 1.423 | 1.423 | | | |
| Volumen del hueco | 1.123 | 1.126 | | | |
| Peso material extralido humedo | 1.989 | 2.002 | | | |
| % Humedad | 6.6 | 7.5 | | | |
| Peso material extralido seco | 1.866 | 1.862 | | | |
| Densidad del material Gms./cc. | 1.662 | 1.654 | | | |
| Densidad del material Lbs./pie ³ | 103.7 | 103.2 | | | |
| Densidad max. Laboratorio Lbs./pie ³ | 108.0 | 108.0 | | | |
| % Humedad optima laboratorio | 10.7 | 10.7 | | | |
| % De compactacion terreno | 95.5 | 95.1 | | | |
| % De compactacion especificada | 95 | 95 | | | |

OBSERVACIONES:

Leonardo Valderrama
Leonardo Valderrama
Ing. Control Calidad

Leonardo Valderrama
Laboratorista



LABORATORIO DE SUELOS
 Concretos, Pavimentos y Estudios de Suelos
 Leonardo Valderrama

Método 107
DENSIDAD EN EL TERREJO

Obras REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRÁULICOS N° 9 Y 10 UBICADOS DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO-SANITARIO DE BALSA ESP. OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ

Remite: UNION TEMPORAL JPO 16
 NIT: 901.495.529-6 07 de Septiembre de 2021

| Adscripción | SUPER MANZANA 5 - MANZANA 4 - CASA 13 | SUPER MANZANA 5 - MANZANA 4 - CASA 20 | SUPER MANZANA 5 - MANZANA 5 - CASA 13 | SUPER MANZANA 1 - MANZANA 3 - CASA 11 | SUPER MANZANA 1 - MANZANA 4 - CASA 17 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Profundidad metros | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Muestra | RECEBO | RECEBO | RECEBO | RECEBO | RECEBO |
| Peso frasco y arena (grm.) | 5,305 | 5,026 | 5,010 | 5,512 | 5,430 |
| Peso frasco y arena saturada (grm.) | 2,242 | 2,022 | 2,021 | 2,012 | 2,202 |
| Peso arena total usada | 2,463 | 3,031 | 2,989 | 2,900 | 3,169 |
| Constante del cono | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 |
| Peso arena en el hueco | 1,438 | 1,506 | 1,464 | 1,375 | 1,643 |
| Densidad de la arena | 1,423 | 1,423 | 1,423 | 1,423 | 1,423 |
| Volumen del hueco | 1,011 | 1,028 | 1,029 | 0,958 | 1,155 |
| Peso material extraído húmedo | 1,783 | 1,875 | 1,872 | 1,654 | 2,027 |
| % Humedad | 6,7 | 7,0 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Peso material extraído seco | 1,671 | 1,752 | 1,715 | 1,551 | 1,919 |
| Densidad del material (grm./cc) | 1,654 | 1,679 | 1,667 | 1,627 | 1,659 |
| Gravidad del material (lb./ft ³) | 103,7 | 103,7 | 104,0 | 103,4 | 103,9 |
| Densidad max. laboratorio (lb./ft ³) | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 |
| % compactación laboratorio | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| % de compactación terreno | 88,8 | 88,1 | 88,8 | 88,2 | 88,3 |
| % de compactación especificada | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |

OBSERVACIONES

Leonardo Valderrama
 Ing. Geólogo Civil

Laboratorio
