

de material de excavación acumulado. Se hace mantenimiento de
batería sanitaria y puntos ecológicos.

José Luis Jiménez

Vélez

Sábado 4 de junio de 2022

Tiempo = Seco

Personal = Oficial, 4 ayudantes.

Maquinaria = Canguro, bobcat, herramienta menor.

Actividades = Se continúa con los llenos compactados en la red de
acueducto y se realiza retiro de material de excavación.

José Luis Jiménez

Vélez

Lunes 6 de junio de 2022

Tiempo = Lluvias en la mañana

Personal = Oficial y 4 ayudantes

Maquinaria = Canguro, planta, herramienta menor.

Actividades = Se continúa con los llenos compactados en la red de
acueducto, se realiza la prueba de hermeticidad en la red instalada con
85 libras de presión durante 2 horas, el resultado fue satisfactorio.
Se continúa con la actividad de llenos compactos sobre la
red de acueducto instalada, se deja todo señalizado.

José Luis Jiménez

Vélez

Martes 7 de junio de 2022

Tiempo = Seco

Personal = Oficiales 2, ayudantes 5, topógrafo, SISO

Maquinaria = Compresor, martillo, bobcat, benitín, herramienta menor.

Actividades = Se continúa con los llenos compactados
en la red de acueducto y se realiza retiro de
material de excavación.

José Luis Jiménez

Vélez


Miércoles 8 de Junio de 2022

Tiempo = Lluvias en la madrugada y seco el resto de día

Personal = Oficial y 4 ayudantes.

Maquinaria = Canguro, herramienta menor.

Actividades = Se continúa con la excavación y llenos compactados en la red de acueducto, se realiza limpieza del frente de obra.

Juan Luis 


Jueves 9 de Junio de 2022

Tiempo = Seco

Personal = Oficial y 4 ayudantes

Maquinaria = Canguro, herramienta menor.

Actividades = Se continúa con los llenos compactados en la red de acueducto después de realizar el manejo de aguas

Juan Luis 

Viernes 10 de Junio de 2022

Tiempo = Lluvias en la madrugada

Personal = Oficial y 4 ayudantes.

Maquinaria = Canguro, herramienta menor.

Actividades = Se continúa con los llenos compactados en la red de acueducto, el proceso es lento debido a la distancia que se debe recorrer de traslado del material de relleno hasta las zanjas por ser un callejón peatonal.

Juan Luis 



Sábado 11 de Junio de 2022

Tiempo = Lluvias

Personal = Oficial y 2 ayudantes.

Maquinaria = herramienta menor.

Actividades = Se continúa con el trasiego de material de lleno desde la vía principal hasta el callejón de la calle 56. Se realiza mantenimiento de batería sanitaria y puntos ecológicos.

por edil.  



Lunes 13 de Junio de 2022

Tiempo = Seco

Personal = Oficial y 4 ayudantes

Maquinaria = herramienta menor.

Actividades = Se continúa de trasiego de material de llenos y compactación en el callejón calle 56. Se realiza retro de material de excavación que se encontraba en el callejón de la calle 56 y se continúa con los llenos compactados de la red de acueducto.

por edil.  



Martes 14 de Junio de 2022

Tiempo = Seco

Personal = Oficial y 4 ayudantes

Maquinaria = Canguro, herramienta menor.

Actividades = Se continúa con el trasiego de material desde la calle principal hasta el callejón calle 56 para terminar los llenos compactados de la red de acueducto.

por edil.  

Miércoles 15 de Junio de 2022

Tiempo = Lluvias en la mañana

Personal = Oficial y 4 ayudantes.

Maquinaria = Canguro, herramienta menor.

Actividades = Se continúa con los llenos compactados en la red de acueducto en el callejón de la calle 56 teniendo en cuenta que el trasiego del material está retirado.

Jhr. Luis. Amador



Jueves 16 de Junio de 2022


Tiempo = Lluvias en la mañana y la tarde

Personal = Oficial y 4 ayudantes.

Maquinaria = Canguro, herramienta menor.

Actividades = Se realiza llenos compactados en la red de acueducto instalado después de hacer limpieza de las zanjas por las lluvias presentadas.

Jhr. Luis. Amador



Viernes 17 de Junio de 2022

Tiempo = Seco

Personal = Oficial y 4 ayudantes.

Maquinaria = Canguro, herramienta menor.

Actividades = Se avanza con los llenos compactados sobre la red de acueducto, ya se terminaron en el callejón de la calle 56 y se continúa con la entrada.

Jhr. Luis. Amador



Sábado 18 de Junio de 2022

Tiempo = Seco

Personal = Oficial y 4 ayudantes

Maquinaria = Canguro, herramienta menor, bobcat.

Actividades = Se continúa con los llenos compactos sobre la red de acueducto y se hace retiro de material de excavación.

Jhr. Luis. Amador



Martes 21 de junio


Tiempo = Lluvias fuertes en la mañana

Personal = Oficial, 4 ayudantes.

Maquinaria = Canguro, compresor, martillo, herramienta menor.

Actividades = Se termina la instalación del certamiento en lona sobre la vía principal y se inicia demolición del pavimento existente en un tramo de 30 mt, se inicia la excavación de la red de acueducto.

Nota = Se suspenden actividades por suspensión temporal del contrato.

pl. Lic. 




24 de agosto de 2022


Tiempo = Lluvias moderadas en la tarde

Personal = Oficial, maestro, 4 ayudantes

Maquinaria = Compresor, martillo, herramienta menor.

Actividades = Se inicia la excavación sobre la carrera 22A y se hace un retiro en volqueta sencilla, se instala el primer tubo de 3".

pl. Lic. 




Miércoles 26 de agosto de 2022

Tiempo = Soleado

Personal = Maestro, oficial, 4 ayudantes.

Maquinaria = Compresor, martillo, herramienta menor.

Actividades = Se continúa con la demolición y excavación de la línea de acueducto de 3", se hace retiro de material de excavación, se hace jornada de aseo y se realiza la señalización preventiva en las excavaciones.

pl. Lic. 




Lunes 29 de agosto de 2022

Tiempo = Lluvias fuertes en la mañana.

Personal = Oficial, Ins auxiliar, maestros 1, auxiliar siso, ayudantes 3.

Maquinaria = Compresor, martillo, herramienta menor.

Actividades = Se identifican puntos de empalme y se adelantan las excavaciones de los mismos.

por Abel. 




Martes 30 de agosto de 2022

Tiempo = Soleado

Personal = Ins auxiliar, maestro, Oficial, ayudantes (2)

Maquinaria = Compresor, martillo, herramienta menor.

Actividades = Se inician los cruces de la demolición para las domiciliarias del costado lateral derecho, se acepta el pavimento demolido para retiro y se renueva señalización preventiva de las excavaciones.

por Abel. 



Viernes 30 de septiembre del 2022


Tiempo = Parcialmente nublado

Personal = Oficiales 2, ayudantes 4, Ins auxiliar

Maquinaria = Compresor, martillo, herramienta menor, Soltavin

Actividades = Se continúa la instalación de los collares de derivación y mangueras p.f. Se continúa con el lleno y compactación de las excavación y de la línea de acueducto y empalmes.

Nota = No se habían retomado actividades por suspensión temporal del contrato.

por Abel. 



Lunes 3 de octubre de 2022

Tiempo = Soleado

Personal = Oficiales 2, ayudantes 3.

Maquinaria = Turbo, Soltarin, herramienta menor

Actividades = Se realiza el cargue y retiro de sobrantes, y se adelanta la recuperación de andenes, se termina de compactar la última excavación de la línea de acueducto en la carrera 22A, aguas arriba.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Martes 4 de octubre de 2022

Tiempo = Nublado

Personal = Oficiales 2, ayudantes 3.

Maquinaria = Turbo, herramienta menor.

Actividades = Se culmina la recuperación de los últimos andenes, se retira la señalización preventiva y se hace limpieza y retiro de sobrantes dando por finalizadas las actividades en este sector.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CERTIFICACION PEGMA



CONSORCIO
SECTOR 6
Nit: 901490124-4

CERTIFICACION REGIMEN

1998-01-01

1998-01-01



IBAGUÉ VIBRA

Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola
- Pbx: (8)2756000 - Fax: (8) 2618982
P.Q.R: Carrera 5 No. 41-16 edificio F25 Piso 2
CANALES DE ATENCIÓN (116) Ibagué - Tolima /
www.ibal.gov.co - ventanilla.unica@ibal.gov.co

211-415

Ibagué, 26 de noviembre de 2021

Doctor
JHON JAIRO PEÑA SERRATO
Representante legal CONSORCIO SECTOR 6
Contrato de obra N° 089 de 18/06/2021
Cra. 5 N°11-24 oficina 401 Edificio Torre Empresarial.
joiapese@hotmail.com
La ciudad

Asunto: Aprobación PEGMA Contrato de Obra N°089 del 18 de junio de 2021, Respuesta Radicado N° 16890 del 20/11/2021.

Cordial Saludo:

Me permito informar que se ha revisado la información que se allego a esta dependencia, con el fin de obtener aprobación del PEGMA para el Contrato N°089 del 18 de junio de 2021 y que tiene como objeto *"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO 06 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A. E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ."* Fue revisada y cumple con los requisitos exigidos en la "lista de Chequeo para Revisión de la Guía de Manejo Ambiental para Obras", se informa que el PEGMA queda APROBADO, es de resaltar que se debe a llegar a esta dependencia el informe de actividades ambientales desarrolladas durante la ejecución del contrato y se realizara visita de campo para verificar la ejecución de dicha Guía en frente de obra.

Atentamente,


ALEXI LILIANA BUITRAGO CAYCEDO
Líder de Gestión Ambiental

Proyecto: Juan Carlos Celemín Bedoya -Gestión Ambiental.
Anexo: (2 folios)

C.C: JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLA- PROFESIONAL DE MANEJO DE CATASTRO Y REDES -SUPERVISOR




SECRET

Page 2 of 2

Dr. Jhon Jairo Berra Serrato
Representante legal CONSORCIO SECTOR 8
Carrera de obra N° 003 de 1902/2001
Calle 1711-24 Oficina 401 Edificio Torre Empresarial
Bogotá, Colombia
Teléfono: 310 4000000

Asunto: Asociación PEGMA Contrato de Obra N° 003 de 1902/2001. Faltas de Pago

Me permito informarle que se ha revisado la información con el fin de obtener aprobación del PEGMA para el contrato N° 003 de 1902/2001 y que tiene como objeto REHABILITACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCAANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO DE LA ZONA DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSAFARI DEL VALLE CAJES. ORIGINAL EN LA OFICINA DE LA ASOCIACION PEGMA. Fue revisado y cumple con los requisitos exigidos en la lista de requisitos para la revisión de la Guía de Manejo Ambiental para Obras, se informa que la PEGMA queda APROBADA, es de resaltar que se debe a llegar a esta decisión a través de actividades ambientales desarrolladas durante la ejecución del contrato y se recomienda para verificar la ejecución de dichas actividades en el frente de obra.

Atentamente,

Juan Carlos Chelín Berra
Liberada Gestión Ambiental

Profesor Juan Carlos Chelín Berra - Gestión Ambiental
Bogotá, D.C.

CC: AVAR, ASOCIACION SUBANADA SURELA, PROFESOR JUAN CARLOS CHELIN BERRA, DATASOL, REDES SECTOR 8



ENTREGA CECOI



CONSORCIO
SECTOR 6
Nit: 901490124-4

ENTREGA DECOI

ENTREGA INFORMACION GEOGRAFICA - ACTUALIZACION CATASTRO - CONTRATO DE OBRA 089 DE 18 DE JUNIO DE 2021 - CONSORCIO SECTOR 6 - DISTRITO 6

CONSORCIO SECTOR 6 <consorciosector6@gmail.com>
para: catastro@ibal.gov.co
CC: "jibustog@yahoo.es" <jibustog@yahoo.es>
fecha: 13 ene 2023, 18:43

Respetado Ing. Bustos

por medio del presente le hacemos entrega de la información geográfica - actualización catastro - contrato de obra 089 de 18 de junio de 2021 - consorcio sector 6 - distrito 6

- Informe de topografía (sobre procedimiento, trabajos realizados y documentación esplosos y topografía) (10 folios)
- Fichas reportes de traslado de coordenadas, materialización y amarras de coordenadas (45 folios)
- (13) Planos digitales en versión AutoCAD civil 3D, con los detalles de la totalidad de las calles intervenidas.
- (13) archivos de excel con las cartillas electrónicas de la totalidad de las calles intervenidas.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
RL CONSORCIO SECTOR 6
Cra 5 No. 11-24 Edificio Torre Empresarial Oficina 401
Itaque - Tolima

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

INSTRUMENTO	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLÍQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
EGUROS LPATRIA	15	\$865.800	0	\$0	\$0	\$865.800	145	\$128.000	\$993.800	0	\$0	\$9.938	\$993.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMPATOLIMA	15	\$497.500	145	\$73.600	\$571.100
SENA	0	\$0	145	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	145	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	145	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	145	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	\$571.200
PENSIONES	2	\$2.283.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$993.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$571.100
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$4.419.700



in: sent

X 𠄎

Redactar

402

Recibidos

Destacados

Postpuestos

Enviados

Borradores

Más



CONSORCIO SECTOR 6 <consorciosector6@gmail.com>

para catastro, jibustostg@yahoo.es

Cordial saludo

Respetado Ing. Bustos

Etiquetas

Por medio del presente le hacemos entrega formal, en medio digital de la información pertinente para actualización de la base de datos de su catastro, con ocasión de las obras adelantadas por el CONSORCIO SECTOR 6, cuyo objeto es la RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO N.º 6 PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL I.B.A.L.S.A.E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ. Información la detallamos a continuación:

- Informe de topografía (sobre procedimiento, trabajos realizados y documentación equipos y topógrafo) (10 folios).
- Fichas reporte de traslado de coordenadas, materialización y amarre de coordenadas (45 folios).
- (13) Planos digitales en versión Autocad civil 3D, con los detalles de la totalidad de la calles intervenidas.
- (13) archivos de excel con las cartelas electrónicas de la totalidad de calles intervenidas.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
R.L. CONSORCIO SECTOR 6
Cra 5 No. 11-24, Edificio Torre Empresarial Oficina 401
Ibagué- Tolima

7 archivos adjuntos • Analizado por Gmail



Министерство культуры Российской Федерации

Музей-заповедник «Исако-Покровский монастырь»

Исако-Покровский монастырь

Музей-заповедник «Исако-Покровский монастырь»

Исако-Покровский монастырь

Исако-Покровский монастырь

Исако-Покровский монастырь

Исако-Покровский монастырь

Исако-Покровский монастырь

Исако-Покровский монастырь

Исако-Покровский монастырь

Исако-Покровский монастырь

Исако-Покровский монастырь

Исако-Покровский монастырь

Исако-Покровский монастырь

Исако-Покровский монастырь

Исако-Покровский монастырь

Исако-Покровский монастырь

Исако-Покровский монастырь

Исако-Покровский монастырь

Исако-Покровский монастырь

Исако-Покровский монастырь

Исако-Покровский монастырь

ENTREGA INFORMACION GEOGR... X +

msa.google.com/mail/u/0/#sent/1CgciHwHspafqDhMnch2mmabCTHbbMncQ

196/233

ENTREGA INFORMACION GEOGRAFICA - ACTUALIZACION CATASTRO - CONTRATO DE OBRA 089 DE 18 DE JUNIO DE 2021 - CONSORCIO SECTOR 6 - DISTRITO 6

CONSORCIO SECTOR 6 conprosector6@gmail.com
para contactar: jautog@ibague.es

Cordial saludo

Respetado Ing. Bustos


Por medio del presente le hacemos entrega formal en medio digital de la información pertinente para actualización de la base de datos de su catastro con ocasión de las obras adelantadas por el CONSORCIO SECTOR 6, cuyo objeto fue "REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y AL CANTARRILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO-SANITARIO DEL IBALSA E.S.P. OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE" información la detallamos a continuación

- Informe de topografía (sobre procedimiento, trabajos realizados y documentación equipos y topógrafo 1x10 folios)
- Fichas reporte de traslado de coordenadas, materialización y amarré de coordenadas (45 folios)
- (13) Planos digitales en versión AutoCAD civil 3D con los detalles de la totalidad de la calle intervenidas
- (13) archivos de excel con las cartillas electrónicas de la totalidad de calles intervenidas.


Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

ING. JHON JAIRO PEÑASERRATO
R.L. CONSORCIO SECTOR 6
Cra 5 No. 11-24, Edificio Torre Empresarial Oficina 401
Ibagué- Tolima

7 archivos adjuntos • Analizado por Gmail



0:45 p.m. 18/07/2021





PLANOS RECORD IMPRESOS



CONSORCIO
SECTOR 6
Nit: 901490124-4

PLANOS RECORD IMPRESOS

INFORMES DE OBRA



CONSORCIO
SECTOR 6
Nit: 901490124-4

INFORMES DE OBRA



INFORMES DE OBRA
AGOSTO/2022


CONSORCIO
SECTOR 6
Nit: 901490124-4

INFORMES DE OBRA

AGOSTO 1952

INFORME DE AVANCE DE OBRA No. 13

CONTRATO DE OBRA No. 0089 DE 18 DE JUNIO DE 2021



“REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P. OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ”.

PERIODO: DEL 24 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

IN FORME DE AVANCE DE OBRA N.º 13

CONTRATO DE OBRA N.º 0089 DE 18 DE JUNIO DE 2023

“REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE
LAS REDES DE ACUEDUCTO Y/O SANEAMIENTO PARA
SANEAMIENTO LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS
SECTORES COMPROMISOS PARA EL DISTRITO
RIPONALUCO N.º 6 BRIGADA CUARTO DE PERMUTACION
MUNICIPALIDAD DEL IBAZ SA S.R.L. ORIGINAL EN LA
CIUDAD DE IBAGOEN”

INFORMACION CONTRATO	
CONTRATO DE OBRA No.	0089 DE 18 DE JUNIO DE 2021
OBJETO	"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"
VALOR	\$ 2.784.659.942,00
ANTICIPO	\$ 0,00
PLAZO	CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO
PRORROGA No. 01	SETENTA Y NUEVE (79) DIAS CALENDARIO
PRORROGA No. 02	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL	DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE (289) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	12/07/2021
SUSPENSION No. 01	23/12/2021
REINICIACION No. 01	24/01/2022
SUSPENSION No. 02	1/04/2022
REINICIACION No. 02	22/04/2022
SUSPENSION No. 03	16/05/2022
REINICIACION No. 03	31/05/2022
SUSPENSION No. 04	22/06/2022
PRÓRROGA DE LA SUSPENSIÓN No. 04	22/07/2022
PRÓRROGA 02 DE LA SUSPENSIÓN No. 04	5/08/2022
PRÓRROGA 03 DE LA SUSPENSIÓN No. 04	18/08/2022
FECHA DE REINICIO No. 04	24/08/2022
FECHA DE TERMINACION	5/09/2022
CONTRATISTA	CONSORCIO SECTOR 6
R.L.	ING JHON JAIRO PEÑA SERRATO
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
R.L.	ING. LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
CONTRATANTE	IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
SUPERVISOR	ING. LUISA FERNANDA HENAO GARCIA
PERIODO INFORME	DEL 24/08/2022 AL 31/08/2022

El presente informe trata las actividades concernientes a desarrollar la ejecución del **CONTRATO DE OBRA No. 089 DE 18 JUNIO DE 2021.**

A continuación, se describe las actividades desarrolladas para cumplir con el objeto del citado contrato con fecha de corte del **24 al 30 de AGOSTO de 2022:**

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	100	1000000
REPARACIÓN DE EQUIPOS	50	500000
SERVICIO DE CONSULTA	200	200000
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	150	150000
SERVICIO DE ENTRENAMIENTO	80	80000
MANTENIMIENTO DE HARDWARE	120	120000
SERVICIO DE ASesorIA	100	100000
MANTENIMIENTO DE RED	90	90000
SERVICIO DE MONITOREO	70	70000
MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD	60	60000
SERVICIO DE RESPALDO	50	50000
MANTENIMIENTO DE SERVIDORES	40	40000
SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN	30	30000
MANTENIMIENTO DE Bases de datos	20	20000
SERVICIO DE ANÁLISIS	10	10000
MANTENIMIENTO DE APlicaciones	10	10000
SERVICIO DE Soporte técnico	10	10000
MANTENIMIENTO DE Herramientas	10	10000
SERVICIO DE Actualización	10	10000
MANTENIMIENTO DE Licencias	10	10000
SERVICIO DE Migración	10	10000
MANTENIMIENTO DE Archivos	10	10000
SERVICIO DE Recupero	10	10000
MANTENIMIENTO DE Copias de seguridad	10	10000
SERVICIO DE Eliminación	10	10000
MANTENIMIENTO DE Desfragmentación	10	10000
SERVICIO DE Limpieza	10	10000

El presente contrato tiene un valor total de \$10,000,000.00 (diez millones de dólares) y se ejecutará durante un periodo de 12 meses, a partir del día de la firma del presente contrato. El pago se realizará de acuerdo a lo establecido en el cronograma de pagos adjunto.

SEMANA DEL 24 AL 27 DE AGOSTO DE 2022

JORDAN 3 ETAPA

Se continua con la elaboración de acometidas domiciliarias de alcantarillado, sobre la calle 76, se realizan corte y demolición de andenes en concreto, para ubicación de cajas de inspección existentes, su respectiva demolición y reposición de las mismas.

Se realiza excavaciones manuales para acometidas domiciliarias de alcantarillado y sumideros de recolección de aguas lluvias.

De manera paulatina se proceder con la recuperación de zanjas mediante de rellenos en recebo y se retira material sobrante.


Se continua con las excavaciones manuales sobre la calle 76, para la reposición de la red de acueducto en 3"; a medida que se avanza con las excavaciones de instala tubería y se recuperan excavaciones mediante rellenos en recebo.



LA ANA DEL... AL 31 DE AGOSTO DE 201...

101. LA ESTADIA

201. La estadía de los turistas en el Hotel...
El hotel cuenta con un total de 100 habitaciones...
Las estadías se registran en el libro de...
El personal del hotel debe verificar...
La estadía de los turistas debe ser...
El hotel debe proporcionar...
La estadía de los turistas debe ser...
El hotel debe proporcionar...



SAN ANTONIO

Una vez instalada la totalidad de la tubería de acueducto 3", se procede a retirar todo el material procedente de las excavaciones.

Queda pendiente definir los detalles y la programación de los empalmes de acueducto ente sector, para finiquitar los trabajos de intervención en este sector.



SEMANA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

JORDAN 3 ETAPA

Se continua con las excavaciones manuales para reponer tubería de sumideros con la instalación de la misma, se construyen sumideros en concreto y se realizan rellenos en recebo sobre las excavaciones intervenidas, sobre la calle 76.


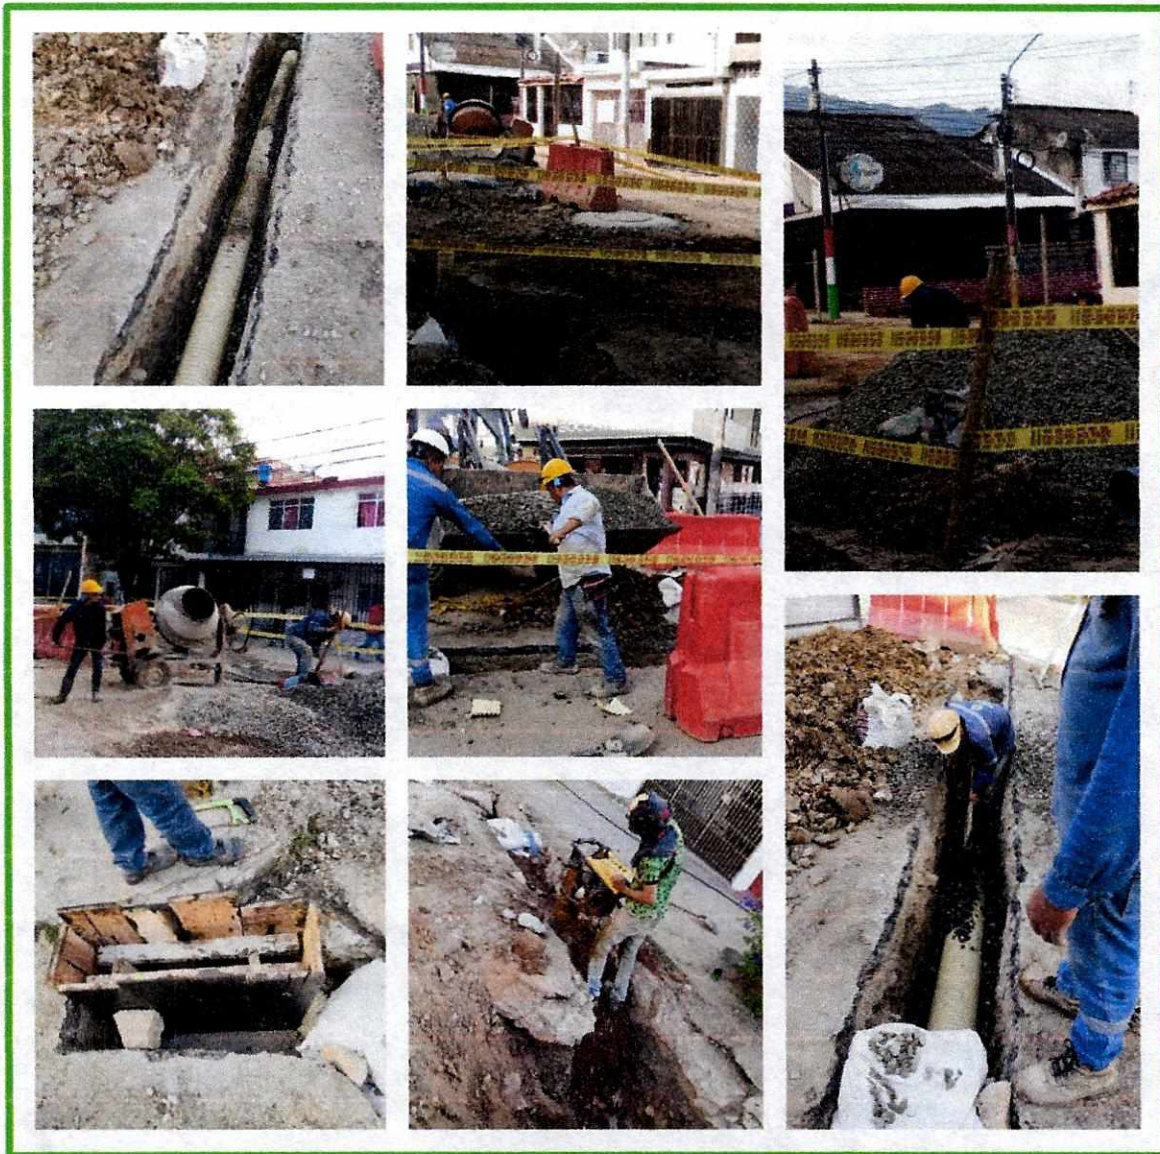


FIGURE 1

The temple of Ankh-emwet is situated on the east bank of the Nile, just below the temple of Ankhnesneferibre. It is a small temple, but it is one of the best preserved of the group. The temple is built of red granite and is decorated with hieroglyphs and lotus flowers. The temple is dedicated to the goddess Ankh-emwet, who is shown in the temple with her husband, Ankhnesneferibre. The temple is a fine example of the art of the late New Kingdom.




Se realiza la instalación de accesorios de derivación para las acometidas de acueducto y recuperaciones en concreto sobre andes de las zonas intervenidas.




Se instalan tapas en fibro concreto, rejillas para sumideros y se elaboran tapas en concreto para cajas de inspección de acometidas domiciliarias.

... la distribución de personas de acuerdo a las zonas de actividad y las actividades económicas de las zonas de actividad.




... la distribución de personas de acuerdo a las zonas de actividad y las actividades económicas de las zonas de actividad.

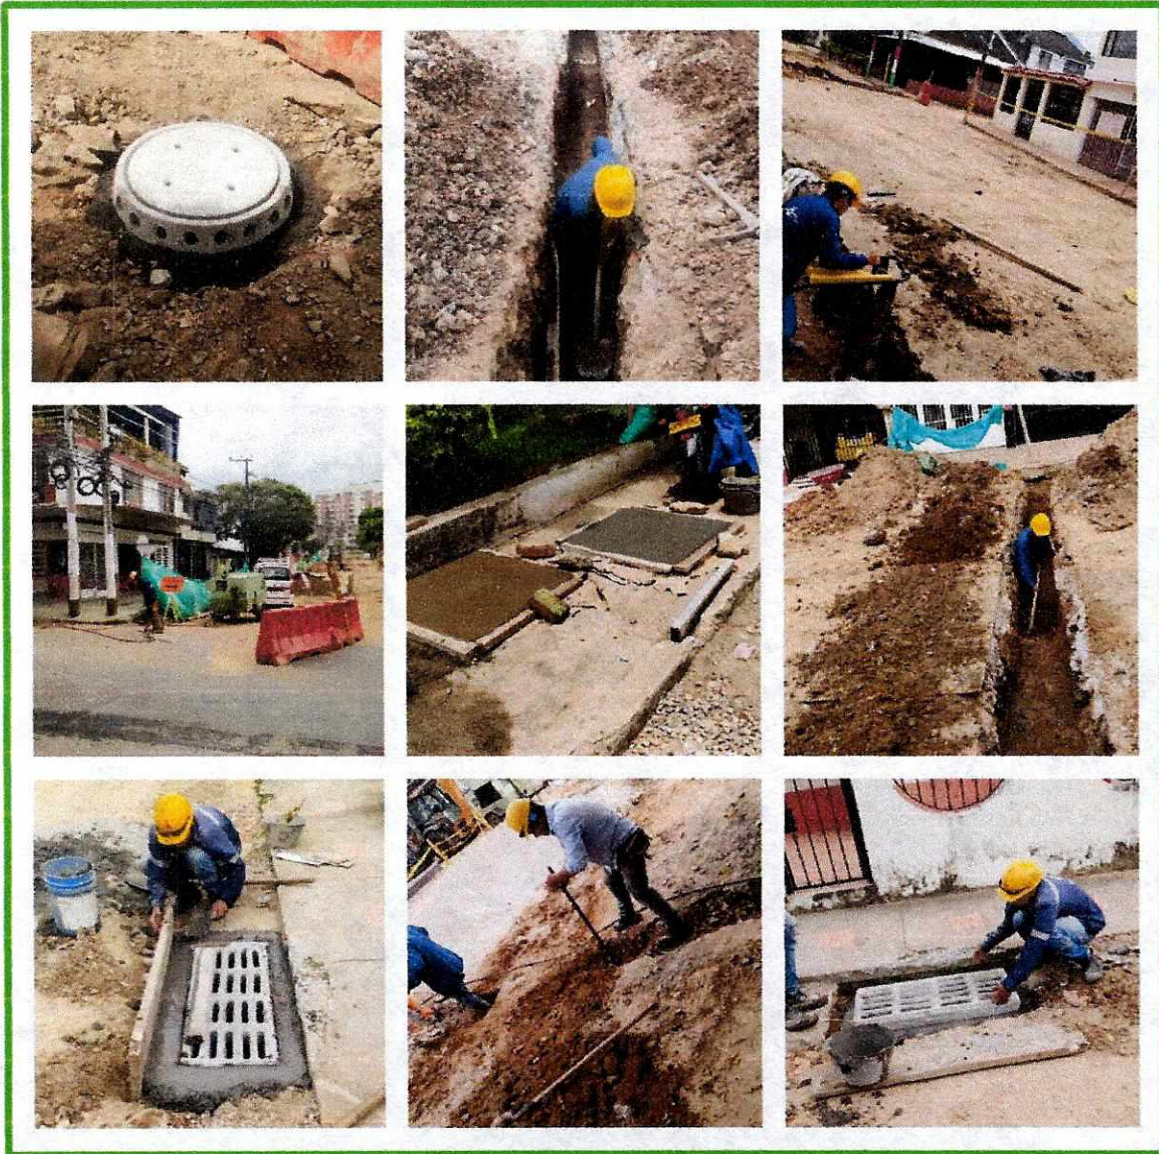


Se instalan válvulas de 3" SB, según lo acordado con el IBAL y se procede a recuperar zonas intervenidas con rellenos compactados en recebo, sobre las actividades desarrolladas sobre la calle 76 del Jordán 3 Etapa.


Se procede al cargue y retiro de material proveniente de las excavaciones y se realiza aseo y limpieza general de los lugares intervenidos.



2014-2015
The following table shows the results of the survey conducted in 2014-2015. The data is presented in a table format, with the first column representing the category and the second column representing the number of responses. The total number of responses is 100.

Category	Number of Responses
Category 1	35
Category 2	25
Category 3	20
Category 4	15
Category 5	10
Category 6	5
Category 7	5
Category 8	5

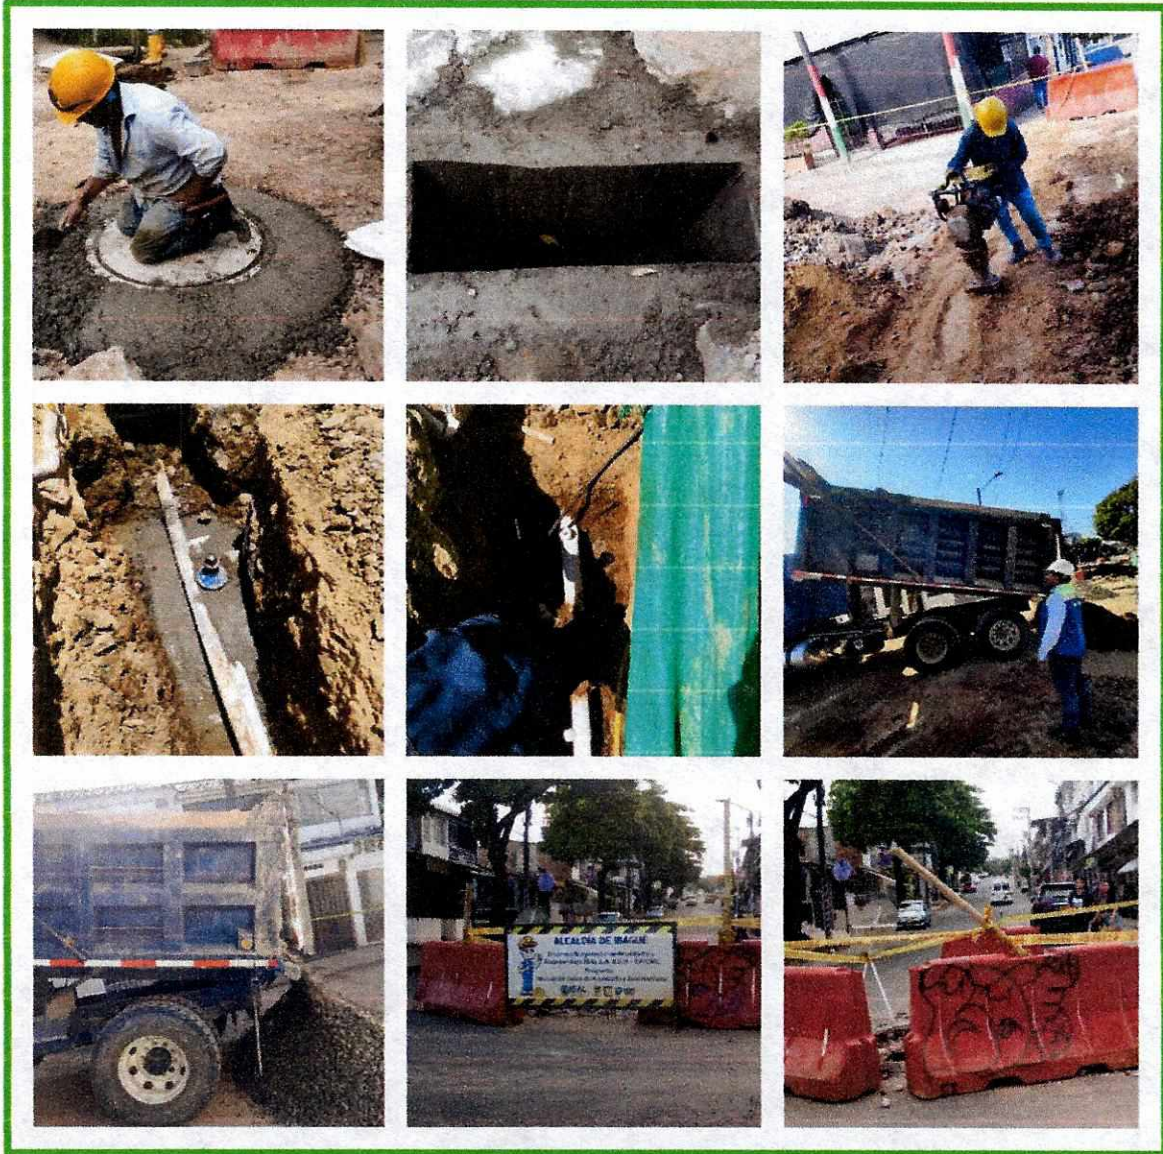



CRONOLOGIA LLUVIAS

DIAS CON PRESENCIA DE LLUVIAS	
24/08/2022	0
25/08/2022	0
26/08/2022	0
27/08/2022	0
28/08/2022	0
29/08/2022	0
30/08/2022	0
31/08/2022	0
TOTAL DIAS AFECTADOS POR LLUVIA	0



CONSORCIO
SECTOR 6
Nit: 901490124-4


STATE OF TEXAS

DATE	DESCRIPTION
10/1/00	STATE OF TEXAS
10/2/00	STATE OF TEXAS
10/3/00	STATE OF TEXAS
10/4/00	STATE OF TEXAS
10/5/00	STATE OF TEXAS
10/6/00	STATE OF TEXAS
10/7/00	STATE OF TEXAS
10/8/00	STATE OF TEXAS
10/9/00	STATE OF TEXAS
10/10/00	STATE OF TEXAS

INFORMACION ECONOMICA Y CONTRACTUAL

INVERSION EJECUTADA A LA FECHA

INVERSION EJECUTADA			
VALOR CONTRATO	\$ 2.784.659.942,00		%
VALOR EJECUTADO A (31-08-2022)		\$ 2.729.298.752,45	98,01%
VALOR POR EJECUTAR		\$ 55.361.189,55	1,99%
SUMAS IGUALES	\$ 2.784.659.942,00	\$ 2.784.659.942,00	100,00%

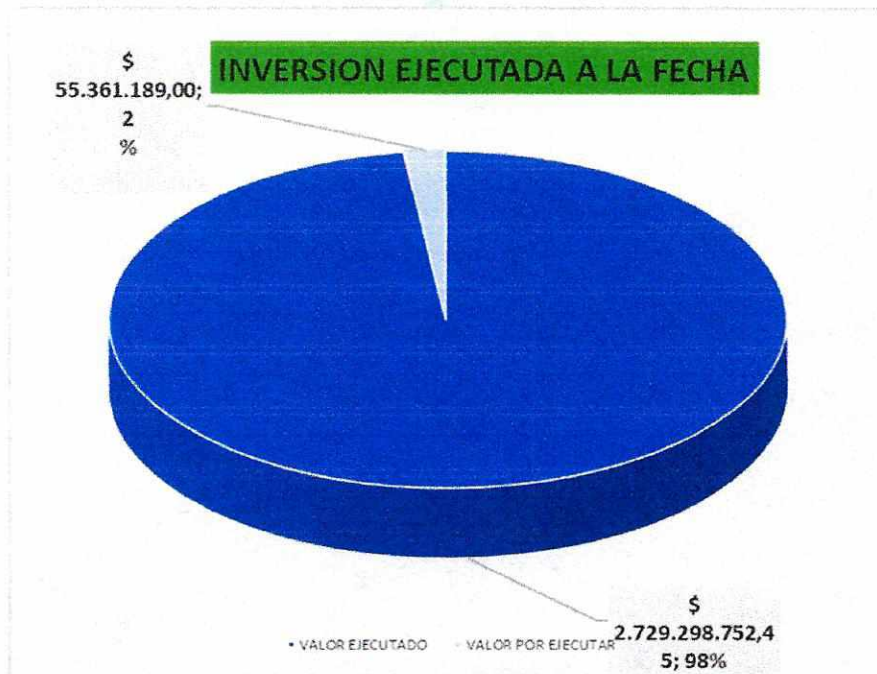

ESTADO MANEJO ANTICIPO


AMORTIZACION ANTICIPO			
VALOR ANTIPO CONTRATO	\$ 0,00	AMORTIZACION ACTA	%
	FECHAS		
ACTA PARCIAL No. 01	15/10/2021	\$ 0,00	0,00%
ACTA PARCIAL No. 02	30/11/2021	\$ 0,00	0,00%
ACTA PARCIAL No. 03	28/01/2022	\$ 0,00	0,00%
ACTA PARCIAL No. 04	25/04/2022	\$ 0,00	0,00%
ACTA PARCIAL No. 05	21/06/2022	\$ 0,00	0,00%
SUMAS IGUALES		\$ 0,00	0,00%

NOTA: El presente contrato No tuvo anticipo

INFORMACION ECONOMICA Y CONTRACTUAL

INVERSION ELECTRICIDAD A LA PROCHA

VALOR INICIAL	VALOR FINAL	VALOR PROMEDIO	VALOR ACTUAL
1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
1000000000	1000000000	1000000000	1000000000




ESTADO MARLELO INICIAL

VALOR INICIAL	VALOR FINAL	VALOR PROMEDIO	VALOR ACTUAL
1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
1000000000	1000000000	1000000000	1000000000

VALOR ACTAS TRAMITADAS			
VALOR ANTIPO CONTRATO	\$ 2.784.659.942,00	VALOR ACTA	%
	FECHAS		
ACTA PARCIAL No. 01	15/10/2021	\$ 583.398.902,00	20,95%
ACTA PARCIAL No. 02	30/11/2021	\$ 461.320.105,00	16,57%
ACTA PARCIAL No. 03	28/01/2022	\$ 602.981.500,00	21,65%
ACTA PARCIAL No. 04	25/04/2022	\$ 478.319.742,00	17,18%
ACTA PARCIAL No. 05	21/06/2022	\$ 289.565.096,00	10,40%
SALDO POR COBRAR		\$ 369.074.597,00	13,25%
SUMAS IGUALES	\$ 2.784.659.942,00	\$ 2.784.659.942,00	100,00%

PLAZO CONTRATO

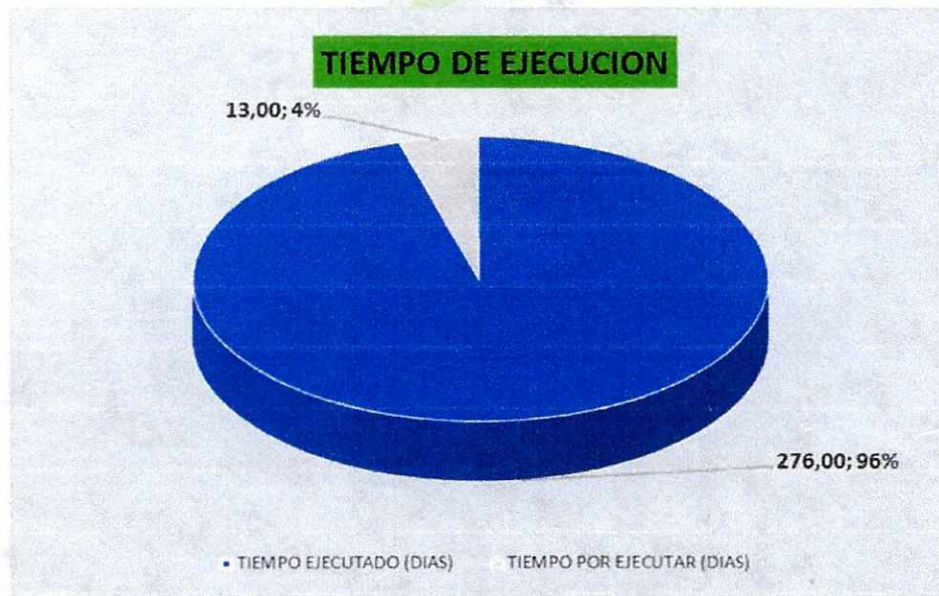

VIGENCIAS POLIZAS

ESTADO POLIZAS				
AMPARO	VIGENCIA		VALOR	ESTADO
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento del contrato	12/07/2021	10/01/2023	\$ 556.931.988,40	VIGENTE
Calidad del servicio	12/07/2021	10/07/2023	\$ 556.931.988,40	VIGENTE
Salarios y prestaciones sociales	12/07/2021	10/07/2025	\$ 556.931.988,40	VIGENTE
Estabilidad de la obra	5 AÑOS	5 AÑOS	\$ 556.931.988,40	VIGENTE
Predios , labores y operaciones	12/07/2021	10/07/2023	\$ 835.397.982,60	VIGENTE

PERSONAL Y EQUIPO DISPONIBLE EN OBRA	
PERSONAL	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SECTOR 6	ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
CONSORCIADO (1)	ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
CONSORCIADO (2)	ARQ. JOSE ALFREDO CARERA ALZATE
CONSORCIADO (3)	ING. DUVAN RAMIREZ BAYONA
DIRECTOR DE OBRA	ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA (1) (ACUEDUCTO)	ING. JHON CAMILO BERMUDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA (2) (ALCANTARILLADO)	ING. HOSSER QUINTERO
PROFESIONAL SST	CRISTHIE JENNIFER ROJAS
AUX SST	PAULA MILENA MARTINEZ
TOPOGRAFO 1	NICOLAS RODRIGUEZ ROA
CADENERO	1
ALMACENISTA	1
CONDUCTOR	1
OPERADOR RETRO-EXCAVADORA	1
OPERADOR EXCAVADORA ORUGA	1
OPERADOR MINI-CARGADOR BOBCAT	1
MAESTRO DE OBRA	1
OFICIALES	5
AYUDANTES	17
CELADOR	1
EQUIPO	
ESTACION DE TOPOGRAFIA (1)	(1) TOPCON
NIVEL DE PRECISION (1)	(1) TOPCON
RETRO-EXCAVADORA DE LLANTAS	(1) CASE 580
MINI-CARGADOR	(1) BOBCAT
COMPRESOR NEUMATICO	SULLAIR (1) - (2) MARTILLOS- (1) ROTOMARTILLO
COMPACTADOR TIPO RODILLO OPERADOR A PIE	1 ECOROAD S67DD
APISIONADOR TIPO CANGURO	(2) -(2) HONDA
CORTADORA DE PISO	(2) 14"
PLANTA ELECTRICA PORTATIL	(2) 1.5 kw
TORRE DE ILUMINACION - PLANTA ELECTRICA	(1) MULTIQUIP LT6K
BOMBA SUMEGIBLE (2) - BOMBA DIESEL (1)	(1) Ø 1.5" - (1) Ø 3" - (1) Ø 6"
VOLQUETAS	(2) 16 M ³ - (2) 8M ³
VEHICULO (1)	(1) CAMIONETA DOBLE CABINA
VEHICULO (2)	(1) CAMIONETA TIPO TURBO NHR
HERRAMIENTA MENOR	(1) GLB


PERSONNEL AND EMPLOYMENT DATA	PERSONNEL AND EMPLOYMENT DATA
1. POSITION	GENERAL
2. TITLE	PRESIDENT FEDERAL COUNCIL ON ECONOMIC EDUCATION
3. GRADE	DIRECTOR (I)
4. SYMBOL	CONTRACT (S)
5. FUNCTION	DIRECTOR OF OPERATIONS
6. DUTY STATION	WASHINGTON, D.C.
7. REPORTING OFFICER	DIRECTOR OF OPERATIONS
8. SUPERVISED PERSONNEL	DIRECTOR OF OPERATIONS
9. EMPLOYMENT STATUS	DIRECTOR OF OPERATIONS
10. DATE OF LAST PROMOTION	DIRECTOR OF OPERATIONS
11. DATE OF LAST ASSIGNMENT	DIRECTOR OF OPERATIONS
12. DATE OF LAST EVALUATION	DIRECTOR OF OPERATIONS
13. DATE OF LAST PROMOTION	DIRECTOR OF OPERATIONS
14. DATE OF LAST ASSIGNMENT	DIRECTOR OF OPERATIONS
15. DATE OF LAST EVALUATION	DIRECTOR OF OPERATIONS
16. DATE OF LAST PROMOTION	DIRECTOR OF OPERATIONS
17. DATE OF LAST ASSIGNMENT	DIRECTOR OF OPERATIONS
18. DATE OF LAST EVALUATION	DIRECTOR OF OPERATIONS
19. DATE OF LAST PROMOTION	DIRECTOR OF OPERATIONS
20. DATE OF LAST ASSIGNMENT	DIRECTOR OF OPERATIONS
21. DATE OF LAST EVALUATION	DIRECTOR OF OPERATIONS
22. DATE OF LAST PROMOTION	DIRECTOR OF OPERATIONS
23. DATE OF LAST ASSIGNMENT	DIRECTOR OF OPERATIONS
24. DATE OF LAST EVALUATION	DIRECTOR OF OPERATIONS
25. DATE OF LAST PROMOTION	DIRECTOR OF OPERATIONS
26. DATE OF LAST ASSIGNMENT	DIRECTOR OF OPERATIONS
27. DATE OF LAST EVALUATION	DIRECTOR OF OPERATIONS
28. DATE OF LAST PROMOTION	DIRECTOR OF OPERATIONS
29. DATE OF LAST ASSIGNMENT	DIRECTOR OF OPERATIONS
30. DATE OF LAST EVALUATION	DIRECTOR OF OPERATIONS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Respecto al trámite de las liquidaciones es fundamental que el IBAL entregue de manera oportuna, bien diligencias y completas, las respectivas AUTORIZACIONES, documento FUNDAMENTAL y que el mismo IBAL indica que el contratista debe entregar dentro del paquete de documentos que se deben radicar para el reconocimiento de las domiciliarias ejecutadas por el mismo; las inconsistencias encontradas ya sea por mal diligenciadas, documentación incompleta o simplemente por la falta de estas, han ocasionado traumatismo al contratista para surtir el trámite de firma de las liquidaciones respectivas, repercutiéndose en demoras para los pagos parciales a los que el contratista tiene derecho, según los niveles de avance que lleven en su respectivo momento. Para concluir, ya de entrada tramitar las liquidaciones es engorroso y desgastante, como para sumarle al contratista el extra de tramitar o y/o enmendar las autorizaciones que desde un inicio el IBAL debía realizar de manera completa y correcta. A la fecha el contratista no ha recibido las AUTORIZACIONES de los sectores jardín, Jordán 3, San Antonio y Villa café entre otros.
- Es necesario que a la entidad programe los cortes respectivos para los empalmes a la red de acueducto de los sectores de villa café, Jordán 3 y san antonio, además de definir técnica y funcionalmente los accesorios a emplear para las respectivas conexiones.

El presente informe trata únicamente las actividades relacionadas con la ejecución física de la obra como tal, los tramites contractuales, administrativos y demás, celebrados o suscritos, están debidamente evidenciados en las respectivas actas, correos electrónicos y oficios generados por las partes durante el tiempo transcurrido de ejecución de la obra, lo anterior reposa en los archivos de la entidad contratante IBAL S.A. E.S.P OFICIAL debidamente tramitado y suscrito

Atentamente,



CONSORCIO SECTOR 6
R.L. ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
C.C. N° 79.474.136 DE BOGOTÁ
