


## DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 123-21 CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y ARQUITECTURA



**De** <dolly.camacho@ibal.gov.co>  
**Destinatario** Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>  
**Fecha** 2022-10-11 11:17

 DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 123-21 CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y ARQUITECTURA.PDF (~8,2 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

 <b>IBAL SIG</b> <small>LA ESP OFICIAL</small>	<b>SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA</b>	<b>CÓDIGO: GJ-R-050</b>
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2016-10-12
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>VERSIÓN: 02</b>
		<b>Página 1 de 1</b>

Ibagué, 06 de octubre del 2022

Doctor:  
**LUIS ALEJANDRO GIRALDO MONTOYA**  
 Secretario General  
 IBAL S.A E.S.P OFICIAL  
 Ciudad

*El Doble C*  
 11-10-22  
 Doc: 032

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 123 del 20 de agosto del 2021.**


**Cordial Saludo:**

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

**DOCUMENTOS ACTA FINAL N° 2:**

- Acta final
- Acta de modificación
- Cantidades de obra acta final
- Certificación de pago de aportes al sistema general de seguridad social
- Paz y salvo comunidad
- Certificación no afectación de redes
- Paz y salvo SENA
- Paz y salvo Ministerio de Trabajo
- Aprobación PEGMA
- CD y plano record
- Bitacora de Obra
- Ficha técnica de evaluación
- Factura de cobro acta fina

Atentamente,



**HAROLD R. RODRIGUEZ SANCHEZ**  
 Director Operativo



CANTIDADES DE OBRA ACTA FINAL  
 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

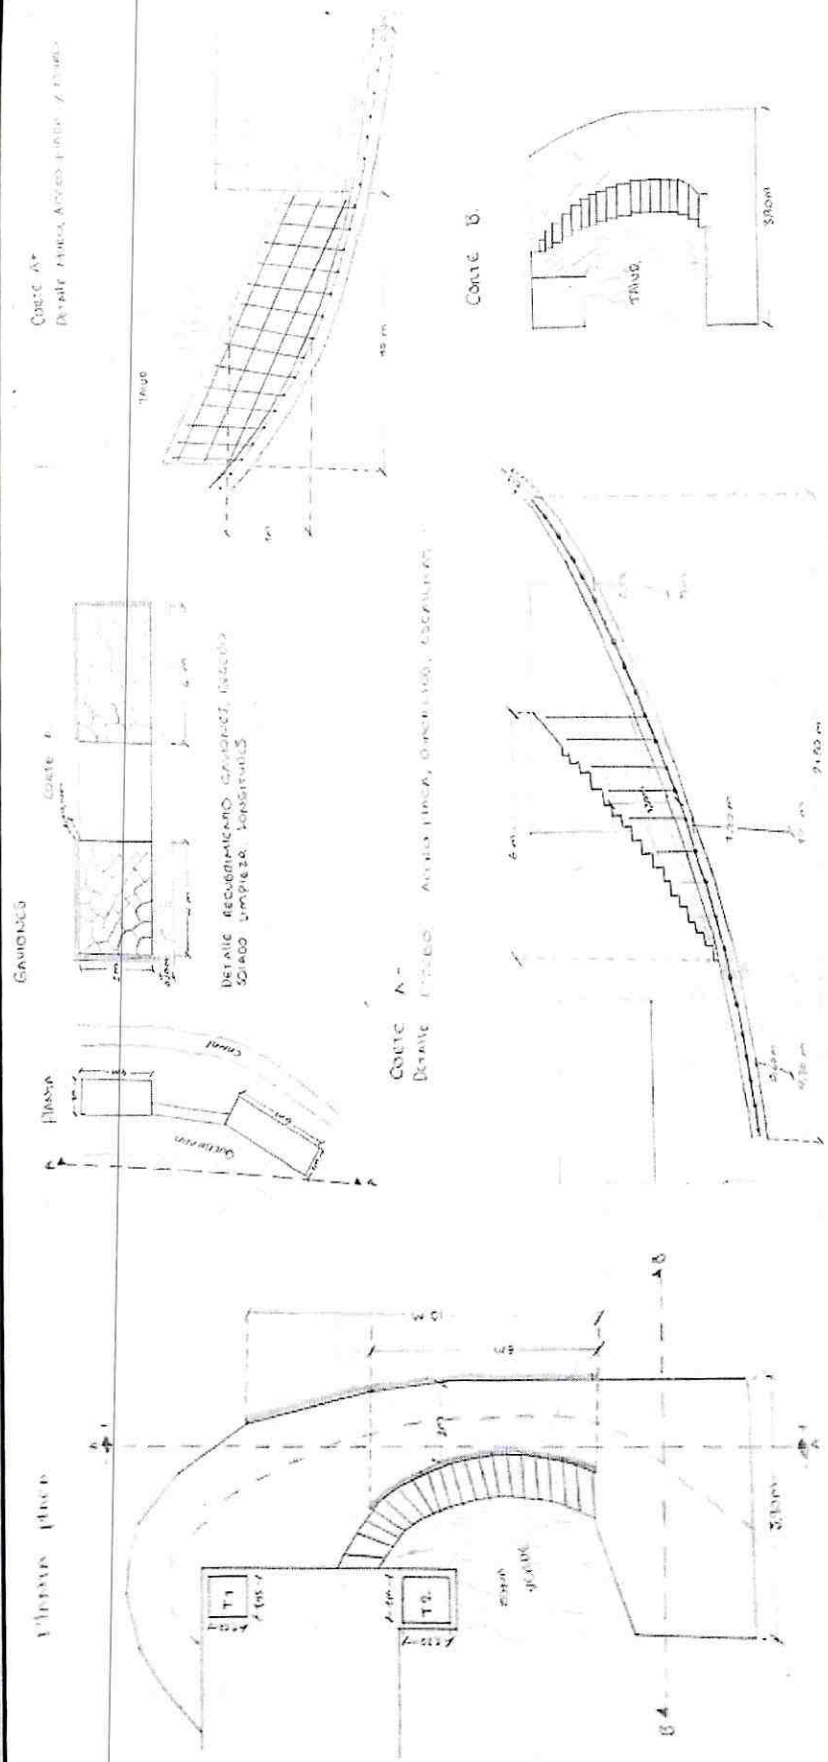
CÓDIGO: SB-R-116  
 FECHA VIGENCIA: 2017-06-22  
 VERSIÓN: 01

**CONTRATO DE OBRA N° 123 DEL 20 DE AGOSTO DEL 2021**

OBJETO: contrato de obra para la construcción de placa de concreto, Gaviones, Muro de CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y ARQUITECTURA S.A.S.  
 HAROLD ROSEMBERG RODRÍGUEZ SANCHEZ  
 17 de septiembre de 2021

OBJETO:  
 CONTRATISTA:  
 SUPERVISOR  
 Fecha Inicio:

**ESQUEMA**



**MEMORIAS DE CALCULO**

*[Handwritten signature]*



DESCRIPCIÓN	LONG.	H INICIAL	H FINAL	ANCHO PROM.	LONG TOTAL
<b>localización y replanteo</b>					
Tramo 01 Red Principal	45.00				45.00
<b>localización y replanteo</b>					<b>45.00</b>
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>LONG.</b>	<b>H INICIAL</b>	<b>H FINAL</b>	<b>ANCHO PROM.</b>	<b>VOLUMEN</b>
<b>Suministro recebo compactado c/15 Cms medio</b>					
gaviones	10	0.2		1	2.00
tramo 1	4.3	0.6		3.9	10.06
tramo 2	10	1.8		2.5	45.00
tramo 3	7	0.57		2.5	9.94
<b>Suministro recebo compactado c/15 Cms medio</b>					<b>67.00</b>
<b>Acarreo interno en obra 50 mts</b>					
<b>GAVIONES</b>					<b>160.00</b>
gavion 1	6	2		1	12.00
gavion 2	4	2		1	8.00
<b>RECEBO</b>					<b>516.65</b>
Recebo gaviones	10.0	0.2		1.0	2.00
Tramo 1	4.3	0.6		3.9	10.06
tramo 2	10.0	1.8		2.5	45.00
tramo 3	7.0	0.6		2.5	9.94
<b>CONCRETO</b>					<b>123.33</b>
Solado de limpieza	10.00	0.10		1	1.00
concreto placa	21.30	0.13		3.00	8.31
concreto muro 1	6.00	0.13		1.30	1.01
concreto muro 2	10.00	0.13		1.00	1.30
concreto impermeabilizado placa tanque 1	1.50	1.45		0.20	0.44
concreto impermeabilizado placa tanque 2	1.00	1.80		0.2	0.36
concreto escaleras	1.50	0.20		1	0.30
concreto gaviones	27.00	0.10		1	2.70
<b>TOTAL ACARREO INTERNO</b>					<b>800.0</b>

*pe*





<b>Señalización en guadua c/3 mts y polisombra de h=2 mts</b>						
placa escalera	20.00					20.00
muro de contención	15.00					15.00
gaviones	10.00					10.00
<b>Señalización en guadua c/3 mts y polisombra de h=2 mts</b>						<b>45.00</b>
<b>Gaviones, triple torcion Cal 12, suministro e instalacion</b>						
Gaviones	10.00	2.00		1		20.00
<b>Gaviones, triple torcion Cal 12, suministro e instalacion</b>						<b>20.00</b>
<b>Manejo de aguas con diametros de 8" a 12"</b>						
placa tanques			1.00			1.00
<b>Manejo de aguas con diametros de 8" a 12"</b>						<b>1.00</b>
<b>Rejilla vibrocompactada para sumidero 1,05 X</b>						
rejilla fibrocemento			3.00			3.00
<b>Rejilla vibrocompactada para sumidero 1,05 X</b>						<b>3.00</b>
<b>Lavado general con hidrolavadora de los muros perimetrales</b>						
Lavado y pintura general			50.00			50.00
						<b>50.00</b>

**CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y ARQUITECTURA S.A.S.**  
**CONTRATISTA**

**ING HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ**  
**DIRECTOR OPERATIVO IBAL S.A.E.S.P**





**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES  
AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD  
SOCIAL Y PARAFISCALES PARA  
CONTRATOS DE OBRA**

**CÓDIGO:** GJ-R-061

**FECHA VIGENCIA:**  
2019-09-19

**VERSIÓN:** 01

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**Página 1 de 2**

**CONTRATO DE OBRA N° 123 DEL 20 DE AGOSTO DEL 2021**

<b>CONTRATANTE</b>	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
<b>CONTRATISTA</b>	CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y ARQUITECTURA S.A.S

<b>OBJETO</b>	<b>CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONCRETO. GAVIONES, MURO DE CONTENCIÓN, MANTENIMIENTO EN GENERAL DE UN TRAMO DEL CANAL CAY POR AFECTACIÓN EN PROPIEDAD ADYACENTE</b>
<b>PLAZO INICIAL</b>	SESENTA DÍAS (60)
<b>PLAZO TOTAL</b>	SESENTA DIAS (60)
<b>FECHA DE INICIO</b>	17/09/2021
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	15/11/2021
<b>VALOR INICIAL</b>	\$47.903.552
<b>VALOR TOTAL</b>	\$47.903.552
<b>SUPERVISOR</b>	HAROLD R. RODRIGUEZ SANCHEZ

El suscrito HAROLD R. RODRIGUEZ SANCHEZ – DIRECTOR OPERATIVO del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, en su calidad de SUPERVISOR del contrato en mención:

**CERTIFICA:**

Contratista persona natural <input type="checkbox"/>	Contratista persona jurídica <input type="checkbox"/>
El contratista presentó la planilla número 9425608822 de fecha 06/10/2021 en la que consta que ha efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales de él y del personal a cargo (cuando a ello hubiere lugar) para el periodo de septiembre del año 2021 verificado el monto de cada uno de los	2. El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar





**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES  
AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD  
SOCIAL Y PARAFISCALES PARA  
CONTRATOS DE OBRA**

**CÓDIGO:** GJ-R-061

**FECHA VIGENCIA:**  
2019-09-19

**VERSIÓN:** 01

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**Página 2 de 2**

aportes en la planilla, se constató que se ajusta a la base de liquidación que aplica para este tipo de contratos

Se expide la presente constancia para efectos del respectivo pago en la ciudad de Ibagué, a los 30 días del mes de noviembre del año 2021

**HAROLD R. RODRIGUEZ SANCHEZ**

Director Operativo

IBAL S.A. E.S.P OFICIAL

Supervisor













## IBAGUÉ VIBRA

Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola  
- Pbx: (8)2756000 - Fax: (8) 2618982  
P.Q.R: Carrera 5 No. 41-16 edificio F25 Piso 2  
CANALES DE ATENCIÓN (116) Ibagué - Tolima /  
[www.ibal.gov.co](http://www.ibal.gov.co) - [ventanilla.unica@ibal.gov.co](mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co)

211- 385

Ibagué, 04 de noviembre de 2021

Ingeniera  
MARIA PAULA BERMUDEZ MEDINA  
Representante legal - Construcciones Diseños y Arquitectura  
Contrato de obra No. 123 de 20/08/2021  
Cra. 14 No. 77-58 Casa 7 Estancia Vergel  
[codiarqsas@gmail.com](mailto:codiarqsas@gmail.com) Tel- 3112142512  
Ciudad

Asunto: Aprobación al PEGMA Contrato de Obra N°123 del 20 de agosto de 2021.  
Respuesta Radicado IBAL N° 15807 del 25/10/2021.

Cordial Saludo:

Me permito informar que se ha revisado la información que se allego a esta dependencia, con el fin de obtener aprobación del PEGMA para el Contrato 123 del 20 de agosto del 2021 y que tiene como objeto "CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO, GAVIONES, MURO DE CONTENCIÓN Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE UN TRAMO DEL CANAL CAY, POR AFECTACION EN PROPIEDADES ADYACENTES."

La misma fue revisada y cumple con los requisitos exigidos en la "lista de Chequeo para Revisión de la Guía de Manejo Ambiental para Obras", se informa que el PEGMA queda APROBADO, es de resaltar que se debe a llegar a esta dependencia el informe de actividades ambientales desarrolladas durante la ejecución del contrato y se realizara visita de campo para verificar la ejecución de dicha Guía en frente de obra.  
Atentamente,

ALEXI LILIANA BUITRAGO CAYCEDO  
Líder de Gestión Ambiental

Proyectó: *Juan Carlos* Celemin Aux. Administrativo - Gestión Ambiental.  
Anexo: Dos (2) Folios.

C.C: Harold Rosembert Rodríguez Sánchez - Director Operativo-SUPERVISOR



Ibagué, Diciembre 9 de 2.021

Señores  
**I B A L**  
Ciudad.

Asunto: CERTIFICACION.

La comunidad de la Vereda "La Coqueta" y entre la vereda La Coqueta y Cay, CERTIFICAMOS que la Constructora CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y ARQUITECTURA S.A.S., realizó las Obras conforme al Contrato No.123 del 2021, quedando la comunidad a entera satisfacción con los trabajos realizados.

Atentamente,

**VECINOS VEREDA "LA COQUETA" Y ENTRE LA COQUETA Y CAY.**

José Antonio Duarte  
C.C. 5997635

Lerner Becerra  
C.C. 28533573 Espinal.

José Alfredo Fuentes  
C.C. 6014029 Tolpué

Miller Soto  
C.C. 1005716107

Juan Andrés  
C.C. 990608217

Dalio Alexander Torres  
C.C. 93378091

\_\_\_\_\_  
C.C.

\_\_\_\_\_  
C.C.

\_\_\_\_\_  
C.C.

\_\_\_\_\_  
C.C.





**CERTIFICACION**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO:** GH-R-037

**FECHA VIGENCIA:**  
2016-10-26

**VERSIÓN:** 03

**Página 1 de 1**

**EL SUSCRITO JEFE DE LA DIRECCION OPERATIVA DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL**

**CERTIFICA QUE:**

Una vez revisada la base de datos que reposa en esta dependencia, se expide el presente paz y salvo del contrato No. 123 del 2021 cuyo objeto es "CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO, GAVIONES, MURO DE CONTENCIÓN Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE UN TRAMO DEL CANAL CAY, POR AFECTACION EN PROPIEDADES ADYACENTES" puesto que las actividades ejecutadas se desarrollaron en zona rural donde no se encuentran redes existentes de gas, telefonía y electricidad.

El presente paz y salvo se expide a los veinticuatro (24) días del mes de enero del 2022.

Atentamente,

**HAROLD R. RODRIGUEZ SANCHEZ**  
Director Operativo

Proyectó: Alejandra Prada Marmolejo.





El empleo  
es de todos

Mintrabajo

## Servicio Nacional de Aprendizaje

**SENA**

MINISTERIO DE TRABAJO

### CERTIFICA:

Que el constructor con razón social CONTRUCCIONES DISENOS Y ARQUITECTURA SAS identificado con el NIT 901447780, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
123 - 2021	const placa concreto canal cay	IBAGUE	119,900	2021-09	14-DIC-2021	73182281
		Total	119,900			

Expedido por el SENA, a los catorce (14) días del mes de Diciembre de 2021

**"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."**

**NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS**

**SENA, MÁS TRABAJO**

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2021-12-14

Generado por : Isidoro Angel

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico [certiaportes@sena.edu.co](mailto:certiaportes@sena.edu.co) informando el siguiente código de verificación: 1125042570 - 115321

**SENA, MÁS TRABAJO**



Certificado No.  
SC-CER33681-1

Pág. 1





El empleo  
es de todos

Mintrabajo

**LA SUSCRITA DIRECTORA TERRITORIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO  
TERRITORIAL TOLIMA**

CERTIFICA QUE,

Una vez verificada la base de datos de reclamaciones, investigaciones administrativas laborales en la **DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DEL MINISTERIO DE TRABAJO**, se evidencio que la empresa y/o persona natural identificada de la siguiente manera,

<b>NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL</b>	CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y ARQUITECTURA S.A.S
<b>IDENTIFICACION NIT Y/O CEDULA</b>	901.447.780-4
<b>No. RADICADO Y FECHA</b>	3605 16-12-2021

**NO REGISTRA INVESTIGACIONES NI QUERELLAS ADMINISTRATIVAS, NI REGISTRA SANCIONES EN SU CONTRA.**

La presente certificación corresponde de **noviembre de 2020 a noviembre de 2021** y su validez se extiende al Departamento del Tolima y sus respectivas Jurisdicciones, lo anterior es de acuerdo con Numeral 19 Art. 1 de la Resolución 2143 de 2014.

El presente certificado se expide en la ciudad de Ibagué, a los 21 días del mes de Diciembre de 2021.

**ANDRES MAURICIO CORDOBA USECHE  
DIRECTOR (E) TERRITORIAL TOLIMA**

Elaboró: J. Lima.  
Revisó: María Giovanna M.  
Coordinador IVC: Adriana G.  
Coordinador GACT: Gina C.  
Aprobó: A. Cordoba.



# BITACORA DE OBRA

## CONTRATO DE OBRA N° 123 DEL 20 DE AGOSTO DEL 2021

Elaborado por: *Elaborado por: [illegible]*

Fecha de inicio de obra: *12 de agosto del 2021*

### AGOSTO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
M	M	J	V	S	D	L	M	M	V	S	D	L	M	M	V	S	D	L	M	M	V	S	D	L	M	M	V	S	D	L	M
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

### SEPT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
M	M	J	V	S	D	L	M	M	V	S	D	L	M	M	V	S	D	L	M	M	V	S	D	L	M	M	V	S	D	L	M
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

### NOV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
M	M	J	V	S	D	L	M	M	V	S	D	L	M	M	V	S	D	L	M	M	V	S	D	L	M	M	V	S	D	L	M
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

### DIC

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
M	M	J	V	S	D	L	M	M	V	S	D	L	M	M	V	S	D	L	M	M	V	S	D	L	M	M	V	S	D	L	M
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*Susp*      *Inde*      *Inde*      *Retenido*

(2)

(2)




## ACTA DE INICIACIÓN


FECHA DE INICIO: SEP. 17 DEL 2021

Se reunieron el ingeniero Harold Rodríguez Director operativo del IBAL como supervisor de la obra por parte del IBAL y el ingeniero Juan Bernardo Bermúdez como ingeniero Residente de Construcciones, Diseño y Arquitectura S.A.S y Reynaldo Mayorga como maestro de obra para hacer entrega del sitio de obra que es un tramo del canal Cay a la vereda la Coqueta.


El Objeto del contrato: Construcción de placa de concreto, Gaviones, muro de contención, mantenimiento general del tramo del canal Cay por afectación en propiedad adyacente



Harold Rodríguez  
Supervisor Obra



Juan Bernardo Bermúdez  
Ingeniero Residente




Reynaldo Mayorga  
Maestro de Obra




18 de SEP del 2021

Se inician trabajos con 6 ayudantes de obra, un oficial, un maestro de obra, SISO ó profesional en Salud Ocupacional y el residente de obra.


Se comienza con la actividad de cenamiento en Guadua y en Polisombro de la obra


  
Juan Bernardo Bermudez  
Ingeniero Residente

  
Harold Rodriguez  
Supervisor obra

19 de SEP del 2021


Se inician labores con el mejoramiento del camino para acceso de material y se continua con el cenamiento.


  
Juan Bernardo Bermudez  
Ingeniero Residente

  
Harold Rodriguez  
Supervisor obra

20 SEP del 2021

Se continua con el mismo personal, realizando actividades de descapote, relocalización y repunteo para la plaza en concreto y mejoramiento del camino.


  
Juan Bernardo Bermudez


  
Harold Rodriguez



21 de SEP. del 2021


Se continua con el mismo personal y realizando las actividades anteriores. Día lluviosa.


  
Juan Bernardo Bermudez  
Ingeniero Residente

  
Harold Rodriguez  
Supervisor Obra

23 de SEP. del 2021


Se inicia con charla de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el mismo personal. Se comienza con actividades de mejoramiento de camino para el transporte de material y excavación para la placa en concreto y para los gaviones.


  
Juan Bernardo Bermudez  
Ingeniero residente

  
Harold Rodriguez  
Supervisor de obra

24 de SEP. del 2021

Se inicio con charla de Seguridad y salud en el Trabajo, con el mismo personal. Se comienza con actividades de mejoramiento de camino para el transporte de material y excavación para la placa en concreto y para los gaviones. Día lluvioso

  
Juan Bernardo Bermudez  
Ingeniero Residente


  
Harold Rodriguez  
Supervisor de obra


25 de Sep del 2021

se inicio con charla de SST, con el mismo personal.




Se comienza con actividades de mejoramiento de camino para el transporte de material y excavación para la placa en concreto y para los gaviones. Día lluvioso


  
Juan Bernardo Bermudez  
Ingeniero Residente

  
Harold Rodriguez  
Supervisor de gas

26 de SEP del 2021


Se inicio con charla de SST, con el mismo personal. Se comienza con actividades de mejoramiento del camino para el transporte de material y excavación para la placa en concreto y para los gaviones.


  
Juan Bernardo Bermudez  
Ingeniero Residente


  
Harold Rodriguez  
Supervisor Obra

29 SEP del 2021

Se continua con el mismo personal, con las mismas actividades y se realizó reunión con el ingeniero Harold Rodriguez y el ingeniero Juan B. Bermudez y Reynaldo Mayaya, maestro de obra, esto para definir el diseño de los gaviones, placa en concreto y muros.

  
Juan Bernardo Bermudez  
Ingeniero Residente


  
Harold Rodriguez  
Supervisor obra


  
Reynaldo Mayaya  
Maestro de obra



28 de SEP del 2021


Se continúan con los mismos labores y con el mismo personal.


  
Juan Bernardo Bermudez  
Ingeniero Residente

  
Harold Rodriguez  
Supervisor de obra

30 de Sep del 2021


Se comienza con la información de SSI, se continúa con el mismo personal, también siguen con actividades de excavación manual para la placa y gaviones y se comienza el transporte de material pedregoso para gaviones.


  
Juan Bernardo Bermudez  
Ingeniero Residente

  
Harold Rodriguez  
Supervisor obra

31 de SEP del 2021

Se continúa con el mismo personal y realizando las mismas actividades, también se continúa con el transporte de material en motobomba a una distancia aproximada de 1000 metros.


  
Juan Bernardo Bermudez  
Ingeniero Residente


  
Harold Rodriguez  
Supervisor obra

3 de Septiembre del 2021

Se continúa con las mismas actividades y se comienza con el alistado en concreto para gaviones.





  
 Juan Fernando Bermudez  
 Ingeniero Residente

  
 Haroldo Rodriguez  
 Supervisor obra

6 de septiembre del 2021


Se continúan con la charla de SST, se continúa con el mismo personal y con actividades de excavación manual, la construcción de gaviones y transporte de piedra y recebo en motorcarron.


  
 Juan Fernando Bermudez  
 Ingeniero Residente

  
 Haroldo Rodriguez  
 Supervisor obra

7 de septiembre del 2021

Se inició con la charla sobre el covid-19, además se continúa con el mismo personal y con actividades de excavación manual, construcción de gaviones y transporte de piedra y recebo en motorcarron, también se continúa con el mejoramiento del camino. Día lluvioso.


  
 Juan Fernando Bermudez  
 Ingeniero Residente


  
 Haroldo Rodriguez  
 Supervisor obra

11 de septiembre del 2021

Se inicio con charla de SST, se continúa con el mismo personal y con actividades de excavación manual, construcción de gaviones y transporte de piedra, recebo, certero, titulado y cemento.





  
Juan Bernardo Bermudez  
Ingeniero Residente

  
Harold Rodriguez  
Supervisor Obra

13 de septiembre del 2021


Se inicia con charla SST, se continuo con actividades de gaviotas, alistamiento en recebo para la placa en concreto y se continua con el transporte de material. Se recibe la visita por parte de los Supervisores del Ibal.


  
Juan Bernardo Bermudez  
Ingeniero Residente

  
Harold Rodriguez  
Supervisor Obra

17 septiembre del 2021

Se continua con el mismo personal, se comienza con revestimiento en concreto de las gaviotas para el mejoramiento del camino y se comienza con la actividad para la construcción de los muros en concreto de las laterales de la placa. Día lluvioso

  
Juan Bernardo Bermudez  
Ingeniero Residente


  
Harold Rodriguez  
Supervisor de Obra


20 septiembre del 2021


Se inicia con charla de SST, continuamos con el mismo personal y seguimos con las actividades de revestimiento en concreto de las gaviotas y el alistamiento para la placa y se continua con el



transporte de materiales y la visita del supervisor de la obra en donde se llega al acuerdo que quedo como responsable de la obra el maestro Reynaldo Mayuga con la supervisión del ingeniero residente Juan Bernabé Bermudez.


  
Juan Bernabé Bermudez  
Ingeniero Residente


  
Harold Rodríguez  
Supervisor Obra

  
Reynaldo Mayuga  
Maestro de obra

24 de Septiembre del 2021


Se continuo con el revestimiento y terminación de gaviones, tambien se sigue con el alistamiento de la placa y el transporte de materiales. Día lluvioso.


  
Reynaldo Mayuga  
Maestro de obra

  
Harold Rodríguez  
Supervisor Obra

25 de Septiembre del 2021

Las actividades no se pudieron realizar por el día lluvioso.


  
Reynaldo Mayuga  
Maestro obra


  
Harold Rodríguez  
Supervisor obra



27 de Septiembre del 2021


Se inicia con la charla de SST en donde se da a conocer el manejo de los residuos que se generan en la obra, también se recibe la visita del supervisor de la obra Harold Rodríguez. Se continúa con las mismas actividades.


  
Reynaldo Mayago  
Maestro de obra

  
Harold Rodríguez  
Supervisor obra

1 de octubre del 2021


Se continúa con el mejoramiento del camino para el transporte de materiales, se continúa con el alistamiento de la placa en concreto, reconstrucción de la escalera.


  
Reynaldo Mayago  
Maestro de obra

  
Harold Rodríguez  
Supervisor obra

4 de octubre del 2021

Se inician labores con la charla SST. Se continúa con el mismo personal. Se sigue realizando el transporte de materiales y el alistamiento para la placa de concreto y la reconstrucción de la escalera.

  
Reynaldo Mayago  
Maestro de obra

  
Harold Rodríguez  
Supervisor obra



9 de octubre del 2021

Se continua con el mismo personal, transporte de materiales, alistamiento de hierro para la placa.

Reynaldo Mayuga  
Maestro de obra

Harold Rodríguez  
Supervisor obra

13 octubre del 2021

Se inicia con charla SST, se realiza el desvío del canal para el arreglo de los pisos del tanque y se comienza con la construcción de la placa. DTA Muñoso

Reynaldo Mayuga  
Maestro de obra

Harold Rodríguez  
Supervisor obra

16 octubre del 2021

Se continua con el mismo personal, la visita del supervisor y se continua con el transporte de material.

Reynaldo Mayuga  
Maestro de obra


Harold Rodríguez  
Supervisor obra


19 octubre del 2021

Se inician con la charla SST, se continua con el mismo personal y las actividades de arreglo de




los pisos de los techos y comenzando a la fundición de la placa en concreto. 1


  
Reynoldo Mayago  
Maestro de obra

  
Haroldo Rodriguez  
Supervisor obra

23 de octubre del 2021


DIA NUVIASO


  
Reynoldo Mayago  
Maestro de obra

  
Haroldo Rodriguez  
Supervisor obra

25 octubre del 2021


Se inicio con lo charlo SST, se continuo con el mismo personal. Se culmino la placa en concreto y se comienza con la actividad del muro lateral derecho.


  
Reynoldo Mayago  
Maestro de obra

  
Haroldo Rodriguez  
Supervisor obra

30 octubre del 2021.

Se continua con un (1) oficial, tres (3) ayudantes de obra, un (1) maestro de obra y lo SISO. y se realizan las actividades del muro lateral derecho y el mejoramiento de la escalera.


  
Reynoldo Mayago  
Maestro obra


  
Haroldo Rodriguez  
Supervisor obra



2 de noviembre del 2021


Se inicio con lo charlo SST, se continua con un (1) oficial, tres ayudantes de obra, un maestro y la SSO. continuamos con la actividad de transporte de materiales, la terminación del muro en concreto del lado derecho. se recibe la visita del señor Harold Rodriguez supervisor de la obra del Ibal.


  
Reynaldo Mayorga  
Maestro de obra

  
Harold Rodriguez  
Supervisor obra

6 noviembre del 2021


Se continua con el mismo personal, por tiempo lluvioso se hace suspensión de la obra a partir del 8 de noviembre.


  
Reynaldo Mayorga  
Maestro de obra

  
Harold Rodriguez  
Supervisor obra.

26 de noviembre del 2021

Reiniciación de la obra, se inicio con charla SST, luego se reunieron el ingeniero Harold Rodriguez, el Maestro de obra Reynaldo Mayorga y el ingeniero residente para dar el reinicio de la obra.


  
Reynaldo Mayorga  
Maestro obra


  
Harold Rodriguez  
Supervisor obra



29 noviembre 2021


se continua con tres (3) ayudantes, un (1) oficial, el maestro de obra y la SISO, se realiza la terminación del muro izquierdo de la placa y la terminación de la escalera. y se comienza con el lavado de los muros de los tanques con hidrolavadora,


  
Haroldo Mayago  
Maestro obra

  
Haroldo Rodríguez  
Supervisor obra

29 noviembre del 2021


Se comienza con la charla SST, se culmino con el lavado de los muros de los tanques y se comienza con la pintura de los muros de los tanques y de los muros laterales.


  
Haroldo Mayago  
Maestro de obra

  
Haroldo Rodríguez  
Supervisor obra

2 de diciembre del 2021

Se continua con tres (3) ayudantes, un oficial, el maestro de obra y la SISO, se termino con las actividades de la pintura de los muros de los tanques y de los muros laterales, el arreglo de la rejilla y la instalación de prefabricado.


  
Haroldo Mayago  
Maestro de obra


  
Haroldo Rodríguez  
Supervisor obra




3 diciembre del 2021

se hace la entrega la entrega oficial al  
señor Harold Rodríguez supervisor de la obra.

  
Fernando Mayago  
Maestro de obra

  
Harold Rodríguez  
Supervisor obra.







FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación:  Fecha evaluación 30/11/2021

Reevaluación:  Fecha reevaluación: \_\_\_\_\_

Acta Parcial N° \_\_\_\_\_

Acta Final

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 123 del 20 de agosto de 2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: MARIA PAULA BERMUDEZ MEDINA

NIT: 901.477.780-4

C.C. 1.110.577.767

FECHA DE INICIO: 9/17/2021

FECHA DE SUSPENSION N° 1: 11/8/2021

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 12/3/2021

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA DE CONCRETO, GAVIONES, MURO DE CONTENSION, MANTENIMIENTO EN GENERAL DE UN TRAMO DEL CANAL CAY POR AFECTACION EN PROPIEDAD ADYACENTE."

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	X

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE                      2= MALO                      3= REGULAR                      4= BUENO                      5= EXCELENTE

8. OBRA PUBLICA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	5	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	5
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	5	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL CONTRATADO.	5
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS	5	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	5
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	5	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	5
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA OPORTUNA DEL PEGMA	5	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5
		PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
		ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5.00</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5.00</b>

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	EVALUACION TOTAL	5.00
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	5		
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	5		
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	5		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	5		
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	5		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	5		
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y DEMAS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL CONTRATO	5		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5.00</b>		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION \_\_\_\_\_ REEVALUACION  POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR





FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

(Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION \_\_\_\_ REEVALUACION X POR PARTE DEL CONTRATISTA:

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION

SI

NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION

SI

NO

**NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion)** De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripción.

SI

NO

**NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)**

HAROLD RODRIGUEZ  
SUPERVISOR

**NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA**

MARIA PAULA BERMUDEZ MEDINA  
CONTRATISTA





FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación:  Fecha evaluación \_\_\_\_\_ Reevaluación:  Fecha reevaluación: 30/11/2021  
Acta Parcial N° \_\_\_\_\_ Acta Final X

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 123 del 20 de agosto de 2021  
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: MARIA PAULA BERMUDEZ MEDINA NIT: 901.477.780-4 C.C. 1.110.577.767  
FECHA DE INICIO: 9/17/2021 FECHA DE SUSPENSION N° 1: 11/8/2021  
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 12/3/2021

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA DE CONCRETO, GAVIONES, MURO DE CONTENSIÓN, MANTENIMIENTO EN GENERAL DE UN TRAMO DEL CANAL CAY POR AFECTACION EN PROPIEDAD ADYACENTE."

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	X

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

8. OBRA PUBLICA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	5	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	5
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	5	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL CONTRATADO.	5
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS	5	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	5
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	5	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	5
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA OPORTUNA DEL PEGMA	5	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5
		PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
		ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5,00</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5,00</b>

CRITERIOS DE CALIDAD

PUNTAJE

COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	5
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	5
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	5
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	5
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	5
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	5
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y DEMAS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL CONTRATO	5

EVALUACION TOTAL

5,00





FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

TOTAL PROMEDIO

5,00

ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN \_\_\_\_ REEVALUACIÓN X POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN \_\_\_\_ REEVALUACIÓN X POR PARTE DEL CONTRATISTA:

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION

SI

NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION

SI

NO

**NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion)** De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripción.

SI

NO

**NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)**

HAROLD RODRIGUEZ  
SUPERVISOR

MARIA PAULA BERMUDEZ MEDINA  
CONTRATISTA



**CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y ARQUITECTURA SAS**

NIT: 901447780-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CL 69 19 15 TO 3 AP 204, Ibagué, Tolima, Colombia

Tel. 3176389899

Email. codiarqsas@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764019367648 válida desde 2021-10-11 hasta 2022-10-11 rango desde FVEC1 hasta FVEC100.

<b>Cliente:</b>	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A E.S.P OFICIAL
<b>NIT:</b>	800089809
<b>Dirección:</b>	CRA 3 No 104BRR LA POLA, Ibagué, Tolima, Colombia
<b>Teléfono:</b>	3102030312
<b>Email:</b>	sistemas@ibal.gov.co
<b>Tipo de negociación:</b>	Contado
<b>Medio de Pago:</b>	Transferencia Crédito Bancario
<b>Fecha de Pago:</b>	31/10/2022
<b>Total de Líneas:</b>	1

<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:</b>		<b>FVEC12</b>			
<b>MONEDA:</b>	COP Colombia, Pesos				
<b>HORA EMISIÓN:</b>	12:25:58				
<b>FECHA FIRMADO:</b>	07/10/2022 12:26:00				
<b>FECHA DE EMISIÓN</b>					
<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>					
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
07	10	2022	31	10	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	CONTRATO DE OBRA	WSD	1,00	\$1.565.715,00		0,00	\$1.565.715,00

<b>Notas:</b> PAGO ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA 123	<b>Subtotal:</b>	\$1.565.715,00
	<b>Cargos:</b>	\$0.00
	<b>Descuento:</b>	\$0.00
	<b>Total:</b>	\$1.565.715,00
<b>SON:</b> (Un millón quinientos sesenta y cinco mil setecientos quince pesos )	<b>ReteRenta:</b>	\$31.314,30
<b>CUFE:</b> 7d45afcb3c0b118215b8e8477f315ebbe3c5d923647570ea1b95fe36bec06542622fb167151a5d521f00f46d585e4e	<b>Neto Factura:</b>	\$1.534.400,70

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
<b>RETENCIONES</b>			
06 ReteRenta	\$1.565.715,00	2,00%	\$31.314,30

Firma Digital: H4Rk15a2X4Iay86LIK445cJQedFvZgw74P2QJLxSWVWCUS5GKVKn4RES9yIugA GuYoDQoseatgd8kLkCC1pl3BSF41J0estIwy1LMhs8oDXe4d+B x+VMVGC0YTU2+ tesU+Yqnl3hamEYJmqdP1siGWUQ8vCnEV4VU9OV9RShmzQdCNDUZHQdV3w3q HXaITNaYFTroflb+InJyKsfhEptLWXay9X bdHG+Hn5teW3x7ncy+twFUGsuf91w IN1E4A/IroqBhmfrH0acyRZmFb1EPLsOp8AwkTFqZc5EAaxdw0Unby4BnRNvn5R /GDUEYnHFkspz/IQ50Y0 wg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.







**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CODIGO:GF-R-108

FECHA VIGENCIA 2022-01-18

VERSION:04

Página : 1 de 1

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20220316**

**CONCEPTO:**

EXPEDICION 7 - Febrero - 2022

CUENTAS POR PAGAR 2021 CONSECUTIVO 121 CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y ARQUITECTURA - CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO GAVIONES MURIO DE CONTENCIÓN Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE UN TRAMO DEL CANAL CAY POR AFECTACIÓN EN PROPIEDADES

**EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO  
HACE CONSTAR:**

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC	RECURSOPTO	VALOR
232010100103080	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos - RECURSOS PROPIOS	54251	RP VIGENCIA ACTUAL	11,137,054.00

**TOTAL DOCUMENTO**


**11,137,054.00**

Elaboro:

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03

**Aprobo:**



	<b>CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CODIGO:</b> GR-R-109
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2022-01-18
		<b>VERSION:</b> 04
		<b>Página:</b> 1 de 1

CDP 20220316

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**

**No. 20220293**

EXPEDICION	7	- Febrero	- 2022
------------	---	-----------	--------

**CONCEPTO:**


CUENTAS POR PAGAR 2021 CONSECUTIVO 121 CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y ARQUITECTURA - CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO GAVIONES MURIO DE CONTENCIÓN Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE UN TRAMO DEL CANAL CAY POR AFECTACIÓN EN PROPIEDADES


**EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO  
HACE CONSTAR:**

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad a favor de 901447780 CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC	RECURSO	PTO	VALOR
2320101001030801	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos - RECURSOS	54251	RP	VIGENCIA	11,137,054.00

<b>TOTAL DOCUMENTO</b>	<b>11,137,054.00</b>
------------------------	----------------------

  
 \_\_\_\_\_  
**Elaboro:**

  
 \_\_\_\_\_  
**JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER**  
**PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03**  
**Aprobo:**
