



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 15 DE 2022

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

FECHA DE INICIO

25 DE MARZO DE 2022

FECHA DE FINALIZACION

10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	2 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSP. DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	10 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	2 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	4 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* Sector Carrera 4B Calles 5 y 5a del Barrio La Pola: En esta jornada se las obras dependen para el avance la solución de la reubicación de la red de acueducto que esta sobre la zona de fundación de la tubería.
 * Varsovia II Calle 59 Cra 1 Sur: Se adelanta la construcción de pozo aliviadero, se siguen conformando llenos en recebo y terminación de acometidas domiciliarias de alcantarillado.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 86 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO

X

NUBLADO:

LLOVIZNA

LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTIÓN ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 15

DE

2022

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE 18 DE 2022 CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
 FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022
 FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	2 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSP. DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	10 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	2 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	4 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- * Sector Carrera 4B Calles 5 y 5a del Barrio La Pola: En esta jornada se las obras de suministro e instalacion de red de acueducto fueron aprobadas, realizando las excavaciones para la reposicion de red de acueducto por parte de las cuadrillas de acueductoadscritas al mismo contrato.
- * Varsovia II Calle 59 Cra 1 Sur: Se adelanta la colocacion de rejillas en fibroconcreto en carcamo de aguas lluvias, se realiza reparacion de placa en concreto sobre via.
- * Se realiza visita tecnica al Barrio Topocio Manzana 24A con el fin de solucionar un taponamiento de red matriz de alcantarillado.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 86 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: LLOVIZNA X LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTIÓN ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE
DIA 18 DE 2022

CONTRATISTA
INTERVENT/SUPERVISOR


MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA **NOVIEMBRE**

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 17 DE

2022

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

FECHA DE INICIO

25 DE MARZO DE 2022

FECHA DE FINALIZACION

10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	2 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	10 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	2 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	4 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA LLUVIOSO, NO SE LABORO

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 86 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO

NUBLADO:

LLOVIZNA

LLUVIA

X

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB-R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 17 DE 2022

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 18 DE 2022 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022

FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	2 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	10 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	2 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	4 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* Sector Carrera 4B Calles 5 y 5a del Barrio La Pola: En esta jornada se las obras de suministro e instalacion de red de acueducto fueron aprobadas, realizando las excavaciones para la reposicion de red de acueducto por parte de las cuadrillas de acueductoadscritas al mismo contrato.

* Varsovia II Calle 59 Cra 1 Sur: Se adelanta la colocacion de rejillas en fibroconcreto en carcamo de aguas lluvias, se realiza reparacion de placa en concreto sobre via.

* Se realiza visita tecnica al Barrio Topocio Manzana 24A con el fin de solucionar un taponamiento de red matriz de alcantarillado.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 86 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: LLOVIZNA LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00


PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE
DIA 18 **DE** 2022

CONTRATISTA
INTERVENT/SUPERVISOR

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO

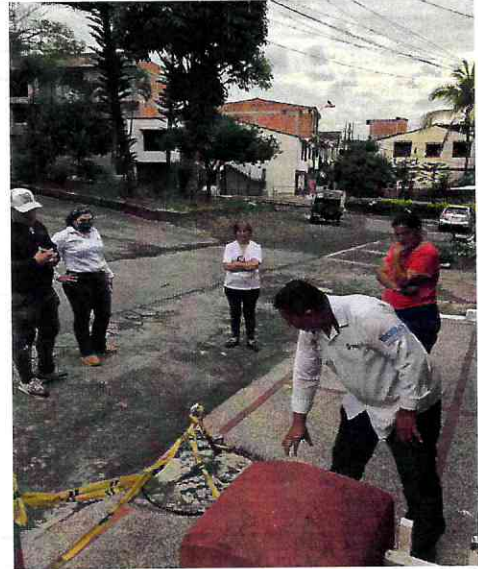


INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE 19 DE 2022 CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
 FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022
 FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	2 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	10 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	2 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	4 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* Varsovia II Calle 59 Cra 1 Sur: Inicia la Construcción de Obra de entrega aguas lluvias y aliviadero.
 * Sector B/ La Pola Calle 4B Cra 4 y 5A: En esta jornada se esta realizando la recuperacion de andenes afectados con la construccion de acometidas domiciliarias, tambien se terminan a nivel de rasante los pozos de inspeccion.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 86 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: X LLOVIZNA LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

26



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE
DIA 19 DE 2022

CONTRATISTA
INTERVENT/SUPERVISOR

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTIÓN ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB-R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE 21 DE 2022 CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
 FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022
 FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 ✓	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 ✓	RETROCARGADOR	2 ✓			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 ✓	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	10 ✓	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	2 ✓			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 ✓	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 ✓			
CONDUCTORES	2 ✓	MOTOBOMBAS	1 ✓			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	4 ✓			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 ✓			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 ✓			
MECANICO		MEZCLADORA	1 ✓			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* Varsovia II Calle 59 Cra 1 Sur: Inicia la Construcción de Obra de entrega aguas lluvias y aliviadero.
 * Sector B/ La Pola Calle 4B Cra 4 y 5A: En esta jornada se esta realizando el suministro e instalacion de tuberia plastica en la zona de pozo inicial del tramo en D=8"

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 86 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: X LLOVIZNA LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

CF



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB-R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 21

DE

2022

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE **CONTRATISTA** MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA 22 **DE** 2022 **INTERVENT/SUPERVISOR** LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022
FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	2 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	10 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	2 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	4 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* Varsovia II Calle 59 Cra 1 Sur: Continua la Construcción de Obra de entrega aguas lluvias y aliviadero. Se realiza arreglo de andenes.
 * Sector B/ La Pola Calle 4B Cra 4 y 5A: En esta jornada se esta realizando los llenos con recobo sobre tubería plastica realizando la compactacion por mediomecanico.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 86 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: LLOVIZNA LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB-R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 22

DE

2022

INTERVENT/SUPERVISOR


LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE 23 DE 2022 CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
 FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022
 FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	2 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	10 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	2 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	4 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- * B/ El Peñon Cra 1B Cale 32: Se realiza visita tecnica al barrio el Peñon, con el fin de atender emergencia por colapso de alcantarillado de aguas residuales.
- * Topacio Mz 35-36: En esta jornada se atiende visita para acometer emergencia presentada por colapso de alcantarillado de aguas combinadas en via peatonal. Se evidencia que las viviendas sacaron sus frentes hacia los antejardines construyendo sobre la zona del colector.
- * Sector B/ La Pola Calle 4B Cra 4 y 5A: En esta jornada se construye camara de caida en pozo profundo sobre talud y se realizan nuevas reparaciones en andenes.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 86 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: X LLOVIZNA LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE

CONTRATISTA


MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 23 DE 2022

INTERVENT/SUPERVISOR


LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO

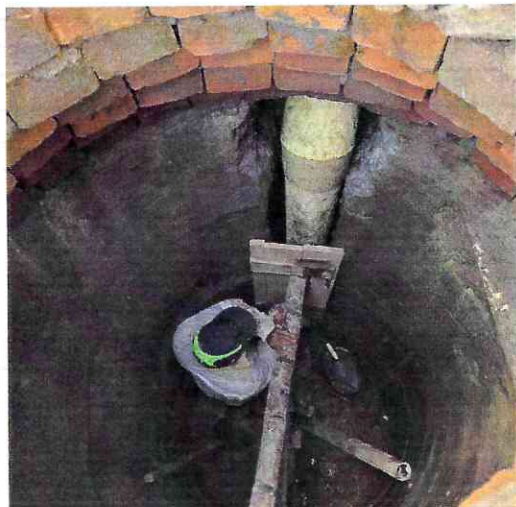


INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
 DIA 24 DE 2022 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
 FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022
 FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	1 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	6 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	1 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- * B/ El Peñon Cra 1B Cale 32:
- * Topacio Mz 35-36:
- * Sector B/ La Pola Calle 4B Cra 4 y 5A: En esta jornada se construye camara de caida en pozo profundo sobre talud y se realizan nuevas reparaciones en andenes.
- * Topacio Mz 24A: Se adelanta visita tecnica con personal de IBAL para dar solucion a taponamiento de colector que pasa por los andenes de las viviendas. Se coordina con la supervision sacar la red de alcantarillado a la eje de la via y mejorar el diametro de 8 a 12 pulgadas.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 86 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: LLOVIZNA LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB-R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00


PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE
DIA 24 DE 2022

CONTRATISTA
INTERVENT/SUPERVISOR


MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO

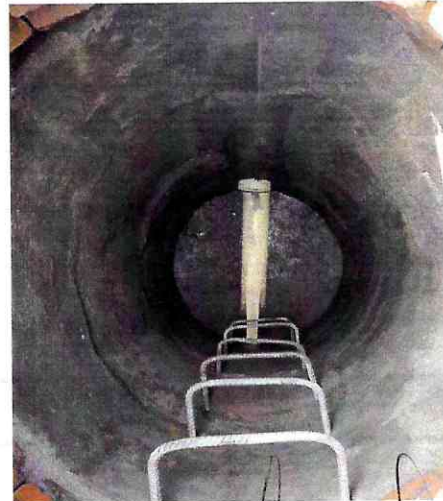


INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
 DIA 25 DE 2022 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
 FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022
 FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	1 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	6 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	1 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- * B/ El Peñon Cra 1B Cale 32:
- * Topacio Mz 35-36:
- * Sector B/ La Pola Calle 4B Cra 4 y 5A: En esta jornada se realiza reparacion sobre escalera en talud hacia carrera 5a, continua la reparacion de andenes.
- * Topacio Mz 24A:

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 86 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: x LLOVIZNA LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE
DIA 25 **DE** 2022

CONTRATISTA
INTERVENT/SUPERVISOR

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE **CONTRATISTA** MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA 28 **DE** 2022 **INTERVENT/SUPERVISOR** LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022
FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR				
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	6 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA				
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS				
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS				
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA				
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- * B/ El Peñon Cra 1B Cale 32:
- * Topacio Mz 35-36:
- * Sector B/ La Pola Calle 4B Cra 4 y 5A: En esta jornada se adelanta el descapote y roceria sobre talud con el fin de acometer las excavaciones para hincado de trinchos en guadua
- * Topacio Mz 24A:

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 86 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: LLOVIZNA LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA 28 DE 2022 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
 DIA 29 DE 2022 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
 FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022
 FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR				
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	6 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	2 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS	1 /			
CELADOR		VOLQUETAS				
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA				
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- * B/ El Peñon Cra 1B Cale 32: Se realiza corte y demolicion de pavimento rigido comenzando por la zona donde se identifico el colapso de red con el fin de liberar la carga de aguas residuales acumulada en la red y domiciliarias.
- * Topacio Mz 35-36: Inicio de actividades con demolicion de andenes y excavaciones manuales desde la zona de descole en tuberia de 16"
- * Sector B/ La Pola Calle 4B Cra 4 y 5A: En esta jornada se adelanta el descapote y roceria sobre talud con el fin de acometer las excavaciones para hincado de trinchos en guadua
- * Topacio Mz 24A:

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 87 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: LLOVIZNA LLUVIA

 INGENIERO RESIDENTE	N.A INTERVENTOR	 GRUPO GESTION ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
-------------------------	--------------------	--



**ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 29

DE

2022

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB-R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE **CONTRATISTA** MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA 30 **DE** 2022 **INTERVENT/SUPERVISOR** LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022
FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR				
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSP. DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	6 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	2 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS	1 /			
CELADOR		VOLQUETAS				
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA				
DIGITALIZADOR						



ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- * B/ El Peñon Cra 1B Cale 32: Inicia la excavacion manual sobre la zona de red principal para dar inicio a las labores de reposicion de alcantarillado.
- * Topacio Mz 35-36: Inicio de actividades con excavaciones manuales a mas de 3mts y con el uso de entibados ya que por la mala calidad del suelo se viene presentando derrumbes que afectan las zonas de antejardines de viviendas.
- * Sector B/ La Pola Calle 4B Cra 4 y 5A: Inician las labores de construccion de trinchos con excavaciones manuales para hincado de trinchos.
- * Topacio Mz 24A:

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 87 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA		
SOLEADO	X	NUBLADO:
		LLOVIZNA
		LLUVIA
 INGENIERO RESIDENTE	N.A INTERVENTOR	 GRUPO GESTION ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

2/3



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE
DIA 30 DE 2022

CONTRATISTA
INTERVENT/SUPERVISOR

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA DICIEMBRE CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA 01 DE 2022 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022
FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR				
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	6 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	2 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS	1 /			
CELADOR		VOLQUETAS				
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA				
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- * B/ El Peñon Cra 1B Cale 32: Inicia la excavacion manual sobre la zona de red principal para dar inicio a las labores de reposicion de alcantarillado.
- * Topacio Mz 35-36: Inicio de actividades con excavaciones manuales a mas de 3 mts y con el uso de entibados ya que por la mala calidad del suelo se viene presentando derrumbes que afectan las zonas de antejardines de viviendas.
- * Sector B/ La Pola Calle 4B Cra 4 y 5A: Inician las labores de construccion de trinchos con excavaciones manuales para hincado de trinchos.
- * Topacio Mz 24A:

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 87 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA		
SOLEADO	X	NUBLADO:
		LLOVIZNA
		LLUVIA
 INGENIERO RESIDENTE	N.A INTERVENTOR	 GRUPO GESTION ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB-R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA DICIEMBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 01

DE

2022

INTERVENT/SUPERVISOR


LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA DICIEMBRE CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
 DIA 02 DE 2022 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
 FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022
 FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	1 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	6 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	3 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS	1 /			
CELADOR		VOLQUETAS				
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA				
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- * B/ El Peñon Cra 1B Cale 32: Continúa la excavacion manual sobre la zona de red principal al tiempo se realiza la instalacion de tuberia plastica de 8"
- * Topacio Mz 35-36: Inicio de actividades con excavaciones manuales a mas de 3 mts y con el uso de entibados ya que por la mala calidad del suelo se viene presentando derrumbes que afectan las zonas de antejardines de viviendas.
- * Sector B/ La Pola Calle 4B Cra 4 y 5A: Inician las labores de construccion de trinchos con excavaciones manuales para hincado de trinchos.
- * B/ Topacio Mz 24A:
- * B/ Ricaurte: Se realiza el cerramiento perimetral con polisombra y la ejecucion de apiques exploratorios para ubicación de redes de servivios publicos y asi evitar daños a los mismos.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 87 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA
 SOLEADO NUBLADO: LLOVIZNA LLUVIA

 INGENIERO RESIDENTE	N.A INTERVENTOR	 GRUPO GESTION ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
-------------------------	--------------------	--



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"


FECHA	DICIEMBRE	CONTRATISTA	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA	02	DE	2022
		INTERVENT/SUPERVISOR	LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
