



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA	MARZO	CONTRATISTA	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA	22	INTERVENT/SUPERVISOR	LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
	DE	FECHA DE INICIO	25 DE MARZO DE 2022
	2023	FECHA DE FINALIZACION	10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	1 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	1 /			
INSP. DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	6 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA				
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS				
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	2 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* B/ 20 de Julio Calle 6 Cra 13:

Continua la construcción de pozo de inspección en ladrillo D=1.8 m identificado en los diseños como No.04 sobre carrera 13. Inicia la construcción de Pozo No.05

Inicia excavación mecánica sobre carrera 13 entre Pozo 4 y 5. realizando el retiro de sobrantes de manera inmediata.

Termina el mejoramiento de base para construcción de dissipador de energía y reubicación de redes de aguas residuales en descole.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 90 % (Contrato adicionado en Recursos y Tiempo)

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: LLOVIZNA LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTIÓN ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA MARZO

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 22



DE

2023

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO

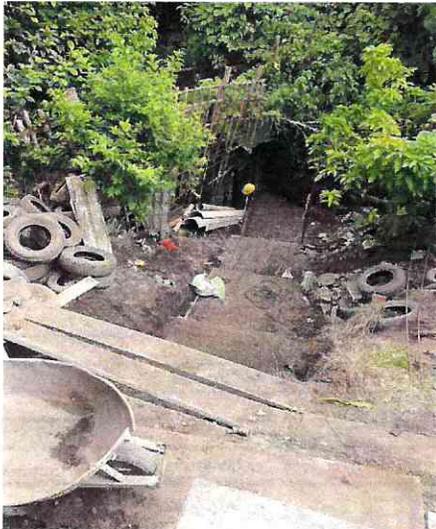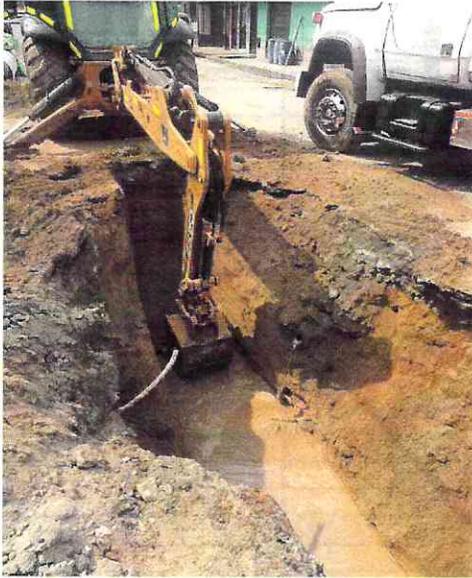


INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114
FECHA VIGENCIA: 2022-09-20
VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA MARZO CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
 DIA 23 DE 2023 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
 FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022
 FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	1 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	1 /			
INSP. DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	6 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA				
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS				
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	2 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX. ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS
 * B/ 20 de Julio Calle 6 Cra 13:
 Termina construcción de pozos 4 y 5 a nivel de rasante.
 Continúa excavación mecánica sobre carrera 13 entre Pozo 4 y 5. realizando el retiro de sobrantes de manera inmediata.
 Se realiza el armado de acero de refuerzo para piso de dissipador de energía.
 Se realiza el entibado para la protección de personal en zanja ya que el terreno excavado es muy inestable.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 90 % (Contrato adicionado en Recursos y Tiempo)

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: LLOVIZNA LLUVIA

 INGENIERO RESIDENTE	N.A INTERVENTOR	 GRUPO GESTION ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
-------------------------	--------------------	--

Handwritten mark



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB-R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA MARZO

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 23

DE


 2023

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB-R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSION: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA MARZO

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 24


DE


2023

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO

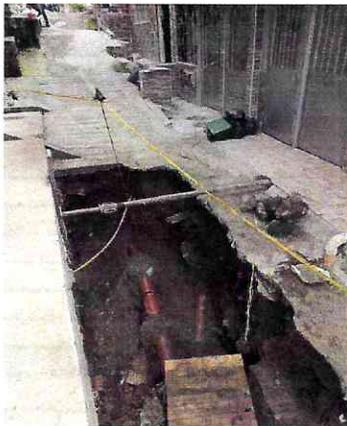


INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA MARZO CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
 DIA 27 DE 2023 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
 FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022
 FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	1 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	1 /			
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	6 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA				
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS				
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	2 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* B/ 20 de Julio Calle 6 Cra 13:

Se realizan llenos con recebo compactado medio mecanico en carrera 13 .

Llenos en recebo entre pozo 4 y 5 calle 13.


Continúa excavacion manual entre pozo 5 y 6 para suministro e instalacion de tubería de 30".

Al realizar excavaciones se identifica un gran numero de redes domiciliarias que se encuentran construidas de manera artesanal y deben ser reubicadas ya que interfieren con el trazado de la red de aguas lluvias de 30". Swe avanza en excavaciones para sentado de tubería de 30".

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 91 % (Contrato adicionado en Recursos y Tiempo)

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA			
SOLEADO	X	NUBLADO:	LLOVIZNA
			LLUVIA

 INGENIERO RESIDENTE	N.A INTERVENTOR	 GRUPO GESTION ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
--	--------------------	---



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB-R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA MARZO

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ



DIA 27 DE

2023

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO

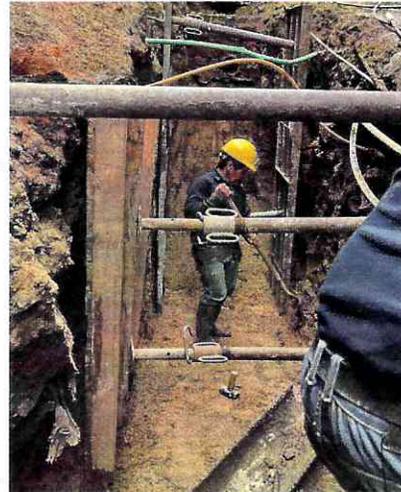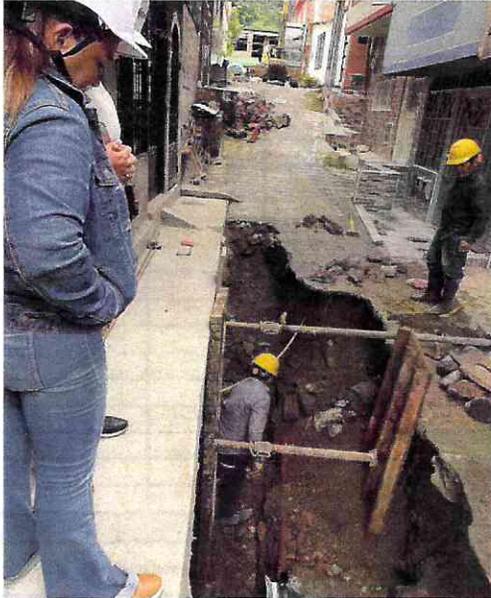


INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA MARZO

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 28

DE

2023

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA	MARZO	CONTRATISTA	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA	29	INTERVENT/SUPERVISOR	LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
	DE	FECHA DE INICIO	25 DE MARZO DE 2022
	2023	FECHA DE FINALIZACION	10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	1 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	1 /			
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	6 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA				
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS				
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	2 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* B/ 20 de Julio Calle 6 Cra 13:


Inicia excavacion mecanica entre pozo 3 y 4 con instalacion de tuberia de 24" con atraque de la misma.
Retiro de sobrantes.
Continua excavacion manual entre pozo 5 y 6 para suministro e instalacion de tuberia de 30".
Se realiza suministro e instalacion de tuberia de 30" en zona de disipador, realizando el atraque inmediato de tuberia en zanja para evitar daños a viviendas.
Se conectan usuarios a red nueva de aguas residuales de 8".

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 91 % (Contrato adicionado en Recursos y Tiempo)

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO	NUBLADO:	X	LLOVIZNA	LLUVIA
---------	----------	----------	----------	--------

 INGENIERO RESIDENTE	N.A INTERVENTOR	 GRUPO GESTION ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
--	--------------------	---



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB-R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSION: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA MARZO

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 29



DE

2023

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO

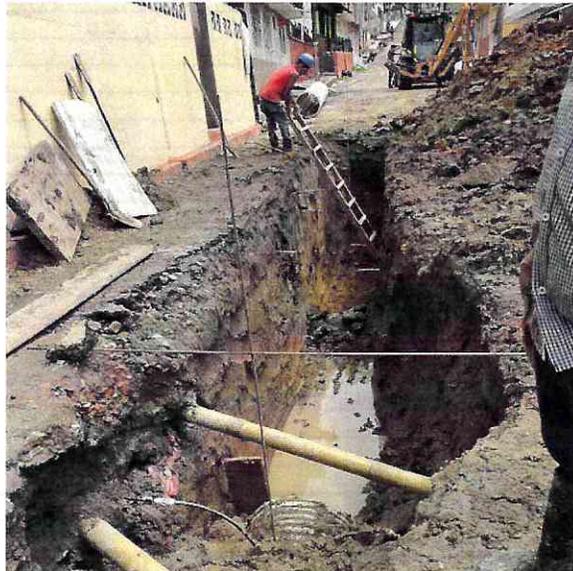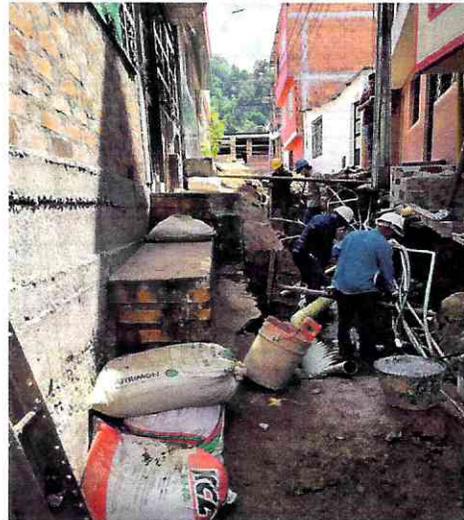


INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA	MARZO	CONTRATISTA	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA	30 DE 2023	INTERVENT/SUPERVISOR	LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
		FECHA DE INICIO	25 DE MARZO DE 2022
		FECHA DE FINALIZACION	10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	1 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	1 /			
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	6 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA				
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS				
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	2 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* B/ 20 de Julio Calle 6 Cra 13:

Inicia excavacion mecanica entre pozo 3 y 4 con instalacion de tuberia de 24" con atraque de la misma realizando llenos con recebo compactado medio mecanico.

Retiro de sobrantes.

Se realiza suministro e instalacion de tuberia de 30" terminando de instalar el diametro mayor en descole sobre el callejon.

Se conectan usuarios a red nueva de aguas residuales de 8".

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 92 % (Contrato adicionado en Recursos y Tiempo)

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: X LLOVIZNA LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB-R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSION: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA MARZO

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 30


DE

2023

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO

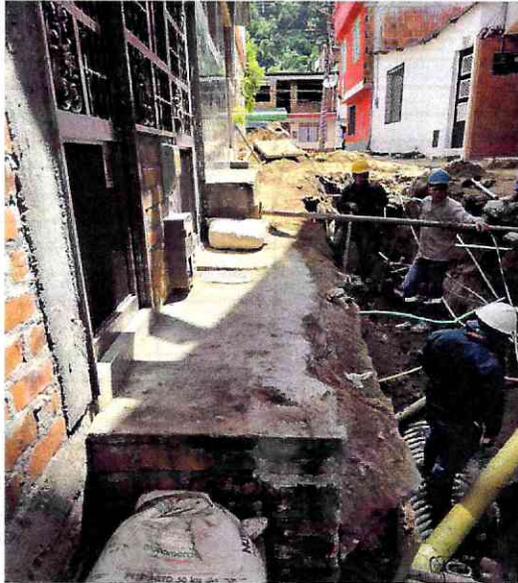


INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

	ACTA DIARIA DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO	CÓDIGO: SB- R-AL-114
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA: 2022-09-20
		VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"
FECHA <u> MARZO </u> CONTRATISTA <u> MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ </u>
DIA <u> 31 </u> DE <u> 2023 </u> INTERVENT/SUPERVISOR <u> LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO </u>
FECHA DE INICIO <u> 25 DE MARZO DE 2022 </u>
FECHA DE FINALIZACION <u> 10 DE MARZO DE 2023 </u>

GENERALIDADES						
PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	1 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	1 /			
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	6 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA				
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS				
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	2 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* B/ 20 de Julio Calle 6 Cra 13:

Llenos con recebo en zanja entre pozos 3 y 4 compactado medio mecanico


Retiro de sobrantes.

Continua el suministro e instalacion de tuberia plastica de 24" entre pozos 2 y 3.

Se reconectan usuarios a red existente de aguas residuales, ya que en el proceso de excavaciones se averiaron las acometidas que existian en gress.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 93 % (Contrato adicionado en Recursos y Tiempo)

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA		
SOLEADO	NUBLADO: X	LLOVIZNA
		LLUVIA
 INGENIERO RESIDENTE	N.A INTERVENTOR	 GRUPO GESTION ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB-R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA MARZO

CONTRATISTA

 MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 31



DE

 2023

INTERVENT/SUPERVISOR

 LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO

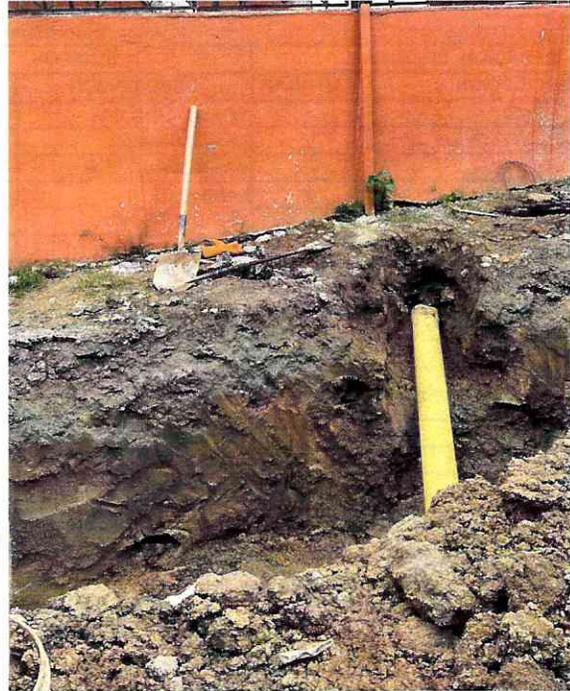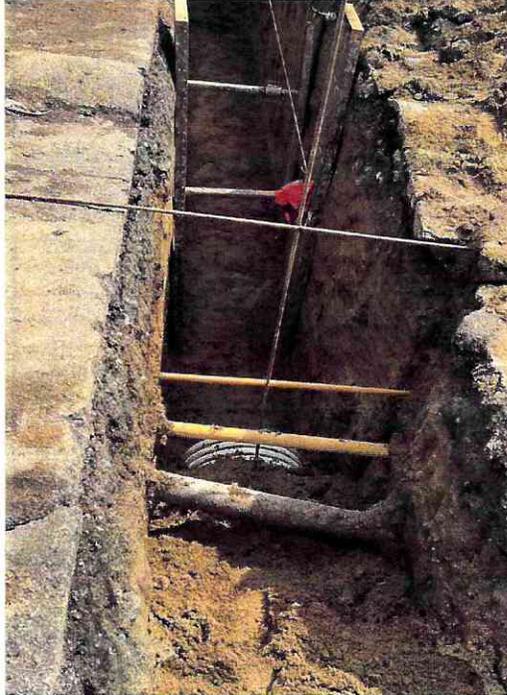


INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTIÓN ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA MARZO **CONTRATISTA** MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA 31 **DE** 2023 **INTERVENT/SUPERVISOR** LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022
FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	1 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	1 /			
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	6 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA				
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS				
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	2 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* B/ 20 de Julio Calle 6 Cra 13:

Se nivela y alista Bocacalle calle 6 (Zona de Descole) y se deja a nivels de recuperacion de pavimento.

Construccion de pozo de Inspeccion No.4

Retiro de sobrantes.


Continua el suministro e instalacion de tuberia plastica de 24" entre pozos 2 y 3.

Se reconectan usuarios a red existente de aguas residuales, ya que en el proceso de excavaciones se averiaron las acometidas que existian en gress.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 93 % (Contrato adicionado en Recursos y Tiempo)

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA			
SOLEADO	NUBLADO:	X	LLOVIZNA
			LLUVIA

 INGENIERO RESIDENTE	N.A INTERVENTOR	 GRUPO GESTION ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
--	--------------------	---



**ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA MARZO

CONTRATISTA


MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 31 DE 2023

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO

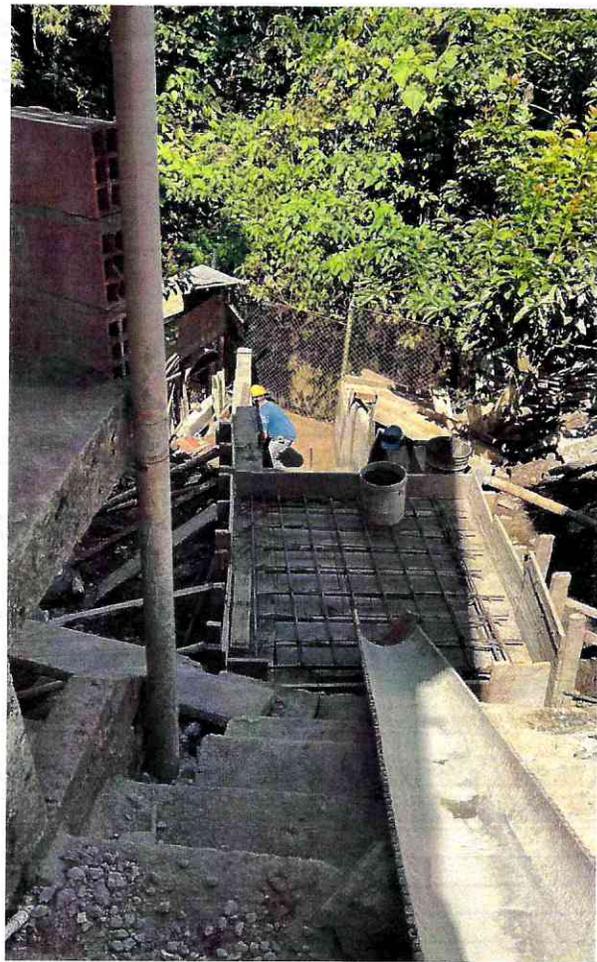

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA ABRIL

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 04


DE

2023

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO

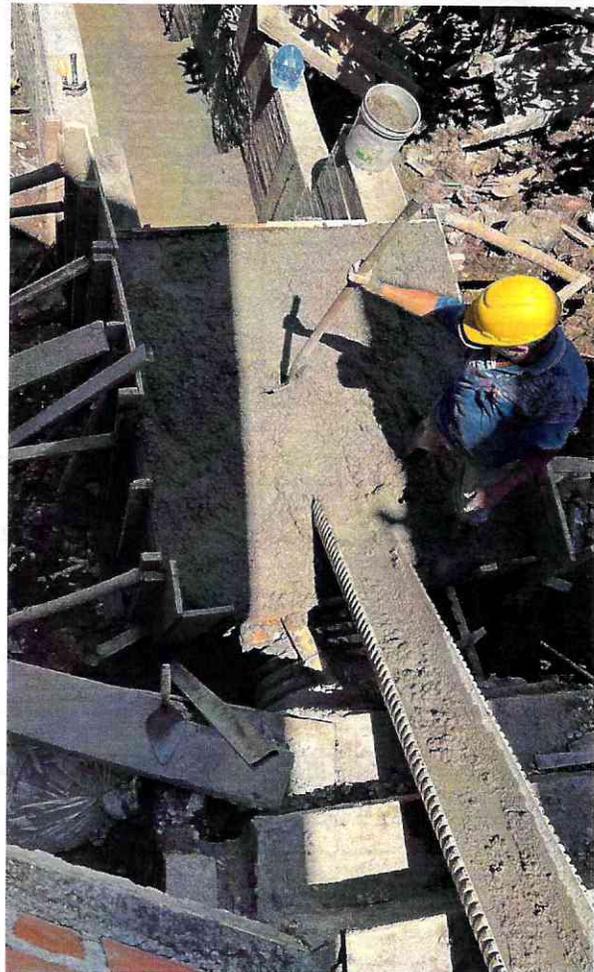

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR



GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA	ABRIL	CONTRATISTA	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA	05 DE	INTERVENT/SUPERVISOR	LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
		FECHA DE INICIO	25 DE MARZO DE 2022
		FECHA DE FINALIZACION	10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	1 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	1 /			
INSP. DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	6 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA				
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS				
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	2 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX. ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* B/ 20 de Julio Calle 6 Cra 13:

S e estan realizando excavaciones para instalacion de tuberia de 12 para sumideros.

Construccion de pozo de Inspeccion No.4

Continua construccion de disipador de energia fundiendo la paca d ela camara de aquietamiento d ela estructura.

Continua el suministro e instalacion de tuberia plastica de 24" entre pozos 2 y 3.

Se reconectan usuarios a red existente de aguas residuales, ya que en el proceso de excavaciones se averiaron las acometidas que existian en gress.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 93 % (Contrato adicionado en Recursos y Tiempo)

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA			
SOLEADO	NUBLADO:	X	LLOVIZNA
			L LUVIA
	INGENIERO RESIDENTE	N.A	INTERVENTOR
	GRUPO GESTION ALCANTARILLADO	IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL	



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA ABRIL

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ


DIA 05 DE

2023

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO

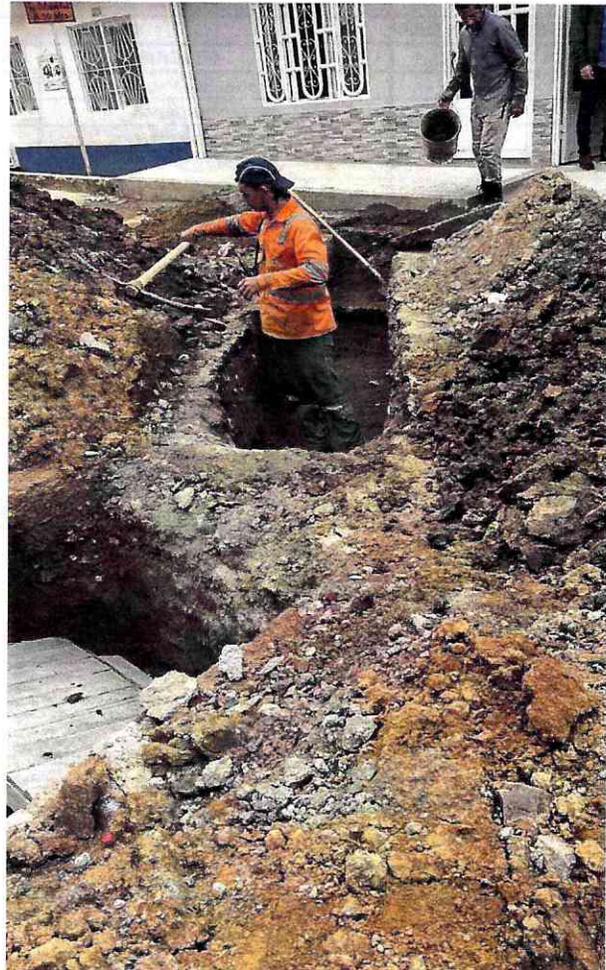

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA	ABRIL	CONTRATISTA	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA	10	INTERVENT/SUPERVISOR	LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
	DE	FECHA DE INICIO	25 DE MARZO DE 2022
	2023	FECHA DE FINALIZACION	10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	1 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	1 /			
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	6 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA				
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS				
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	2 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* B/ 20 de Julio Calle 6 Cra 13:

Se estan realizando excavaciones para instalacion de tuberia de 12 para sumideros.

Se realiza empalme de acueducto de 4" para suministro de agua potable en Bocacalle.

Comienza la construccion de sumideros tipo.

Continua el suministro e instalacion de tuberia plastica de 24" entre pozos 2 y 3.

Se reconectan usuarios a red existente de aguas residuales, ya que en el proceso de excavaciones se averiaron las acometidas que existian en gress.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 93 % (Contrato adicionado en Recursos y Tiempo)

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA			
SOLEADO	NUBLADO:	X	LLOVIZNA
			LLUVIA
	INGENIERO RESIDENTE	N.A	INTERVENTOR
	GRUPO GESTION ALCANTARILLADO	IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL	

Handwritten mark



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA ABRIL

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ


DIA 10 DE

2023

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO

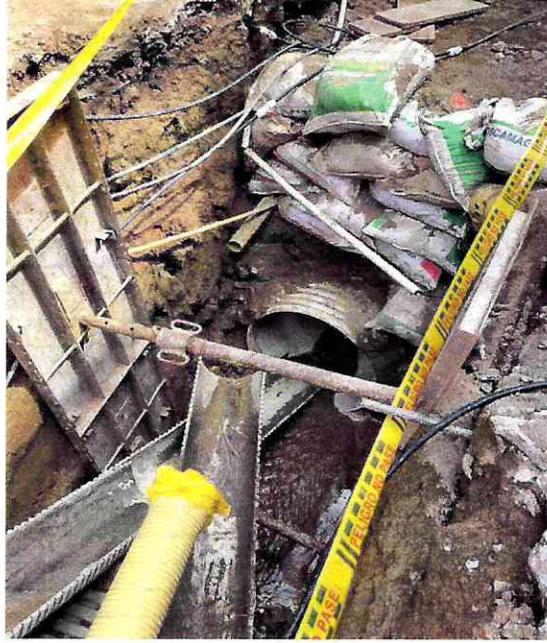


INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114


FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA	ABRIL	CONTRATISTA	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA	11	INTERVENT/SUPERVISOR	LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO

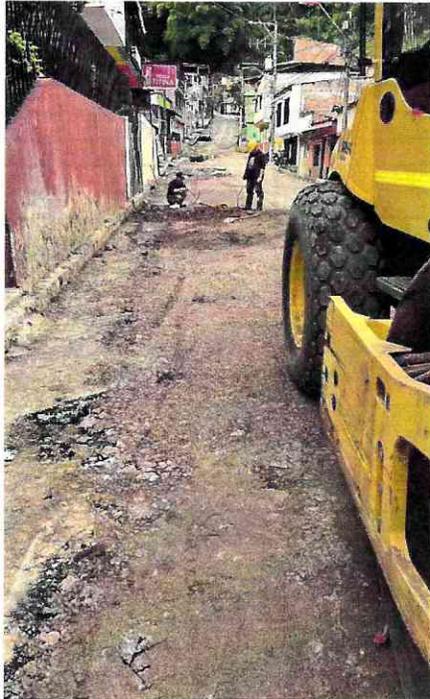


INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

	ACTA DIARIA DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO	CÓDIGO: SB- R-AL-114
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA: 2022-09-20
		VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"			
FECHA	ABRIL	CONTRATISTA	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA	12	INTERVENT/SUPERVISOR	LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
	DE	FECHA DE INICIO	25 DE MARZO DE 2022
	2023	FECHA DE FINALIZACIÓN	10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES						
PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	1 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	1 /			
INSP. DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	6 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA				
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS				
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	2 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX. ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES


ACTIVIDADES REALIZADAS

* B/ 20 de Julio Calle 6 Cra 13:

Se estan realizando excavaciones para instalacion de tuberia de 12 para sumideros.
 Se estan construyendo sumideros tipo con poceta.
 Termina el suministro e instalacion de tuberia plastica de 24" entre pozos 1 y 2. Construccion de pozo de inspeccion 1.
 Se reconectan usuarios a red existente de aguas residuales, ya que en el proceso de excavaciones se averiaron las acometidas que existian en gress.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 93 % (Contrato adicionado en Recursos y Tiempo)

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA			
SOLEADO	NUBLADO:	X	LLOVIZNA
			LLUVIA
 INGENIERO RESIDENTE	N.A INTERVENTOR	 GRUPO GESTION ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL	

Handwritten mark



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114


FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA ABRIL CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA 12 DE 2023 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO

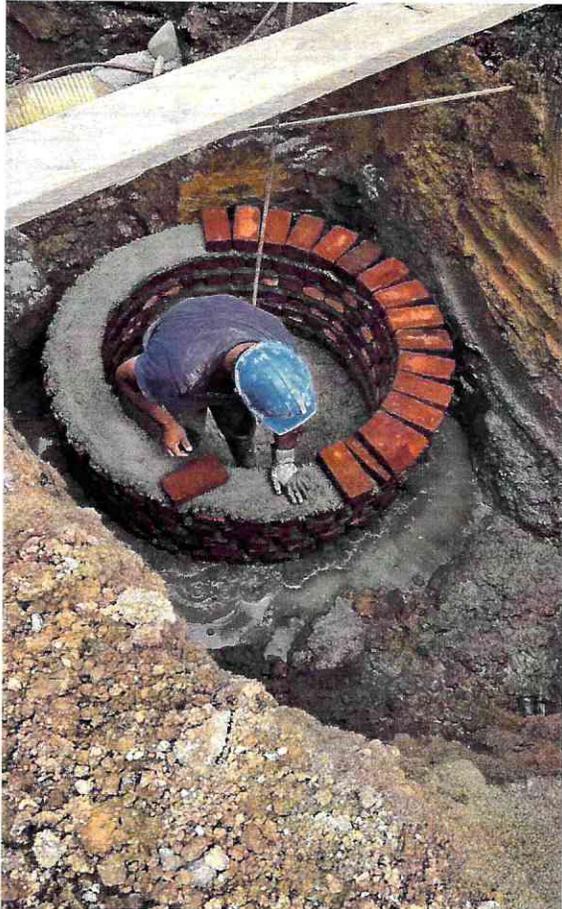

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

	ACTA DIARIA	CÓDIGO: SB- R-AL-114
	DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO	FECHA VIGENCIA: 2022-09-20
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"			
FECHA	ABRIL	CONTRATISTA	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA	13	INTERVENT/SUPERVISOR	LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
	DE	FECHA DE INICIO	25 DE MARZO DE 2022
	2023	FECHA DE FINALIZACION	10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES						
PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	1 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	1 /			
INSP. DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	6 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA				
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS				
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	2 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX. ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* B/ 20 de Julio Calle 6 Cra 13:

Se estan realizando excavaciones para instalacion de tuberia de 12 para sumideros.

Se estan construyendo sumideros tipo poceta.

Termina el suministro e instalacion de tuberia plastica de 24" entre pozos 1 y 2. Construccion de pozo de inspeccion 1.

Se reconectan usuarios a red existente de aguas residuales, ya que en el proceso de excavaciones se averiaron las acometidas que existian en gress.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 94 % (Contrato adicionado en Recursos y Tiempo)

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA			
SOLEADO	NUBLADO:	X	LLOVIZNA
			LLUVIA
 INGENIERO RESIDENTE	N.A INTERVENTOR	 GRUPO GESTION ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL	

CF



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114


FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA ABRIL CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA 13 DE 2023 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO

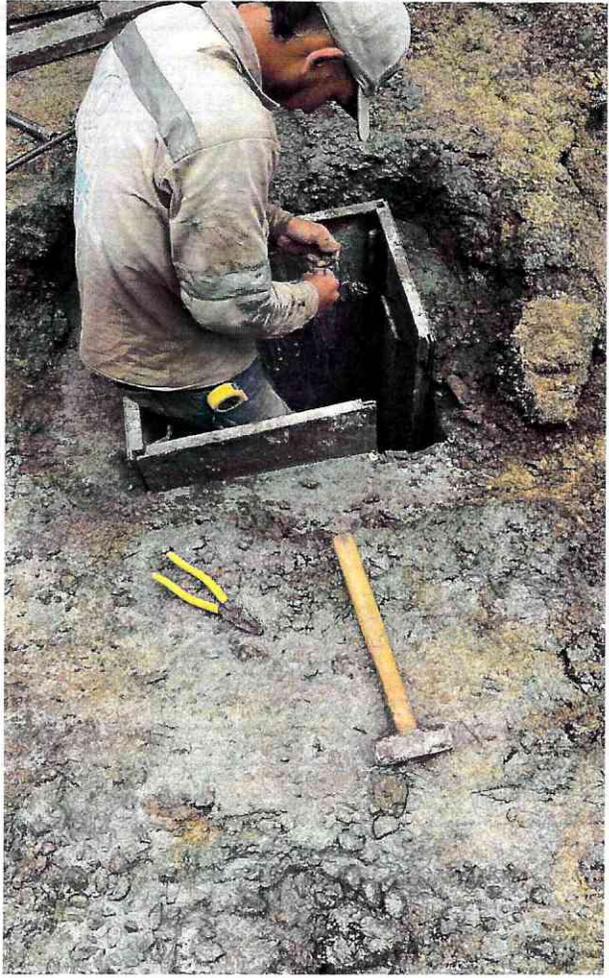


INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
