	ACTA DIARIA	CÓDIGO: SB- R-AL-114
	DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO	FECHA VIGENCIA: 2022-09-20
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"		
FECHA	OCTUBRE	CONTRATISTA	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA	26	INTERVENT/SUPERVISOR	LADY JOANNA BONILLA MEDINA
	DE	FECHA DE INICIO	25 DE MARZO DE 2022
	2022	FECHA DE FINALIZACION	10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES						
PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA	1			
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR				
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	1			
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR	1			
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	5 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	2			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2			
MECANICO		MEZCLADORA	1			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES


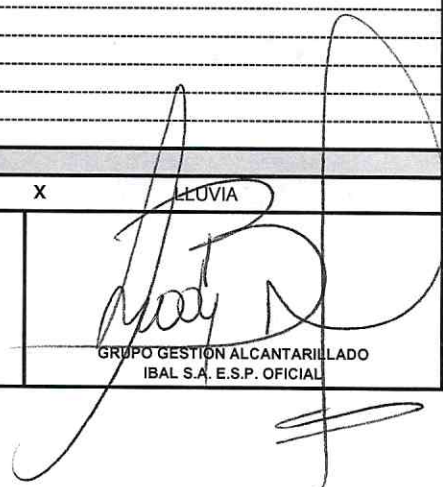
ACTIVIDADES REALIZADAS

* Calle 23 cra 5a: Se vienen realizando las excavaciones mecanicas realizando la instalacion de entibados, llenos en recebo compactado medio mecanico, instalacion de tuberia de 16"

* Sector Carrera 4B Calles 5 y 5a del Barrio La Pola: Continúa la demolición de concreto pavimento rígido y excavaciones mecanicas, realizando el retiro de sobrantes de manera coordinada. Se encuentra red de acueducto dentro de la zona de excavacion, que debido a que presenta multiples fugas, se vienen provocando derrumbes.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 84 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA			
SOLEADO	NUBLADO:	LLOVIZNA	X
 INGENIERO RESIDENTE	N.A INTERVENTOR	 GRUPO GESTION ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL	



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA OCTUBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 26


DE

2022

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

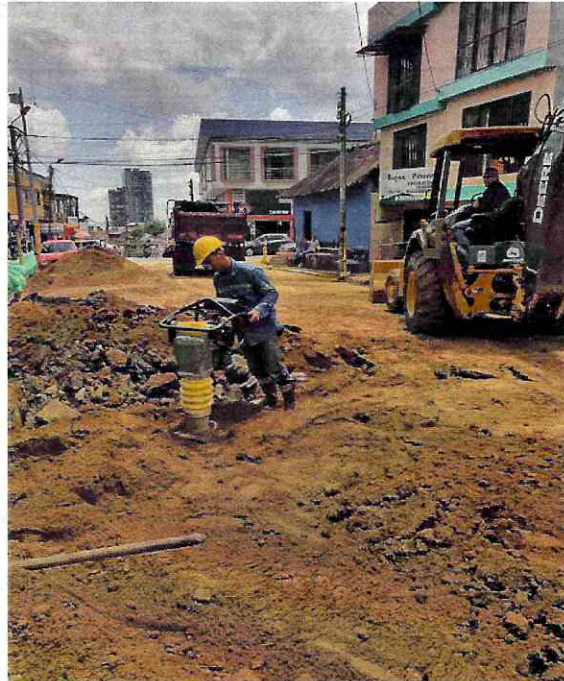


REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

		ACTA DIARIA DE REPORTE Y PROGRAMACION ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO			CÓDIGO: SB- R-AL-114	
		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			FECHA VIGENCIA: 2022-09-20	
					VERSIÓN: 00	
PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"						
FECHA <u>OCTUBRE</u>		CONTRATISTA <u>MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ</u>				
DIA <u>27</u> DE <u>2022</u>		INTERVENT/SUPERVISOR <u>LADY JOANNA BONILLA MEDINA</u>				
		FECHA DE INICIO <u>25 DE MARZO DE 2022</u>				
		FECHA DE FINALIZACION <u>10 DE MARZO DE 2023</u>				
GENERALIDADES						
PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA	1 /			
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR				
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	1 /			
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR	1 /			
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	5 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	2 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						
ACTIVIDADES						
ACTIVIDADES REALIZADAS						
<p>* Calle 23 cra 5a: Continuan las excavaciones mecanicas realizando la instalacion de entibados, llenos en recebo compactado medio mecanico, instalacion de tuberia de 16". Inicio de construccion de pozo de inspeccion.</p> <p>* Sector Carrera 4B Calles 5 y 5a del Barrio La Pola: En esta jornada las excavaciones mecanicas se cambian a manuales toda vez que los multiples derrumbes en zanjas ya abiertas ameritan por operatividad la intervencion de operarios.</p>						
AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 84 %						
OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES						
CLIMA						
SOLEADO	NUBLADO:	LLOVIZNA	X	LLUVIA		
 INGENIERO RESIDENTE		N.A INTERVENTOR		 GRUPO GESTION ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL		

26



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA OCTUBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 27

DE

2022

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO


REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

	ACTA DIARIA	CÓDIGO: SB- R-AL-114
	DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO	FECHA VIGENCIA: 2022-09-20
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"			
FECHA	OCTUBRE	CONTRATISTA	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA	28 DE	INTERVENT/SUPERVISOR	LADY JOANNA BONILLA MEDINA
		FECHA DE INICIO	25 DE MARZO DE 2022
		FECHA DE FINALIZACION	10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES						
PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA	1 /			
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	2 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	2 /			
INSPC DE OBRA	3 /	COMPRESOR	1 /			
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	10 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	2 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES



ACTIVIDADES REALIZADAS

* Calle 23 cra 5a: Continuan las excavaciones mecanicas realizando la instalacion de entibados, llenos en receo compactado medio mecanico, instalacion de tuberia de 16". Inicio de construccion de pozo de inspeccion.

* Sector Carrera 4B Calles 5 y 5a del Barrio La Pola: En esta jornada inicia el sentado e instalacion de tuberia de 8" y 10" en descole hacia la carrera 5a. Continúa construccion de pozos de inspeccion.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 84 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA			
SOLEADO	NUBLADO:	X	LLOVIZNA
			LLUVIA
 INGENIERO RESIDENTE	N.A INTERVENTOR	 GRUPO GESTION ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL	

CF



**ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"


FECHA OCTUBRE CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA 28 DE 2022 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA	OCTUBRE		CONTRATISTA	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA	29	DE	INTERVENT/SUPERVISOR	LADY JOANNA BONILLA MEDINA
			FECHA DE INICIO	25 DE MARZO DE 2022
			FECHA DE FINALIZACION	10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA	1 /			
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	2 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	2 /			
INSP. DE OBRA	3 /	COMPRESOR	1 /			
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	10 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	2 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* Calle 23 cra 5a: Continuan las excavaciones mecanicas realizando la instalacion de entibados, llenos en receo compactado medio mecanico, instalacion de tuberia de 16". Inicio de construccion de pozo de inspeccion.
 * Sector Carrera 4B Calles 5 y 5a del Barrio La Pola: En esta jornada inicia el sentado e instalacion de tuberia de 8" y 10" en descole hacia la carrera 5a. Continua construccion de pozos de inspeccion.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 84 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: X LLOVIZNA LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB-R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA OCTUBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 29

DE

2022

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA OCTUBRE

DIA 31 DE 2022

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA

FECHA DE INICIO

25 DE MARZO DE 2022

FECHA DE FINALIZACION

10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA	1 /			
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	2 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	2 /			
INSP. DE OBRA	3 /	COMPRESOR	1 /			
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	10 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	2 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- * Calle 23 cra 5a: Continuan las excavaciones mecanicas realizando la instalacion de entibados, llenos en recebo compactado medio mecanico, instalacion de tuberia de 16". Inicio de construccion de pozo de inspeccion.
- * Sector Carrera 4B Calles 5 y 5a del Barrio La Pola: En esta jornada se esta realizando la composicion de llenos en recebo en descole hacia la carrera 5a. Continua construccion de pozos de inspeccion en ladrillo y otro en concreto en la zona inestable del talud ue se conecta con la carrera 5a.
- * Sector B/ Ricaurte P/ Alta Calle 16 Cra 5 Sur: En este sector se va a adelantar la reposicion de alcantarillado combinado en D=14", buscando conectar a la mayoria de usuarios del sector a dicha red, ya que los mismo estan disponiendo en un colector antiguo que pasa bajo algunas viviendas. En esta jornada se realiza la toma topografica para el chequeo de niveles y apiques exploratorios.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 84 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO

NUBLADO:

X

LLOVIZNA

LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB-R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA OCTUBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 31

DE

2022

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB-R-AL-114
FECHA VIGENCIA: 2022-09-20
VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA 01 DE 2022 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022
FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	2 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	2 /			
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR	1 /			
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	10 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	2 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* Calle 23 cra 5a: Para este periodo, se adelanta la excavacion mecanica del tramo de tubería de 8" que descolara las aguas residuales al un colector de 8" existente sobre la calle 22. Asi mismo se esta realizando la excavacion para pozo de 1,20 m para arranque tubería de 8".
* Sector Carrera 4B Calles 5 y 5a del Barrio La Pola: En esta jornada se esta a la espera que acueducto realice visita tecnica para realizar el desvio de una red acueducto que pasa justo dentro de la zanja de colocacion de tubería de alcantarillado.
* Sector B/ Ricaurte P/ Alta Calle 16 Cra 5 Sur: En esta jornada continua la ejecucion de la toma topografica para el chequeo de niveles y apiques exploratorios.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 84 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: X LLOVIZNA LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 01

DE

2022

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO


REGISTRO FOTOGRAFICO



INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

	ACTA DIARIA	CÓDIGO: SB- R-AL-114
	DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO	FECHA VIGENCIA: 2022-09-20
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"			
FECHA	NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA	02	INTERVENT/SUPERVISOR	LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
DE	2022	FECHA DE INICIO	25 DE MARZO DE 2022
		FECHA DE FINALIZACION	10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES						
PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	2 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	2 /			
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR	1 /			
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	10 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	2 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS



* **Calle 23 cra 5a:** Para este periodo, se adelanta la excavacion mecanica del tramo de tubería de 8" que descolara las aguas residuales al un colector de 8" existente sobre la calle 22. Asi mismo se esta realizando la construccion de pozo de 1,20 m para arranque tubería de 8".

* **Sector Carrera 4B Calles 5 y 5a del Barrio La Pola:** En esta jornada se esta a la espera que acueducto realice visita tecnica para realizar el desvio de una red acueducto que pasa justo dentro de la zanja de colocacion de tubería de alcantarillado.

* **Sector B/ Ricaurte P/ Alta Calle 16 Cra 5 Sur:** En esta jornada continua la ejecucion de la toma topografica para el chequeo de niveles y apiques exploratorios.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 84 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA			
SOLEADO	NUBLADO:	X	LLOVIZNA
 INGENIERO RESIDENTE	N.A INTERVENTOR	 GRUPO GESTION ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL	LLUVIA



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 02

DE

2022

INTERVENT/SUPERVISOR


LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
 DIA 03 DE 2022 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
 FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022
 FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	2 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	2 /			
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR	1 /			
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	10 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	2 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- * Calle 23 cra 5a: Para este periodo, se adelanta el suministro e instalacion de tuberia plastica de 8".
- * Sector Carrera 4B Calles 5 y 5a del Barrio La Pola: En esta jornada se adelanta la construccion de cajas de inspeccion domiciliarias.
- * Varsovia II Calle 59 Cra 1 Surr: En esta jornada y una vez realizada la socializacion, se adelanta la demolicion de pavimento rigido y el inicio de excavaciones mecanicas.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 84 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: X LLOVIZNA LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

cto.



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB-R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ


DIA 03 DE

2022

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO

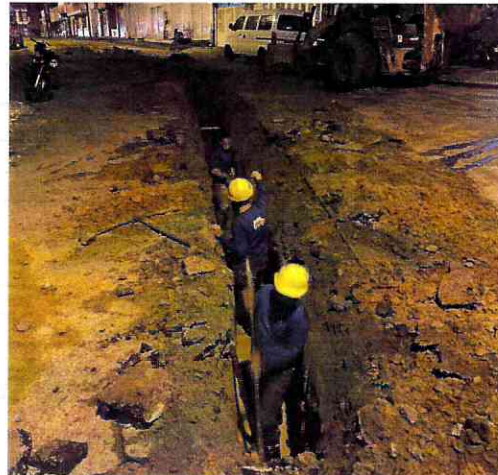

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA	NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA	04	INTERVENT/SUPERVISOR	LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
DE	2022	FECHA DE INICIO	25 DE MARZO DE 2022
		FECHA DE FINALIZACION	10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 ✓	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 ✓	RETROCARGADOR	2 ✓			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	2 ✓			
INSPEC DE OBRA	3 ✓	COMPRESOR	1 ✓			
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	10 ✓	VIBRADOR DE CONC	1 ✓			
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 ✓			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 ✓	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 ✓			
CONDUCTORES	2 ✓	MOTOBOMBAS	1 ✓			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	2 ✓			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 ✓			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 ✓			
MECANICO		MEZCLADORA	1 ✓			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- * Calle 23 cra 5a: Para este periodo, se realizan los llenos e recebo de toda la red principal y domiciliarias, asi mismo la terminacion del pozo de inspeccion.
- * Sector Carrera 4B Calles 5 y 5a del Barrio La Pola: En esta jornada se adelanta la construccion de un nuevo pozo de inspeccion en concreto.
- * Varsovia II Calle 59 Cra 1 Sur: En esta jornada de adelanta la excavacion mecanica con el uso de entibados dada la inestabilidad de los taludes de la zanja.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 85 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: X LLOVIZNA LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB-R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ


DIA 04 DE

2022

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO

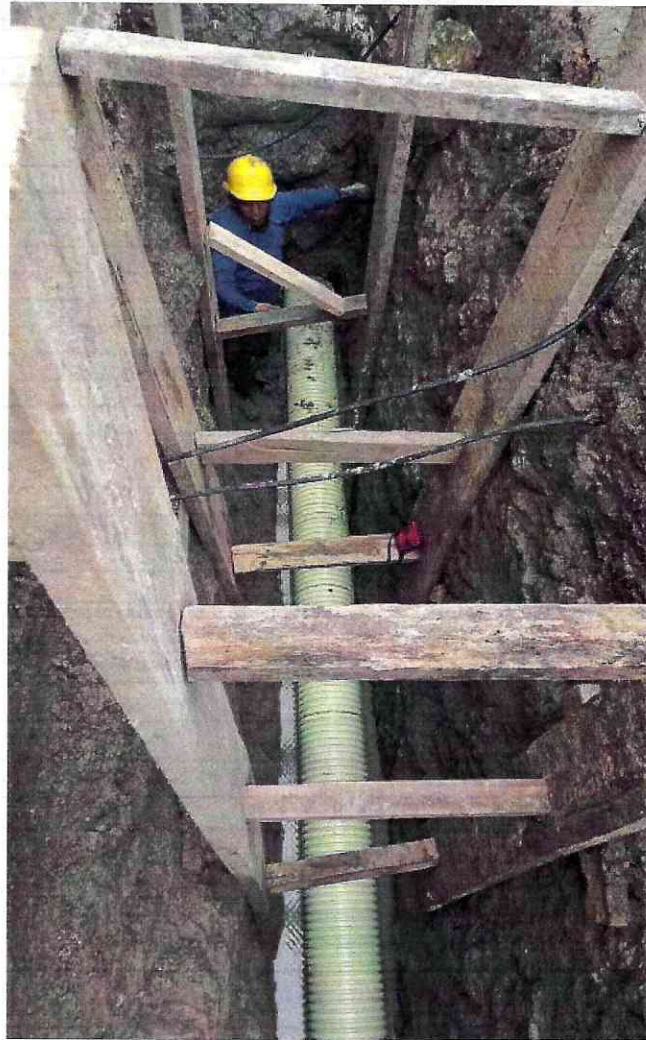


INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA	NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA	05	DE	2022
		INTERVENT/SUPERVISOR	LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
		FECHA DE INICIO	25 DE MARZO DE 2022
		FECHA DE FINALIZACION	10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	2 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	2 /			
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR	1 /			
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	10 /	VIBRADOR DE CONC	1 /			
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	2 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

NO SE LABORO DEBIDO A TORRENCIALES LLUVIAS DURANTE TODA LA MAÑANA DEL DIA SABADO

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 85 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO	NUBLADO:	LLOVIZNA	LLUVIA	X
---------	----------	----------	--------	---

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114


FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA 05 DE 2022 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO

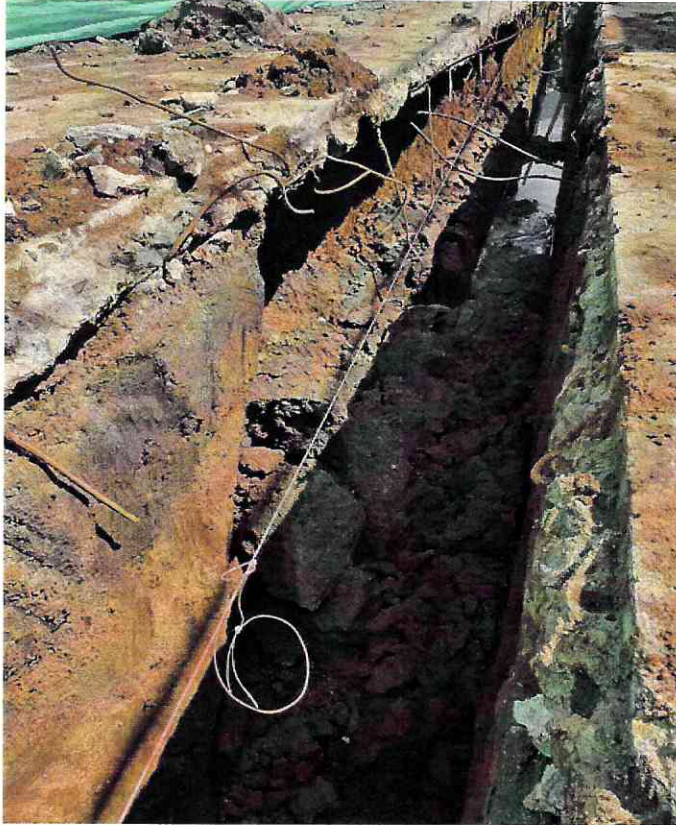


INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA	NOVIEMBRE	CONTRATISTA	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA	08	INTERVENT/SUPERVISOR	LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
DE	2022	FECHA DE INICIO	25 DE MARZO DE 2022
		FECHA DE FINALIZACION	10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	2 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	2 /			
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR	1 /			
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	10 /	VIBRADOR DE CONC	1 /			
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	2 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* **Calle 23 cra 5a:** Para este periodo, se realizan los llenos e recebo de toda la red principal y domiciliarias, asi mismo la terminacion del pozo de inspeccion.
 * **Sector Carrera 4B Calles 5 y 5a del Barrio La Pola:** En esta jornada se adelanta la construccion de un nuevo pozo de inspeccion en concreto y se recuperan llenos que fueron arrastrados por la intensas lluvias del fin de semana.
 * **Varsovia II Calle 59 Cra 1 Sur:** En esta jornada de adelanta la excavacion mecanica con el uso de entibados dada la inestabilidad de los taludes de la zanja de manera coordinada se realiza la instalacion de tuberia plastica de 10"

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 85 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: X LLOVIZNA LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 08


DE

2022

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO

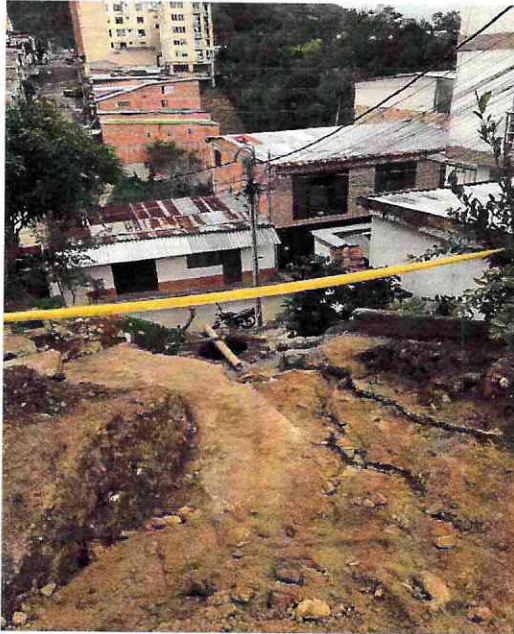

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR



GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE 09 DE 2022 CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
 FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022
 FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	2 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	2 /			
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR	1 /			
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	10 /	VIBRADOR DE CONC	1 /			
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	2 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- * Calle 23 cra 5a: Para este periodo, se reraliza la construccion de las ultimas 4 acometidas de alcantarillado domiciliario y se realiza el aseo de obra y retiro de sobrantes.
- * Sector Carrera 4B Calles 5 y 5a del Barrio La Pola: En esta jornada se las obras dependen para el avance la solucion de la reubicacion de la red de acueducto que esta sobre la zona de fundacion de la tuberia.
- * Varsovia II Calle 59 Cra 1 Sur: En esta jornada decontinua la excavacion mecanica con el uso de entibados dada la inestabilidad de los taludes de la zanja de manera coordinada se realiza la instalacion de tuberia plastica de 10", se realizan acometidas domiciliarias de alcantarillado sanitario en la medida del avance de la reposicion de tuberia de red principal.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 85 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: LLOVIZNA LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 09


DE

2022

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO

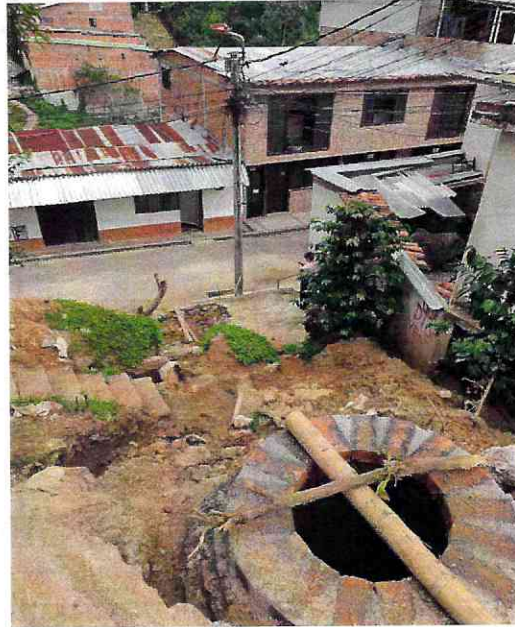


INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 10 DE 2022

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

FECHA DE INICIO

25 DE MARZO DE 2022

FECHA DE FINALIZACION

10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	2 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	2 /			
INSP. DE OBRA	3 /	COMPRESOR	1 /			
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	10 /	VIBRADOR DE CONC	1 /			
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	2 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- * Calle 23 cra 5a: Para este periodo, se estan terminando de construir las ultimas 4 acometidas de alcantarillado domiciliario y se realiza el aseo de obra y retiro de sobrantes.
- * Sector Carrera 4B Calles 5 y 5a del Barrio La Pola: En esta jornada se las obras dependen para el avance la solucion de la reubicacion de la red de acueducto que esta sobre la zona de fundacion de la tubería.
- * Varsovia II Calle 59 Cra 1 Sur: En esta jornada se realizan llenos en recebo sobre red principal e inicia la construccion de pozo de inspeccion mejorando aliviadero tipo orificio existente hacia la quebrada Hato de la Virgen

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 86 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO

NUBLADO:

X

LLOVIZNA

LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 10 DE 2022

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB-R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
 DIA 11 DE 2022 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
 FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022
 FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	2 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	2 /			
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR	1 /			
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	10 /	VIBRADOR DE CONC	1 /			
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	2 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- * Calle 23 cra 5a: Para este periodo, se estan terminando de construir las ultimas 4 acometidas de alcantarillado domiciliario y se realiza el aseo de obra y retiro de sobrantes.
- * Sector Carrera 4B Calles 5 y 5a del Barrio La Pola: En esta jornada se las obras dependen para el avance la solcucion de la reubicacion de la red de acueducto que esta sobre la zona de fundacion de la tubería.
- * Varsovia Il Calle 59 Cra 1 Sur: En esta jornada se realizan llenos en recebo sobre red principal e inicia la construccion de pozo de inspeccion mejorando aliviadero tipo orificio existente hacia la quebrada Hato de la Virgen

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 86 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: LLOVIZNA LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB-R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE
DIA 11 DE 2022

CONTRATISTA
INTERVENT/SUPERVISOR


MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 12 DE 2022

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

FECHA DE INICIO

25 DE MARZO DE 2022

FECHA DE FINALIZACION

10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	2 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	10 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	2 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	4 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* Sector Carrera 4B Calles 5 y 5a del Barrio La Pola: En esta jornada se las obras dependen para el avance la solución de la reubicación de la red de acueducto que esta sobre la zona de fundación de la tubería.

* Varsovia II Calle 59 Cra 1 Sur: Se adelanta la construcción de pozo aliviadero, se siguen conformando llenos en recebo y terminación de acometidas domiciliarias de alcantarillado.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 86 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO

X

NUBLADO:

LLOVIZNA

LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTIÓN ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA NOVIEMBRE CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA 12 DE 2022 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
