



**ACTA DIARIA  
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA  
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**PROYECTO** "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

**FECHA**           OCTUBRE           **CONTRATISTA**           MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ            
**DIA**           05           **DE**           2022           **INTERVENT/SUPERVISOR**           LADY JOANNA BONILLA MEDINA            
**FECHA DE INICIO**           25 DE MARZO DE 2022            
**FECHA DE FINALIZACION**           10 DE MARZO DE 2023          

**GENERALIDADES**

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	3 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	3 /			
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR	2 /			
OPERARIOS ( OFICIALES Y OBREROS)	15 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	3 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	3 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	3 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	3 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	3 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	3 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	3 /			
DIGITALIZADOR	1 /					

**ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- \* **AV. GUABINAL CALLES 16 - 19:** En esta jornada se esta realizando el suministro e instalacion de tubería plastica o lisa D=16" entre 18 y 17 con avenida Guabinal, siendo necesario realizar el recubrimiento de la misma con un carcamo en concreto de 3000 psi dado que no cumple con la profundidad minima a cota clave que recomienda la Resolucion 330/17. /
- \* **B/ La Sorbona Calle 79 Cra 1B:** En este sector terminó de instalar la tubería Novafort de 8" en el tramo inicial e igualmente en tramo 2 con tubería de 10" zona de entrega, con excavaciones 8 domiciliarias en tubería Novafort de 6". Se realizan llenos en recebo compactado medio mecanico sobre las zonas con tubería ya instalada.
- \* **B/ 1 de Mayo Carrera 1B y 34:** En este sector al corte de esta semana se ha instalado la totalidad de tubería Novafort de 10" en la red principal, con 7 acometidas domiciliarias las cuales tienen una longitud total de 24.70 ml en tubería Novafort de 6" se realiza el recubrimiento en concreto de un tramo de tubería que no cumple con la profundidad minima a cota clave.
- \* **B / Nueva Castilla SPM 5 Mz 1 y 10:** En este sector al corte de este mes se ha instalado el primer tramo de tubería Novafort de 10" en la red principal y se adelanta la excavacion mecanica del segundo tramo de tubería en 10" tambien. Se viene realizando las excavaciones e instalacion de acometidas domiciliarias.

**AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 80 %**

**OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES**

**CLIMA**

SOLEADO                      NUBLADO:                      X                      LLOVIZNA                      LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL





ACTA DIARIA  
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES  
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA OCTUBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 05 DE

2022

INTERVENT/SUPERVISOR


LADY JOANNA BONILLA MEDINA

REGISTRO FOTOGRAFICO



  
INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

  
GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL





**ACTA DIARIA  
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA  
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA OCTUBRE CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ  
 DIA 06 DE 2022 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA  
 FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022  
 FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

**GENERALIDADES**

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 ✓	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 ✓	RETROCARGADOR	3 ✓			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	3 ✓			
INSP. DE OBRA	3 ✓	COMPRESOR	2 ✓			
OPERARIOS ( OFICIALES Y OBREROS)	15 ✓	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	3 ✓			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	3 ✓	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	3 ✓			
CONDUCTORES	2 ✓	MOTOBOMBAS	3 ✓			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	3 ✓			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	3 ✓			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 ✓			
MECANICO		MEZCLADORA	3 ✓			
DIGITALIZADOR	1 ✓					

**ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- \* **AV. GUABINAL CALLES 16 - 19:** En esta jornada se esta realizando el suministro e instalacion de tubería plastica o lisa D=16" entre 18 y 17 con avenida Guabinal, siendo necesario realizar el recubrimiento de la misma con un carcamo en concreto de 3000 psi dado que no cumple con la profundidad minima a cota clave que recomienda la Resolucion 330/17.
- \* **B/ La Sorbona Calle 79 Cra 1B:** En este sector termino de instalar la tubería Novafort de 8" en el tramo inicial e igualmente en tramo 2 con tubería de 10" zona de entrega, con excavaciones 8 domiciliarias en tubería Novafort de 6". Se realizan llenos en recebo compactado medio mecanico sobre las zonas con tubería ya instalada.
- \* **B/ 1 de Mayo Carrera 1B y 34:** En este sector al corte de esta semana se esta realizando la recuperacion de placa en concreto de 3000 psi y los ultimos empalmes de tubería de 6" con las cajas domiciliarias.
- \* **B / Nueva Castilla SPM 5 Mz 1 y 10:** En este sector al corte de este mes se ha instalado el primer tramo de tubería Novafort de 10" en la red principal y se adelanta la excavacion mecanica del segundo tramo de tubería en 10" tambien. Se viene realizando las excavaciones e instalacion de acometidas domiciliarias.

**AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 80 %**

**OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES**

**CLIMA**

SOLEADO                      NUBLADO:                      X                      LLOVIZNA                      LLUVIA

  
INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

  
GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL





ACTA DIARIA  
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES  
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114  
FECHA VIGENCIA: 2022-09-  
VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA OCTUBRE CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ  
DIA 06 DE 2022 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA

REGISTRO FOTOGRAFICO



  
INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

  
GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL





**ACTA DIARIA  
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA  
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA           OCTUBRE          

CONTRATISTA

          MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ          

DIA           07           DE           2022          

INTERVENT/SUPERVISOR

          LADY JOANNA BONILLA MEDINA          

FECHA DE INICIO

          25 DE MARZO DE 2022          

FECHA DE FINALIZACION

          10 DE MARZO DE 2023          

**GENERALIDADES**

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	3 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	3 /			
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR	2 /			
OPERARIOS ( OFICIALES Y OBREROS)	15 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	3 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	3 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	3 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	3 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	3 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	3 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	3 /			
DIGITALIZADOR	1 /					

**ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- \* **AV. GUABINAL CALLES 16 - 19:** En esta jornada se esta realizando la demolición y excavación mecanica apra continuar co la instalacion de tubería de 16" entre calles 16-17 con avenida Guabinal, siendo necesario realizar el recubrimiento de la misma con un carcamo en concreto de 3000 psi dado que no cumple con la profundidad minima a cota clave que recomienda la Resolucion 330/17.
- \* **B/ La Sorbona Calle 79 Cra 1B:** En este sector la intervencion termina con la limpieza del sitio de la obra, aclarando que las obras de pavimentacion las realizara la secretaria de Infraestructura.
- \* **B/ 1 de Mayo Carrera 1B y 34:** En este sector se terminan de manera completa las obras de recuperacion vial y por ende las obras de alcantarillado.
- \* **B / Nueva Castilla SPM 5 Mz 1 y 10:** En este sector al corte de esta semana se viene instalado el segundo tramo de tubería Novafort de 10" en la red principal . Se viene realizando las excavaciones e instalacion de acometidas domiciliarias.

**AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 80 %**

**OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES**

CLIMA		
SOLEADO	x	NUBLADO:
		LLOVIZNA
		LLUVIA
 INGENIERO RESIDENTE	N.A INTERVENTOR	 GRUPO GESTION ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL





ACTA DIARIA  
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES  
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB-R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA OCTUBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ


DIA 07 DE

2022

INTERVENT/SUPERVISOR


LADY JOANNA BONILLA MEDINA

REGISTRO FOTOGRAFICO

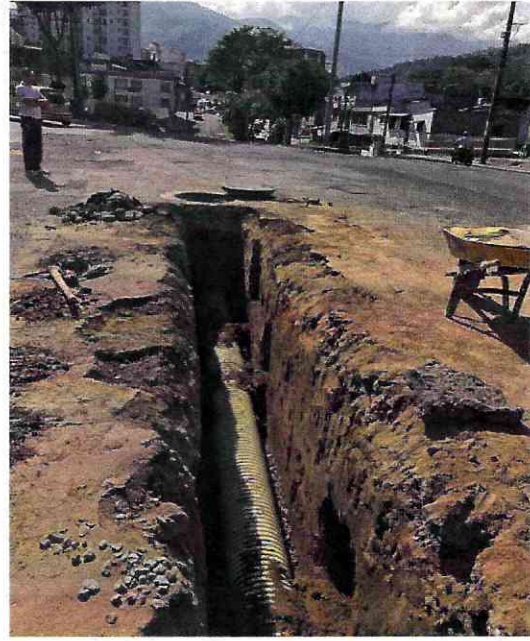

  
INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

  
GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL





**ACTA DIARIA  
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA  
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**PROYECTO** "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

**FECHA** OCTUBRE **CONTRATISTA** MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ  
**DIA** 10 **DE** 2022 **INTERVENT/SUPERVISOR** LADY JOANNA BONILLA MEDINA  
**FECHA DE INICIO** 25 DE MARZO DE 2022  
**FECHA DE FINALIZACION** 10 DE MARZO DE 2023

**GENERALIDADES**

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 ✓	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 ✓	RETROCARGADOR	3 ✓			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	3 ✓			
INSPEC DE OBRA	3 ✓	COMPRESOR	2 ✓			
OPERARIOS ( OFICIALES Y OBREROS)	15 ✓	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	3 ✓			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	3 ✓	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	3 ✓			
CONDUCTORES	2 ✓	MOTOBOMBAS	3 ✓			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	3 ✓			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	3 ✓			
AUX ADMINIST.		VEHICULOS	2 ✓			
MECANICO		MEZCLADORA	3 ✓			
DIGITALIZADOR	1 ✓					

**ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

\* **AV. GUABINAL CALLES 16 - 19:** En esta jornada se esta realizando la terminacion de llenos con recebo a -0,50 m de nivel de rasante de via, ya que la secretaria de infraestructura de ibague viene realizando el cajeo de la via para su pavimentacion.

Inicia intervencion con rotura de pavimento rigido y excavacion mecanica entre carreras 8 y Avenida Guabinal para dar por terminada la reposicion en la zona.

\* **B / Nueva Castilla SPM 5 Mz 1 y 10:** En este sector al corte de esta semana se viene instalado el segundo tramo de tuberia Novafort de 10" en la red principal completando los 50 ml de intervencion. Se viene realizando las coxiones de las acometidas domiciliarias.

**AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 80 %**

**OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES**

**CLIMA**

SOLEADO  NUBLADO:  LLOVIZNA  LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL





ACTA DIARIA  
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES  
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA OCTUBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 10 DE

2022

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA

REGISTRO FOTOGRAFICO



  
INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

  
GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL





**ACTA DIARIA  
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA  
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA	OCTUBRE	CONTRATISTA	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA	11	INTERVENT/SUPERVISOR	LADY JOANNA BONILLA MEDINA
DE	2022	FECHA DE INICIO	25 DE MARZO DE 2022
		FECHA DE FINALIZACION	10 DE MARZO DE 2023

**GENERALIDADES**

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 ✓	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 ✓	RETROCARGADOR	2 ✓			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	2 ✓			
INSP. DE OBRA	3 ✓	COMPRESOR	1 ✓			
OPERARIOS ( OFICIALES Y OBREROS)	12 ✓	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	2 ✓			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	3 ✓	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 ✓			
CONDUCTORES	2 ✓	MOTOBOMBAS	1 ✓			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR	1 ✓	VOLQUETAS	3 ✓			
ADMINISTRADOR	1 ✓	CORTADORA	1 ✓			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 ✓			
MECANICO		MEZCLADORA	1 ✓			
DIGITALIZADOR	1 ✓					

**ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

\* **AV. GUABINAL CALLES 16 - 19:** Toda la zona de trabajo que se intervino sobre la avenida guabinal fue entregada a la secretaria de infraestructura de ibague que viene realizando el cajeo de la via para su pavimentacion.  
 Inicia el suministro e instalacion de tubería de 12 y llenos en recebo entre carreras 8 y Avenida Guabinal con calle 16 para dar por terminada la reposicion en la zona.  
 \* **B / Nueva Castilla SPM 5 Mz 1 y 10:** En este sector se viene realizando los llenos con recebo en el segundo tramo de tubería Novafort de 10" en la red principal.

**AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 82 %**

**OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES**

**CLIMA**

SOLEADO	NUBLADO:	X	LLOVIZNA	LLUVIA
---------	----------	---	----------	--------

INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

GRUPO GESTIÓN ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL





ACTA DIARIA  
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES  
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL

FECHA OCTUBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 11

DE

2022

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA

REGISTRO FOTOGRAFICO



  
INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

  
GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL





**ACTA DIARIA  
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA  
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA           OCTUBRE           CONTRATISTA           MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ            
 DIA           12           DE           2022           INTERVENT/SUPERVISOR           LADY JOANNA BONILLA MEDINA            
 FECHA DE INICIO           25 DE MARZO DE 2022            
 FECHA DE FINALIZACION           10 DE MARZO DE 2023          

**GENERALIDADES**

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	1 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	1 /			
INSP. DE OBRA	3 /	COMPRESOR	1 /			
OPERARIOS ( OFICIALES Y OBREROS)	7 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	3 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX. ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR	1 /					

**ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

\* **AV. GUABINAL CALLES 16 - 19:** Toda la zona de trabajo que se intervino sobre la avenida guabinal fue entregada a la secretaria de Infraestructura de ibague que viene realizando el cajeo de la via para su pavimentacion.  
 Inicia el suministro e instalacion de tubería de 12 y llenos en recebo entre carreras 8 y Avenida Guabinal con calle 16 para dar por terminada la reposicion en la zona.  
 \* **B / Nueva Castilla SPM 5 Mz 1 y 10:** En este sector se viene realizando los llenos con recebo en el segundo tramo de tubería Novafort de 10" en la red principal.

**AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 82 %**

**OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES**

**CLIMA**

SOLEADO                      NUBLADO:                      X                      LLOVIZNA                      LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

GRUPO GESTIÓN ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL





ACTA DIARIA  
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES  
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA OCTUBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 12 DE

2022

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA

REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



	<b>ACTA DIARIA</b> <b>DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA</b> <b>DE ALCANTARILLADO</b>	<b>CÓDIGO:</b> SB- R-AL-114
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2022-09-20
		<b>VERSIÓN:</b> 00

<b>PROYECTO</b> "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"			
<b>FECHA</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>CONTRATISTA</b>	<b>MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ</b>
<b>DIA</b>	<b>13</b>	<b>INTERVENT/SUPERVISOR</b>	<b>LADY JOANNA BONILLA MEDINA</b>
	<b>DE</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>25 DE MARZO DE 2022</b>
	<b>2022</b>	<b>FECHA DE FINALIZACION</b>	<b>10 DE MARZO DE 2023</b>

GENERALIDADES						
PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	1 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	1 /			
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR	1 /			
OPERARIOS ( OFICIALES Y OBREROS)	7 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	3 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR	1 /					

**ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES REALIZADAS**



\* Av. Guabinal Calles 16 - 19: Toda la zona de trabajo que se intervino sobre la avenida guabinal fue entregada a la secretaria de infraestructura de ibague que viene realizando el cajeo de la via para su pavimentacion.

Continúa el suministro y compactacion de recebo entre carreras 8 y Avenida Guabinal con calle 16 para dar por terminada la reposicion en la zona.

\* Sector POLLOSGAR Ruta 40 Variante Ibague: En este sector, se presenta emergencia por taponamiento o colapso de colector de aguas residuales que viene desde el Conjunto Residencial Asiltos de Berlin

**AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 82 %**

**OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES**

CLIMA			
SOLEADO	NUBLADO:	X	LLOVIZNA
			LLUVIA
 INGENIERO RESIDENTE	N.A INTERVENTOR	 GRUPO GESTION ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL	





ACTA DIARIA  
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES  
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB-R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA OCTUBRE CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ  
DIA 13 DE 2022 INTERVENTOR/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA

REGISTRO FOTOGRAFICO



  
INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

  
GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL





**ACTA DIARIA  
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA  
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA OCTUBRE 14 DE 2022 CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ  
 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA  
 FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022  
 FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

**GENERALIDADES**

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA	1 /			
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR				
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	1 /			
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR	1 /			
OPERARIOS ( OFICIALES Y OBREROS)	5 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	2 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

**ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

\* Av. Guabinal Calles 16 - 19: Toda la zona de trabajo que se intervino sobre la avenida guabinal fue entregada a la secretaria de infraestructura de ibague que viene realizando el cajeo de la via para su pavimentacion.  
 Continúa el suministro y compactacion de recebo entre carreras 8 y Avenida Guabinal con calle 16 para dar por terminada la reposicion en la zona. Construccion de acometidas domiciliarias.

\* Sector POLLOSGAR Ruta 40 Variante Ibague: En este sector, se realizan apiques exploratorios con retroexcavadora con el fin de identificar el sitio de colapso o taponamiento de la red de alcantarillado.

**AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 83 %**

**OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES**

**CLIMA**

SOLEADO                      NUBLADO:                      X                      LLOVIZNA                      LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

GRUPO GESTIÓN ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL





ACTA DIARIA  
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES  
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA OCTUBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 14

DE

2022

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA

REGISTRO FOTOGRAFICO






  
INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

  
GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



		<b>ACTA DIARIA DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO</b>			<b>CÓDIGO: SB- R-AL-114</b>	
		<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>			<b>FECHA VIGENCIA: 2022-09-20</b>	
					<b>VERSIÓN: 00</b>	
<b>PROYECTO</b> "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"						
<b>FECHA</b>		<b>CONTRATISTA</b>		<b>MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ</b>		
<b>OCTUBRE</b>		<b>INTERVENT/SUPERVISOR</b>		<b>LADY JOANNA BONILLA MEDINA</b>		
<b>DIA 15 DE 2022</b>		<b>FECHA DE INICIO</b>		<b>25 DE MARZO DE 2022</b>		
		<b>FECHA DE FINALIZACION</b>		<b>10 DE MARZO DE 2023</b>		
GENERALIDADES						
PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA	1 /			
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR				
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	1 /			
INSP. DE OBRA	3 /	COMPRESOR	1 /			
OPERARIOS ( OFICIALES Y OBREROS)	5 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	2 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						
ACTIVIDADES						
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>						
* Av. Guabinal Calles 16 - 19: Toda la zona de trabajo que se intervino sobre la avenida quabinal fue entregada a la secretaria de infraestructura de ibague que viene realizando el cajeo de la via para su pavimentacion.						
En esta jornada se realiza el suministro e instalacion de base granular entre carreras 8 y Avenida Guabinal con calle 16 para dar por terminada la reposicion en la zona.						
* Sector POLLOSGAR Ruta 40 Variante Ibague: En este sector, se realizan apiques exploratorios con retroexcavadora con el fin de identificar el sitio de colapso o taponamiento de la red de alcantarillado.						
<b>AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 83 %</b>						
<b>OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES</b>						
CLIMA						
SOLEADO	X	NUBLADO:		LLOVIZNA		LLOVIA
 INGENIERO RESIDENTE		N.A INTERVENTOR		 GRUPO GESTION ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL		





**ACTA DIARIA  
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES  
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114


FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

**PROYECTO** "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

<b>FECHA</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>CONTRATISTA</b>	<b>MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ</b>
<b>DIA</b>	<b>15</b>	<b>INTERVENT/SUPERVISOR</b>	<b>LADY JOANNA BONILLA MEDINA</b>

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

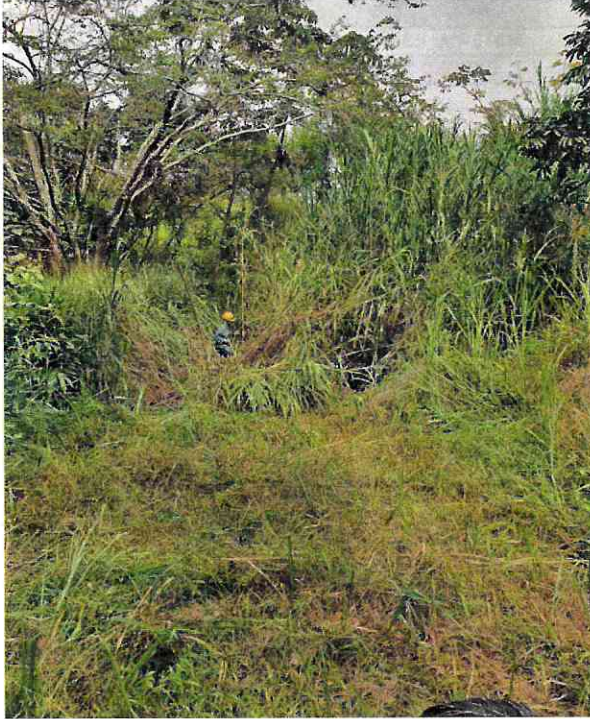

  
INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

  
GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL





**ACTA DIARIA  
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA  
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA OCTUBRE 18 DE 2022 CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ  
 DIA 18 DE 2022 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA  
 FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022  
 FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

**GENERALIDADES**

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA	1 /			
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR				
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	1 /			
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR	1 /			
OPERARIOS ( OFICIALES Y OBREROS)	5 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	2 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

**ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

\* Av. Guabinal Calles 16 - 19: Dia lluvioso, No se Laboró

\* Sector POLLOSGAR Ruta 40 Variante Ibague: Dia Lluvioso, no se laboró.

**AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 83 %**

**OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES**

**CLIMA**

SOLEADO                      NUBLADO:                      LLOVIZNA                      LLUVIA                      X

INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL





ACTA DIARIA  
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES  
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB-R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSION: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA OCTUBRE CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ  
DIA 18 DE 2022 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA

REGISTRO FOTOGRAFICO



INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR



GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL





**ACTA DIARIA  
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA  
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**PROYECTO** "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

**FECHA** OCTUBRE

**CONTRATISTA**

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 19 DE 2022

**INTERVENT/SUPERVISOR**

LADY JOANNA BONILLA MEDINA

**FECHA DE INICIO**

25 DE MARZO DE 2022

**FECHA DE FINALIZACION**

10 DE MARZO DE 2023

**GENERALIDADES**

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA	1 /			
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR				
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	1 /			
INSP. DE OBRA	3 /	COMPRESOR	1 /			
OPERARIOS ( OFICIALES Y OBREROS)	5 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	2 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

**ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

\* Av. Guabinal Calles 16 - 19: Toda la zona de trabajo que se intervino sobre la avenida guabinal fue entregada a la secretaria de infraestructura de ibague que viene realizando el cajeo de la via para su pavimentacion.

En esta jornada se realiza el suministro e instalacion de base granular entre carreras 8 y Avenida Guabinal con calle 16 para dar por terminada la reposicion en la zona.

\* Sector POLLOSGAR Ruta 40 Variante Ibague: En este sector, continua la realizacion de apiques exploratorios con retroexcavadora con el fin de identificar el sitio de colapso o taponamiento de la red de alcantarillado.

**AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 83 %**

**OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES**

**CLIMA**

SOLEADO

NUBLADO:

X

LLOVIZNA

LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

GRUPO GESTIÓN ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL





**ACTA DIARIA  
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES  
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA OCTUBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 19 DE

2022

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA

**REGISTRO FOTOGRAFICO**






  
INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

  
GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



		<b>ACTA DIARIA DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO</b>			<b>CÓDIGO: SB- R-AL-114</b>								
		<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>			<b>FECHA VIGENCIA: 2022-09-20</b>								
					<b>VERSIÓN: 00</b>								
<b>PROYECTO</b> "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"													
<b>FECHA</b> <u>          OCTUBRE          </u>		<b>CONTRATISTA</b> <u>          MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ          </u>											
<b>DIA</b> <u>          20          </u> <b>DE</b> <u>          2022          </u>		<b>INTERVENT/SUPERVISOR</b> <u>          LADY JOANNA BONILLA MEDINA          </u>											
		<b>FECHA DE INICIO</b> <u>          25 DE MARZO DE 2022          </u>											
		<b>FECHA DE FINALIZACION</b> <u>          10 DE MARZO DE 2023          </u>											
<b>GENERALIDADES</b>													
PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL									
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN							
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA	1 /										
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR											
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	1 /										
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR	1 /										
OPERARIOS ( OFICIALES Y OBREROS)	5 /	VIBRADOR DE CONC											
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /										
CADENERO		RANA											
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC											
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /										
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /										
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS											
CELADOR		VOLQUETAS	2 /										
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /										
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /										
MECANICO		MEZCLADORA	1 /										
DIGITALIZADOR													
<b>ACTIVIDADES</b>													
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>													
<p>* <u>Av. Guabinal Calles 16 - 19: Toda la zona de trabajo que se intervino sobre la avenida guabinal fue entregada a la secretaria de infraestructura de ibague que viene realizando el cajeo de la via para su pavimentacion.</u></p> <p>En esta jornada se realiza el suministro e instalacion de base granular entre carreras 8 y Avenida Guabinal con calle 16 para dar por terminada la reposicion en la zona. La secretaria de infraestructura realizara la recuperacion del pavimento rigido en la zona intervenida con la reposicion de alcantarillado. Terminacion de las ultimas 2 acometidas domiciliarias.</p> <p>* <u>Sector POLLOSGAR Ruta 40 Variante Ibague: En este sector, continua la realizacion de apiques exploratorios con retroexcavadora con el fin de identificar el sitio de colapso o taponamiento de la red de alcantarillado.</u></p>													
<b>AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 83 %</b>													
<b>OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES</b>													
<div style="text-align: center;"><b>CLIMA</b></div> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">SOLEADO</td> <td style="width: 25%;">NUBLADO:</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 25%;">LLOVIZNA</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;">LLUVIA</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>							SOLEADO	NUBLADO:	X	LLOVIZNA		LLUVIA	
SOLEADO	NUBLADO:	X	LLOVIZNA		LLUVIA								
 INGENIERO RESIDENTE		N.A INTERVENTOR		 GRUPO GESTION ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL									





**ACTA DIARIA  
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES  
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB-R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA OCTUBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 20

DE

2022

INTERVENT/SUPERVISOR


LADY JOANNA BONILLA MEDINA

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



  
INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

  
GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



	<b>ACTA DIARIA</b>	<b>CÓDIGO:</b> SB- R-AL-114
	<b>DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO</b>	<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2022-09-20
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>VERSIÓN:</b> 00

<b>PROYECTO</b>	"CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"		
<b>FECHA</b>	OCTUBRE	<b>CONTRATISTA</b>	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
<b>DIA</b>	21	<b>INTERVENT/SUPERVISOR</b>	LADY JOANNA BONILLA MEDINA
	DE	<b>FECHA DE INICIO</b>	25 DE MARZO DE 2022
	2022	<b>FECHA DE FINALIZACION</b>	10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES						
PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA	1 /			
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR				
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	1 /			
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR	1 /			
OPERARIOS ( OFICIALES Y OBREROS)	5 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	2 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

**ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

\* Av. Guabinal Calles 16 - 19: Toda la zona de trabajo que se intervino sobre la avenida guabinal fue entregada a la secretaria de infraestructura de ibague que viene realizando el cajeo de la via para su pavimentacion.

En esta jornada se termina el suministro e instalacion de base granular entre carreras 8 y Avenida Guabinal con calle 16 para dar por terminada la reposicion en la zona. La secretaria de infraestructura realizará la recuperacion del pavimento rigido en la zona intervenida con la reposicion de alcantarillado.

\* Sector POLLOSGAR Ruta 40 Variante Ibague: En este sector, continua la realizacion de apiques exploratorios con retroexcavadora con el fin de identificar el sitio de colapso o taponamiento de la red de alcantarillado hallando que una gran roca aplasto el tubo principal de 12", por lo que se ordena una reparacion puntual.

\* Sector Barrio Ricaurte Cll 23 Cra 14 Sur: En este sector se realiza visita tecnica con el fin de realizar la construccion de un alcantarillado de aguas lluvias, pero la comunidad se opone.

\* Sector Salado Rio Alvarado: Se realiza visita tecnica con el fin de construir alcantarillado de aguas lluvias, el contratista solicita a alcantarillado diseños para acometer la emergencia, ya que es una obra nueva.

**AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 83 %**

**OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES**

CLIMA			
SOLEADO	NUBLADO:	LLOVIZNA	X
			LLUVIA

 INGENIERO RESIDENTE	N.A INTERVENTOR	 GRUPO GESTION ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
-------------------------	--------------------	--

86





ACTA DIARIA  
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES  
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA OCTUBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 21

DE

2022

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA

REGISTRO FOTOGRAFICO



  
INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

  
GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL





**ACTA DIARIA  
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA  
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA OCTUBRE CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ  
 DIA 24 DE 2022 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA  
 FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022  
 FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

**GENERALIDADES**

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA	1 /			
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR				
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	1 /			
INSP. DE OBRA	3 /	COMPRESOR	1 /			
OPERARIOS ( OFICIALES Y OBREROS)	5 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	2 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

**ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- \* Av. Guabinal Calles 16 - 19: Toda la zona de trabajo que se intervino sobre la avenida guabinal fue entregada a la secretaria de infraestructura de ibague que viene realizando el cajon de la via para su pavimentacion.
- En esta jornada se termina el suministro e instalacion de base granular entre carreras 8 y Avenida Guabinal con calle 16 para dar por terminada la reposicion en la zona. La secretaria de infraestructura realizará la recuperacion del pavimento rigido en la zona intervenida con la reposicion de alcantarillado.
- \* Sector POLLOS GAR Ruta 40 Variante Ibague: En este sector, continua la realizacion de apiques exploratorios con retroexcavadora con el fin de identificar el sitio de colapso o taponamiento de la red de alcantarillado hallando que una gran roca aplasto el tubo principal de 12", por lo que se ordena una reparacion puntual.
- \* Sector Barrio Ricaurte CII 23 Cra 14 Sur: En este sector se realiza visita tecnica con el fin de realizar la construccion de un alcantarillado de aguas lluvias, pero la comunidad se opone.
- \* Sector Salado Rio Alvarado: Se realiza visita tecnica con el fin de construir alcantarillado de aguas lluvias, el contratista solicita a alcantarillado diseños para acometer la emergencia, ya que es una obra nueva.
- \* Se realiza visita tecnica en Sector Carrera 4B Calles 5 y 5a del Barrio La Pola con el fin de socializar la Reposicion de alcantarillado en la zona el cual ha colapsado bajo una zona que fue invadida.

**AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 83 %**

**OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES**

**CLIMA**

SOLEADO                      NUBLADO:                      LLOVIZNA                      X                      LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL





ACTA DIARIA  
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES  
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA           OCTUBRE           CONTRATISTA           MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ            
DIA           24           DE           2022           INTERVENT/SUPERVISOR           LADY JOANNA BONILLA MEDINA          

REGISTRO FOTOGRAFICO



  
INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

  
GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL





**ACTA DIARIA  
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA  
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA           OCTUBRE           CONTRATISTA           MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ            
 DIA           25           DE           2022           INTERVENT/SUPERVISOR           LADY JOANNA BONILLA MEDINA            
 FECHA DE INICIO           25 DE MARZO DE 2022            
 FECHA DE FINALIZACION           10 DE MARZO DE 2023          

**GENERALIDADES**

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA	1 /			
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR				
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	1 /			
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR	1 /			
OPERARIOS ( OFICIALES Y OBREROS)	5 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	2 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

**ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- \* Calle 23 cra 5a: Se vienen realizando las excavaciones mecanicas para instalacion de tuberia plastica de 16", realizando llos llenos con recebo compactado medio mecanico.
- \* Sector Carrera 4B Calles 5 y 6a del Barrio La Pola: Inicia la intervencion de la red de alcantarillado que ha colapsado, realizando la demolicion de concreto pavimento rigido y excavaciones mecanicas.
- \* Sector Varsovia II Calle 59 Cra 1 Sur: En este sector inicialme se realiza acompañamiento al equipo Vactor y Video Robot para las laborers d einspection y asi determinar la dimension de la intervencion,

**AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 84 %**

**OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES**

**CLIMA**

SOLEADO                      NUBLADO:                      LLOVIZNA                      X                      LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL





ACTA DIARIA  
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES  
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA OCTUBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 25

DE

2022

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO



  
INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

  
GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
