



ORDEN DE TRABAJO

ACTA PARCIAL DE OBRA No.03

CONTRATO DE OBRA N° 083 DE MARZO 09 DE 2022

Dirección:
Contratista:
Supervisor:

B / 20de Julio Calle 6 - Cra 13
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
LADY JOANNA BONILLA MEDINA

Sumidero 5	4.00	2.00				8.00
Sumidero 6	2.00	2.00				4.00
Sumidero 7	4.00	2.00				8.00
Sumidero 8	2.00	2.00				4.00
Sumidero 9	4.00	2.00				8.00
Sumidero 10	2.00	2.00				4.00
Sumidero 11	4.00	2.00				8.00
Sumidero 12	2.00	2.00				4.00
Sumidero 13	4.00	2.00				8.00
PZ-0 a P1	34.90	2.00				69.80
PZ-1 a P2	26.40	2.00				52.80
PZ-2 a P3	53.50	2.00				107.00
PZ-3 a P4	49.60	2.00				99.20
PZ-4 a P5	13.70	2.00				27.40
					Total	448.00
Sum e Int Tubería 6"						
Reparación viviendas	50.00					
					Total	50.00
Sum e Int Tubería 8"						
Manija Callejón Descole	44.00					
					Total	44.00
Sum e Int Tubería 12"						
Carcamo	5.90					5.90
Sumideros	40.00					40.00
Red Inicial	34.90					34.90
					Total	80.80
Sum e Int Tubería 24"						
Red Principal						
PZ-1 a P2	26.40					26.40
PZ-2 a P3	53.50					53.50
PZ-3 a P4	49.60					49.60
PZ-4 a P5	13.70					13.70
					Total	143.20
Sum e Int Tubería 30"						
Red Principal						
PZ-5 a P6	20.00	0.50				20.50
PZ-6 a Disipador	18.25	0.50				18.75
					Total	39.25
Suministro e Instalación de Kit Silla Yee 8"X 6"						
PVC Incluye Agarraderas Caucho y Adherencia						
Manija Callejón Descole						
CASA # 1	1.00					
CASA # 2	1.00					
CASA # 3	1.00					
CASA # 4	1.00					
CASA # 5	1.00					
CASA # 6	1.00					
CASA # 7	1.00					
CASA # 8	1.00					
CASA # 9	1.00					
CASA # 10	1.00					
CASA # 11	1.00					
					Total	11.00
Señalización en Guadua	198.10	2.00				396.20
Cama en Gravilla Tubería	214.50		0.40	1.20		102.96
Pozos de Inspeccion D=1.20 m						
	Base	Pañete	Cilindro	Cono	Pasos	Aro Tapa
Pozo 1	1.00	1.00	1.35	1.00	3.00	1.00
Pozo 2	1.00	1.00	2.00	1.00	4.00	1.00
Pozo 3	1.00	1.00	0.65	1.00	3.00	1.00

OK!

OK!

OK!

OK!

OK!

OK!

OK!

OK!

OK!

BP

CF



ORDEN DE TRABAJO

ACTA PARCIAL DE OBRA No.03

CONTRATO DE OBRA N° 083 DE MARZO 09 DE 2022

Dirección:
Contratista:
Supervisor:

B / 20 de Julio Calle 6 - Cra 13
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
LADY JOANNA BONILLA MEDINA

Pozo 4	1.00	1.00		1.00	3.00	1.00
Pozo 5	1.00	0.74		1.00	3.00	1.00
Totales	5.00	4.74	4.00	5.00	18.00	6.00
Cajas de Inspección 0.60*0.60*1.00						
Manija Callejón Descole		3.00				
					Total	3.00
Pozos de Inspección D=1.50 m						
	Base	Pañete	Cilindro	Cono	Pasos	Aro Tapa
Pozo 6	1.00	1.00	1.65	1.00	3.00	1.00
Pozo 7	1.00	1.00	1.65	1.00	3.00	1.00
Totales	2.00	2.00	3.30	2.00	6.00	2.00
Concreto 4000 PSI Disipador						
Escala 1		2.20		0.25	1.16	0.64
Escala 2		1.80		0.25	1.13	0.51
Escala 3		1.80		0.25	1.15	0.52
Escala 4		2.50		0.25	1.16	0.73
Muro Derecho						
Nivel 1		3.25		0.25		0.81
Nivel 2		2.15		0.25		0.54
Nivel 3		2.15		0.25		0.54
Nivel 4		3.84		0.25		0.96
Muro Izquierdo						
Nivel 1		3.25		0.25		0.81
Nivel 2		2.15		0.25		0.54
Nivel 3		2.15		0.25		0.54
Nivel 4		1.15		0.25		0.29
Placa Caja Disipador		2.20	1.60	0.20		0.70
Pantalla Hacia Tubo 30"		1.58		0.38	1.58	0.94
Pantalla Escalones		1.15	0.35	0.35	3.00	0.42
					Total	9.48
Acero de Refuerzo						
Pantalla y Escalones	Muro 1	8.00	5.00	1.55	2.00	124.00
	Muro 2	8.00	5.00	1.55	2.00	124.00
	Piso Disipador	10.69	10.00	1.55	2.00	331.39
		2.45	38.50	1.55	2.00	292.41
	Placa Disipador	3.01	31.00			93.25
					Total	965.05
Recebo Cemento						
PZ-0 a P1		34.90		0.30	1.50	15.71
PZ-1 a P2		26.40		0.30	1.50	11.88
PZ-2 a P3		53.50		0.30	1.50	24.08
PZ-3 a P4		49.80		0.30	1.50	22.41
PZ-4 a P5		13.70		0.30	1.50	6.17
					Total	80.24
Entibado Metalico						
PZ-1 a P2		26.40	2.00		2.00	105.60
PZ-2 a P3		53.50	2.00		2.00	214.00
PZ-3 a P4		49.60	2.00		2.00	198.40
PZ-4 a P5		13.70	2.00		2.00	54.80
PZ-5 a P6		20.00	2.00		3.00	120.00
PZ-6 a Disp		18.00	2.00		3.00	108.00
Zona Disipador		4.00	2.00		3.00	24.00
						824.80

OK!

OK!

OK!

OK!

OK!

OK!

BJ

CF

**ORDEN DE TRABAJO**

ACTA PARCIAL DE OBRA No.03

CONTRATO DE OBRA N° 083 DE MARZO 09 DE 2022

Dirección: B / 20de Julio Calle 6 - Cra 13
Contratista: MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
Supervisor: LADY JOANNA BONILLA MEDINA

Valla Informativa IBAL	3,00				3,00
------------------------	------	--	--	--	------

PRESUPUESTO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR UNIT	VR TOTAL
PRELIMINARES				
Localización y replanteo Topografico	ml	214,50 ✓	\$ 4.084,80	\$ 876.189,60
Cargue y Retiro de sobrantes hasta 24 Kms a Maquina	m3/comp	962,87 ✓	\$ 43.302,40	\$ 41.694.508,76
Suministro de Recebo en zanja compactado c/ 15 Cms. Medio mecánico	m3/comp	824,47 ✓	\$ 54.921,60	\$ 45.280.981,50
EXCAVACIONES A MANO				
De 0 a 2 mts en seco				
Excavaciones en material común	m3	231,31 ✓	\$ 24.872,00	\$ 5.753.100,12
EXCAVACIONES A MAQUINA				
Excavaciones en material común y Conglomerado	m3	572,49 ✓	\$ 19.283,20	\$ 11.039.450,74
CONCRETOS				
Concreto de 17,2 Mpa (2.500 PSI)	m3	6,47 ✓	\$ 452.782,40	\$ 2.928.596,56
Anden en concreto de 2500 PSI e=0,10 (incluye alistado y nivelación)	m2	20,00	\$ 67.438,40	\$ 1.348.768,00
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN				
Cargue, suministro, extendida y compactación de base granular	m3/comp	14,14 ✓	\$ 113.899,20	\$ 1.610.079,09
Construcción placa en concreto 3000 p.s.i. e= 0,13 m.	m2	93,71 ✓	\$ 108.205,60	\$ 10.139.516,77
Parqueo de pavimento asfáltico - (Incluye imprimación o riego de liga, suministro, extendida y compactación de la mezcla asfáltica)	m3/comp	4,24 ✓	\$ 961.957,60	\$ 4.079.469,79
Rotura pavimento rígido E= 0,10 m.	m2	102,39 ✓	\$ 18.252,00	\$ 1.868.731,02
Rotura pavimento flexible E= 0,10 m.	m2	252,04 ✓	\$ 16.749,60	\$ 4.221.569,18
Corte de Pavimento Rígido con Cortadora	ml	448,00 ✓	\$ 14.596,80	\$ 6.539.366,40
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA Norma Técnica Colombiana 3722-1 y Norma Técnica Colombiana 4764 (100% de Hermeticidad)				
De Diámetro 6"	ml	50,00 ✓	\$ 45.625,60	\$ 2.281.280,00
De Diámetro 8"	ml	44,00 ✓	\$ 64.121,60	\$ 2.821.350,40
De Diámetro 10"	ml		\$ 85.552,80	
De Diámetro 12"	ml	80,80 ✓	\$ 119.316,80	\$ 9.640.797,44
De Diámetro 24"	ml	143,20 ✓	\$ 445.586,40	\$ 63.807.972,48
De Diámetro 30"	ml	39,25 ✓	\$ 665.597,60	\$ 26.124.705,80
CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION				
DIAMETRO 1.20 Mts				
Base y cañuela en concreto de 3.000 PSI e = 0,30 Mts	und	5,00 ✓	\$ 404.143,20	\$ 2.020.716,00
Pañete interior	ml	4,74 ✓	\$ 90.384,00	\$ 428.420,16
Cilindro en ladrillo e = 0,30 Mts	ml	4,00 ✓	\$ 390.345,60	\$ 1.561.382,40
Cono de reducción H = 0,65 Mts	und	5,00 ✓	\$ 362.017,60	\$ 1.810.088,00
Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo C/40 cm	und	18,00 ✓	\$ 15.732,80	\$ 283.190,40
Suministro e instalación de Aro tapa Completa Vibro compactada	und	6,00 ✓	\$ 613.008,80	\$ 3.678.052,80
Caja de inspección 60 x 60 x 100 Cmts en Ladrillo, concreto de 2500 PSI y tapa reforzada en concreto de 3000 PSI	und	3,00 ✓	\$ 314.848,80	\$ 944.546,40
Entibado Tipo 3 (Metálico) Con Tableros	m2	824,80	\$ 37.645,60	\$ 31.050.090,88
OTROS				
Señalización en Guadua C/3 mts y Polisombra de h=2mts	ml	396,20 ✓	\$ 13.500,00	\$ 5.348.700,00
Suministro e Instalación Lecho en Grava para Cama de Tubería D= 1/2 a 3/4	m3	102,96 ✓	\$ 97.848,80	\$ 10.074.512,45
Suministro e Instalación de Kit Silla Yee 8"X 6" PVC Incluye Agarraderas Caucho y Adherencia	und	11,00 ✓	\$ 149.018,40	\$ 1.639.202,40
Suministro de valla informativa de piso según diseño IBAL	und	3,00 ✓	\$ 373.333,60	\$ 1.120.000,80
Manejo de Aguas Con Diámetros de 12" a 24"	glb	1,00 ✓	\$ 946.596,80	\$ 946.596,80
Manejo de Aguas más de 30"	glb	1,00 ✓	\$ 2.281.056,00	\$ 2.281.056,00
CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION				
DIAMETRO 1.50 Mts				
Base y cañuela en concreto de 3.000 PSI e = 0,30 Mts	und	2,00 ✓	\$ 755.938,00	\$ 1.511.876,00
Pañete interior	ml	2,00 ✓	\$ 195.715,00	\$ 391.430,00

32

33




ORDEN DE TRABAJO


ACTA PARCIAL DE OBRA No.03

CONTRATO DE OBRA N° 083 DE MARZO 09 DE 2022

Dirección: B / 20 de Julio Calle 6 - Cra 13
Contratista: MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
Supervisor: LADY JOANNA BONILLA MEDINA

Cilindro en ladrillo e = 0,30 Mts	ml	3,30 /	\$ 840.075,00	\$ 2.772.247,50
Cono de reducción H = 0,90 Mts	und	2,00 /	\$ 612.420,00	\$ 1.224.840,00
Carcamo Desarenador Incluye Rejilla	Un	1,00 /	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
Sumidero Desarenador Incluye Rejilla	Un		\$ 1.850.000,00	\$ -
Suministro e Instalación de Recebo Cemento compactado Medio mecánico	m3/comp	80,24 /	\$ 187.111,00	\$ 15.012.851,09
Concreto Estructuras Hidraulicas 4000 PSI	m3	9,48 /	\$ 812.500,00	\$ 7.702.723,44
Acero Figurado PDR60	Kg	965,05 /	\$ 9.708,00	\$ 9.368.661,71
Sistema aseguramiento Poste MT incluye Grúa	Hr	24,00 /	\$ 250.000,00	\$ 6.000.000,00
Caja de inspección 100x100 Cmts, concreto de 2500 PSI y tapa reforzada en concreto de 3000 PSI	Und	3,00 /	\$ 520.000,00	\$ 1.560.000,00
COMPONENTE RED DE ALCANTARILLADO				\$ 355.787.618,88
AIU 25%				\$ 88.946.904,72
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU				\$ 444.734.523,60


Contratista


Supervisor IBAL

CP



ORDEN DE TRABAJO


ACTA PARCIAL DE OBRA No.03

CONTRATO DE OBRA N° 083 DE MARZO 09 DE 2022

Dirección:
Contratista:
Supervisor:

B / La Pola Cra 4B Calle 5
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
LADY JOANNA BONILLA

ESQUEMA

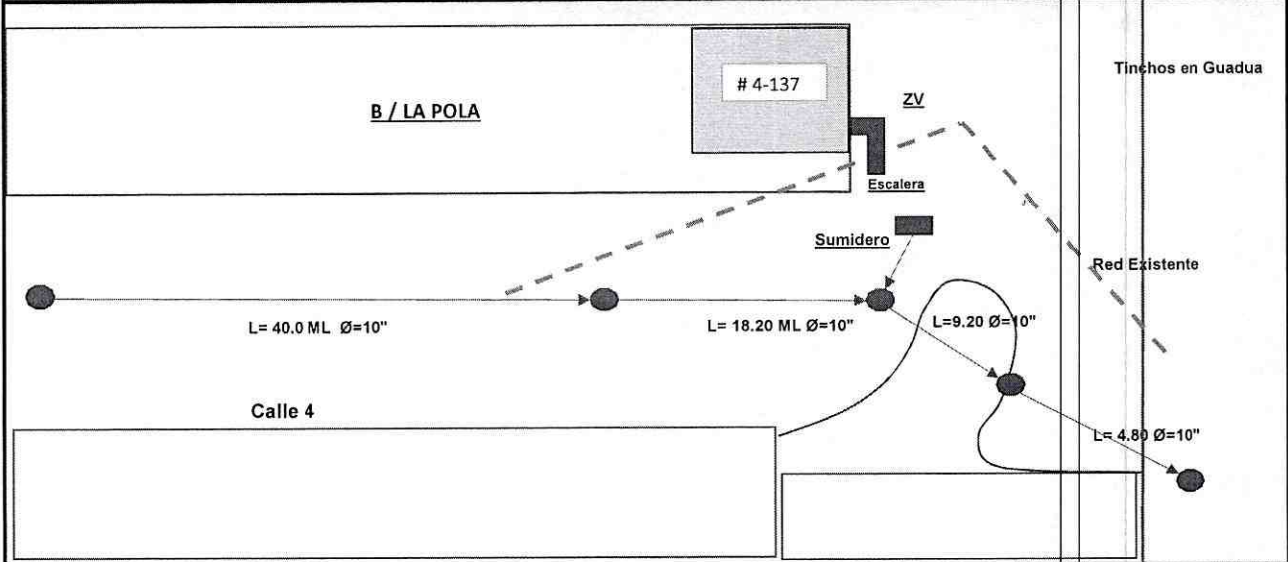

MEMORIAS DE CÁLCULO

DESCRIPCIÓN	LONG.	H INICIAL	H FINAL	A. PROM.	VOLUMEN
Localización y Replanteo Topografico					
Tramo 1	40,00				40,00
Tramo 2	18,20				18,20
Tramo 3	9,20				9,20
Tramo 4	4,80				4,80
				Total	72,20
Suministro de Recebo en zanja compactado c/ 15 Cms. Medio mecánico					
Tramo 1	40,00	1,87	2,37	0,80	67,84
Tramo 2	18,20	2,87	1,07	0,90	32,27
Tramo 3	9,20	3,48	1,26	0,90	19,62
Tramo 4	4,80	2,26	1,63	0,90	7,60
Sobre Ancho	25,00	1,20	1,20	0,70	24,76
Lleno Tubería Retirada	44,00	1,50	1,50	0,70	41,58
TOTAL	72,20				
Domiciliarias					
CALLE 4B # 4-137	6,50	0,85	1,30	0,60	5,07
CALLE 4B #4-135	5,00	0,85	1,30	0,60	3,90
CALLE 4B #4-125	6,90	0,85	1,30	0,60	5,38
CALLE 4B #4-126	9,60	0,85	1,30	0,60	7,49
CALLE 4B #4-123	5,50	0,85	1,30	0,60	4,29
CALLE 4B #4-113	5,10	0,85	1,30	0,60	3,98
CALLE 4B #4-134	2,00	0,85	1,30	0,60	1,56
CALLE 4B#4-107	5,30	0,85	1,30	0,60	4,13
CALLE 4B # 4-95	5,20	0,85	1,30	0,60	4,06
TOTAL	51,10				

OK!

BD

2/6



ORDEN DE TRABAJO

ACTA PARCIAL DE OBRA No.03

CONTRATO DE OBRA N° 083 DE MARZO 09 DE 2022

Direccion: B / La Pola Cra 4B Calle 5
 Contratista: MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
 Supervisor: LADY JOANNA BONILLA

Llenos Tras Trichos	40,88		1,00	0,50	20,44
Menos Descuento de Tuberia 6"					-0,90
Menos Descuento de Tuberia 8"	58,20				-1,28
Menos Descuento de Tuberia 10"	14,00				-3,54
				Total	248,24
Cargue y Retiro de sobrantes hasta 24 km a Maquina					296,82
Excavacion Mecanica 0-2 mts					
Excavaciones en material común y Conglomerado					
Tramo 1	40,00	1,87	2,37	0,80	67,84
Tramo 2	18,20	2,87	1,07	0,90	32,27
Tuberia Retirada	44,00	1,50	1,50	0,70	46,20
Excavacion para Cama Gravilla	72,20		0,20	0,90	13,00
				Total	159,30
Excavacion Manual 0-2 mts					
En Material Comun					
Red Principal					
Tramo 3	9,20	3,48	1,26	0,90	19,62
Tramo 4	4,80	2,26	1,63	0,90	7,60
Excavacion Pozos					
Pozo 1	2,60				2,94
Pozo 2	3,60				4,07
Pozo 3	4,13				4,67
Pozo 4	2,80				3,17
Domiciliarias					
CALLE 4B # 4-137	6,50	1,10	1,55	0,60	6,05
CALLE 4B #4-135	5,00	1,10	1,55	0,60	4,65
CALLE 4B #4-125	6,90	1,10	1,55	0,60	6,42
CALLE 4B #4-126	9,60	1,10	1,55	0,60	8,93
CALLE 4B #4-123	5,50	1,10	1,55	0,60	5,12
CALLE 4B #4-113	5,10	1,10	1,55	0,60	4,74
CALLE 4B #4-134	2,00	1,10	1,55	0,60	1,86
CALLE 4B#4-107	5,30	1,10	1,55	0,60	4,93
CALLE 4B # 4-95	5,20	1,10	1,55	0,60	4,84
				Total	89,60
Rotura pavimento Rigido E= 0,15 m.					
	2,40			2,80	6,72
	1,60			1,30	2,08
	1,80			2,70	4,86
	2,80			5,00	14,00
	5,60			1,73	9,69
	5,00			2,86	14,30
	2,30			17,30	39,79
	7,30			6,10	44,53
	3,00			9,00	27,00
	0,50				0,00
	4,30			3,00	12,90
	1,90			1,30	2,47
	2,50			0,85	2,13
	1,50			3,50	5,25
	2,40			0,60	1,44
	1,30			5,50	7,15
				Total	194,30
Construccion Placa Concreto 3000 psi					
	2,40			2,80	6,72
	1,60			1,30	2,08
	1,80			2,70	4,86
	2,80			5,00	14,00
	5,60			1,73	9,69
	5,00			2,86	14,30

OK!

OK!

OK!

BJ

CF



ORDEN DE TRABAJO

ACTA PARCIAL DE OBRA No.03

CONTRATO DE OBRA N° 083 DE MARZO 09 DE 2022

Dirección: B / La Pola Cra 4B Calle 5
 Contratista: MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
 Supervisor: LADY JOANNA BONILLA

	2,30			17,30	39,79
	7,30			6,10	44,53
	3,00			9,00	27,00
	0,50				0,00
	4,30			3,00	12,90
	1,90			1,30	2,47
	2,50			0,85	2,13
	1,50			3,50	5,25
	2,40			0,60	1,44
	1,30			5,50	7,15
				Total	194,30
Corte de Pavimento Flexible					
Red Principal	0,50	2,00			1,00
Domiciliarias					
# 1	4,75	2,00			9,50
# 2	4,75	2,00			9,50
# 3	4,75	2,00			9,50
# 4	4,75	2,00			9,50
# 5	4,75	2,00			9,50
# 6	4,75	2,00			9,50
# 7	4,75	2,00			9,50
# 8	4,75	2,00			9,50
# 9	4,75	2,00			9,50
				Total	86,50
Sum e Int Tubería 6"					
CALLE 4B # 4-137	6,50				6,50
CALLE 4B #4-135	5,00				5,00
CALLE 4B #4-125	6,90				6,90
CALLE 4B #4-126	9,60				9,60
CALLE 4B #4-123	5,50				5,50
CALLE 4B #4-113	5,10				5,10
CALLE 4B #4-134	2,00				2,00
CALLE 4B#4-107	5,30				5,30
CALLE 4B # 4-95	5,20				5,20
				Total	51,10
Sum e Int Tubería 8"					
Red Principal					
Tramo 1	40,00	0,25			40,25
Tramo 2	18,20	0,50			18,70
				Total	58,95
Sum e Int Tubería 10"					
Red Principal					
Tramo 3	9,20	0,25			9,45
Tramo 4	4,80	0,50			5,30
				Total	14,75
Señalización en Guadua					
Cama en Gravilla Tubería	78,20	2,00			156,40
	72,20		0,20	0,90	13,00
Sillas Yee 8x6					
# 1	1,00				1,00
# 2	1,00				1,00
# 3	1,00				1,00
# 4	1,00				1,00
# 5	1,00				1,00
				Total	5,00

OK!

OK!

31

46



ORDEN DE TRABAJO

ACTA PARCIAL DE OBRA No.03

CONTRATO DE OBRA N° 083 DE MARZO 09 DE 2022

Direccion: B / La Pola Cra 4B Calle 5
 Contratista: MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
 Supervisor: LADY JOANNA BONILLA

Sillas Yee 10x6						
# 6		1,00				1,00
# 7		1,00				1,00
# 8		1,00				1,00
# 9		1,00				1,00
					Total	4,00
Pozos de Inspeccion D=1.20 m						
	Base	Pañete	Cilindro	Cono	Pasos	Aro Tapa
Pozo 1						
Pozo 2	1,00	1,00	2,22	1,00	4,00	1,00
Pozo 3						
Pozo 4	1,00	0,70	0,70	1,00	1,00	1,00
Totales	2,00	1,70	2,92	2,00	5,00	2,00
Cajas de Inspeccion						
# 1		1,00				1,00
# 2		1,00				1,00
# 3		1,00				1,00
# 4		1,00				1,00
# 5		1,00				1,00
# 6		1,00				1,00
# 7		1,00				1,00
# 8		1,00				1,00
# 9		1,00				1,00
# 10		1,00				1,00
# 11		1,00				1,00
					Total	11,00
Recubrimiento de Taludes						
Nivel 1		6,70			1,17	7,84
Nivel 2		6,60			1,17	7,72
Nivel 3		5,28			1,20	6,33
Nivel 4		4,00			1,00	4,00
Nivel 5		4,15			0,80	3,32
Nivel 6		4,15			0,30	1,25
					Total	30,46
Trinchos en Guadua						
Nivel 1		6,70				6,70
Nivel 2		6,60				6,60
Nivel 3		5,28				5,28
Nivel 4		4,00				4,00
Nivel 5		4,15				4,15
Nivel 6		4,15				4,15
Trincho Proteccion Vivienda		6,00				6,00
Trincho Zona Verde		4,00				4,00
						40,88
Entibado Tipo 3 Metalico						
Tramo 1		31,50			2,00	63,00
Tramo 2		18,20				0,00
Tramo 3		9,20				0,00
Tramo 4		4,80				0,00
						63,00
Valla Informativa IBAL						
						2,00

BP

OK!
OK!

46



ORDEN DE TRABAJO

ACTA PARCIAL DE OBRA No.03

CONTRATO DE OBRA N° 083 DE MARZO 09 DE 2022

Dirección: B / La Pola Cra 4B Calle 5
 Contratista: MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
 Supervisor: LADY JOANNA BONILLA

PRESUPUESTO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR UNIT.	VR TOTAL
PRELIMINARES				
Localización y replanteo Topografico	ml	72,20 ✓	\$ 4.084,80	\$ 294.922,56
Cargue y Retiro de sobrantes hasta 24 Kms a Maquina	m3/comp		\$ 43.302,40	\$ -
Suministro de Recebo en zanja compactado c/ 15 Cms. Medio mecánico	m3/comp		\$ 54.921,60	\$ -
EXCAVACIONES A MANO				
De 0 a 2 mts en seco				
Excavaciones en material común	m3	89,60 ✓	\$ 24.872,00	\$ 2.228.519,13
EXCAVACIONES A MAQUINA				
Excavaciones en material común y Conglomerado	m3	159,30 ✓	\$ 19.283,20	\$ 3.071.902,46
CONCRETOS				
Anden en concreto de 2500 PSI e=0,10 (incluye alistado y nivelación)	m2		\$ 67.438,40	\$ -
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN				
Construcción placa en concreto 3000 p.s.i. e= 0,15 m.	m2		\$ 114.288,80	\$ -
Rotura pavimento rígido E= 0,10 m.	m2		\$ 18.252,00	\$ -
Rotura pavimento rígido E= 0,15 m.	m2	194,30 ✓	\$ 29.560,00	\$ 5.743.596,68
Corte de Pavimento Rígido con Cortadora	ml	86,50 ✓	\$ 14.596,80	\$ 1.262.623,20
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA Norma Técnica Colombiana 3722-1 y Norma Técnica Colombiana 4764 (100% de Hermeticidad)				
De Diámetro 6"	ml		\$ 45.625,60	\$ -
De Diámetro 8"	ml		\$ 64.121,60	\$ -
De Diámetro 10"	ml		\$ 85.552,80	\$ -
CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION				
Base y cañuela en concreto de 3.000 PSI e = 0,30 Mts	und		\$ 404.143,20	\$ -
Pañete interior	ml		\$ 90.384,00	\$ -
Cilindro en ladrillo e = 0,30 Mts	ml		\$ 390.345,60	\$ -
Cono de reducción H = 0,65 Mts	und		\$ 362.017,60	\$ -
Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo C/40 cm	und		\$ 15.732,80	\$ -
Suministro e instalación de Aro tapa Completa Vibro compactada	und		\$ 613.008,80	\$ -
Caja de inspección 60 x 60 x 100 Cmts en Ladrillo, concreto de 2500 PSI y tapa reforzada en concreto de 3000 PSI	und		\$ 314.848,80	\$ -
Sumidero en concreto 3.000 PSI (Incluye rejilla vibro compactada de 1,05x0,36)	und		\$ 522.303,20	\$ -
OTROS				
Señalización en Guadua C/3 mts y Polisombra de h=2mts	ml	156,40 ✓	\$ 13.500,00	\$ 2.111.400,00
Suministro e Instalación Lecho en Grava para Cama de Tubería D= 1/2 a 3/4	m3		\$ 97.848,80	\$ -
Suministro e Instalación de Kit Silla Yee 8"X 6" PVC Incluye Agarraderas Caucho y Adherencia	und		\$ 149.018,40	\$ -
Suministro e Instalación de Kit Silla Yee 10"X 6" PVC Incluye Agarraderas Caucho y Adherencia	und		\$ 221.721,60	\$ -
Manejo de Aguas Con Diámetros de 8" a 12"	glb		\$ 539.915,20	\$ -
Suministro de valla informativa de piso según diseño IBAL	und	2,00 ✓	\$ 373.333,60	\$ 746.667,20
ITEMS NO PREVISTOS				
Entibado Tipo 3 (Metálico) Con Tableros	m2	63,00 ✓	\$ 37.645,60	\$ 2.371.672,80
Caja de inspección 80 x 60 x 100 Cmts, concreto de 2500 PSI y tapa reforzada en concreto de 3000 PSI	und		\$ 387.596,00	\$ -
Roceria y Limpieza	m2		\$ 6.500,00	\$ -
Cámara de caída Diametro 8" Revestida en Concreto.	ml		\$ 263.768,80	\$ -
Trincho en guadua	ml		\$ 94.431,00	\$ -
Pozo de Inspeccion en Concreto de 3000 psi	Und		\$ 3.000.000,00	\$ -
Recubrimiento de taludes Concreto Lanzado 3000 psi Incluye Malla	m2		\$ 121.000,00	\$ -
COMPONENTE RED DE ALCANTARILLADO				\$ 17.831.304,04
AIU 25%				\$ 4.457.826,01
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU				\$ 22.289.130,05

MGS
 Contratista

Lady Joanna Bonilla
 Supervisor

46



LABORATORIO DE SUELOS
Construcciones - Pavimentos y Estudios de Suelos

INVE- 161
DENSIDAD EN EL TERRENO

Proyecto: Contrato 083 De Marzo de 2022,
Objeto: CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P. OFICIAL

Remitente: Ing Mario Gabriel Jimenez Martinez

MATERIAL: RECEBO

Tramo: Ricaurte Parte Alta Carrera 10 Sur CII 15-16 (llenos de zanja)

Fecha ensayo:
18/12/2022

UBICACIÓN	Toma 1	Toma 2	Toma 3			
Profundidad metros	0,15	0,15	0,15			
Material	RECEBO	RECEBO	RECEBO			
Peso frasco y arena inicial (Grs.)	5.850	5.791	5.744			
Peso frasco y arena restante (Grs.)	3.110	3.095	3.035			
Peso arena total usada	2.740	2.696	2.709			
Constante del cono	1.525	1.525	1.525			
Peso arena en el hueco	1.215	1.171	1.184			
Densidad de la arena	1,423	1,423	1,423			
Volumen del hueco	853,8	822,9	832,0			
Peso material extraido humedo	1.755	1.690	1.701			
% Humedad	5,6	5,6	5,4			
Peso material extraido seco	1.662	1.600	1.614			
Densidad del material Gms./cc.	1,946	1,945	1,940			
Densidad del material Lbs/pie3	121,5	121,4	121,0			
Densidad max. Laboratorio Lbs./pie3	124,2	124,2	124,2			
% Humedad optima laboratorio	7,9	7,9	7,9			
% De compactacion terreno	97,8	97,7	97,4			
% De compactacion especificada						

OBSERVACIONES:

Leonardo Valderrama

LEONARDO VALDERRAMA
ING. CONTROL DE CALIDAD

Leonardo Valderrama

LABORATORISTA

EP



LABORATORIO DE SUELOS
Construcciones - Pavimentos y Estudios de Suelos

INVE- 161
DENSIDAD EN EL TERRENO

Proyecto: Contrato 083 De Marzo de 2022,
Objeto: CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P. OFICIAL

Remitente: Ing Mario Gabriel Jimenez Martinez

MATERIAL: RECEBO

Tramo: Carrera 4B Calle 4-5a b/ La Pola (Llenos zanja)

Fecha ensayo:
26/12/2022

UBICACIÓN	Toma 1	Toma 2	Toma 3		
Profundidad metros	0,15	0,15	0,15		
Material	RECEBO	RECEBO	RECEBO		
Peso frasco y arena inicial (Grs.)	5.510	5.497	5.481		
Peso frasco y arena restante (Grs.)	3.165	3.111	3.029		
Peso arena total usada	2.345	2.386	2.452		
Constante del cono	1.525	1.525	1.525		
Peso arena en el hueco	820	861	927		
Densidad de la arena	1,423	1,423	1,423		
Volumen del hueco	576	605	651		
Peso material extraido humedo	1.181	1.242	1.332		
% Humedad	5,7	5,6	5,7		
Peso material extraido seco	1.117	1.176	1.260		
Densidad del material Gms./cc.	1,939	1,944	1,934		
Densidad del material Lbs./pie3	121,0	121,3	120,7		
Densidad max. Laboratorio Lbs./pie3	124,2	124,2	124,2		
% Humedad optima laboratorio	7,9	7,9	7,9		
% De compactacion terreno	97,4	97,7	97,2		
% De compactacion especificada					

OBSERVACIONES:

LEONARDO VALDERRAMA
ING. CONTROL DE CALIDAD

LABORATORISTA



LABORATORIO DE SUELOS
Construcciones - Pavimentos y Estudios de Suelos

INVE-161
DENSIDAD EN EL TERRENO

Proyecto: Contrato 083 De Marzo de 2022, Objeto: CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P. OFICIAL	
Remitente: Ing Mario Gabriel Jimenez Martinez	MATERIAL: RECEBO
Tramo: B/ 20 de Julio Carrera 13 Calle 6 (Llenos de zanja)	Fecha ensayo: 24/04/2023

UBICACIÓN	Toma 1	Toma 2	Toma 3		
Profundidad metros	0,15	0,15	0,15		
Material	RECEBO	RECEBO	RECEBO		
Peso frasco y arena inicial (Grs.)	4.790	4.762	4.725		
Peso frasco y arena restante (Grs.)	2.010	1.996	1.988		
Peso arena total usada	2.780	2.766	2.737		
Constante del cono	1.525	1.525	1.525		
Peso arena en el hueco	1.255	1.241	1.212		
Densidad de la arena	1,423	1,423	1,423		
Volumen del hueco	881,9	872,1	851,7		
Peso material extraido humedo	1.815	1.790	1.738		
% Humedad	5,5	5,6	5,6		
Peso material extraido seco	1.720	1.695	1.646		
Densidad del material Gms./cc.	1,951	1,944	1,932		
Densidad del material Lbs/pie3	121,7	121,3	120,6		
Densidad max. Laboratorio Lbs./pie3	124,2	124,2	124,2		
% Humedad optima laboratorio	7,9	7,9	7,9		
% De compactacion terreno	98,0	97,7	97,1		
% De compactacion especificada					

OBSERVACIONES:

Leonardo Valderrama

LEONARDO VALDERRAMA
ING. CONTROL DE CALIDAD

Leonardo Valderrama

LABORATORISTA

B/



LABORATORIO DE SUELOS
Construcciones - Pavimentos y Estudios de Suelos

INVE-161
DENSIDAD EN EL TERRENO

Proyecto: Contrato 083 De Marzo de 2022,
Objeto: CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P. OFICIAL

Remitente: Ing Mario Gabriel Jimenez Martinez

MATERIAL: RECEBO

Tramo: B/ 20 de Julio Carrera 13 Calle 6 (Llenos de zanja)

Fecha ensayo:
25/04/2023

UBICACIÓN	Toma 1				
Profundidad metros	0,14				
Material	RECEBO				
Peso frasco y arena inicial (Grs.)	5.200				
Peso frasco y arena restante (Grs.)	2.800				
Peso arena total usada	2.400				
Constante del cono	1.525				
Peso arena en el hueco	875				
Densidad de la arena	1,423				
Volumen del hueco	614,9				
Peso material extraido humedo	1.260				
% Humedad	5,9				
Peso material extraido seco	1.190				
Densidad del material Gms./cc.	1,935				
Densidad del material Lbs/pie3	120,7				
Densidad max. Laboratorio Lbs./pie3	124,2				
% Humedad optima laboratorio	7,9				
% De compactacion terreno	97,2				
% De compactacion especificada					

OBSERVACIONES:

Leonardo Valderrama

LEONARDO VALDERRAMA
ING. CONTROL DE CALIDAD

Rosalia Velazquez

LABORATORISTA

5/

13



LABORATORIO DE SUELOS


Concretos, Pavimentos y Estudios de suelos

**RESISTENCIA A LA COMPRESION
CILINDROS DE CONCRETO NORMA
I.N.V.E - 410**

PROYECTO: "CONTRATO 083 DE 2022 "CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAI S.A.S.P.OFICIAL"
SOLICITANTE: ING MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
FECHA:
12 DE MAYO DE 2023

REF.	FECHA TOMA DE MUESTRA	FECHA ENSAYO	EDAD (DIAS)	DIAMETRO (cm)	CARGA (kg)	CARGA (lb)	AREA (cm²)	AREA (PUL²)	RESISTENCIA (kg/cm²)	RESISTENCIA P.S.I.	RESISTENCIA DISEÑO P.S.I.	% ALCANZADO	OBSERVACIONES	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA BUENA
1	24/04/2023	1/05/2023	7	10,16	44356,95	97782,72	81,1	12,57	242,07	3458,18	4000	86,45	Camera 4B Calle 4 - 5a b/La Pola DISIPADOR	B	X
2	24/04/2023	8/05/2023	14	10,16	49761,36	109674,04	81,1	12,57	271,57	3879,52	4000	96,99	Camera 4B Calle 4 - 5a b/La Pola DISIPADOR	C	X
4	26/04/2023	3/05/2023	7	10,16	33140,25	73041,11	81,1	12,57	180,86	2583,70	3000	86,12	B20 de Julio Carrera 13 Calle 16 PLACA VIA PEATONAL	C	X
5	27/04/2023	4/05/2023	7	10,16	33446,16	73715,34	81,1	12,57	182,53	2607,55	3000	86,92	B20 de Julio Carrera 13 Calle 16 PLACA VIA PEATONAL	C	X
6	28/04/2023	5/05/2023	7	10,16	44153,01	97313,23	81,1	12,57	240,96	3442,28	4000	86,06	B20 de Julio Carrera 13 Calle 16 DISIPADOR	B	X
7	28/04/2023	12/05/2023	14	10,16	48965,30	110123,52	81,1	12,57	272,68	3895,42	4000	97,39	B20 de Julio Carrera 13 Calle 16 DISIPADOR	C	X

TIPOS DE FALLA




OBSERVACIONES: MUESTRAS ENVIADAS POR EL INTERESADO.

Leonardo Valderrama

LEONARDO VALDERRAMA
INGENIERO CONTROL Y CALIDAD


Leonardo Valderrama

LABORATORISTA

 LABORATORIO DE SUELOS Concretos, Pavimentos y Estudios de suelos	RESISTENCIA A LA COMPRESION CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.E. - 410	PROYECTO: "CONTRATO 083 DE 2022 "CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL" SOLICITANTE: ING MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ 06 DE ABRIL DE 2023	FECHA:
---	---	---	--------

REF.	FECHA TOMA DE MUESTRA	FECHA ENSAYO	EDAD (DIAS)	DIAMETRO (cm)	CARGA (Kg)	CARGA (lb)	AREA (cm ²)	AREA (PUL ²)	RESISTENCIA (kg/cm ²)	RESISTENCIA P.S.I.	RESISTENCIA DISEÑO P.S.I.	% ALCANZADO	OBSERVACIONES	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA BUENA
1	30/03/2023	6/04/2023	7	10,16	43745,13	96414,27	81,1	12,57	238,73	3410,48	4000	85,26	B/20 de Julio Carrera 13 Calle 16 DISIPADOR	B	X

TIPOS DE FALLA



OBSERVACIONES: MUESTRAS ENVIADAS POR EL INTERESADO.


LEONARDO VALDERRAMA
 INGENIERO CONTROL Y CALIDAD


 LABORATORISTA



LABORATORIO DE SUELOS
Concreto, Pavimentos y Estudios de suelos

RESISTENCIA A LA COMPRESION
CILINDROS DE CONCRETO NORMA
I.N.V.E - 410

PROYECTO: "CONTRATO 083 DE 2022 "CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL"

SOLICITANTE: ING MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

FECHA:

22 DE MAYO DE 2023

REF.	FECHA TOMA DE MUESTRA	FECHA ENSAYO	EDAD (DIAS)	DIAMETRO (cm)	CARGA (kg)	CARGA (lb)	AREA (cm ²)	AREA (PUL ²)	RESISTENCIA (kg/cm ²)	RESISTENCIA P.S.I.	RESISTENCIA DISEÑO P.S.I.	% ALCANZADO	OBSERVACIONES	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA BUENA
3	24/04/2023	22/05/2023	28	10,16	52208,64	115067,84	81,1	12,57	284,92	4070,32	4000	101,76	Carrera 4B Calle 4 - 5a b/ La Pola	C	X



OBSERVACIONES: MUESTRAS ENVIADAS POR EL INTERESADO

Leonardo Valderrama

LEONARDO VALDERRAMA
INGENIERO CONTROL Y CALIDAD

Mario Gabriel Jimenez Martinez


LABORATORISTA

4.13-FOR-LAB-005

NOTA: No se debe reproducir el Informe de ensayo en su totalidad o parcial, sin la aprobación escrita del Laboratorio de Suelos Leonardo Valderrama.

REV: 0

BP





**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES
AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES PARA
CONTRATOS DE OBRA**

CÓDIGO: GJ-R-061

FECHA VIGENCIA:
2019-09-19

VERSIÓN: 01

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN


Página 1 de 2

CONTRATO DE OBRA N° 0083 DEL 09 DE MARZO DE 2022

CONTRATANTE	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.
CONTRATISTA	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

OBJETO	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERÍMETRO HIDRÁULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP OFICIAL.
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) MESES
PLAZO ADICIONAL	DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL	DOCE (12) MESES
VALOR INICIAL:	TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS CON 75/100 (\$3.999.986.316.75) M/CTE.
VALOR ADICIONAL:	SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 18/100 (\$662'354.219.18) M/CTE.
VALOR TOTAL:	CUATROMIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$4.662'340.586.00)
FECHA DE INICIO	25 DE MARZO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	24 DE ENERO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	17 DE ENERO DE 2023
FECHA DE REINICIO 01	MARZO 03 DE 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	MARZO 10 DE 2023
SUPERVISOR	PROFESIONAL ESPECIALIZADO III GESTIÓN ACUEDUCTO Y PROFESIONAL ESPECIALIZADO III GESTIÓN ALCANTARILLADO.

BJ


	CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PARA CONTRATOS DE OBRA	CÓDIGO: GJ-R-061
		FECHA VIGENCIA: 2019-09-19
		VERSIÓN: 01
		Página 2 de 2
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		


Los suscritos a saber: **Ing. CARLOS ANDRES MEDINA ARÉVALO**, Profesional Especializado III de Gestión de Acueducto y **LADY JOANNA BONILLA MEDINA**, Profesional Especializado III de Gestión de Alcantarillado, en su condición de Supervisores, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con NIT 800.089.809-6, del contrato en mención:

CERTIFICAN:

Contratista persona natural	X	Contratista persona jurídica
<p>El contratista presentó planillas</p> <p>N° 9446754287 de 09/02/2023 N° 9448198281 de 13/03/2023 N° 9449494143 de 17/04/2023 N° 9450839344 de 12/05/2023 N° 25499913 de 09/02/2023 N° 25576732 de 13/03/2023 N° 25884553 de 11/04/2023 N° 26150780 de 12/05/2023</p> <p>En las que consta que ha efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión, y riesgos laborales, de él y del personal a cargo, para el período de enero, febrero, marzo y abril de 2023.</p> <p>Verificado el monto de cada uno de los aportes en la planilla, se constató que se ajusta a la base de liquidación que aplica para este tipo de contratos.</p>		

Se expide la presente constancia para efectos del respectivo pago en la ciudad de Ibagué, a los 31 días del mes de mayo del año 2023.


LADY JOANNA BONILLA MEDINA
Prof. Especializado III Gestión Alcantarillado
Supervisora


CARLOS ANDRÉS MEDINA ARÉVALO.
Prof. Especializado III Gestión Acueducto
Supervisor

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SERA e ICBF	
Identificación	dV	Reason Social	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	IBAGUE-TOLIMA	267175	SI		
NIT 93162251	3	JIMENEZ MARTINEZ MARIO GABRIEL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	2023/02/13	2023/02/09	BANCOLOMBIA	carrera 5a n 20-89					

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Planilla	Planilla
2023-01	9446754287	E	
2023-02	1909707220		
Pensión		Pago	Valor
2023-01		2023/02/13	\$3,396,700

RESUMEN DE PAGO		CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)										
COLFONDOS	231001	800,227,940	6			12	\$1,868,600	\$0	\$1,868,600	\$1,868,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7			1	\$185,700	\$0	\$185,700	\$185,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8			4	\$563,100	\$0	\$563,100	\$563,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0			6	\$934,200	\$0	\$934,200	\$934,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)										
ARL SURA	14-11	890,903,790	5			12	\$637,900	\$0	\$637,900	\$637,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)										
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1			12	\$422,800	\$0	\$422,800	\$422,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)										
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7			2	\$48,000	\$0	\$48,000	\$48,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2			4	\$140,800	\$0	\$140,800	\$140,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2			1	\$46,400	\$0	\$46,400	\$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4			4	\$185,700	\$0	\$185,700	\$185,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6			1	\$46,500	\$0	\$46,500	\$46,500
TOTAL						12	\$3,396,700	\$0	\$3,396,700	\$3,396,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor			
NIT 91362251	3	JIMENEZ MARTINEZ MARIO GABRIEL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	2023/03/13	2023/03/13	IBAGUE-TOLIMA	carrera 5a n 20-89	0	\$3,390,100	2612175	SI	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-02	2023-03	1964955581	9448198281	E	2023/03/13	2023/03/13	2023/03/13	BANCOLOMBIA	0	\$3,390,100	

RESUMEN DE PAGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)																	
COLFONDOS		231001		800,227,940	6			10		\$1,856,000		\$0		\$0	\$1,856,000		
COLPENSIONES		25-14		900,336,004	7			1		\$185,600		\$0		\$0	\$185,600		
PORVENIR		230301		800,224,808	8			3		\$556,800		\$0		\$0	\$556,800		
PROTECCION		230201		800,229,739	0			5		\$928,000		\$0		\$0	\$928,000		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)																	
ARL SURA		14-11		890,903,790	5			10		\$652,500		\$0		\$0	\$652,500		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)																	
COMFATOLIMA		CCF48		800,211,025	1			10		\$417,600		\$0		\$0	\$417,600		
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)																	
FAMISANAR		EPS017		830,003,564	7			1		\$46,400		\$0		\$0	\$46,400		
NUEVA E.P.S.		EPS037		900,156,264	2			3		\$139,200		\$0		\$0	\$139,200		
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041		900,156,264	2			1		\$46,400		\$0		\$0	\$46,400		
SALUD TOTAL		EPS002		800,130,907	4			4		\$185,600		\$0		\$0	\$185,600		
SANITAS		EPS005		800,251,440	6			1		\$46,400		\$0		\$0	\$46,400		
TOTAL								10		\$3,390,100		\$0		\$0	\$3,390,100		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dV	Razon Social	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	IBAGUE-TOLIMA	2617175	Si		
NIT 93360251	3	JIMENEZ MARTINEZ MARIO GABRIEL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	2023/04/17	2023/04/17	BANCOLOMBIA	carrera 5a n. 26-89					

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias/Mora	Valor	
2023-03	2023-04	2020346736	949494143	E	2023/04/17	2023/04/17	BANCOLOMBIA		0	\$3,396,800	

RESUMEN DE PAGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
APF (ADMINISTRADORAS: 4)																	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$1,856,100	\$0	\$0	\$1,856,100	\$0	\$0	\$1,856,100	\$0	\$0	\$185,700	\$185,700	\$0	\$0
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	\$0	\$0	\$556,800	\$556,800	\$0	\$0
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$528,000	\$0	\$0	\$528,000	\$0	\$0	\$528,000	\$0	\$0	\$641,700	\$641,700	\$0	\$0
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$641,700	\$0	\$0	\$641,700	\$0	\$0	\$641,700	\$0	\$0	\$434,900	\$434,900	\$0	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)																	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	\$434,900	\$0	\$0	\$434,900	\$0	\$0	\$434,900	\$0	\$0	\$464,100	\$464,100	\$0	\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)																	
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	10	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	\$0	\$0	\$139,200	\$139,200	\$0	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)																	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	\$46,400	\$0	\$0
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200	\$0	\$0	\$46,400	\$46,400	\$0	\$0
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	\$0	\$0	\$46,500	\$46,500	\$0	\$0
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$46,500	\$0	\$0	\$46,500	\$0	\$0	\$46,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL				10	\$3,396,800	\$0	\$0	\$3,396,800	\$0	\$0	\$3,396,800	\$0	\$0	\$3,396,800	\$3,396,800	\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	B - JIMENEZ MARTINEZ MARIO GABRIEL		B - JIMENOS DE 200 COTIZANTES		ADMINISTRATIVOS		carrera 5a n 20-89		IBAGUE-TOLIMA		7612175		SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Periodo	Salud	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora				
2023-04	2023-05	2076085926	9426839344	2023/05/12	2023/05/11	BANCOLOMBIA	0			\$3,042,500	

RESUMEN DE PAGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$1,670,400	\$0	\$0	\$1,670,400	\$1,670,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	\$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$556,800	\$0	\$0	\$556,800	\$556,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$742,400	\$0	\$0	\$742,400	\$742,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$571,700	\$0	\$0	\$571,700	\$571,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMFATOLIMA	CCF-48	800,211,025	1	9	\$382,800	\$0	\$0	\$382,800	\$382,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)									
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	\$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200	\$139,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	\$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200	\$139,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	\$46,400
TOTAL				9	\$3,042,500	\$0	\$0	\$3,042,500	\$3,042,500




RAZON SOCIAL :	JIMENEZ MARTINEZ MARIO GABRIEL
IDENTIFICACION:	CC-93362251
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-02-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-02-13
FECHA DE PAGO:	2023-02-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-01
PERIODO SALÚD:	2023-01
NUMERO PLANILLA:	25499913
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25499913
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 11.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.450.000	\$ 1.450.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 11.600.000	\$ 58.000	\$ 58.000	\$ 0	\$ 1.972.000	\$ 1.972.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 11.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.600	\$ 60.600
Total a pagar					\$ 58.000	\$ 58.000	\$ 0	\$ 3.482.600	\$ 3.482.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/03/2023
----------------------------------	------------

Bj





RAZON SOCIAL :	JIMENEZ MARTINEZ MARIO GABRIEL
IDENTIFICACION:	CC-93362251
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-14
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-03-13
FECHA DE PAGO:	2023-03-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-02
PERIODO SALUD:	2023-02
NUMERO PLANILLA:	25576732
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25576732
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 11.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.450.000	\$ 1.450.000
25-14	900338004	COLPENSIONES	1	\$ 11.600.000	\$ 58.000	\$ 58.000	\$ 0	\$ 1.972.000	\$ 1.972.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 11.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.600	\$ 60.600
Total a pagar					\$ 58.000	\$ 58.000	\$ 0	\$ 3.482.600	\$ 3.482.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/04/2023
----------------------------------	------------

B4
