



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA	DICIEMBRE	CONTRATISTA	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA	22	INTERVENT/SUPERVISOR	LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
DE	2022	FECHA DE INICIO	25 DE MARZO DE 2022
		FECHA DE FINALIZACION	10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	1 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	12 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	2 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS				
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA				
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* Topacio Mz 35-36: Se realiza la recuperacion de anden peatonal principal con su alistado en recebo.
 * B/ Topacio Mz 24A: Se realizan los llenos con recebo en zanja, continúa la construcción de pozos de inspeccion instalacion de arotapas.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 92 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: X LLOVIZNA LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA DICIEMBRE

CONTRATISTA

 MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 22


DE

 2022

INTERVENT/SUPERVISOR

 LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO

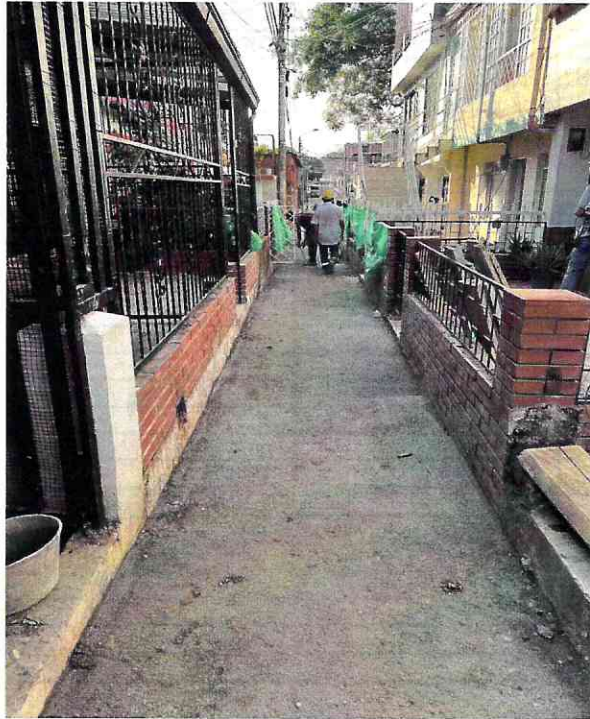


INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA	DICIEMBRE	CONTRATISTA	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA	23	INTERVENT/SUPERVISOR	LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
	DE	FECHA DE INICIO	25 DE MARZO DE 2022
	2022	FECHA DE FINALIZACION	10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	1 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	12 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	2 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS				
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA				
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* Topacio Mz 35-36: Se realiza la recuperacion de anden peatonal principal con su alistado en recebo.
 * B/ Topacio Mz 24A: Se realizan los llenos con recebo en zanja, continúa la construcción de pozos de inspección instalación de arotapas.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 92 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO X NUBLADO: LLOVIZNA LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTIÓN ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



ACTA DIARIA
DE REPOTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB-R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA DICIEMBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 23


DE

2022

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO

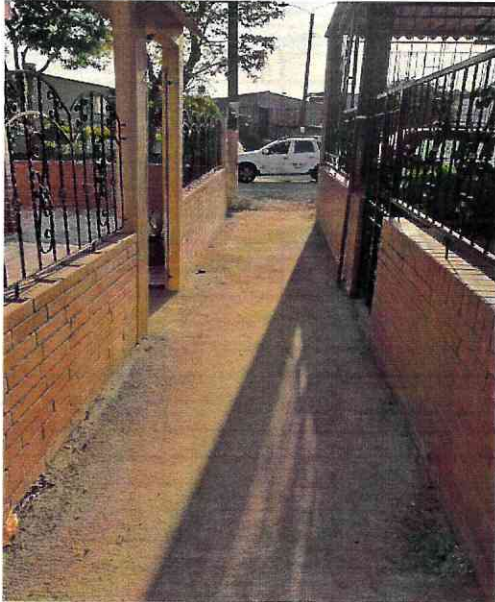

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA	DICIEMBRE	CONTRATISTA	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA	27	INTERVENT/SUPERVISOR	LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
DE	2022	FECHA DE INICIO	25 DE MARZO DE 2022
		FECHA DE FINALIZACION	10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	1 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSP. DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	10 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	2 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA				
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS				
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	1 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA				
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* Topacio Mz 35-36: Termina la recuperacion de anden peatonal principal con su alistado en recebo. Se realizan algunos arreglos a viviendas por cuenta y cargo del contratista de obra.
 * B/ Topacio Mz 24A: Inicia la recuperacion de placa concreto 3000 psi en via.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 92 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: LLOVIZNA LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA DICIEMBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 27


DE

2022

INTERVENT/SUPERVISOR


LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO

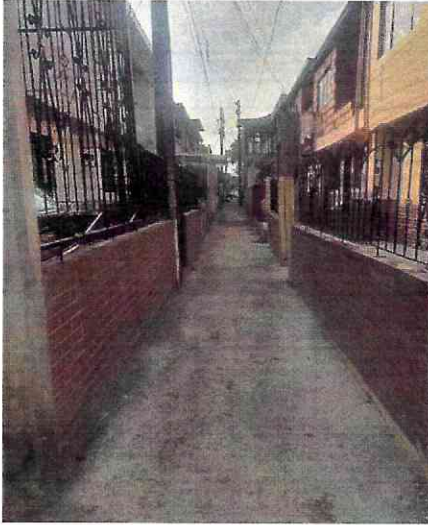


INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA DICIEMBRE CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
 DIA 28 DE 2022 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
 FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022
 FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	1 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	4 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN				
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA				
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS				
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	1 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA				
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* Topacio Mz 35-36: Termina la recuperacion de anden peatonal principal con su alistado en recebo. Se realizan algunos arreglos a viviendas por cuenta y cargo del contratista de obra.
 * B/ Topacio Mz 24A: Termina la recuperacion de placa concreto 3000 psi en via.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 93 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: LLOVIZNA LLOVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA DICIEMBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 28

DE

2022

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA	DICIEMBRE	CONTRATISTA	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA	29	INTERVENT/SUPERVISOR	LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
DE	2022	FECHA DE INICIO	25 DE MARZO DE 2022
		FECHA DE FINALIZACION	10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	1 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSP. DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	4 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN				
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA				
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS				
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	1 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA				
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* B/ Topacio Mz 24A: Se realiza el retiro de sobrantes y limpieza de obra.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 93 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: LLOVIZNA LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA DICIEMBRE CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA 29 DE 2022 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA	ENERO	CONTRATISTA	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA	03	INTERVENT/SUPERVISOR	LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
DE	2023	FECHA DE INICIO	25 DE MARZO DE 2022
		FECHA DE FINALIZACION	10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	1 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	4 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN				
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA				
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS				
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	1 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA				
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- * Ricaurte P/ Alta Calle 16 Cra 10D - Sur: Se realiza visita tecnica junto con la comunidad con el fin evidenciar problemas de taponamiento d ela red de aguas residuales.
- * B/ Topacio Mz 24A Mz 35-36: Se realiza la construccion de las ultimas cajas domiciliarias y reparacion de andenes

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 93 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: LLOVIZNA LLDVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA ENERO

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA

03

DE

2023

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA	ENERO	CONTRATISTA	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA	04	INTERVENT/SUPERVISOR	LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
DE	2023	FECHA DE INICIO	25 DE MARZO DE 2022
		FECHA DE FINALIZACION	10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	1 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	4 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN				
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA				
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS				
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	1 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA				
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- * B/ El Eden Calle 69: Se realiza visita tecnica con el fin de evidenciar vertimiento de aguas residuales al Rio Chipalo. /
- * B/ Ambala Cra 15a: Se realiza visita tecnica con el fin de evidenciar problemas de alcantarillado en este sector y que a traves del contrato se realice la intervencion necesaria. /
- * B/ Topacio Mz 24A Mz 35-36: Se realiza la construccion de las ultimas cajas domiciliarias y reparacion de andenes /

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 93 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: X LLOVIZNA LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSION: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA ENERO

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 04

DE

2023

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO



INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA	ENERO	CONTRATISTA	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA	06 DE 2023	INTERVENT/SUPERVISOR	LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
		FECHA DE INICIO	25 DE MARZO DE 2022
		FECHA DE FINALIZACION	10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 ✓	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 ✓	RETROCARGADOR	1			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 ✓	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	4 ✓	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN				
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 ✓	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA				
CONDUCTORES	2 ✓	MOTOBOMBAS				
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	1			
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2			
MECANICO		MEZCLADORA				
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- * B/La Sorbona: Se realiza visita tecnica con el fin evidencia inundacion de vivienda por aguas residuales.
- * B/ Kenedy Mz E Cs 5A: Se realiza visita tecnica para atender emergencia por colapso de red.
- * B/ Topacio Mz 24A Mz 35-36: Se realiza la construccion de las ultimas cajas domiciliarias y reparacion de andenes.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 96 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: X LLOVIZNA LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSION: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA ENERO **CONTRATISTA** MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA 06 **DE** 2023 **INTERVENT/SUPERVISOR** LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO


REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

	ACTA DIARIA DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO	CÓDIGO: SB- R-AL-114
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA: 2022-09-20
		VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"	
FECHA ENERO	CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA 10 DE 2023	INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
	FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022
	FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES						
PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR				
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSP. DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)		VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN				
CADENERO		RANA				
OPERADOR		COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA				
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS				
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS				
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX. ADMINIST.		VEHICULOS				
MECANICO		MEZCLADORA				
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS



* B/ 20 de Julio Calle 6 Cra 13: Se atiende visita tecnica para evidenciar la falat de un sistema de aguas lluvias en el sector y asi evitar las inundaciones que se vienen presentado en el sector. Se realizo primer acercamiento con la comunidad que se o pone a la realizacion de las obras.

Para este fecha el contrato de obra se encuentra casi terminado, por lo que se espera se surta el tramite de un Adicional en Tiempo y recursos, con el fin de adelantar otras emergencias que se agendaron por visita tecnica y que son indispensables realizar.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 99 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA			
SOLEADO	NUBLADO:	X	LLOVIZNA
			LLUVIA

 INGENIERO RESIDENTE	N.A INTERVENTOR	 GRUPO GESTION ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
--	--------------------	---



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA	ENERO	CONTRATISTA	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA	10	INTERVENT/SUPERVISOR	LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO


REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

	ACTA DIARIA DE REPORTE Y PROGRAMACION ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO	CÓDIGO: SB- R-AL-114
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA: 2022-09-20
		VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"
FECHA <u> MARZO </u> CONTRATISTA <u> MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ </u>
DIA <u> 10 </u> DE <u> 2023 </u> INTERVENT/SUPERVISOR <u> LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO </u>
FECHA DE INICIO <u> 25 DE MARZO DE 2022 </u>
FECHA DE FINALIZACION <u> 10 DE MARZO DE 2023 </u>

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR				
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)		VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN				
CADENERO		RANA				
OPERADOR		COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA				
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS				
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS				
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS				
MECANICO		MEZCLADORA				
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS
 * B/ 20 de Julio Calle 6 Cra 13: Se atiende visita tecnica para evidenciar la falta de un sistema de aguas lluvias en el sector y asi evitar las inundaciones que se vienen presentado en el sector. Se realizo segundo acercamiento con la comunidad que esta a favor y que se opone a la realizacion de las obras.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 90 % (Contrato adicionado en Recursos y Tiempo)

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: X LLOVIZNA LLUVIA

 INGENIERO RESIDENTE	N.A INTERVENTOR	 GRUPO GESTION ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
--	--------------------	---



**ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB-R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA MARZO

CONTRATISTA

 MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 10

DE

 2023

INTERVENT/SUPERVISOR

 LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO



INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA MARZO **CONTRATISTA** MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA 14 **DE** 2023 **INTERVENT/SUPERVISOR** LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022
FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 ✓	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 ✓	RETROCARGADOR				
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 ✓	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	6 ✓	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN				
CADENERO		RANA				
OPERADOR		COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA				
CONDUCTORES	2 ✓	MOTOBOMBAS				
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS				
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 ✓			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 ✓			
MECANICO		MEZCLADORA				
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* B/ 20 de Julio Calle 6 Cra 13:
 Se vincula personal a obra con todos los elementos de proteccion y seguridad.
 Se realiza el cerramiento perimetral en tela verde en carrera 13 y calle 6.
 Corte de pavimento flexible.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 90 % (Contrato adicionado en Recursos y Tiempo)

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: **X** LLOVIZNA LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTIÓN ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

df



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA MARZO

CONTRATISTA


 MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 14 DE 2023

INTERVENT/SUPERVISOR


 LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO

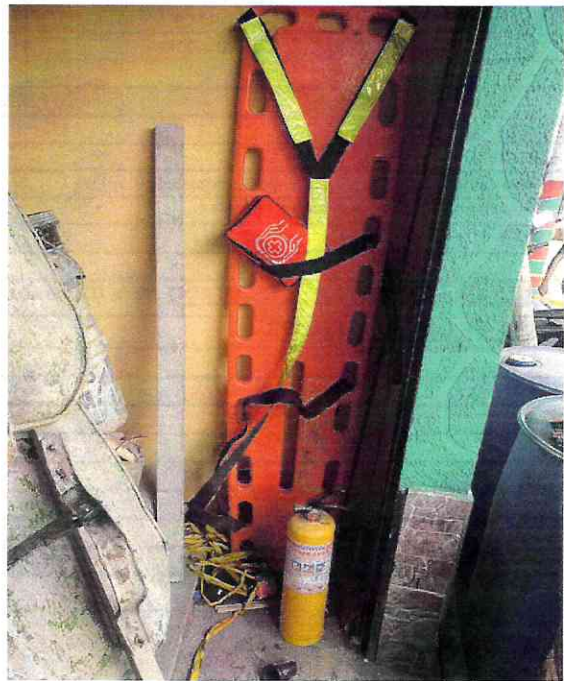


INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA	MARZO	CONTRATISTA	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA	15	INTERVENT/SUPERVISOR	LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
DE	2023	FECHA DE INICIO	25 DE MARZO DE 2022
		FECHA DE FINALIZACION	10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	1			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	1			
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	6 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA				
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS				
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	2 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* B/ 20 de Julio Calle 6 Cra 13:

Inician labores en la zona de descole del sistema de aguas lluvias a construir.
 Se realiza el cerramiento perimetral en tela verde en carrera 13 y calle 6, colocacion valla institucional.
 Corte de pavimento flexible sobre calle 6
 La ejecucion de obra se realizara en dos frentes de trabajo, con el fin de realizar las obras de conduccion de aguas llvias lo mas pronto posible.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 90 % (Contrato adicionado en Recursos y Tiempo)

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: X LLOVIZNA LLUVIA

	INGENIERO RESIDENTE	N.A INTERVENTOR	 GRUPO GESTION ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
--	---------------------	--------------------	--

cfp.



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA MARZO

CONTRATISTA

 MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 15

DE

 2023

INTERVENT/SUPERVISOR

 LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB-R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA MARZO CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
 DIA 17 DE 2023 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
 FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022
 FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	1 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	1 /			
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	6 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA				
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS				
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	2 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* B/ 20 de Julio Calle 6 Cra 13:


- Inician labores en la zona de descole del sistema de aguas lluvias a construir.
- Inicia construccion de pozo de inspeccion en ladrillo D=1.8 m identificado en los diseños como No.04 sobre carrera 13.
- Se realiza el cerramiento perimetral en tela verde en carrera 13 y calle 6, colocacion valla institucional.
- Se realizan excavaciones manuales para construccion de disipador de energia aguas lluvias
- Ya que la zona de excavacion corresponde a rellenos con materiales organicos, se realiza mejoramiento en concreto apara apoyar estructura de disipador de energia.
- Se construye caja de aguas residuales en zona de descole de aguas lluvias y se reubican redes de aguas residuales hacia caja nueva construida.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 90 % (Contrato adicionado en Recursos y Tiempo)

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: LLOVIZNA LLUVIA

 INGENIERO RESIDENTE	N.A INTERVENTOR	 GRUPO GESTION ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
--	--------------------	---



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB-R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA MARZO

CONTRATISTA

 MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ


DIA 17 DE

 2023

INTERVENT/SUPERVISOR

 LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO

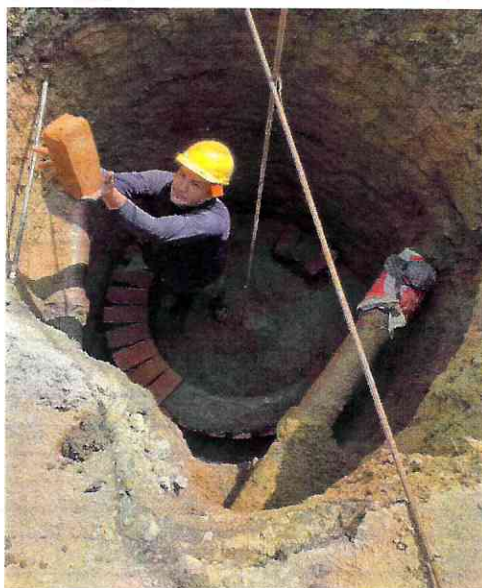


INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA MARZO **CONTRATISTA** MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA 18 **DE** 2023 **INTERVENT/SUPERVISOR** LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022
FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	1 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	1 /			
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	6 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA				
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS				
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	2 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* B/ 20 de Julio Calle 6 Cra 13:

Continua la construccion de pozo de inspeccion en ladrillo D=1.8 m identificado en los diseños como No.04 sobre carrera 13.

Se realizan excavaciones manuales para construccion de disipador de energia aguas lluvias

Ya que la zona de excavacion corresponde a rellenos con materiles organicos, se realiza mejoramiento en concreto apara apoyar estructura de disipador de energia en toda su longitud..

Se recibe induccion del profesional en SST al personal en obra.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 90 % (Contrato adicionado en Recursos y Tiempo)

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: LLOVIZNA LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

46



**ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB-R-AL-114



FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSION: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA	MARZO	CONTRATISTA	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA	18	INTERVENT/SUPERVISOR	LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO

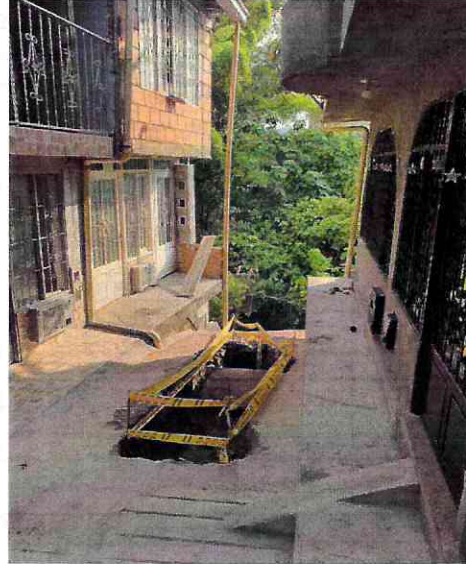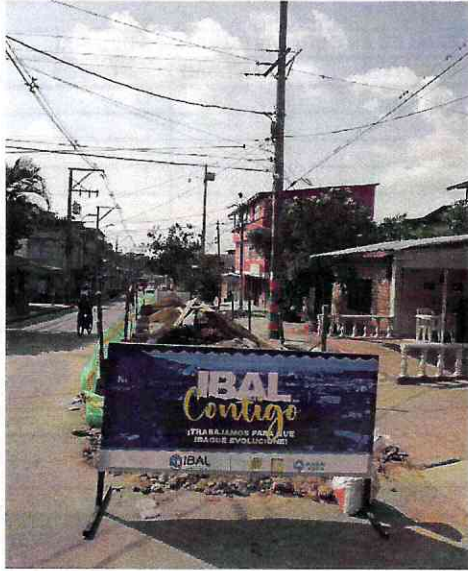


INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA MARZO **CONTRATISTA** MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA 21 **DE** 2023 **INTERVENT/SUPERVISOR** LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022
FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	1 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	1 /			
INSP. DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	6 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA				
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS				
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	2 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX. ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* B/ 20 de Julio Calle 6 Cra 13:

Continua la construcción de pozo de inspección en ladrillo D=1.8 m identificado en los diseños como No.04 sobre carrera 13. Inicia la construcción de Pozo No.05

Inicia excavación mecánica sobre carrera 13 entre Pozo 4 y 5. realizando el retiro de sobrantes de manera inmediata.

Termina el mejoramiento de base para construcción de dissipador de energía y reubicación de redes de aguas residuales en descole.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 90 % (Contrato adicionado en Recursos y Tiempo)

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: LLOVIZNA LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTIÓN ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL





ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB-R-AL-114
FECHA VIGENCIA: 2022-09-
VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA MARZO CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA 21 DE 2023 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO

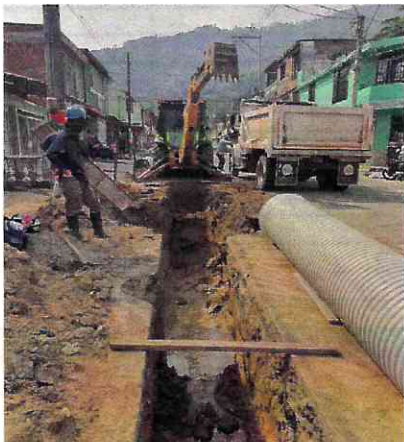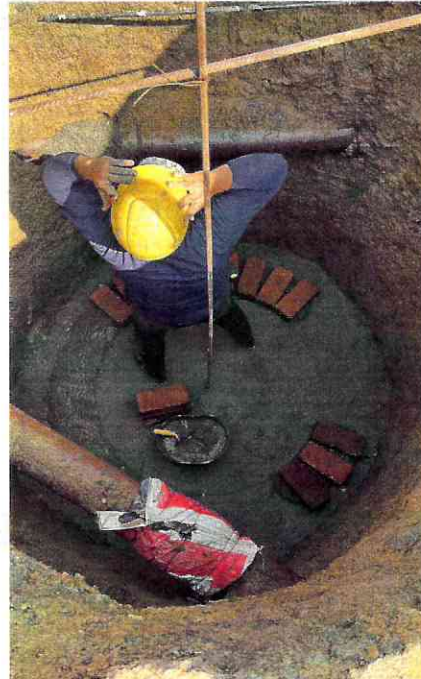


INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
