



**ACTA DIARIA  
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA  
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA           DICIEMBRE           CONTRATISTA           MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ            
 DIA           03           DE           2022           INTERVENT/SUPERVISOR           LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO            
 FECHA DE INICIO           25 DE MARZO DE 2022            
 FECHA DE FINALIZACION           10 DE MARZO DE 2023          

**GENERALIDADES**

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	2 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS ( OFICIALES Y OBREROS)	6 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	3 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS	1 /			
CELADOR		VOLQUETAS				
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA				
DIGITALIZADOR						

**ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- \* B/ El Peñon Cra 1B Cale 32: Continua la excavacion manual sobre la zona de red principal al tiempo se realiza la instalacion de tuberia plastica de 8"
- \* Topacio Mz 35-36: Inicio de actividades con excavaciones manuales a mas de 3 mts y con el uso de entibados ya que por la mala calidad del suelo se viene presentando derrumbes que afectan las zonas de antejardines de viviendas.
- \* Sector B/ La Pola Calle 4B Cra 4 y 5A: Continuan las labores de construccion de trinchos con excavaciones manuales para hincado de trinchos.
- \* B/ Topacio Mz 24A:
- \* B/ Ricaurte: Inicia la excavacion mecanica en zanja con retiro inmediato. Suministro e Instalacion de Tuberia Plastica de 14"

**AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 87 %**

**OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES**

**CLIMA**

SOLEADO                      NUBLADO:                      X                      LLOVIZNA                      LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL





ACTA DIARIA  
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES  
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA DICIEMBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 03


DE

2022

INTERVENT/SUPERVISOR


LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO

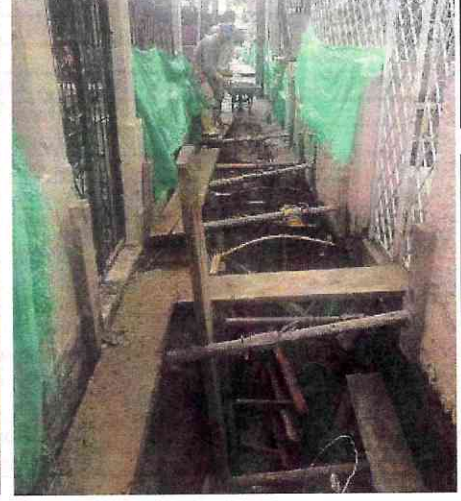

  
INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

  
GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL





**ACTA DIARIA  
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA  
DE ALCANTARILLADO**

**CÓDIGO:** SB- R-AL-114  
**FECHA VIGENCIA:** 2022-09-20  
**VERSIÓN:** 00

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**PROYECTO** "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

<b>FECHA</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>CONTRATISTA</b>	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
<b>DIA</b>	05	<b>INTERVENT/SUPERVISOR</b>	LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
<b>DE</b>	2022	<b>FECHA DE INICIO</b>	25 DE MARZO DE 2022
		<b>FECHA DE FINALIZACION</b>	10 DE MARZO DE 2023

**GENERALIDADES**

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	2 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSP. DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS ( OFICIALES Y OBREROS)	15 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	3 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS	1 /			
CELADOR		VOLQUETAS				
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA				
DIGITALIZADOR						

**ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- \* B/ El Peñon Cra 1B Cale 32: Continúa la excavación manual sobre la zona de red principal al tiempo se realiza la instalación de tubería plástica de 8", llenos en recebo.
- \* Topacio Mz 35-36: Continúa la excavación manual a doble paleo mas acarreo interno de material excavado. Se mantienen y mejoran las medidas de seguridad entibados para excavaciones.
- \* Sector B/ La Pola Calle 4B Cra 4 y 5A: Continúan las labores de construcción de trinchos con excavaciones manuales para hincado de trinchos, inicia la reconstrucción de pavimento concreto rígido sobre vía calle 4B.
- \* B/ Topacio Mz 24A:
- \* B/ Ricaurte: Continúa la excavación mecánica en zanja con retiro inmediato. Suministro e instalación de Tubería Plástica de 14", llenos en recebo compactado medi mecánico, se realiza entibado de la excavación.

**AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 87 %**

**OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES**

CLIMA			
SOLEADO	NUBLADO:	X	LLOVIZNA
			LLUVIA
 INGENIERO RESIDENTE	N.A INTERVENTOR	 GRUPO GESTION ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL	



**ACTA DIARIA  
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES  
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA DICIEMBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 05

DE

2022

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL





ACTA DIARIA  
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA  
DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA: DICIEMBRE  
DIA: 06 DE 2022  
CONTRATISTA: MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ  
INTERVENT/SUPERVISOR: LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO  
FECHA DE INICIO: 25 DE MARZO DE 2022  
FECHA DE FINALIZACION: 10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	2 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS ( OFICIALES Y OBREROS)	15 /	VIBRADOR DE CONG				
TOPOGRAFO		SALTARIN	3 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS	1 /			
CELADOR		VOLQUETAS				
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA				
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- \* B/ El Peñon Cra 1B Cale 32: Continúa la excavacion manual sobre la zona de red principal al tiempo se realiza la instalacion de tuberia plastica de 8", llenos en recebo. Conexioes domiciliarias en 6".
- \* Topacio Mz 35-36: Continúa la excavacion manual a doble paleo mas acarreo interno de material excavado. Se mantinene y mejoran las medidas de seguridad entibados para excavaciones. Termina construccion de cono pozo de inspeccion.
- \* Sector B/ La Pola Calle 4B Cra 4 y 5A: Continuan las labores de construccion de trinchos con excavaciones manuales para hincado de trinchos, inicia la reconstruccion de pavimento concreto rigido sobre via calle 4B.
- \* B/ Topacio Mz 24A:
- \* B/ Ricaurte: Continúa la excavacion mecanica en zanja con retiro inmediato. Suministro e instalacion de Tubería Plástica de 14", llenos en recebo compactado medi mecanico, se realiza entibado de la excavacion.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 87 %

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO	NUBLADO:	X	LLOVIZNA	LLUVIA
---------	----------	---	----------	--------

INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

50





**ACTA DIARIA  
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES  
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA            DICIEMBRE           

CONTRATISTA


MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA            06            DE            2022

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

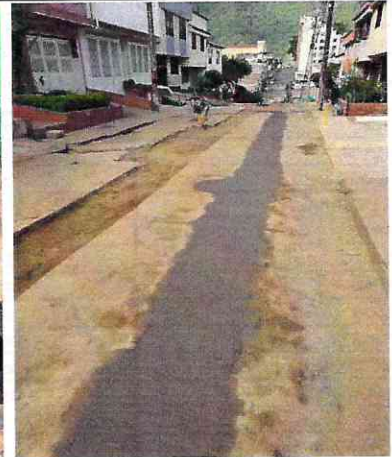

  
INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

  
GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL





**ACTA DIARIA  
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA  
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA            **DICIEMBRE**            DE            **2022**            **CONTRATISTA**            **MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ**  
**DIA**            **07**            **DE**            **2022**            **INTERVENT/SUPERVISOR**            **LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO**  
           **FECHA DE INICIO**            **25 DE MARZO DE 2022**  
           **FECHA DE FINALIZACION**            **10 DE MARZO DE 2023**

**GENERALIDADES**

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	2 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSP. DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS ( OFICIALES Y OBREROS)	15 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	3 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS	1 /			
CELADOR		VOLQUETAS				
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA				
DIGITALIZADOR						

**ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- \* B/ El Peñon Cra 1B Cale 32: Continúa la construcción de placa en concreto de 3000 psi.
- \* Topacio Mz 35-36: Se realizan llenos en recebo sobre andén principal y zona de antejardines viviendas.
- \* Sector B/ La Pola Calle 4B Cra 4 y 5A: Termina construcción de trinchos en zona de derrumbe.
- \* B/ Topacio Mz 24A:
- \* B/ Ricaurte: Continúa la excavación mecánica en zanja con retiro inmediato. Suministro e instalación de Tubería Plástica de 14", llenos en recebo compactado medi mecánico, se realiza entibado de la excavación.

**AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 90 %**

**OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES**

**CLIMA**

SOLEADO                      NUBLADO:                      **X**                      LLOVIZNA                      LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

Gf





ACTA DIARIA  
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES  
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA DICIEMBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 07 DE

2022

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO



  
INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

  
GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL





**ACTA DIARIA  
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA  
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA            **DICIEMBRE**            DE            **2022** CONTRATISTA            **MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ**  
 DIA            **09**            DE            **2022** INTERVENT/SUPERVISOR            **LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO**  
FECHA DE INICIO            **25 DE MARZO DE 2022**  
FECHA DE FINALIZACION            **10 DE MARZO DE 2023**

**GENERALIDADES**

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	2 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPER DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS ( OFICIALES Y OBREROS)	15 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	3 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS	1 /			
CELADOR		VOLQUETAS				
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA				
DIGITALIZADOR						

**ACTIVIDADES**



**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- \* B/ El Peñon Cra 1B Cale 32:
- \* Topacio Mz 35-36:
- \* Sector B/ La Pola Calle 4B Cra 4 y 5A:
- \* B/ Topacio Mz 24A:
- \* B/ Ricaurte:

**AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 88 %**

**OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES**

CLIMA			
SOLEADO	NUBLADO:	LLOVIZNA	LLUVIA
			X

 INGENIERO RESIDENTE	N.A INTERVENTOR	 GRUPO GESTION ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
--	--------------------	---

45



ACTA DIARIA  
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES  
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA DICIEMBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 09

DE

2022

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO

X



INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL





**ACTA DIARIA  
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA  
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA DICIEMBRE 10 DE 2022 CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ  
 DIA 10 DE 2022 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO  
 FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022  
 FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

**GENERALIDADES**

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	2 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS ( OFICIALES Y OBREROS)	15 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	3 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS	1 /			
CELADOR		VOLQUETAS				
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA				
DIGITALIZADOR						

**ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- \* B/ El Peñon Cra 1B Cale 32: Termina la construcción de placa en concreto de 3000 psi.
- \* Topacio Mz 35-36: Inicia segundo tramo de colector de 8", el cual va a una profundidad menor por lo que los trabajos se realizaran de manera mas rapida.
- \* Sector B/ La Pola Calle 4B Cra 4 y 5A: Termina construcción de trinchos en zona de derrumbe, e inicia aplicación de recubrimiento de talud en concremallá en cada escalon de trincho.
- \* B/ Topacio Mz 24A:
- \* B/ Ricaurte: Continúa la excavación mecánica en zanja con retiro inmediato. Suministro e Instalación de Tubería Plástica de 14", llenos en rebase compactado medi mecánico, se realiza entibado de la excavación.

**AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 90 %**

**OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES**

CLIMA			
SOLEADO	X	NUBLADO:	LLOVIZNA
			LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL





**ACTA DIARIA  
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES  
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA            DICIEMBRE           

CONTRATISTA


MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA            10            DE            2022

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

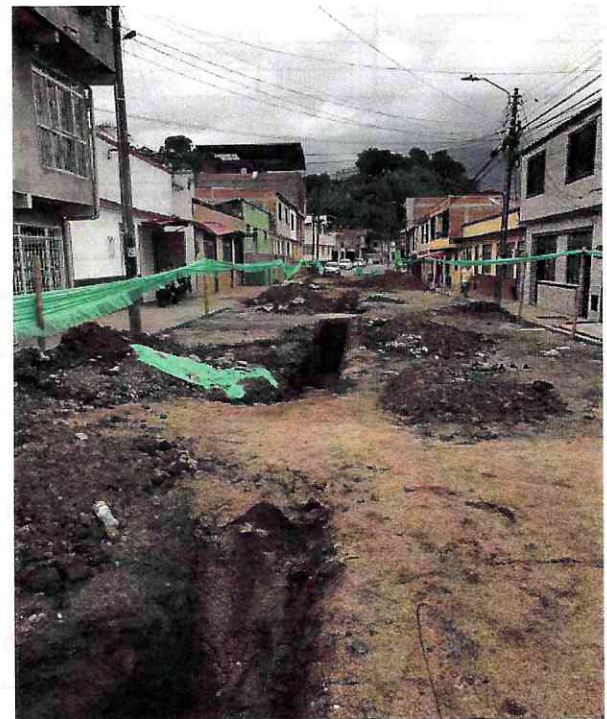

  
INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

  
GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL





**ACTA DIARIA  
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA  
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**PROYECTO** "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

**FECHA** DICIEMBRE DE 2022 **CONTRATISTA** MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ  
**DIA** 12 **DE** 2022 **INTERVENT/SUPERVISOR** LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO  
**FECHA DE INICIO** 25 DE MARZO DE 2022  
**FECHA DE FINALIZACION** 10 DE MARZO DE 2023

**GENERALIDADES**

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	2 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS ( OFICIALES Y OBREROS)	15 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	3 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS	1 /			
CELADOR		VOLQUETAS				
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA				
DIGITALIZADOR						

**ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- \* Topacio Mz 35-36: Inicia segundo tramo de colector de 8", el cual va a una profundidad menor por lo que los trabajos se realizaran de manera mas rapida.
- \* Sector B/ La Pola Calle 4B Cra 4 y 5A: Inicia la construccion de trinchos en zona lateral viviendas con el fin de controlar las aguas de escorrentia superficial.
- \* B/ Topacio Mz 24A:
- \* B/ Ricaurte: Continua la excavacion mecanica en zanja con retiro inmediato. Suministro e Instalacion de Tuberia Plastica de 14", llenos en recebo compactado medi mecanico, se realiza entibado de la excavacion.

**AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 90 %**

**OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES**

CLIMA		
SOLEADO	X	NUBLADO:
		LLOVIZNA
		LLUVIA
 INGENIERO RESIDENTE	N.A INTERVENTOR	 GRUPO GESTION ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

46



ACTA DIARIA  
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES  
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB-R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA            DICIEMBRE            CONTRATISTA            MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ  
DIA            12            DE            2022 INTERVENT/SUPERVISOR            LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO



  
INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

  
GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL





**ACTA DIARIA  
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA  
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**PROYECTO** "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

**FECHA**           DICIEMBRE           **CONTRATISTA**           MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ            
**DIA**           13           **DE**           2022           **INTERVENT/SUPERVISOR**           LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO            
**FECHA DE INICIO**           25 DE MARZO DE 2022            
**FECHA DE FINALIZACION**           10 DE MARZO DE 2023          

**GENERALIDADES**

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	2 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS ( OFICIALES Y OBREROS)	15 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	3 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS	1 /			
CELADOR		VOLQUETAS				
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA				
DIGITALIZADOR						



**ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- \* Topacio Mz 35-36: Continua instalacion de tubería de 8" con sus respectivas sillas yee, recuperacion de llenos con recebo.
- \* Sector B/ La Pola Calle 4B Cra 4 y 5A: inicia la construccion de trinchos en zona lateral viviendas con el fin de controlar las aguas de escorrentía superficial.
- \* B/ Topacio Mz 24A: Inician labores realizando el secado de aguas residuales en zona de colapso de colector, se realiza el corte y demolición de pavimento rígido y asfáltico.
- \* B/ Ricaurte: La obra culmina con la reposicion total de tubería y la conexión de todos los usuarios que por cota podian conectarse a la nueva red. Exeptuando: #15-55, #15-51, #15-49, #15-45.

**AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 90 %**

**OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES**

CLIMA			
SOLEADO	NUBLADO:	X	LLOVIZNA
			LLUVIA
 INGENIERO RESIDENTE	N.A INTERVENTOR	 GRUPO GESTION ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL	

cf





**ACTA DIARIA  
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES  
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO**

**CÓDIGO: SB- R-AL-114**

**FECHA VIGENCIA: 2022-09-**

**VERSIÓN: 00**

**PROYECTO** "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

**FECHA** DICIEMBRE

**CONTRATISTA**

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

**DIA** 13

**DE**

2022

**INTERVENT/SUPERVISOR**

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



*[Signature]*  
INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

*[Signature]*  
GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL





**ACTA DIARIA  
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA  
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA           DICIEMBRE           CONTRATISTA           MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ            
 DIA           14           DE           2022           INTERVENT/SUPERVISOR           LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO            
 FECHA DE INICIO           25 DE MARZO DE 2022            
 FECHA DE FINALIZACION           10 DE MARZO DE 2023          

**GENERALIDADES**

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	2 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS ( OFICIALES Y OBREROS)	15 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	3 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS	1 /			
CELADOR		VOLQUETAS				
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA				
DIGITALIZADOR						



**ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- \* Topacio Mz 35-36: Continua construccion de segundo tramo de colector de 8", Construccion de cajas de inspeccion.
- \* Sector B/ La Pola Calle 4B Cra 4 y 5A: termina la construccion de trinchos en zona lateral viviendas con el fin de controlar las aguas de escorrentia superficial.
- \* B/ Topacio Mz 24A: Inicia excavacion mecanica en zanja con retiro de material sobrante.
- \* B/ Ricaurte: Continua la excavacion mecanica en zanja con retiro inmediato. Suministro e Instalacion de Tuberia Plastica de 14", llenos en receo compactado medi mecanico, se realiza entibado de la excavacion.

**AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 90 %**

**OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES**

CLIMA			
SOLEADO	NUBLADO:	X	LLOVIZNA
			LLUVIA
 INGENIERO RESIDENTE	N.A INTERVENTOR	 GRUPO GESTION ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL	





ACTA DIARIA  
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES  
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA DICIEMBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 14


DE

2022

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO

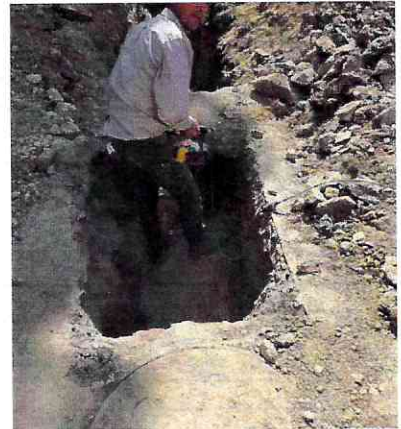

  
INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

  
GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL





**ACTA DIARIA  
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA  
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA           DICIEMBRE           CONTRATISTA           MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ            
 DIA           15           DE           2022           INTERVENT/SUPERVISOR           LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO            
 FECHA DE INICIO           25 DE MARZO DE 2022            
 FECHA DE FINALIZACION           10 DE MARZO DE 2023          

**GENERALIDADES**

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	2 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS ( OFICIALES Y OBREROS)	15 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	3 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS	1 /			
CELADOR		VOLQUETAS				
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA				
DIGITALIZADOR						

**ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- \* Topacio Mz 35-36: Se realizan llenos con roceo a nivel de andén.
- \* B/ Topacio Mz 24A: Inicia excavacion mecanica en zanja con retiro de material sobrante, suministro e instalacion de tuberia de 12" en red pncipal, excavaciones para pozo e inspeccion.

**AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 90 %**

**OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES**

**CLIMA**

SOLEADO                      NUBLADO:                      X                      LLOVIZNA                      LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

*Handwritten mark*



ACTA DIARIA  
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES  
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB-R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA DICIEMBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 15 DE

2022

INTERVENTOR/SUPERVISOR


LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO



  
INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

  
GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL, S.A. E.S.P. OFICIAL





**ACTA DIARIA  
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA  
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA           DICIEMBRE           CONTRATISTA           MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ            
 DIA           16           DE           2022           INTERVENT/SUPERVISOR           LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO            
 FECHA DE INICIO           25 DE MARZO DE 2022            
 FECHA DE FINALIZACION           10 DE MARZO DE 2023          

**GENERALIDADES**

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	2 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS ( OFICIALES Y OBREROS)	12 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	3 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	2 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS	1 /			
CELADOR		VOLQUETAS				
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA				
DIGITALIZADOR						

**ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

\* Topacio Mz 35-36: Se realizan lenos con roceo a nivel de anden, construccion de cajas de inspeccion, reparacion de andenes en antejardines.  
 \* B/ Topacio Mz 24A: Inicia excavacion mecanica en zanja con retiro de material sobrante, suministro e instalacion de tuberia de 12" en red pincipal, excavaciones para pozo e inspeccion.

**AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 90 %**

**OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES**

**CLIMA**

SOLEADO  NUBLADO:  LLOVIZNA  LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



ACTA DIARIA  
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES  
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA DICIEMBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 16


DE

2022

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO

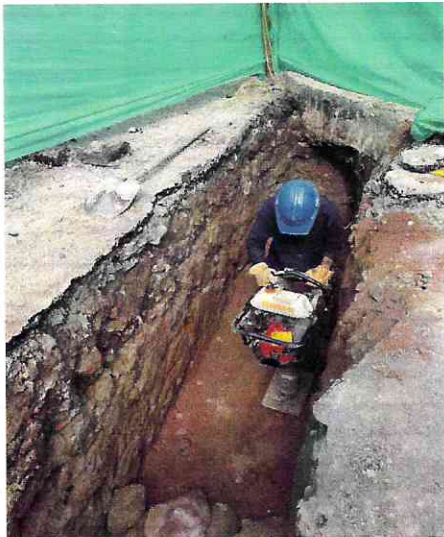



  
INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

  
GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



IBAL SIG		ACTA DIARIA DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO			CÓDIGO: SB- R-AL-114	
		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			FECHA VIGENCIA: 2022-09-20	
					VERSIÓN: 00	
PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"						
FECHA		DICIEMBRE		CONTRATISTA		
DIA		17		DE		2022
				MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ		
				LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO		
				25 DE MARZO DE 2022		
				10 DE MARZO DE 2023		
GENERALIDADES						
PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	1 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS ( OFICIALES Y OBREROS)	12 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	2 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS				
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA				
DIGITALIZADOR						
ACTIVIDADES						
ACTIVIDADES REALIZADAS						
* Topacio Mz 35-36: Se realiza instalacion de tubería de 8" en descole colector de 8", llenos con recebo.						
* B/ Topacio Mz 24A: Continua excavacion mecanica en zanja con retiro de material sobrante, suministro e instalacion de tubería de 12" en red principal, excavaciones para pozo de inspeccion.						
AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 90 %						
OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES						
CLIMA						
SOLEADO	X	NUBLADO:		LLOVIZNA		LUVIA
 INGENIERO RESIDENTE		N.A INTERVENTOR		 GRUPO GESTION ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL		

46



**ACTA DIARIA  
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES  
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB-R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA            DICIEMBRE           

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA            17            DE            2022

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



  
INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

  
GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL





**ACTA DIARIA  
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA  
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA	DICIEMBRE	CONTRATISTA	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA	19 DE	INTERVENT/SUPERVISOR	LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
		FECHA DE INICIO	25 DE MARZO DE 2022
		FECHA DE FINALIZACION	10 DE MARZO DE 2023

**GENERALIDADES**

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	1 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS ( OFICIALES Y OBREROS)	12 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	2 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS				
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA				
DIGITALIZADOR						

**ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- \* Topacio Mz 35-36: Se realiza instalacion de tuberia de 8" en descole colector de 8", llenos con recebo.
- \* B/ Topacio Mz 24A: Continua excavacion mecanica en zanja con retiro de material sobrante, suministro e instalacion de tuberia de 12" en red pricipal, excavaciones para pozo de inspeccion.

**AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 90 %**

**OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES**

**CLIMA**

SOLEADO                      NUBLADO:                      X                      LLOVIZNA                      LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



ACTA DIARIA  
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES  
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA DICIEMBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 19

DE

2022

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO



  
INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

  
GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL





**ACTA DIARIA  
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA  
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**PROYECTO** "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA	DICIEMBRE	CONTRATISTA	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA	20	INTERVENT/SUPERVISOR	LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
DE	2022	FECHA DE INICIO	25 DE MARZO DE 2022
		FECHA DE FINALIZACION	10 DE MARZO DE 2023

**GENERALIDADES**

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	1 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS ( OFICIALES Y OBREROS)	12 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	2 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS				
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA				
DIGITALIZADOR						

**ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

\* Topacio Mz 35-36: Continúa la construcción de cajas de inspección y reparación de andenes en antejardines.

\* B/ Topacio Mz 24A: Se realizan los llenos con recebo en zanja, continúa la construcción de pozos de inspección.

**AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 91 %**

**OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES**

**CLIMA**

SOLEADO                      NUBLADO:                      X                      LLOVIZNA                      LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

CF



ACTA DIARIA  
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES  
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA DICIEMBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 20


DE

2022

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO

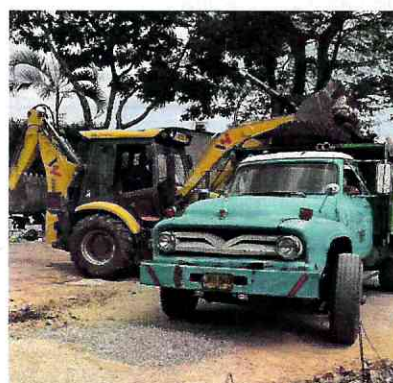

  
INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

  
GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL





**ACTA DIARIA  
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA  
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA            DICIEMBRE            CONTRATISTA            MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ  
 DIA            21            DE            2022 INTERVENT/SUPERVISOR            LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO  
 FECHA DE INICIO            25 DE MARZO DE 2022  
 FECHA DE FINALIZACION            10 DE MARZO DE 2023

**GENERALIDADES**

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	1 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS ( OFICIALES Y OBREROS)	12 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	2 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA	1 /			
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS	1 /			
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS				
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA				
DIGITALIZADOR						

**ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

\* Topacio Mz 35-36: Continua la construccion de cajas de inspeccion y reparacion de andenes en antejardines.  
 \* B/ Topacio Mz 24A: Se realizan los llenos con recebo en zanja, continua la construccion de pozos de inspeccion.

**AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 91 %**

**OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES**

**CLIMA**

SOLEADO            NUBLADO:            X            LLOVIZNA            LLOVIA           

INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

45



ACTA DIARIA  
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES  
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSION: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA DICIEMBRE

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 21


DE

2022

INTERVENT/SUPERVISOR


LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO

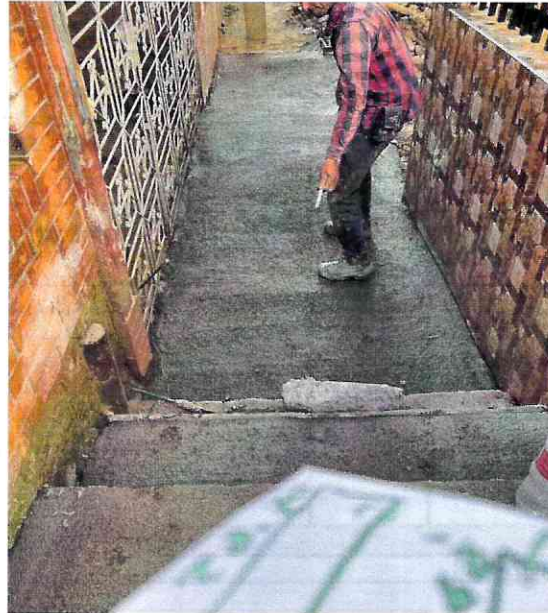

  
INGENIERO RESIDENTE

N.A  
INTERVENTOR

  
GRUPO GESTION ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
