



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA ABRIL CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA 14 DE 2023 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRÁFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

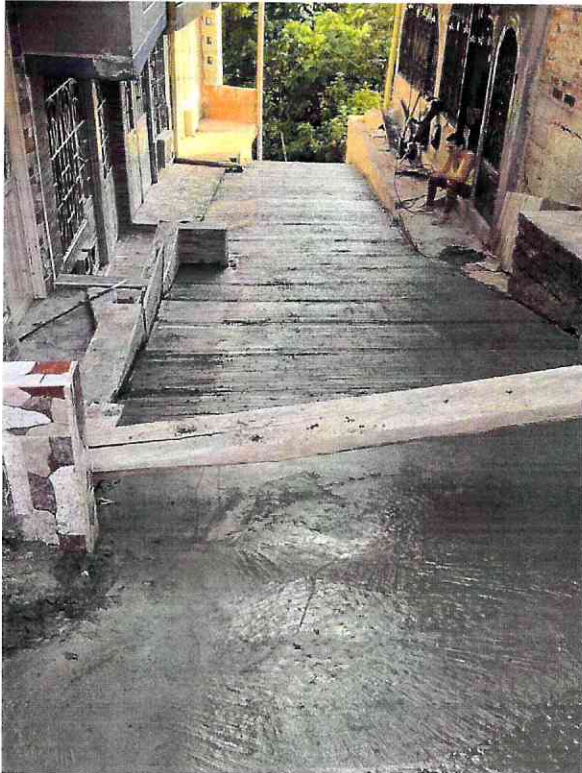
PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA ABRIL
DIA 15 DE

CONTRATISTA
2023
INTERVENT/SUPERVISOR

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA ABRIL CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
 DIA 15 DE 2023 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
 FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022
 FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	1 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	1 /			
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	6 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA				
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS				
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	2 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* B/ 20 de Julio Calle 6 Cra 13:

Se realiza la pavimentación completa de la bocacalle calle 6 en concreto de 3000 psi en espesor de 0,13 m.

Se arreglan detalles en andenes, fachadas, y demas en calle 6.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 94 % (Contrato adicionado en Recursos y Tiempo)

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: X , LLOVIZNA LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

28



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB-R-AL-114

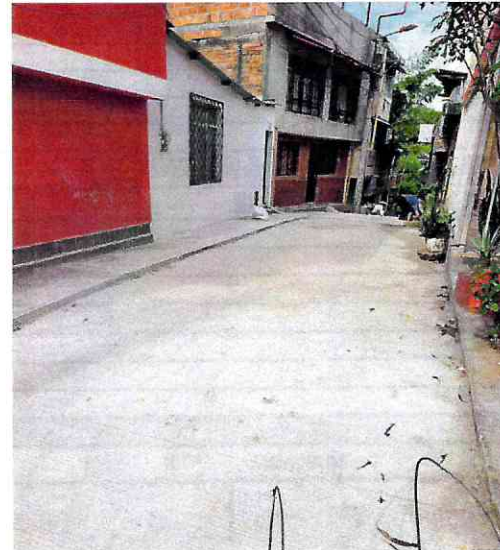
FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA ABRIL CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA 15 DE 2023 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA ABRIL
DIA 18 DE 2023

CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022

FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	1 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	1 /			
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	6 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA				
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS				
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	2 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA	1 /			
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* B/ 20 de Julio Calle 6 Cra 13:
Se realiza la pavimentación completa de la bocacalle calle 6 en concreto de 3000 psi en espesor de 0,13 m.
Se instalan espiones en caja de aquietamiento en disipador.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 94 % (Contrato adicionado en Recursos y Tiempo)

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA		
SOLEADO	NUBLADO:	LLOVIZNA
	X	
		LLUVIA
	N.A	
INGENIERO RESIDENTE	INTERVENTOR	GRUPO GESTION ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"


FECHA ABRIL CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA 18 DE 2023 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRÁFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA ABRIL DE 2023 CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
 DIA 19 DE 2023 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022
FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	1 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	5 /	VIBRADOR DE CONC	1 /			
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA				
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS				
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	1 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* B/ 20 de Julio Calle 6 Cra 13:

Se realiza la instalacion de base granular la cual se deja alta en la zona de cruce cra 13 calle 6 para el paso seguro de vehiculos.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 94 % (Contrato adicionado en Recursos y Tiempo)

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: X LLOVIZNA LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB-R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA ABRIL CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA 19 DE 2023 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA ABRIL

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 20 DE

2023

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

FECHA DE INICIO

25 DE MARZO DE 2022

FECHA DE FINALIZACION

10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	1 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	5 /	VIBRADOR DE CONC	1 /			
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA				
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS				
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	1 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* B/ 20 de Julio Calle 6 Cra 13:

Termina construccion de carcamo aguas lluvias sobre la zona de pozo inicial del colector construido.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 94 % (Contrato adicionado en Recursos y Tiempo)

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO

NUBLADO:

X

LLOVIZNA

LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

df



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB-R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA	ABRIL	CONTRATISTA	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA	20	INTERVENT/SUPERVISOR	LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA ABRIL

DIA 21

DE

2023

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

FECHA DE INICIO

25 DE MARZO DE 2022

FECHA DE FINALIZACION

10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR	1 /			
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	5 /	VIBRADOR DE CONC	1 /			
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA				
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS				
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	1 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* B/ 20 de Julio Calle 6 Cra 13:

Se realiza parcheo en pavimento asfaltico tipo MDEC-19 sobre carrera 13 con calle 6.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 94 % (Contrato adicionado en Recursos y Tiempo)

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO

NUBLADO:

X

LLOVIZNA

LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

df



**ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB-R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA	ABRIL	CONTRATISTA	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA	21	INTERVENT/SUPERVISOR	LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO



INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR



GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA ABRIL CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 24 DE 2023 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022

FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR				
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	1 /			
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	5 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA				
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS				
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	1 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* B/ 20 de Julio Calle 6 Cra 13:

Se recibe apoyo del equipo Vactor con el fin de evacuar aguas residuales del predio del Señor CARLOS QUIMBAYO, con el fin de iniciar las labores de adecuacion y mejoramiento de redes que desolaban sobre su predio y reparaciones localivas.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 94 % (Contrato adicionado en Recursos y Tiempo)

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: X LLOVIZNA LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

cf



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"


FECHA	ABRIL	CONTRATISTA	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA	24	INTERVENT/SUPERVISOR	LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA ABRIL DE 2023 CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
 DIA 25 DE 2023 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
 FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022
 FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR				
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	1 /			
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	5 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA				
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS				
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	1 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* B/ 20 de Julio Calle 6 Cra 13:

Inician las labores en el predio del Sr Carlos Quimbayo con el reforzamiento estructural del muro posterior d ela vivienda y el llenano en recebo de una caja de inspeccion profunda.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 94 % (Contrato adicionado en Recursos y Tiempo)

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: X LLOVIZNA LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

of



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA ABRIL

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 25

DE

2023

INTERVENT/SUPERVISOR


LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA ABRIL CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
 DIA 26 DE 2023 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
 FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022
 FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR				
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	1 /			
INSPER DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	5 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA				
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS				
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	1 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* B/ 20 de Julio Calle 6 Cra 13:

Se realiza excavacion manual para fundida de zapata Muro Vivienda.

Reubicacion de tuberia plastica de 6" provenientes de la zona humeda de la vivienda.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 94 % (Contrato adicionado en Recursos y Tiempo)

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: X LLOVIZNA LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB-R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA ABRIL CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA 26 DE 2023 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA ABRIL 27 DE 2023 CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
 FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022
 FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR				
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR	1 /			
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	5 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA				
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS				
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	1 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* B/ 20 de Julio Calle 6 Cra 13:

Se realiza fundida de zapata muro vivienda en concreto de 4000 psi y acero de refuerzo.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 96 % (Contrato adicionado en Recursos y Tiempo)

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: X LLOVIZNA LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTIÓN ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA ABRIL CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA 27 DE 2023 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA ABRIL 28 DE 2023 CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
 INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
 FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022
 FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR				
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	4 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA				
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS				
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	1 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* B/ 20 de Julio Calle 6 Cra 13:

Se realiza fundida de vastago muro vivienda en concreto de 4000 psi y acero de refuerzo.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 96 % (Contrato adicionado en Recursos y Tiempo)

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: X LLOVIZNA LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

df



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA ABRIL

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 28

DE

2023

INTERVENT/SUPERVISOR


LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRÁFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA ABRIL

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 28 DE

2023

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

FECHA DE INICIO

25 DE MARZO DE 2022

FECHA DE FINALIZACION

10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR				
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	4 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA				
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS				
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	1 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* B/ 20 de Julio Calle 6 Cra 13:

Se realizan llenos con recebo y retiro de sobrantes.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 97 % (Contrato adicionado en Recursos y Tiempo)

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO

NUBLADO:

X

LLOVIZNA

LUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

FECHA	ABRIL	CONTRATISTA	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA	28	INTERVENT/SUPERVISOR	LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO



[Handwritten Signature]
INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

[Handwritten Signature]
GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA	MAYO	CONTRATISTA	MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
DIA	02	INTERVENT/SUPERVISOR	LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO
DE	2023	FECHA DE INICIO	25 DE MARZO DE 2022
		FECHA DE FINALIZACION	10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR				
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSP. DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	4 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA				
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS				
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	1 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* B/ 20 de Julio Calle 6 Cra 13:

Se termino construccion de caja de inspeccion para vivienda y alberca en ladrillo enchapada.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 98 % (Contrato adicionado en Recursos y Tiempo)

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: X LLOVIZNA LLUVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB-R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSIÓN: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"


FECHA
DIA DE INTERVENT/SUPERVISOR

REGISTRO FOTOGRAFICO




INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR


GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



**ACTA DIARIA
DE REPORTE Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE OBRA
DE ALCANTARILLADO**

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-20

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA MAYO
DIA 03 DE 2023

CONTRATISTA MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

INTERVENT/SUPERVISOR LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

FECHA DE INICIO 25 DE MARZO DE 2022

FECHA DE FINALIZACION 10 DE MARZO DE 2023

GENERALIDADES

PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS		MATERIALES EN OBRA Y/O RETIRADOS DEL IBAL		
DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORDEN
DIRECTOR	1 /	RETROEXCAVADORA				
INGENIEROS	2 /	RETROCARGADOR				
SUPERVISOR		VIBROCOMPACTADOR				
INSPEC DE OBRA	3 /	COMPRESOR				
OPERARIOS (OFICIALES Y OBREROS)	4 /	VIBRADOR DE CONC				
TOPOGRAFO		SALTARIN	1 /			
CADENERO		RANA				
OPERADOR	1 /	COMPACTADOR PC				
ALMACENISTA		PLANTA ELECTRICA				
CONDUCTORES	2 /	MOTOBOMBAS				
CONTROLADORES		EQUIPOS TOPOGRAFICOS				
CELADOR		VOLQUETAS	1 /			
ADMINISTRADOR		CORTADORA				
AUX.ADMINIST.		VEHICULOS	2 /			
MECANICO		MEZCLADORA	1 /			
DIGITALIZADOR						

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

* B/ 20 de Julio Calle 6 Cra 13:

Reforzamiento estructural muro 2 para apto terminado.

Ejecucion de llenos a nivel de vigas terminado.

AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE EJECUTADO 100 % (Contrato adicionado en Recursos y Tiempo)

OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES

CLIMA

SOLEADO NUBLADO: X LLOVIZNA LLOVIA

INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR

GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



ACTA DIARIA
DE REPORTES Y PROGRAMACION ACTIVIDADES
PARA CONTRATOS DE OBRA DE ALCANTARILLADO

CÓDIGO: SB- R-AL-114

FECHA VIGENCIA: 2022-09-

VERSION: 00

PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

FECHA MAYO

CONTRATISTA

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

DIA 03 DE

2023

INTERVENT/SUPERVISOR

LADY JOANNA BONILLA MEDINA / CARLOS MEDINA AREVALO

REGISTRO FOTOGRAFICO



INGENIERO RESIDENTE

N.A
INTERVENTOR



GRUPO GESTION ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
