


DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 069-22 BIOCIVIL ING SAS




De <dolly.camacho@ibal.gov.co>

Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>

Fecha 2024-01-23 16:49

 DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 069-22 BIOCIVIL ING SAS-1-65 (2).pdf (~12 MB)

ADJUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

	SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA	CÓDIGO: GJ-R-050
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
		Página 1 de 2

Ibagué, 15 de enero del 2024

Doctor(a)
Angie Julieta Rojas Millán
Secretaria General
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
Ibagué

RPJowk
23.01.24
3:08 PM

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 069 DE 2022.

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo trámite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA FINAL

1. Factura electrónica.
2. Acta final.
3. Acta de entrega y recibo a satisfacción (GJ-R-055).
4. Certificación aportes de seguridad social (GJ-R-061)
5. Planillas de seguridad social.
 - 5.1 Certificaciones de aportes con firma del revisor fiscal.
 - 5.2 Certificación de antecedentes JCC revisor fiscal.
 - 5.3 Copia C.C y T.P revisor fiscal.
6. Bitácora de obra
7. Plano récord impreso.
8. Registro fotográfico
9. Paz y salvo almacén.
10. Constancia pago FIC
11. Certificación de ministerio de trabajo.



**SOPORTES DOCUMENTALES
PARA TRAMITE DE CUENTA**

**SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN**

**CÓDIGO: GJ-R-
050**

**FECHA
VIGENCIA:
2016-10-12**


VERSIÓN: 02

Página 2 de 2

12. Acta de modificación de cantidades registros GJ-R-06
13. Acta de modificación de cantidades GJ-R-06, GJ-R-007.
14. Pólizas ampliadas con acta final y aprobación de garantías.
15. Ficha técnica de evaluación GJ-R-056.
16. Ficha técnica de reevaluación GJ-R-056.
17. Constancia u oficio de entrega de información geográfica de las redes al Cecoi.

Atentamente,

MARCO MATHEUS SAAVEDRA RANGEL
Director Operativo - Supervisor

	ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES E INCORPORACION DE ITEMS NO PREVISTOS.	CÓDIGO: GJ-R-006
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 03
		Página 1 de 2

CONTRATO DE OBRA N° 069 DEL 2022	
OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE RED PARA DESCOLE DE LAVADO DE MODULOS DE PLANTA 1 UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL IBAL DE LA POLA, PARA MITIGAR AFECTACIONES EN LAS ZONAS COMUNES DEL CONJUNTO IRAZU II DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ
VALOR TOTAL:	\$ 171,880,000
PLAZO:	90 DÍAS
SUPERVISOR:	HAROLD R. RODRIGUEZ SANCHEZ – DIRECTOR OPERATIVO
FECHA DE INICIO	14 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE SUSPENSION N° 1	25 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE REINICIACION N° 1	25 DE ABRIL DEL 2022
TIEMPO DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSION N°1	2 MESES
NUEVA FECHA DE REINICIACION N°1	25 DE JUNIO DEL 2022
TIEMPO DE AMPLIACIÓN N° 2 A LA SUSPENSION N° 1	23 DÍAS
NUEVA FECHA DE REINIACION N° 1	12 DE JULIO DEL 2022
NUEVA FECHA DE SUSPENSION	15 DE JULIO DEL 2022
NUEVA FECHA DE REINICIACION	15 DE AGOSTO DEL 2022
FECHA DE TERMINACION	28 DE OCTUBRE DEL 2022

El (26) Veintiséis de octubre del 2022, se reunieron en la ciudad de (Ibagué), los suscritos, a saber:

HAROLD R. RORIGUEZ SANCHEZ, en su condición de supervisor del contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con **NIT 800.089.809-6**, de una parte; y por la otra, (**JOHANNA MILENA LINARES CLAVIJO**) identificado(a) con cédula de ciudadanía No 103200034 en su calidad de Representante Legal de la empresa (**BIOCIVIL ING LTDA**), identificada con NIT 809.006.054-1, con el fin de presentar la justificación de acta de modificación de cantidades e ítems no previstos, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:



**ACTA DE MODIFICACION DE
CANTIDADES E INCORPORACION DE
ITEMS NO PREVISTOS.**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-006

**FECHA VIGENCIA:
2021-07-15**

VERSIÓN: 03

Página 2 de 2

- Teniendo en cuenta que se realizaron obras de construcción de Gaviones para mitigar los efectos de la erosión en el cauce existente, estas requieren ser revestidas con mortero para preservar su funcionamiento y mejorar la condición de conservación del talud.

JOHANA MILENA LINARES CLAVIJO
Contratista

HAROLD R RODRIGUEZ SANCHEZ
Director Operativo
Supervisor(a)



CONTRATO DE OBRA N° 069 DE 28 DE ENERO DE 2022

OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE RED PARA DESCLOR DE LAVADO DE MODULOS PLANTA 1 UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL MAL DE LA POOL, PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LAS ZONAS COMUNES DEL CONJUNTO BRAZU II DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

CONTRATISTA: BOCHIL INGLITA

INTERVENIOR Y SUPERVISOR: DIRECTOR OPERATIVO

ACTUALIZADA DE OBRA

SISTEMA AUTOMATIZADO DE EJECUCION

COSQUO CLAS 008

FOCMA VISUAL

2022 - 01 - 12

VERSION 4

Página 1 de 2

Valor Contrato: (Si el contrato tiene adiciones ya sea en valor o plazo, sobre incluir las filas dentro el ítem los incrementos y rebajas).

117.600.000.00

90 Dias

14 MARZO DE 2022

28 DE OCTUBRE 2022

Fecha Terminación

28 DE OCTUBRE 2022

Fecha Elaboración Presente Acta

28 DE OCTUBRE 2022

Fecha Periodo de Ejecución Presente Acta

AGOSTO 4 OCTUBRE

Valor Presente Acta

\$ 21.903.971.82

ITEM	DETALLE	CONDICIONES CONTRATADAS										ACUMULADO ACTA 1			MODIFICACION DE CANTIDADES N° 1			PRESENTE ACTA			ACUMULADO TOTAL		
		CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
1	PRELIMINARES	53290	Servicios de construcción	0.00		\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
1.1	Localización y replanteo Topográfico	53290	Servicios de construcción	350.00	ML	\$ 5,100.00	\$ 1,785,000.00	251.05	\$ 1,280,355.00	98.95	\$ 504,645.00	0	\$ -	251.05	\$ 1,280,355.00	0	\$ -	251.05	\$ 1,280,355.00	0	\$ -		
1.1.2	Lleno compactado con material del sitio proveniente de la excavación	53290	Servicios de construcción	875.00	M3(comp)	\$ 25,250.00	\$ 22,531,250.00	221.16	\$ 5,694,870.00	653.84	\$ 16,836,380.00	0	\$ -	221.16	\$ 5,694,870.00	0	\$ -	221.16	\$ 5,694,870.00	0	\$ -		
1.1.3	Acarreo interno en obra 50 m³	53290	Servicios de construcción	400.00	M3	\$ 15,000.00	\$ 6,240,000.00	400.00	\$ 6,240,000.00	0	\$ -	0	\$ -	400.00	\$ 6,240,000.00	0	\$ -	400.00	\$ 6,240,000.00	0	\$ -		
3	EXCAVACIONES A MANO	53290	Servicios de construcción	0.00		\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
0	De 0 a 2 mts en Seco	53290	Servicios de construcción	0.00		\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
3.2	Excavaciones en material común	53290	Servicios de construcción	875.00	M3	\$ 31,000.00	\$ 27,125,000.00	368.67	\$ 11,428,770.00	-506.33	\$ -15,696,230.00	0	\$ -	368.67	\$ 11,428,770.00	0	\$ -	368.67	\$ 11,428,770.00	0	\$ -		
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA Norma Técnica Colombiana 3722-1 y Norma Técnica Colombiana 4764 (100% de Hermeticidad)	53290	Servicios de construcción	0.00		\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
15.1	De 0.00 a 2.00 Mts	53290	Servicios de construcción	0.00		\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
15.1.4	De Diámetro 16"	53290	Servicios de construcción	-350.00	ML	\$ 257,375.00	\$ -90,081,250.00	0.00	\$ -	-350	\$ -90,081,250.00	0	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
19	CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION	53290	Servicios de construcción	0.00		\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
19.1	DIAMETRO 1.20 Mts	53290	Servicios de construcción	0.00		\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
19.1.1	Base y salfuete en concreto de 3.000 Psi e = 0.30 Mts	53290	Servicios de construcción	7.00	und	\$ 505,000.00	\$ 3,535,000.00	0.00	\$ -	-2	\$ -1,010,000.00	5	\$ 2,525,000.00	5	\$ 2,525,000.00	0	\$ -	5	\$ 2,525,000.00	0	\$ -		
19.1.2	Paquete interior	53290	Servicios de construcción	30.00	ml	\$ 112,375.00	\$ 3,371,250.00	0.00	\$ -	-24	\$ -2,697,000.00	6	\$ 674,250.00	6	\$ 674,250.00	0	\$ -	6	\$ 674,250.00	0	\$ -		
19.1.4	Cono de reducción H=0.65 Mts	53290	Servicios de construcción	7.00	und	\$ 482,800.00	\$ 3,379,600.00	5.00	\$ 2,362,500.00	-2	\$ -905,000.00	0	\$ -	5.00	\$ 2,362,500.00	0	\$ -	5.00	\$ 2,362,500.00	0	\$ -		
19.1.5	Pasos en hierro de 24" con anticorrosivo C140 cm	53290	Servicios de construcción	30.00	und	\$ 19,825.00	\$ 594,750.00	0.00	\$ -	-20	\$ -396,500.00	10	\$ 198,250.00	10	\$ 198,250.00	0	\$ -	10	\$ 198,250.00	0	\$ -		
19.1.6	Suministro e instalación de Acustapas Completa Vibrocompactada	53290	Servicios de construcción	7.00	und	\$ 765,000.00	\$ 5,355,000.00	5.00	\$ 3,825,000.00	-2	\$ -1,530,000.00	0	\$ -	5.00	\$ 3,825,000.00	0	\$ -	5.00	\$ 3,825,000.00	0	\$ -		
20	OTROS	53290	Servicios de construcción	0.00		\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -		
20.5	Suministro e instalación Ladrillo en Grava para Cima de Tubería D=12 a 24"	53290	Servicios de construcción	70.00	M3	\$ 100,825.00	\$ 7,043,750.00	11.85	\$ 1,192,406.25	-58.15	\$ -5,851,343.75	0	\$ -	11.85	\$ 1,192,406.25	0	\$ -	11.85	\$ 1,192,406.25	0	\$ -		
20.38	Manejo de Aguas Con Diámetros de 12" a 24"	53290	Servicios de construcción	1.00	GLB	\$ 1,056,250.00	\$ 1,056,250.00	1.00	\$ 1,056,250.00	0	\$ -	0	\$ -	1.00	\$ 1,056,250.00	0	\$ -	1.00	\$ 1,056,250.00	0	\$ -		
0	OBRAS ADICIONALES	53290	Servicios de construcción	0.00		\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0.00	\$ -	0	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
0	ITEMS NO PREVISTOS	53290	Servicios de construcción	0.00		\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0.00	\$ -	0	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
INP1	difusor en ladrillo e=0.30 mts	53290	Servicios de construcción	10.00	ml	\$ 487,532.00	\$ 4,875,320.00	6.00	\$ 2,927,592.00	6	\$ 2,927,592.00	0	\$ -	6.00	\$ 2,927,592.00	0	\$ -	6.00	\$ 2,927,592.00	0	\$ -		
INP2	demolicion estructura concreto ciclopeo (medio mecanico)	53290	Servicios de construcción	1.00	m3	\$ 95,882.00	\$ 95,882.00	0.87	\$ 83,417.34	1	\$ 95,882.00	0.13	\$ 12,464.66	1.00	\$ 95,882.00	0	\$ -	1.00	\$ 95,882.00	0	\$ -		
0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA Norma Técnica Colombiana 3722-1 y Norma Técnica Colombiana 4764 (100% de Hermeticidad)	53290	Servicios de construcción	0.00		\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0.00	\$ -	0	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
0	de diámetro 20"	53290	Servicios de construcción	0.00		\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0.00	\$ -	0	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
INP3	de diámetro 20"	53290	Servicios de construcción	251.00	ml	\$ 408,531.00	\$ 102,491,081.00	251.00	\$ 102,491,081.00	0	\$ -	0	\$ -	251.00	\$ 102,491,081.00	0	\$ -	251.00	\$ 102,491,081.00	0	\$ -		
INP4	concreto de 2.5 Mpa (2500 PSI)	53290	Servicios de construcción	11.00	m3	\$ 728,613.00	\$ 8,014,743.00	11.00	\$ 8,014,743.00	14.15	\$ 10,308,873.95	3.15	\$ 2,295,130.95	14.15	\$ 10,308,873.95	0	\$ -	14.15	\$ 10,308,873.95	0	\$ -		
INP5	acero de refuerzo Egrado e instalado A-60	53290	Servicios de construcción	390.37	kg	\$ 8,530.00	\$ 3,327,664.00	309.37	\$ 2,677,664.00	1694	\$ 13,278,020.00	1082.489	\$ 9,016,966.77	1392.00	\$ 11,595,386.00	0	\$ -	1392.00	\$ 11,595,386.00	0	\$ -		
INP6	Concreto Ciclopeo (2500Psi) 17 Mpa Cimentacion	53290	Servicios de construcción	4.00	m3	\$ 604,517.00	\$ 2,418,068.00	0.00	\$ -	-4	\$ -2,412,890.20	4.00	\$ 2,412,890.20	4.00	\$ 2,412,890.20	0	\$ -	4.00	\$ 2,412,890.20	0	\$ -		
20.4	Gaviones Triple Torsion Cal 12, Suministro e instalación	53290	Servicios de construcción	12.00	m3	\$ 332,418.00	\$ 3,989,016.00	0.00	\$ -	12	\$ 3,989,016.00	12.00	\$ 3,989,016.97	12.00	\$ 3,989,016.97	0	\$ -	12.00	\$ 3,989,016.97	0	\$ -		
5.1	Mortero 1:3	53290	Servicios de construcción	1.50	m3	\$ 520,449.00	\$ 780,673.50	0.00	\$ -	1.50	\$ 780,673.50	1.50	\$ 780,673.50	1.50	\$ 780,673.50	0	\$ -	1.50	\$ 780,673.50	0	\$ -		
TOTALES											\$ -		\$ 149,074,048.59		\$ -		\$ 21,003,971.82		\$ 170,978,020.00				



ACTA FINAL DE OBRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-009
FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
VERSIÓN: 04
Página 2 de 2

BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 171.880.000
VALOR ACTA PARCIAL N°1	\$ 149.074.048
VALOR ACTA FINAL	\$ 21.903.972
VALOR SIN EJECUTAR	\$ 901.980
SUMAS IGUALES	\$ 171.880.000
BALANCE PRESENTE ACTA	
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 21.903.972
(-) AMORTIZACION ANTICIPO	\$ -
(-) VALOR A PAGAR EN ACTA DE LIQUIDACION	\$ 4.380.794
VALOR NETO A CANCELAR EN ESTA ACTA	\$ 17.523.177

BALANCE DEL ANTICIPO	
VALOR ANTICIPO	\$ -
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL N° -	\$ -
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	\$ -
SUMAS IGUALES	\$ -

BALANCE PARA PAGO ACTA DE LIQUIDACION	
VALOR PARA PAGO EN ACTA DE LIQUIDACION	\$ 34.195.604
VALOR ACTA PARCIAL N°1	\$ 29.814.810
VALOR ACTA FINAL	\$ 4.380.794
SUMAS IGUALES	\$ 34.195.604


SON: DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS

EL SUSCRITO INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE EL Y DE SUS TRABAJADORES

JOHANNA MILENA LINARES CLAVIJO
 CONTRATISTA

HAROLD ROLDÁN SANCHEZ
 SUPERVISOR

V° B° PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL IBAL

	CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PARA CONTRATOS DE OBRA	CÓDIGO: GJ-R-061
		FECHA VIGENCIA: 2019-09-19
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 2
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		

CONTRATO DE OBRA N°069 DEL 2022	
CONTRATANTE	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
CONTRATISTA	BIOCIVIL ING S.A.S

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DESCOLE DE LAVADO DE MÓDULOS DE PLANTA 1 UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL IBAL DE LA POLA, PARA MITIGAR AFECTACIONES EN LAS ZONAS COMUNES DEL CONJUNTO IRAZU II DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.
PLAZO INICIAL	NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	14 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1	25 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE REINICIACIÓN N°1	25 DE ABRIL DEL 2022
TIEMPO DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN N° 1	2 MESES
NUEVA FECHA DE REINICIACIÓN N°1	25 DE JUNIO DEL 2022
TIEMPO DE AMPLIACIÓN N° 2 A LA SUSPENSIÓN N° 1	23 DÍAS
NUEVA FECHA DE REINICIACIÓN N° 1	12 DE JULIO DEL 2022
NUEVA FECHA DE SUSPENSIÓN	15 DE JULIO DEL 2022
NUEVA FECHA DE REINICIACIÓN	15 DE AGOSTO DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE OCTUBRE DEL 2022
VALOR INICIAL	\$ 171.880.000
VALOR ADICIÓN N°	N-A
VALOR TOTAL	\$170.978.020,00
SUPERVISOR	HAROLD R. RODRIGUEZ SANCHEZ-DIRECTOR OPERATIVO

El suscrito HAROLD R. RODRIGUEZ SANCHEZ del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, en su calidad de supervisor del contrato de obra 069 de 2022:

CERTIFICA:

Contratista persona natural <input type="checkbox"/>	Contratista persona jurídica <input checked="" type="checkbox"/>
2. El contratista presentó la planilla número _____ de fecha _____ en la que consta que ha efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión, y riesgos laborales, de él y del personal a cargo (Cuando a ello hubiere lugar), para el	2. El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social



**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES
AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES PARA
CONTRATOS DE OBRA**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-061

FECHA VIGENCIA:
2019-09-19


VERSIÓN: 01

Página 2 de 2

período de _____. Verificado el monto de cada uno de los aportes en la planilla, se constató que se ajusta a la base de liquidación que aplica para este tipo de contratos.

Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

Se expide la presente constancia para efectos del respectivo pago en la ciudad de Ibagué, a los 28 días del mes de octubre del año 2022.




HAROLD R. RODRIGUEZ SANCHEZ
Director operativo
Supervisor

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

ALBERTO CRIALES VARGAS identificado con CC. 93.120.297 de Espinal, y con tarjeta profesional No. 107117-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de BIOCIVIL ING SAS identificada con NIT 809006054-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de IBAGUE luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico que conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, nos encontramos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Ibagué, a los 03 días del mes de octubre de 2022. ✓



ALBERTO CRIALES VARGAS
CC. 93.120.297 de Espinal
CONTADOR PUBLICO
TP. 107117-T
REVISOR FISCAL BIOCIVIL ING SAS
NIT:809006054-1

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

107117-T

ALBERTO CRIALES VARGAS
C.C. 93120297
RES. INSCRIPCIÓN 257 DEL 16/12/2004

UNIVERSIDAD DE IBAGUE

Jose Orlando Ramirez Zuluaga

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

273820 116747




Identificación Píctica S.A. 10042/0111

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

Jose Orlando Ramirez Zuluaga

FIRMA




COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **93.120.297**
CRIALES VARGAS

APELLIDOS **ALBERTO**

NOMBRES

Jose Orlando Ramirez Zuluaga

FIRMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO **19-ABR-1963**

ESPINAL
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

14-JUL-1981 ESPINAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO



A-2900100-01058094-M-0093120297-20190125 0064328444A 1 6365286014

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A F 6 E 2 9 9 9 C 7 E 6 F D F 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ALBERTO CRIALES VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93120297 de ESPINAL (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 107117-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Septiembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-11-04, 12:19:41 PM
Período de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2022
Período de Cotización Para Salud	noviembre de 2022
Empresa	BIOCIVIL ING SAS
NIT	NI 809006054
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1049974016
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1740905261
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 859.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	\$ 400.000	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	2	\$ 100.000	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1	\$ 40.000	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	3	\$ 179.300	\$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	1	\$ 40.000	\$ 0
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	2	\$ 100.000	\$ 0

SubTotales: \$ 859.300 \$ 0
Total a Pagar: \$ 859.300



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-10-03, 06:57:29 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2022
Empresa	BIOCIVIL ING SAS
NIT	NI 809006054
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1048431385
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1686859924
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 990.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	\$ 400.000	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	1	\$ 85.400	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	2	\$ 100.000	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	2	\$ 61.400	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	4	\$ 182.100	\$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	2	\$ 61.400	\$ 0
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	2	\$ 100.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 990.300	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 990.300



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-08-27, 02:28:11 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2022
Empresa	BIOCIVIL ING SAS
NIT	NI 809006054
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1048331737
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1622395917
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 973.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	\$ 400.000	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	1	\$ 74.700	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	2	\$ 100.000	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	2	\$ 58.700	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	4	\$ 181.800	\$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	2	\$ 58.700	\$ 0
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	2	\$ 100.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 973.900	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 973.900



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-08-17, 12:10:04 PM
Período de Cotización Otros Riesgos	Julio de 2022
Período de Cotización Para Salud	agosto de 2022
Empresa	BIOCIVIL ING SAS
NIT	NI 809006054
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1047543740
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1607086823
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 864.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	\$ 400.000	\$ 2.100
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	2	\$ 100.000	\$ 600
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1	\$ 40.000	\$ 300
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	3	\$ 179.300	\$ 1.000
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	1	\$ 40.000	\$ 300
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	2	\$ 100.000	\$ 600

SubTotales: \$ 859.300 \$ 4.900
Total a Pagar: \$ 864.200





Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-07-17, 03:12:51 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2022
Empresa	BIOCIVIL ING SAS
NIT	NI 809006054
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1047079663
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1558010504
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 859.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	\$ 400.000	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	2	\$ 100.000	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1	\$ 40.000	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	3	\$ 179.300	\$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	1	\$ 40.000	\$ 0
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALGO DEL TOLIMA - COMFENALCO	2	\$ 100.000	\$ 0

SubTotales: \$ 859.300 \$ 0
Total a Pagar: \$ 859.300



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-06-30, 03:13:17 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2022
Empresa	BIOCIVIL ING SAS
NIT	NI 809006054
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1046329816
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1529585095
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 859.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	\$ 400.000	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	2	\$ 100.000	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1	\$ 40.000	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	3	\$ 179.300	\$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	1	\$ 40.000	\$ 0
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	2	\$ 100.000	\$ 0

SubTotales: \$ 859.300 \$ 0
Total a Pagar: \$ 859.300



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-05-22, 01:34:57 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2022
Empresa	BIOCIVIL ING SAS
NIT	NI 809006054
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1045640936
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1469500475
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 859.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	\$ 400.000	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	2	\$ 100.000	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1	\$ 40.000	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	3	\$ 179.300	\$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	1	\$ 40.000	\$ 0
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	2	\$ 100.000	\$ 0

SubTotales: \$ 859.300 \$ 0
Total a Pagar: \$ 859.300

Contrato N° 069 del 28 Enero de 2022.

Entidad Contratante: Empresa Itzaquera de Acueducto
y Alcantarillado IBAL SA E.S.P.

Contratista : Biocivil Ing SAs.

Nit : 809.006.054-1

Objeto : Contrato de obra para la construcción
de red para descole de lavado de
módulos de planta 1 ubicada en las
instalaciones del Ibal de la pala,
para mitigar afectaciones en las
zonas comunes del Conjunto Trazú II
en la ciudad de Itzaquí

Valor del Contrato : (\$171.880.000)

plazo : 90 Días

Fecha de Inicio : 14 Marzo de 2022

Fecha Suspensión N° 1 : 25 de Marzo de 2022

Ampliación Suspensión 1 : 2 meses

Ampliación Suspensión 2 : 23 días

12 de Julio de 2022.

En las instalaciones de la Empresa Ibaquereña de Acueducto y alcantarillado IBAL. Se reunieron el Ingeniero Harold R. Rodríguez Sánchez Director operativo en calidad de Supervisor por parte del IBAL, la Ingeniera Johanna Milena Linares Clavijo en representación de la entidad Contratista Biocivil para dar inicio a las labores contratadas, en la que se determinó hacer visita en la obra para determinar las condiciones actuales del plan de trabajo.

13 de Julio de 2022.

Se realizó visita de campo al sitio donde se va hacer la construcción del descole en compañía de funcionario del Instituto Ibaquereño de Acueducto y alcantarillado Ibal, se recorrió la línea prevista, se encontró que existía una línea de alcantarillado de aguas negras con sus respectivos pozos (2) de inspección. En el recorrido se notó unos sectores donde las excavaciones iban hacer muy superiores y además existía dificultad por la pendiente y material vegetal para lo cual se determinó realizar un trabajo conjunto entre el topógrafo de la empresa del Instituto de acueducto y alcantarillado Ibal y el Contratista.

donde se llegaría a la forma más efectiva de llevar a cabo el objeto del contrato.

14 de Julio de 2022

Se realiza visita conjunta para mirar y determinar la mejor opción para la construcción de descole por lo cual se plantean la línea base y los niveles requeridos para la ejecución del proyecto, para esta actividad se lleva el respectivo equipo de topografía compuesto por un nivel de precisión.

Se espera el respectivo trabajo de oficina a fin de obtener la línea definitiva donde va la línea de la obra de descole.

En este trabajo de campo se logra identificar que existe un red de alcantarillado de aguas negras y un encofrado.

Regio fotografica


scor ab alky ab 01



15 de Julio de 2022

Se realizó el trabajo de oficina materializando la posible línea de descole a ejecutar, teniendo en cuenta las condiciones actuales del terreno como lo son pendientes, vegetación y actividades de excavaciones.

ESQUEMA DESCOLE

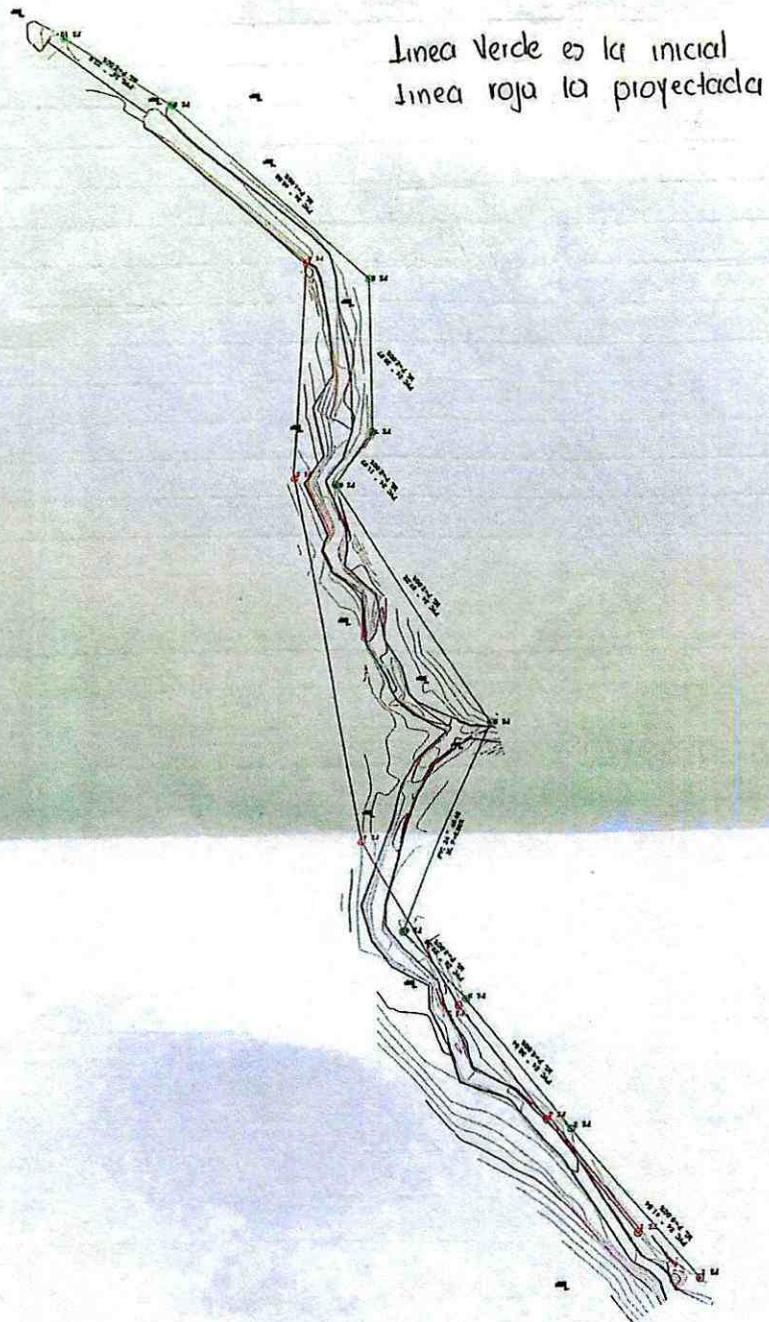

18 de julio de 2022

Se realizó comité técnico en las oficinas del IBAL con el propósito de plantear el nuevo trazado del descole, con el fin de buscar la solución más conveniente para este proyecto.

De igual forma se tomaron las siguientes decisiones:

1. Utilizar tubería de 20"
2. Realizar una caja en concreto
3. Se requiere un viaducto

Con esta nueva línea se reduce de manera significativa las cantidades de excavación y se disminuye la afectación al componente vegetal.

Se solicita por parte del IBAL entregar los cortes del nuevo trazado.

19 de julio de 2022

Una vez materializada la línea se procedió a definir los puntos y los respectivos pozos en terreno y se realizaron actividades de desmonte y limpieza que permitieran demarcar la zona de trabajo

21 de Julio de 2022


En atención a la recomendación y sugerencia por parte de la dirección operativa del IBAL SA Esp, de iniciar por el sector del descole en el sector, además a raíz, se procede a continuar las labores de roceria y limpieza del trazado, así como la instalación definitiva del alineamiento, en apoyo conjunto con topografía se definen niveles, alturas y condiciones para la optimización de la línea.


Se propone la construcción en el tramo inicial de una Caja de 1.20 x 1.20 con 1 m de altura, para darle manejo al caudal y reducir la energía en este punto.

Se indica a continuación la relación de pendientes, distancias y observaciones para el manejo de las condiciones de trabajo, tomando como relación que se debe construir una estructura tipo viaducto con una longitud de 11 mb la cual va a manejar un desnivel propuesto del 11, para favorecer las condiciones del terreno y un manejo apropiado del tramo.

Inicio	Fin	P	D	Observación
Bates Salida	Caja 1	12.7	30 m	En el punto de la Caja Exc. 1 m
Caja 1	pozo palo	2.87	35.30	En el punto del pozo Excava 1m. la Salida en la Caja es a + 0.50 de la llegada
pozo palo	pozo Talla x	1.37	60 m	En el punto del pozo TX, excav 50 y la Salida es 5cm por encima de la llegada
pozo Talla x	Dado del Cruce 1	1.07	34 m	En el punto del Cruce se sube 40 cm del terreno Natural
Dado Cruce 1	Dado Cruce 2	1.07 Viaducto	11 m	En el punto Cruce 2. Se sube 30 cm del terreno natural

Crudo 2	pozo 3	5.17.	23	llega en cero solo limpieza del terreno.
pozo 3	pozo 4	1.587.	31.50	llega en cero y solo requiere limpieza
pozo 4	Caja Encade	3.07.	36.60	llevar pendiente al nivel del encontrado oxígeno.

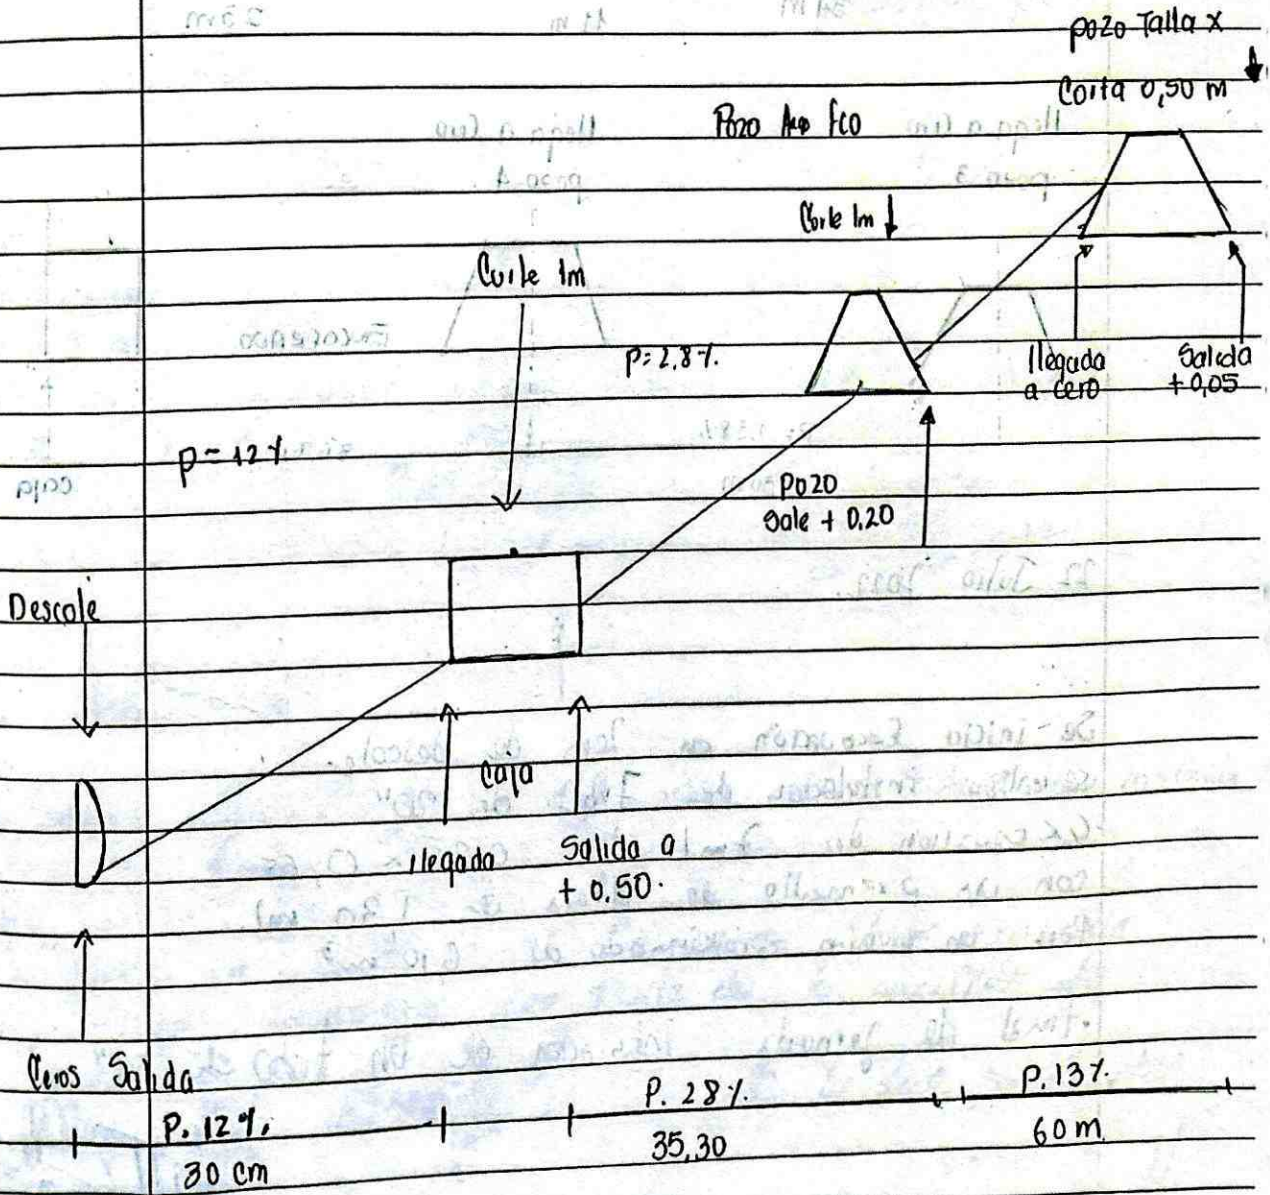

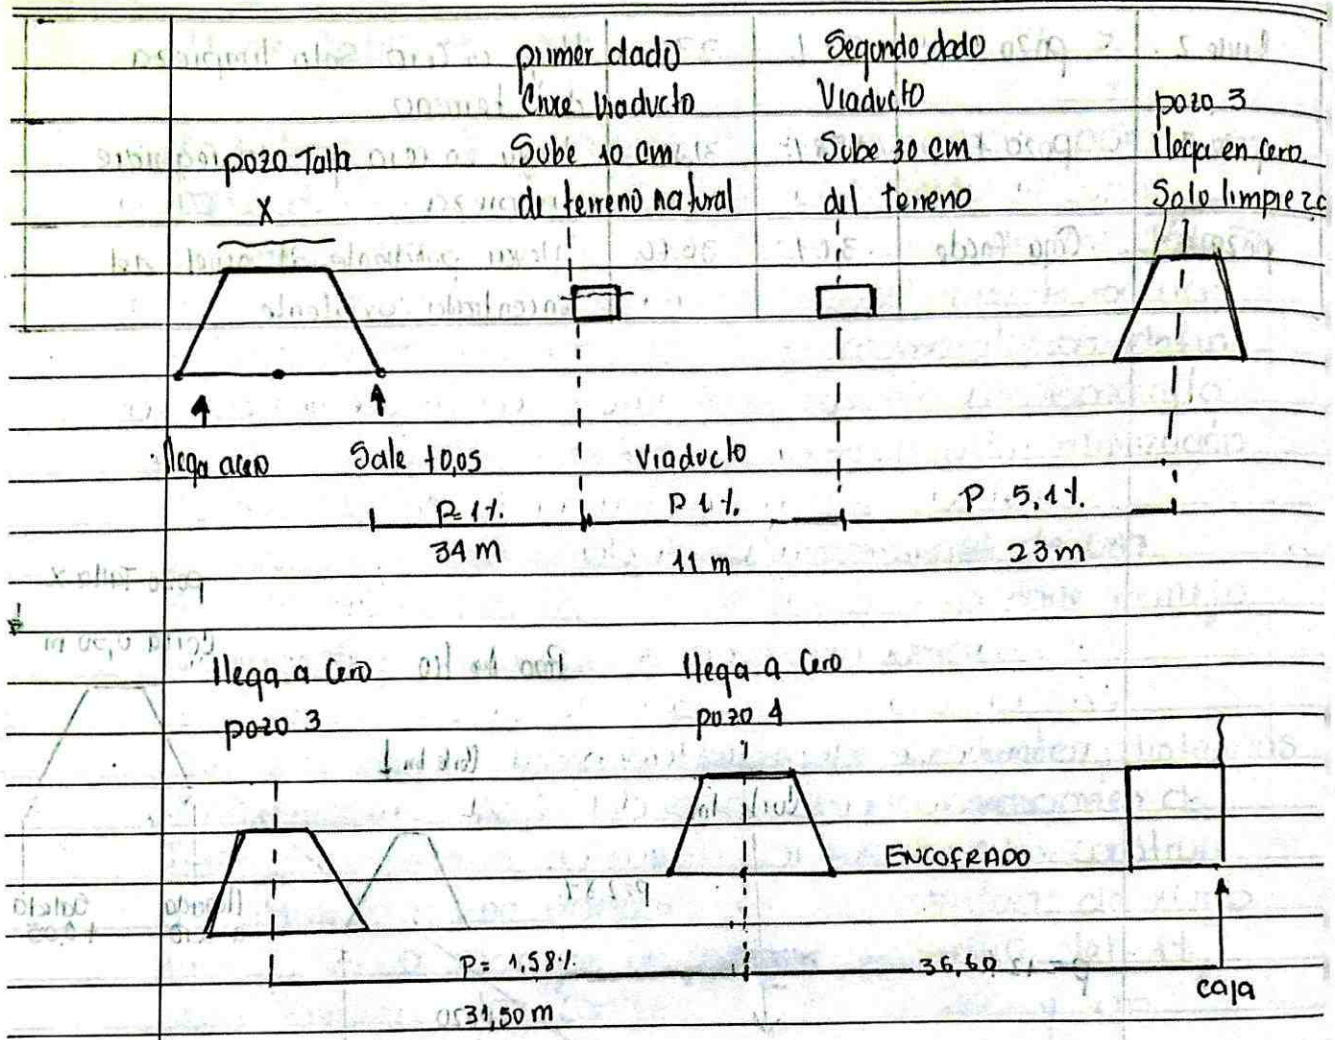

22 Julio 2022.

Se inicio Excavación en zona de descole
 se realiza instalación de tubo de 20"
 Excavación de fudo de $0,85 \times 0,65$
 con un promello de altura de 1,30 ml.
 Para un volumen aproximado de $6,10 \text{ m}^3$

final de jornada instalación de un tubo de 20"

[Handwritten signature]
 22-07-22

23 Julio 2022

Se continua Excavacion, para la instalacion de 2 tubos.


• Se realiza instalacion de arena en lecho filtrante d

• Se avanza con 19,4 ml de Excavacion inicial 1,20
final 1,0

total Area 15,50 m³ Excavacion

se instalan dos tubos.

• se continua rosaria y limpieza, para replanteo topografico


23-07-22

26 Julio 2022


• se continua Excavacion. se avanza en 22 ml

Altura inicial: 0,8 ml - promedio Excavacion

Altura final: 0,65 ml

• se realiza Excavacion para caja 1,4 x 1,40 x 1,20

total Excavacion de 10,7 m³


20-07-22

27 Julio 2022

Se continuan labores de instalacion de tuberia se instala
1 tubo de 6 ml. 20"


• se Perfilto Excavacion

• Se verifican medidas de Excavacion y se procede
a verificar pendientes por parte de la comision de

topografia

• se suspenden actividades en honor de la fiesta por fiestas

Nawal


27-07-22

20 Julio 2021

- Se reanuda labores de instalación de tubería
- Debido a fuertes lluvias no se pueden continuar labores de excavación,
- Se utiliza motobomba para retirar inundación
- Se continúan labores de limpieza y reserías
- Comisión de topografía continuo replanteo y control de niveles

[Signature]
20-07-21


30 Julio 2021

- Se inician labores de excavación para pozos fijos
- Perfilado de terreno, toma de niveles, puestas y emb. de excavación para tubería de 20"
- Llenado y compactado de primer tramo de tubería instalada

[Signature]
30-07-21

1. Agosto 2022


- Continúa Excavación para construcción de pozos
- Se inicia construcción de cilindro pozo final
- Se continúa con 15 m² de excavación.
- Se pasan niveles y se realiza cambio de dirección al alineamiento.
- Se identifican puntos para cruce de Vialidad.
- Se suspende actividades en la tarde por fuertes lluvias


01-08-22

2 Agosto 2022.

- Perfilado y Verificación de nivel. para instalación trazo, continuación de instalación de tubería de 20".
- Excavación 12m², perfilado de (puntos para instalación de Vialidad)

- Se fijan alturas de topas para pozos.
- Se realiza trincho en zona alta para protección del talud.


02-08-22


03 Agosto 2022

Se atrende visita de verificación por parte de personal de IBAM, donde se aceptan recomendaciones constructivas frente a la instalación de tubería y altura de pozos.

La comisión de topografía replantea y pasa niveles para continuación de tramo superior. Se adelantan labores de rosaría y limpieza.

Se instalan 3 fibras de 40"

03-08-22



04 Agosto 2022


Se continúa instalación de tubería de 20". Labores de excavación para finalizar tramo de viaducto.

Se definen niveles en línea de pendientes cruce viaducto;

Se continúa instalación de lleno y compactación del mismo.

Se realiza demolición de caja de descale.

05-08-22



05- Agosto -2022

Se recibe visita por parte de personal IBAW, Auditoria ASEQ, para validacion de condiciones de trabajo.

Se continua con el lleno y compactacion de material,


• Se realiza instalacion de 2 tubos en diametro de 20".

[Signature]
05-08-22

09/ Agosto -2022

• Se continuan labores de construccion de pozos a la fecha se lleva instalacion de 21 tubos de $\varnothing 20"$.

Se establecen lineamientos par recubrimiento en tierra

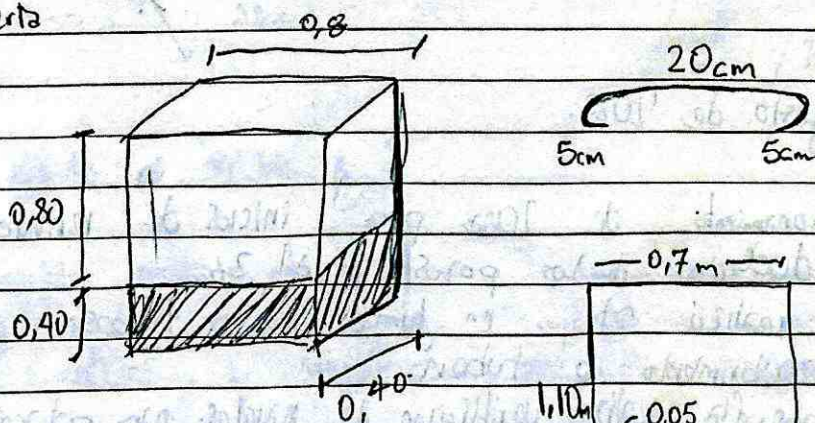


• Se solicita al personal el uso del casco

[Signature]
09-08-22

13 Agosto 2022

- Se realiza verificación de alturas en pozos
- A la fecha se tienen 24 tubos instalados
- Se continúa con construcción de pozos
- Se miran labores de excavación y fijación de los estratos para viradento.

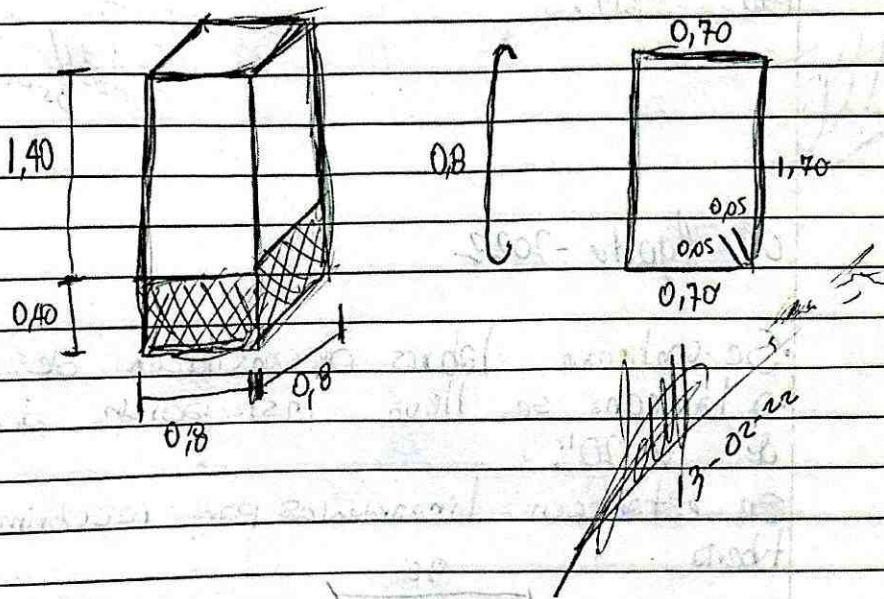

15 Agosto de 2022

Acondicionamiento de zonas para inicio de remates en conos de reducción de los pozos 9 al 2,


- Se realizó ataque en juntas de tubos dando inicio al recubrimiento de tubería.
- Topografía realiza verificación de niveles para ubicación de viradento
- Se realiza replanteo para trinchero en cuadro y frezo alzado
- Se realiza limpieza sobre trazo final

16 Agosto 2022

• Se realiza limpieza de encofrado existente y se continua con replanteo de tubería hasta la caja de encodo, ubicada en el inicio del trazado.

• Se continúan con actividades de nivelación para instalación de tubería faltante.

• Se realiza balance de cantidades de concreto y se realiza fijado de hierro para recubrimiento en juntas de tubería.


 16.08.22

17 Agosto 2022.

• Se continúa con instalación de tubería, y Pañete interior de pozos;

• Se realiza vano y compactado de material de prostramas

De acuerdo a lo evidenciado, se realiza, actividades de limpieza y aseo en obra.

 17.08.22

18 Agosto 2022.

• Se realiza recorrido con personal de IBAL para control y seguimiento de actividades, observaciones a procesos constructivos y Verificación de avance de obra.

• Se dispone a la continuación de las actividades de instalación, y ataque de tubería expuestas.


• Con relación y verificación de supervisa operativo, se realizan modificaciones a las pendientes.

19 Agosto de 2022

Tras realizar las respectivas modificaciones de las pendientes se continúan y se verifican los respectivos niveles de la tubería para darle continuidad a la instalación de la misma.

Se suspenden actividades durante el resto de la jornada por intensa lluvia presentada.


Nuevamente se realiza visita por parte del personal HSEQ de BAI, verificando condiciones o instrucciones en visita exterior.


19-08-22

20 Agosto.

Se coordina la instalación de tubería sobre el encofrado existente, tomando como condición obligada la entrega a una caja de encofrado que será construida en el tanque de rebosa existente.

Se realiza adecuación de fincha en grado, para conservar circulación al trasiego de material.


20-08-22

22-Agosto 2022

- Se finaliza la instalación de tubería, se continúa con parete de pozos. instalación de arrotapas en los pozos ya con parete finalizado.
- Se realiza recubrimiento de tramos de tubería expuesta.

23 Agosto 2022

- Se continúan con las actividades, de instalación de tubería para encofrar, y se realiza emparillado.

Se adecua formaleta para caja de encenso

Agosto 24. 2022

Se continúa con actividades de instalación de tubería con las actividades de Rellenos y muestros para armar la tubería
Pue Pue

Agosto 24. 2023.

En la mañã no se pudo
trabaja por condiciones climáticas
por presentar fuertes lluvias;
que impiden el normal
desarrollo de las actividades
programadas

Fin Fin.

Agosto 25. 2023

Se sigue transportado la
tobaca para seguir
manteniéndola y de igual forma
se realiza el respectivo
registro y comprobación del
material

Fin Fin.

Agosto 26. 2023.

Se instalan las tapas de
(a) colectores se pintan
(b) canales y se sigue
llemando la tobaca

Fin

Septiembre 5 - 2023

Se termino Toda la
localización de la tubería
con los correspondientes abrigos
y rellenos.

Fin Fin

Septiembre 6

Se realiza la localización
de los ganimas se establecen
la altura y cantidad de los muros.

Septiembre 7.

Se encuentra la dificultad
para poder colocar la piedra
y materiales como arena,
Cemento y Mallas, aún no
nos autorizan el permiso para
poder entrar la piedra por la
parte de arriba.

Se sigue estudiado la
question para poder entrar los
materiales.

Se reanudarán las actividades
hasta cuando den el respectivo
permiso.

Fin Fin.

Octubre 10. de 2023

Nos dieron Permiso para
entrar la piedra, se organizo
la ruta de poder llevar los
materiales.

Paula

Octubre 11. de 2023

Se Expone a definir la
piedra en la parte Superior.
por donde daron Permiso

Paula

Octubre 12 de 2023

Se Sigue transportada Piedra
en el lugar donde dieron
Permiso

Paula

Octubre 13 de 2023

Con los trabajadores se
Expone la actualidad de
llevar la piedra desde donde
entra la volquete hasta el
lugar donde se construyen los
cimientos

Paula

14 de octubre 2023

Se sigue llevando la
pedra hasta el sitio de
trabajo.

Quila

17 de octubre 2023

Se termina de llevar la
pedra arena y cemento,
malla madera alambre pautilla
para tener todo listo.

Quila

17 de octubre

Se realiza el respectivo
Replanteo y excavaciones
requeridas para la construcción
de los gaviones.

Quila

19 octubre 2023

Se arma la malla se hacen
los tablones en madera y
se fija el alambre

Quila

21 de octubre 2023

Teniendo listo el terreno se
empieza con las actividades de
llenado de los muros de
ganera

Carla

22. octubre 2023

Se sigue con las actividades
de llenado de los muros y
se termina la actividad de
armado de ganeras

Carla

25. octubre 2023

Se realiza la primera etapa
de recubrimiento de la parte
inferior del muro en ganera

Carla

26 de octubre 2023

se realiza la segunda etapa
de recubrimiento del muro en
ganera

Carla

27 de Octubre. 2023

Se retira la fomaleta del
recibimiento del curso en gansen
y se realiza la respectiva
limpieza y aseo de la obra

Plu Plu

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Ilustración 1. Topografía



Ilustración 2. Excavación



Ilustración 3. Construcción de gaviones





Ilustración 5. Construcción pozos de inspección



PAZ Y SALVO ALMACÉN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: AF-R-222

FECHA VIGENCIA:
2021-02-22

VERSIÓN: 00

Página 27 de 27


EL SUSCRITO ALMACENISTA GENERAL DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

CERTIFICA:

Que de acuerdo al contrato de obra N° 069 DEL 28 DE ENERO DE 2022 cuyo objeto es "CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE RED PARA DESCOLE DE LAVADO DE MODULOS DE PLANTA 1 UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL IBAL DE LA POLA, PARA MITIGAR AFECTACIONES EN LAS ZONAS COMUNES DEL CONJUNTO IRAZU II DE LA CIUDAD DEL IBAGUE.", celebrado entre el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, y la empresa denominada BIOCIVIL ING LTDA identificada con NIT. 809.006054-1 su representante legal, JOHANNA MILENA LINARES CLAVIJO identificada con cedula de ciudadanía 1.032.400.034 de Bogotá, se encuentra a PAZ Y SALVO, con esta dependencia.



Almacenista General

 IBAL SIG <small>LA ESPERANZA</small> <small>COMUNIDAD ASISTIDA POR LA NACIÓN</small>	SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA PAZ Y SALVO	CÓDIGO: GJ-R-050
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
		VERSIÓN: 02
		Página 1 de 1

EL SUSCRITO SUPERVISOR


HAROL R. RODRIGUEZ SANCHEZ, obrando como director operativo-supervisor del contrato 069 que tiene por objeto: **CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DESCOLE DE LAVADO DE MÓDULOS DE PLANTA 1 UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL IBAL DE LA POLA, PARA MITIGAR AFECTACIONES EN LAS ZONAS COMUNES DEL CONJUNTO IRAZU II DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ**

CERTIFICO:

Que, el sitio donde se desarrolló la obra citada con anterioridad no pasa redes de servicios domiciliarios de energía, gas, telefonía, por lo tanto, no es requerido el paz y salvo de empresas de servicios públicos.



HAROLD R. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR OPERATIVO

	SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA	CÓDIGO: GJ-R-050
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
		VERSIÓN: 02
		Página 1 de 1


PAZ Y SALVO

EL SUSCRITO SUPERVISOR

HAROL R. RODRIGUEZ SANCHEZ, obrando como director operativo-supervisor del contrato 069 que tiene por objeto: **CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DESCOLE DE LAVADO DE MÓDULOS DE PLANTA 1 UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL IBAL DE LA POLA, PARA MITIGAR AFECTACIONES EN LAS ZONAS COMUNES DEL CONJUNTO IRAZU II DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ**

CERTIFICO:

Que, el sitio donde se desarrolló el contrato citado anteriormente no se encuentran viviendas aledañas, por lo anterior no es requerido el respectivo paz y salvo.



HAROLD R. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR OPERATIVO

No. Radicado: 08SE2023747300100006205
Fecha: 2023-06-29 10:29:52 am
Remitente: Sede: D. T. TOLIMA
Depen: DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL
Destinatario: BIOCIVIL ING SAS
Anexos: 0 Folios: 1


08SE2023747300100006205

**LA SUSCRITA DIRECTORA TERRITORIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO
TERRITORIAL TOLIMA**



CERTIFICA QUE,

Una vez verificada la base de datos de reclamaciones, investigaciones administrativas laborales en la **DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DEL MINISTERIO DE TRABAJO**, se evidenció que la empresa y/o persona natural identificada de la siguiente manera,

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	BIOCIVIL ING SAS
IDENTIFICACION NIT Y/O CEDULA	809.006.054-1
No. RADICADO Y FECHA	11EE2023747300100001967 - 02/06/2023

NO REGISTRA INVESTIGACIONES, QUERELLAS ADMINISTRATIVAS, NI SANCIONES EN SU CONTRA.

La presente certificación corresponde de **mayo de 2022 a mayo de 2023** y su validez se extiende al Departamento del Tolima y sus respectivas Jurisdicciones, lo anterior es de acuerdo con Numeral 19 Art. 1 de la Resolución 2143 de 2014.

El presente certificado se expide en la ciudad de Ibagué, a los veintinueve (29) días del mes de junio de 2023.

TATIANA GARCÍA R
JESSICA TATIANA GARCIA RENZA

Directora Territorial Tolima

Elaboró:
Diego López
Profesional Universitario
Mintrabajo - DT Tolima

Revisó:
Diego López
Profesional Universitario
Mintrabajo - DT Tolima

Aprobó:
Jessica García
Directora
Mintrabajo - DT Tolima

Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.



MINISTERIO DEL TRABAJO

LA SUSCRITA DIRECTORA TERRITORIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO TERRITORIAL TOLIMA

CERTIFICA QUE,

Una vez verificada la base de datos de reclamaciones, investigaciones administrativas laborales en la **DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DEL MINISTERIO DE TRABAJO**, se evidencio que la empresa y/o persona natural identificada de la siguiente manera,

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	BIOCIVIL ING SAS
IDENTIFICACION NIT Y/O CEDULA	809.006.054-1
No. RADICADO Y FECHA	05064 DEL 27-12-2022

NO REGISTRA INVESTIGACIONES NI QUERELLAS ADMINISTRATIVAS, NI REGISTRA SANCIONES EN SU CONTRA.

La presente certificación corresponde de **noviembre de 2021 a noviembre de 2022** y su validez se extiende al Departamento del Tolima y sus respectivas Jurisdicciones, lo anterior es de acuerdo con Numeral 19 Art. 1 de la Resolución 2143 de 2014.

El presente certificado se expide en la ciudad de Ibagué, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2022.

TATIANA GARCÍA R.

JESSICA TATIANA GARCIA RENZA
Directora Territorial Tolima

Elaboró: Alejandra N.G.
Revisó: María Giovanna M.
Coordinador IVC: Adriana G.
Coordinador GACT: Gina C.
Aprobó: Jessica G.R.

Sede Administrativa
Dirección: Carrera 14 No. 99-33
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13
Teléfono PBX
(601) 3779999

Atención Presencial
Con cita previa en cada
Dirección Territorial o
Inspección Municipal del
Trabajo.

Línea nacional gratuita
018000 112518
Celular 120
www.mintrabajo.gov.co



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social BIOCIVIL ING SAS identificado con el NIT 809006054, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
192019	mantenimiento de areas de impo	puli cundinamarca	150,000	2019-12	30-DIC-2019	64320477
193	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	PULI CUNDINAMARCA	50,600	2018-06	04-JUL-2018	61178575
CTO 014-2010	MANTENIMIENTO DE VIAS	Sin Ciudad de la Obra	156,650	2011-01	07-ENE-2011	15796509
023	CONSTRUCCION 12 UNID VIVIENDA	809006054	250,000	2022-10	24-ENE-2023	83605162
SAMC 0092017	Mejoramiento y adecuacion CDI	QUIPILE	151,400	2017-12	19-ENE-2018	60509177
036	construccion de placa huella e	puli cundinamarca	250,000	2018-12	13-DIC-2018	61951116
CO1772018	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION	LA MESA	230,000	2019-03	02-JUL-2019	62923142
CT-069-2022	CONSTRUCCION DE RED PARADESCO	809006054	150,000	2022-10	06-SEP-2023	96349482
CTO 016-2010	MANTENIMIENTO DE VIAS	Sin Ciudad de la Obra	143,400	2011-01	07-ENE-2011	15796500
36	CONSTRUCCION PLACA HUELLA PULI	PULI CUNDINAMARCA	81,500	2018-04	14-JUN-2018	61072956
Sin Numero de Licencia o Contrato	Sin Nombre de la Obra	Sin Ciudad de la Obra	100,000	2010-10	09-OCT-2010	15602546
Sin Numero de Licencia o Contrato	Sin Nombre de la Obra	Sin Ciudad de la Obra	100,000	2010-12	04-DIC-2010	15721662
082-2021	BARBACOAS	RIOBLANCO	140,000	2021-11	16-NOV-2021	72870631
2022017	Suministro alumbrado publico	Puli	23,400	2017-12	01-FEB-2018	60556398
892018	Unidades san Consorcio la Mesa	La mesa Cundinamarca	250,000	2018-07	08-MAY-2019	62591341
71	construccion de 30 unidades de	Puli	380,000	2018-12	19-DIC-2018	61973317
Sin Numero de Licencia o Contrato	Sin Nombre de la Obra	Sin Ciudad de la Obra	95,000	2010-11	06-NOV-2010	15659261



Certificado No.
SC-CER939691-1

Pág. 1





El empleo
es de todos

Mintrabajo

Sin Numero de Licencia o Contrato	Sin Nombre de la Obra	Sin Ciudad de la Obra				
760 2011	Construcci?n muro de contenci?	YAGUARA HUILA	92,450	2010-11	06-NOV-2010	15659229
178	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE?O	PULI	160,700	2011-12	10-OCT-2012	17208256
092 de 2013	CONSTRUC CELDA DISPOS RESIDU	CHAPARRAL	283,850	2018-05	24-MAY-2018	60992614
204	construcci?n de vivienda	Puli	399,150	2015-03	27-MAR-2015	20630994
Sin Numero de Licencia o Contrato	Sin Nombre de la Obra	Sin Ciudad de la Obra	250,000	2018-12	04-FEB-2019	62129518
			132,550	2010-12	04-DIC-2010	15722777
		Total	4,020,650			

Expedido por el SENA, a los seis (06) dias del mes de Septiembre de 2023

“LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC.”

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

SENA, MÁS TRABAJO

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2023-09-06

Generado por : Certificados En Linea

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 3543364995 - 220893

SENA, MÁS TRABAJO



Certificado No:
SC-CER25981-1

Pág. 2



COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	96349482	144917938	06/09/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **809006054**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.146.54.183**

Su transacción fue **Total Pagado \$ 150,000.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 150,000.00	COP\$ 150,000.00

HT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	96349482	144917938	06/09/2023

Número de Identificación

809006054

Primer Apellido (si es Persona natural)**Dígito de Verificación (Si es persona**

1

Departamento

TOLIMA

Dirección de Domicilio

CRA 7 27A 15 BRR BELALCAZAR

Localización

Nacional

Correo electrónico

biocivilingenieriosltada@gmail.com

Regional

Tolima

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DESCO

Fecha Terminación Obra

28/10/2022

Tipo FIC

Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)

Mes Periodo a Pagar

10

Costo Total Mano de Obra

15000000.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

BIOCIVIL ING LTDA

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

IBAGUE (TOLIMA)

Ciudad de Domicilio

IBAGUE

Teléfono de Contacto

+57,2664260

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-073-000000

Número Contrato de Obra

CT-069-2022

Fecha Inicio Obra

14/03/2022

Ciudad de Ejecución de la Obra

809006054

Año Periodo a Pagar

2022

Costo Total de Obra a Todo Costo

171880000.00

Número de Trabajadores en el Periodo

4

Aporte FIC

150000.00

Valor del Pago

150000.00

Ibagué, 18 de diciembre 2023

Doctora:
JOHANNA MILENA LINARES
Biocivil Ing SAS
Referencia CT-069-2022.
Ciudad

Asunto: Recibido de Información.

Respetada Doctora Linares:

Reciba cordial saludo, desde el Centro de Comando y Control del IBAL – CECOI, me permito informar que se recibe información digital del contrato 069 del 2022, los cuales hacen referencia de las intervenciones realizadas en los siguientes puntos:

“CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DESCOLE DE LAVADO DE MÓDULOS DE PLANTA 1 UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL IBAL DE LA POLA, PARA MITIGAR AFECTACIONES EN LAS ZONAS COMUNES DEL CONJUNTO IRAZU II DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ”

Dentro de las carpetas adjuntas, se recibió la siguiente información: Ficha técnica, Posicionamiento Mojones, Postproceso, Efemérides precisas, Datos Crudos, Rinex IBAG, Coordenadas semanales, Informes Generales, Cartera de Nivelación, Cartera de detalles, Planos, Licencia Profesional.

Agradezco la gestión realizada.

Cordial saludo;



JOHN JAIRO BUSTOS GOMEZ
Profesional Universitario II – CECOI



BIOCIVIL ING SAS BIOCIVIL ING SAS <biocivilingsas@gmail.com>

PLANO RECORD -CT-069-2022

1 mensaje

BIOCIVIL ING SAS BIOCIVIL ING SAS <biocivilingsas@gmail.com>
Para: catastro@ibal.gov.co

21 de septiembre de 2023, 11:24

Señores:

CO-BIO-079-2023**CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DEL IBAL (CECOI)**

REFERENCIA: CT-069-2022 QUE TIENE POR OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DESCOLE DE LAVADO DE MÓDULOS DE PLANTA 1 UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL IBAL DE LA POLA, PARA MITIGAR AFECTACIONES EN LAS ZONAS COMUNES DEL CONJUNTO IRAZU II DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

ASUNTO: ENTREGA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS REDES PARA ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO DE REDES IBAL.

Cordial saludo, **JOHANNA MILENA LINARES CLAVIJO** identificada con C.C N°1.032.400.034 de Bogotá, obrando como representante legal de **BIOCIVIL ING SAS** con NIT:809006054-1, muy cordialmente me permito adjuntar el plano récord colector línea descole Irazú-Ibagué-Tolima, correspondiente al proyecto citado en la referencia, para la actualización de catastro de redes del IBAL, en caso que se aplique, en caso contrario solicitamos la respuesta vía correo electrónico a: biocivilingsas@gmail.com

Mil gracias, estaremos atentos a su respuesta.





BIOCIVIL ING S.A.S

"Ejecución de obras y planificación ambiental".

Entre todos hacemos el cambio, evita imprimir este correo si no es estrictamente indispensable.

2 archivos adjuntos

 **BIOCIVIL_PLANORECORD (1) (1).dwg**
18785K

 **79.CO-BIO-079-2023 -IBAL.pdf**
97K

Ibagué, 21 de septiembre de 2023

Señores:

CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DEL IBAL (CECOI)

CO-BIO-079-2023

REFERENCIA: CT-069-2022 QUE TIENE POR OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DESCOLE DE LAVADO DE MÓDULOS DE PLANTA 1 UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL IBAL DE LA POLA, PARA MITIGAR AFECTACIONES EN LAS ZONAS COMUNES DEL CONJUNTO IRAZU II DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

ASUNTO: ENTREGA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS REDES PARA ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO DE REDES IBAL.

Cordial saludo, **JOHANNA MILENA LINARES CLAVIJO** identificada con C.C N°1.032.400.034 de Bogotá, obrando como representante legal de **BIOCIVIL ING SAS** con NIT:809006054-1, muy cordialmente me permito adjuntar el plano récord colector línea descole Irazú-Ibagué-Tolima, correspondiente al proyecto citado en la referencia, para la actualización de catastro de redes del IBAL, en caso que se aplique, en caso contrario solicitamos la respuesta vía correo electrónico a: biocivilingsas@gmail.com

Agradezco su atención.

Cordialmente:



JOHANNA MILENA LINARES
C.C 1.032.400.034 de BOGOTÁ
R.L BIOCIVIL ING S.A.S



BIOCIVIL ING SAS BIOCIVIL ING SAS <biocivilingsas@gmail.com>

DOCUMENTACIÓN CT-069-2022

2 mensajes

BIOCIVIL ING SAS BIOCIVIL ING SAS <biocivilingsas@gmail.com>
Para: catastro@ibal.gov.co

29 de noviembre de 2023, 12:30 p.m.

Ibagué, 29 de nov. de 23

CO-BIO-147-2023

Señores:

CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DEL IBAL (CECOI)

REFERENCIA: CT-069-2022 QUE TIENE POR OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DESCOLE DE LAVADO DE MÓDULOS DE PLANTA 1 UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL IBAL DE LA POLA, PARA MITIGAR AFECTACIONES EN LAS ZONAS COMUNES DEL CONJUNTO IRAZU II DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

ASUNTO: ENTREGA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS REDES PARA ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO DE REDES IBAL.

Cordial saludo, **JOHANNA MILENA LINARES CLAVIJO** identificada con C.C N°1.032.400.034 de Bogotá, obrando como representante legal de **BIOCIVIL ING SAS** con NIT:809006054-1, muy cordialmente me permito adjuntar los documentos correspondiente al proyecto citado en la referencia, para la actualización de catastro de redes del IBAL, en caso que se aplique, en caso contrario solicitamos la respuesta vía correo electrónico a: biocivilingsas@gmail.com

Agradezco su atención.

Cordialmente:

Ing Johanna Milena Linares

--

**BIOCIVIL ING S.A.S**

"Ejecución de obras y planificación ambiental".

Entre todos hacemos el cambio, evita imprimir este correo si no es estrictamente indispensable.

 **DESCOLE IRAZU.7z**
14494K**BIOCIVIL ING SAS BIOCIVIL ING SAS** <biocivilingsas@gmail.com>
Para: catastro@ibal.gov.co

18 de diciembre de 2023, 9:53 a.m.

Cordial saludo atendiendo a las observaciones nos permitimos adjuntar el respectivo informe del levantamiento topográfico.

Para los fines correspondientes.

Gracias.

[Texto citado oculto]



INFOR LEVANT TOP-CT-069.pdf

695K



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación: Fecha evaluación 28/10/2022

Reevaluación: Fecha reevaluación:

Acta Parcial N° _____

Acta Final

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 069 DEL 28 DE ENERO DEL 2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: BIOCIVIL ING S.A.S

NIT: 809.006.054-1 C.C.

FECHA DE INICIO: 14 DE MARZO DEL 2022

28 DE OCTUBRE DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DESCOLE DE LAVADO DE MÓDULOS DE PLANTA 1 UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL IBAL DE LA POLA, PARA MITIGAR AFECTACIONES EN LAS ZONAS COMUNES DEL CONJUNTO IRAZU II DE LA CIUDAD DE IBAGÜE.

CLASE DE CONTRATO

- 1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION
- 2. SUMINISTRO Y ADQUISICION
- 3. ARRENDAMIENTO
- 4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA
- 5. SERVICIO
- 6. SEGUROS
- 7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS
- 8. OBRA PUBLICA

X

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	4	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	5
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	N/A	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	4	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	3	SERVICIO POSTVENTA	5
TOTAL PROMEDIO	3,67	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	4
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	4
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	4,67
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	4	EVALUACION TOTAL	4,33
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	5		
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	4,67		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION _____ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION _____ POR PARTE DEL CONTRATISTA:

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.


La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.


SI

NO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)


HAROLD R RODRIGUEZ SÁNCHEZ
Director operativo-Supervisor

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA


JOHANNA MILENA LINARES CLAVIJO
BIOCIVIL ING S.A.S



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación: Fecha evaluación _____ Reevaluación Fecha reevaluación: 28-oct-22

Acta Parcial N° _____ Acta Final

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 069 DEL 28 DE ENERO DEL 2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: BIOCIVIL ING S.A.S NIT: 809.006.054-1 C.C.

FECHA DE INICIO: 14 DE MARZO DEL 2022 28 DE OCTUBRE DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DESCOLE DE LAVADO DE MÓDULOS DE PLANTA 1 UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL IBA DE LA POLA, PARA MITIGAR AFECTACIONES EN LAS ZONAS COMUNES DEL CONJUNTO IRAZU II DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.

CLASE DE CONTRATO

- 1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION
- 2. SUMINISTRO Y ADQUISICION
- 3. ARRENDAMIENTO
- 4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA
- 5. SERVICIO
- 6. SEGUROS
- 7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS
- 8. OBRA PUBLICA

X

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	4	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	5
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	N/A	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	4	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	3	SERVICIO POSTVENTA	5
TOTAL PROMEDIO	3,67	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	4
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	4
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	4,67
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	4	EVALUACION TOTAL	4,33
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	5		
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	4,67		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION _____ REEVALUACION POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION _____ REEVALUACION POR PARTE DEL CONTRATISTA:

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.


La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual término a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluación de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripción.


SI

NO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)


HAROLD R RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
Director operativo-Supervisor

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA


JOHANNA MILENA LINARES CLAVIJO
BIOCIVIL ING, S.A.S
