



CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



ITEM	UBICACIÓN Y ACTIVIDAD	OBSERVACION	ESTADO
	K9+800 - K11+200 Suministro e instalación tubería 36"	El contratista a la fecha ha realizado la instalación de la tubería y accesorios 36" GRP del sector conocido como túnel falso. Falta empalmar ambos extremos de la tubería para darle continuidad a la red de conducción. Obra 75%	
	K9+800 - K11+200 Construcción cajas purga y ventosa	a la fecha no se evidencia el inicio de la construcción de las cajas para válvulas ventosas y purgas, por lo tanto, se incumple la fecha de inicio de actividades establecido en la programación. Avance 0%	
	K11+200 (Túneles)Obras de arte, alcantarillado y pavimentación de túneles para atraque de tubería.	El contratista de obra ha culminado la pavimentación del tramo de vía del sector túneles, se está adelantan actividades complementarias como construcción de andenes, cunetas y señalización. Avance 85%	Incumplimiento
10	K11+200 - K12+640 Optimización de 1 anclaje	Solo se ha realizado localización y replanteo para la optimización del anclaje H169. Avance 0%	Incumplimiento
11	K12+646-K12+750 Instalación de 61,69m de tubería GRP de 32" a 36" Instalación de 43,5m de tubería GRP de 32" a 36" en cercha K 12+700 Suministro e instalación de viaducto No 10	En este frente de obra se han ejecutado las actividades de figurado, amarre de aceros e instalación de platinas de soporte en los estribos de la estructura metálica proyectada. Por el momento se ha fundido el estribo del sector cural, se está a la espera de la fundición del estribo boquerón y el izaje de la estructura metálica, la cual ya se encuentran en sitio. Además, han iniciado las actividades de localización y replanteo, excavación e instalación de los 45 ml tubería GRP 36" correspondientes al sector cural. Suministro 65% Obra 35%	Incumplimiento
12	K12+640 - K12+971 Optimización de 1 anclajes y construcción de 7 anclajes nuevos K12+960 - K12+972 (Derivación Boquerón) Instalación de 12m de tubería GRP de 24" Instalación de accesorios especiales (VALVULAS)	El contratista a la fecha no iniciado actividades según lo programado, retraso acumulado superior a 30 días. Avance 0%	Incumplimiento



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGÜERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



ITEM	UBICACIÓN Y ACTIVIDAD	OBSERVACION	ESTADO
		la construcción de la placa superior (Acceso) de las cámaras. Suministro 70% Obra 30%	
13	K12+972 - K18+090 Optimización de 34 anclajes y construcción de 7 anclajes nuevos	No han iniciado actividades de chequeo de anclajes existentes, es necesario adelantar la revisión de los elementos con el fin de determinar si se optimizan o no. Avance 0%	Incumplimiento
	K17+940 - K18+090 (paso Combeima Viaducto 11) Suministro e instalación de 146,18m de tubería GRP de 24"	El contratista de obra se encuentra ajustando las silletas que van a soportar la tubería GRP Ø 24" sobre el viaducto. Se han instalado Ø 24" GRP 87 ml sobre la estructura metálica. Suministro 40% Obra 40%	Incumplimiento
14	K18+091 - K19+300 (llegada a la Pola) Optimización de 18 anclajes y construcción de 4 anclajes nuevos Suministro e instalación de 119,47m de tubería GRP de 24" instalación de accesorios especiales (VALVULAS)	El contratista de obra ha instalado 60 ml de tubería GRP Ø24", pero en el desarrollo de las actividades de excavación se encontró un macizo en concreto sobre la tubería de Cay Ø 14" que obligo a detener de nuevo las actividades para replantear la línea de aducción de Ø 24". La propuesta planteada por el contratista fue aprobada en comité virtual de 5 agosto 2023, pero se está a la espera de conocer en qué condición esta la adquisición de los suministros y la reactivación de este frente de trabajo en el menor tiempo posible para evitar traumatismos con la comunidad. Suministro 67% Obra 35%	Incumplimiento
15	(estructuras de disipación) Construcción de cámaras de llegada a la planta	En este frente de trabajo se están construyendo las tres cámaras proyectadas: cámara flujo anular, cámara macro medidor y cámara filtro Yee, las tres cámaras se encuentran construidas en un 80% faltando por construir las placas superiores y la instalación de los accesorios especiales y equipos. Suministro 5% Obra 25%	Incumplimiento
16	K0 - K0+02,49 (salida tanque ciudad) Construcción de la cámara de válvulas de salida del tanque Ciudad Suministro e instalación de una válvula mariposa de 32" y una válvula ventosa de 6"	El contratista a la fecha ha realizado localización, replanteo y excavación manual de la cámara para la válvula mariposa Ø32". Suministro 50% Obra 5%	Incumplimiento



ITEM	UBICACIÓN Y ACTIVIDAD	OBSERVACION	ESTADO
17	K4+302 - K4+490 (PASO 1- BOX PASO 2 - CERCHA) Suministro e instalación de 26,26m de tubería GRP de 32" Construcción de un Boxculvert para paso subfluvial Suministro e instalación de un viaducto para paso elevado	Se visita taller del proveedor donde se evidencia la estructura metálica ya construida. El contratista no ha dado inicio a las actividades programadas para este frente de trabajo según lo evidenciado en campo. Suministro 20% Obra 0%	Incumplimiento
18	K0-K4+587 Optimización de 20 anclajes y construcción de 10 anclajes nuevos	El contratista no ha iniciado actividades a la fecha, por tal motivo se determina incumplimiento. Obra 0%	Incumplimiento
19	Llegada tanque Sur Suministro e instalación de 20,78m de tubería GRP de 36" a 32" Suministro e instalación de accesorios para llegada a tanque sur	El contratista no ha iniciado las actividades programadas para este frente de trabajo, por tal motivo se determina incumplimiento Suministro 20% Obra 0%	Incumplimiento

Fuente. Consorcio Interbontrabe

6.5. SEGUIMIENTO DE TRABAJO SOCIAL.

Durante el periodo que comprende el presente informe se realizó seguimiento y acompañamiento a las actividades realizadas por el contratista como levantamiento de actas de vecindad, visitas puntuales a los predios a intervenir y socializaciones e imprevistos sociales; a continuación, se detallan las actividades mencionadas:

Tabla 21: registros de trabajo social.

FECHA	LUGAR	TEMAS TRATADOS	ASISTENTES
26/08/2023	Finca El Porvenir	Socialización de actividades y levantamiento de acta de vecindad con las señoras Martha Leal y Olga Aristizábal de los predios El Horizonte y El Porvenir para la ejecución de obras de drenaje transversal que limitan con los predios.	Martha Graciela Leal, Olga Aristizábal y Profesional social del contratista.
28/08/2023	Sector Boquerón	Socialización a los representantes y/o delegados de los acueductos comunitarios de Los Túneles, La Unión, Jazmín y La Isla por parte de la profesional social y el topógrafo del contratista de las actividades de	Representantes y/o delegados acueductos comunitarios de Los Túneles, La Unión, Jazmín y La Isla, Profesional social y



FECHA	LUGAR	TEMAS TRATADOS	ASISTENTES
		instalación de tubería 36" GRP en el sector puente 12 entrada a túneles El equipo del contratista aclara que de llegar a presentarse afectación sobre las redes de los acueductos comunitarios se realizara el arreglo respectivo.	topógrafo del contratista.
31/08/2023	Tienda social sector Túneles	Reunión con el presidente de sector Túneles Carmelo Montalvo con el fin de solicitarle permiso para realizar actividades de figurado de acero en un lote administrado por la junta, para lo cual el señor Carmelo solicita adecuar algunos puntos críticos de la vía alterna, además de señalar y delimitar la vía alterna como medida preventiva.	Presidente de sector túneles, ingeniera residente, profesional SST y profesional social del contratista.
06/09/2023	Sector Tigresa	Recorrido con el presidente del sector Carlos Caicedo para verificar y cuantificar en campo las alcantarillas existentes en el sector de la Tigresa para manejo de aguas lluvias.	Presidente de sector la Tigresa, ingeniera residente y profesional social del contratista.
12/09/2023	Tienda social sector Túneles	Reunión extraordinaria con los líderes de los sectores túneles y la tigresa para dar a conocer el avance de la pavimentación de la vía y socialización de la fecha de apertura programada para el 20 septiembre 2023, debido a que se debe esperar una semana más para protección y curado del concreto. Lo anterior para garantizar la calidad de la obra.	Líder sector túneles, líder sector La tigresa, ingeniera residente, profesional SST y profesional social del contratista.

Fuente. Consorcio Interbontrabe

6.6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CHOQUE

Esta interventoría presenta el día 4 de abril de 2023 un informe de posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista de obra y solicitud de imposición de multas, para que la entidad contratante tome las medidas necesarias. Se lleva a cabo la segunda sesión de la audiencia de posible incumplimiento el día miércoles 29 de julio de 2023, en la cual el contratista de obra presenta una reformulación plan de choque para recuperar el tiempo y cumplir con los tiempos contractuales del contrato. A continuación, se presenta el plan de choque del contratista de obra:

RESUMEN DE EJECUCION	SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE	
	Cantidad		Cantidad		Cantidad	
	1 -15	15-30	1 -15	15-30	1 -15	15-30
ANCLAJES						
K0+00 A K7+650 (BOCATOMA A PUENTE COELLO)						
HORIZONTALES		1	1		1	
VERTICALES		1	1			
MIXTOS						
K7+650 A K10+650 (PUENTE COELLO A TUNEL FALSO)						
HORIZONTALES		3	6		3	2
VERTICALES			5		3	3
MIXTOS						
K10+650 A K19+300 (TUNEL FALSO A IBAL LA POLA)						
HORIZONTALES		2	3		2	
VERTICALES			4		2	
MIXTOS						
TOTAL ANC.	0	2	2		1	0
ADUCCION (13 CAMARAS)						
Camara K6+380 Concreto (VALVULA SOBREVELOCIDAD)		1			OK	
Accesorios (Brida)			1			
Nipleria		1				
Suministro valvula			1		OK	
Montaje Valvula						1
Camara K7+640 Concreto (VALVULA CHEQUE)			X			
Accesorios Brida			1			
Nipleria			1			

RESUMEN DE EJECUCION	SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE	
	Cantidad		Cantidad		Cantidad	
	1 -15	15-30	1 -15	15-30	1 -15	15-30
Suministro valvula			X			
Montaje Valvula			X			
Camara K8+350 concreto (VALVULA VENTOSA R. PATINO)		1				
Accesorios Tornilleria		1				
Nipleria	NA					
Suministro valvula	1			OK		
Montaje valvula			1			
Camara K9+520 Concreto (VALVULA VENTOSA MORROCHUSCO)			1			
Accesorios			1			
Nipleria	NA					
Suministro valvula	1		1	OK		
Montaje valvula					1	
Camara K8+923 Concreto (CHEQUE, VENTOSA Y PURGA)			X			
Accesorios Brida			1			
Nipleria			1			
Suministro valvula			X			
Montaje Valvula			X			
Camara K10+620 Concreto (VENTOSA TUNEL FALSO)			1			1
Accesorios			1			
Nipleria			1			
Suministro valvula	1			OK		
Montaje valvula					1	

RESUMEN DE EJECUCION	SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE	
	Cantidad		Cantidad		Cantidad	
	1 - 15	15-30	1 - 15	15-30	1 - 15	15-30
Camara K12+968 Concreto (MARIPOSA 14" DERIVACION BOQUERON)		1		OK		
Accesorios HD					1	
Nipleria			1			
Suministro valvula		1		OK		
Montaje valvula					1	
Camara K12+968 Concreto (MARIPOSA 24" DERIVACION BOQUERON)		1		OK		
Accesorios			1			
Nipleria			1			
Suministro valvula		1		OK		
Montaje valvula					1	
Camara K18+084 concreto (VALVULA CHEQUE)			X	NO		
Accesorios			1			
Nipleria			1			
Suministro valvula			X	NO		
Montaje valvula			X	NO		
Camara K18+710 (VALVULA PURGA) definir abscisa			1	NO		
Accesorios		1				
Nipleria			1			
Suministro valvula		1		OK		
Montaje valvula					1	
Camara K19+276 (VALVULA VENTOSA IBAL POLA)			1	NO		



CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.I. JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C. 5.829.473 DE IBAGUÉ.



RESUMEN DE EJECUCION	SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE	
	Cantidad		Cantidad		Cantidad	
	1 -15	15-30	1 -15	15-30	1 -15	15-30
Accesorios			1			
Nipleria	NA					
Suministro valvula	1			OK		
Montaje valvula					1	
Camara K19+290 (FILTRO EN Y)	1			OK		
Accesorios					1	
Nipleria					1	
Suministro valvula					1	
Montaje valvula					1	
Camara K19+305 (MACROMEDIDOR)	1			OK		
Accesorios					1	
Nipleria					1	
Suministro macromedidor					NA	
Montaje valvula					NA	
Camara K19+355 (VALVULAS ANULARES)	1			OK		
Accesorios					1	
Nipleria					1	
Suministro valvulas					1	
Montaje valvula					1	
CONDUCCION (5 CAMARAS)						
Camara K4+465 (VALVULA 8" PURGA PASO 2)						
Accesorios					1	

RESUMEN DE EJECUCION	SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE	
	Cantidad		Cantidad		Cantidad	
	1 - 15	15-30	1 - 15	15-30	1 - 15	15-30
Nipleria					1	
Suministro valvula		1		OK		
Montaje valvula					1	
Camara K4+482 (VALVULA VENTOSA 4" PASO 2) solo instalacion					NA	
Accesorios					NA	
Nipleria					NA	
Suministro valvula	1			OK		
Montaje valvula					1	
Camara K4+601 (VALVULA COMPUERTA (3) 14" + VALV REG NIVEL TANQUE SUR)						1
Accesorios						
Nipleria						
Suministro valvula						
Montaje valvula						
Camara K4+586 (VALVULAS MARIPOSA 20")						1
Accesorios						
Nipleria						
Suministro valvula						
Montaje valvula						
Camara K1+010 (VALVULAS COMPUERTA 14" DISTRIBUCION)						1
Accesorios						
Nipleria						

	SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE	
	Cantidad		Cantidad		Cantidad	
	1 - 15	15-30	1 - 15	15-30	1 - 15	15-30
RESUMEN DE EJECUCION						
Suministro valvula						
Montaje valvula						
TOTAL CAMARAS	8	11	22	20	6	0
K3+800 (OJO)				OK 36 ML INSTALADOS	70	
K8+311 a K8+366 (Tubería WSP)		32		OK		
K9+146 a K9+417 (Tubería WSP)		60	60	NO FALTAN ACCESORIOS		
K9+505 a K9+538 (Tubería A.C)		30	30	NO FALTAN ACCESORIOS		
K9+418 a K9+505 (Tubería GRP carcamo)			6	NO FALTAN ACCESORIOS		
K9+538 a K9+787 (Tubería GRP)				NO FALTAN ACCESORIOS		
K10+520 a K10+625 (Tubería GRP tunel falso)		30			110	
K12+640 a K12+750 (Tubería GRP puente 12)						
K12+960 a K12+990 (Derivación Boqueron)	11					
K17+940 a K18+100 (Paso comebeima)		80	67			
K19+230 a K19+300 (Planta Ibal)			25			
K4+300 a K4+580 (Conduccion tanque sur)					50	
TOTAL INSTALACION TUBERIAS	11	232	188		230	0
K9+500 Obras estabilización			1			
K11+100 Construcción alcantarillas					1	
K11+500 Obras pavimentacion tuneles	0.1	0.1		OK		
K12+00 Montaje estructura puente 12			1			
K4+300 estructura paso 2 (Conduccion tanque sur)					1	
O. DE ARTEY						

RESUMEN DE EJECUCION	SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE	
	Cantidad		Cantidad		Cantidad	
	1 -15	15-30	1 -15	15-30	1 -15	15-30
K0+00 Empalme tanque ciudad(conducción tanque sur)			1			
TOTAL OBRAS ARTE Y PASOS	0.1	0.1	3	2		
Valvula sobrevelocidad		1		OK		
Valvulas anulares			1	OK		
Valvulas purga y ventosa		1		OK		
Tubería WSP, AC, HD		0.15	0.15			
Tubería GRP		0.1	0.1			
Automatización						
TOTAL VALVULAS	0	2.25	1.25	0	0	0

Fuente: Consorcio CÓCORA IBALTOL



6.7. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

De acuerdo con el contrato de obra 144 de 2022 la forma de pago establecida en la cláusula No. 8 Forma de pago: se pagará al contratista el valor equivalente al 90% del total del contrato mediante pagos parciales conforme al avance de obra y un valor equivalente al 10% del valor del contrato a través del acta de liquidación.

De acuerdo con lo anterior a la fecha del presenta informe el contratista de obra no ha tramitado cobros mediante actas parciales, a continuación, se presenta el balance del contrato de obra:

Tabla 22. Balance del contrato.

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 25,040,391,019	
ACTA PARCIAL No. 1 del 30/03/2023		\$ 2,349,363,000.00
ACTA PARCIAL No. 2 del 14/06/2023		\$ 3,669,196,912.00
ACTA PARCIAL No. 3 del 14/07/2023		\$ 2,700,478,810.00
ACTA PARCIAL No. 4 del 02/08/2023		\$ 1,445,643,607.00
ACTA PARCIAL No. 5 del 04/09/2023		\$ 1,898,912,218.00
SALDO POR EJECUTAR		\$ 12,976,796,472.00
SUMAS IGUALES	\$ 25,040,391,019.49	\$ 25,040,391,019.49

Fuente. Consorcio Interbontrabe

Según la cláusula 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPO del contrato de obra 144 de 2022 el contratista obtendrá un anticipo del 25% del valor del contrato, el cual se desembolsará a través de una fiducia. A continuación, se realiza resumen del balance del anticipo.

Tabla 23. Balance del anticipo del contrato de obra

BALANCE DEL ANTICIPO		
VALOR DEL ANTICIPO 25%	\$ 6,260,097,754.87	
VALOR AMORTIZADO EN ACTA No. 1		\$ 587,340,750.00
VALOR AMORTIZADO EN ACTA No. 2		\$ 917,299,228.00
VALOR AMORTIZADO EN ACTA No. 3		\$ 675,119,702.50
VALOR AMORTIZADO EN ACTA No. 4		\$ 361,410,901.75
VALOR AMORTIZADO EN ACTA No. 5		\$ 474,728,054.50
ANTICIPO POR AMORTIZAR		\$ 3,244,199,118.12
SUMAS IGUALES	\$ 6,260,097,754.87	\$ 6,260,097,754.87

Fuente. Consorcio Interbontrabe

El contratista de obra apertura una cuenta para el manejo del anticipo con ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS con cuenta de ahorros 040 0000 5314. Además, constituyo póliza de seguro para manejo del anticipo con entidades estatales N-Póliza I- 100015986 de aseguradora COMPAÑÍA MUNDIA DE SEGUROS S.A.



IBAL
S.A. Sól oficial
EMPRESA IBAGÜERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



Tabla 24: Plan inversión del anticipo

PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO 1			
No	DESCRIPCION	VALOR TOTAL (EN MILES)	PORCENTAJE
1	COMPRA DE MATERIALES	\$ 4.695.073.316,06	75.00%
2	MANO DE OBRA	\$ 626.009.775,48	10.00%
3	TRANSPORTE	\$ 313.004.887,74	5.00%
4	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 626.009.775,48	10.00%
	TOTAL	\$ 6.260.097.754,75	100.00%

Fuente. Consorcio Cócora Ibaltoi

A la fecha del presente periodo del informe la entidad realizo el desembolso del valor correspondiente al anticipo.

Tabla 25 Balance del giro del anticipo

BALANCE DEL GIRO DEL ANTICIPO		
ANTICIPO 25% DEL VALOR DEL CONTRATO	\$ 6,260,097,755.00	
DESCUENTOS APLICADOS POR LA ENTIDAD - CONTRIBUCION DE OBRA 5%		- \$ 313,004,888.00
VALOR DE GIRO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE		\$ 5,947,092,867.00
SUMAS IGUALES	\$ 6,260,097,755.00	\$ 6,260,097,755.00

Fuente. Consorcio Cócora Ibaltoi

De acuerdo con el valor girado por la entidad contratante **IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL** a la fiduciaria **ALIANZA FIDUCIARIA** por CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CIENTE PESOS M/CTE (**\$ 5.947.092.867,00**), esta última solicito ajustar el plan de inversión del anticipo con relación a este mismo, conservando las descripciones o ítems iniciales e incluyendo el gravamen a los movimientos financieros o 4 por mil, siendo obligación tributaria.

Tabla 26: Plan inversión del anticipo No.0 2 según fiducia

PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO 2 (AJUSTADO SEGÚN FIDUCIA)			
No	DESCRIPCION	VALOR TOTAL (EN MILES)	PORCENTAJE
1	COMPRA DE MATERIALES	\$ 4,460,319,650.25	75.00%
2	MANO DE OBRA Y ADMINISTRACIÓN	\$ 594,709,286.70	10.00%
3	TRANSPORTES	\$ 297,354,643.35	5.00%
4	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 570,920,915.23	9.60%
5	GRF (4x1.000)	\$ 23,788,371.47	0.40%
	TOTAL	\$ 5,947,092,867.00	100.00%

Fuente. Consorcio Cócora Ibaltoi

Tabla 27: Plan inversión del anticipo No.03 ajustado por contratista.



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBACUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.




PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO 3 (AJUSTADO POR CONTRATISTA)			
No	DESCRIPCION	VALOR TOTAL (EN MILES)	PORCENTAJE
1	COMPRA DE MATERIALES	\$4,535,319,650.00	75.00%
2	MANO DE OBRA Y ADMINISTRACIÓN	\$644,709,287.00	10.00%
3	TRANSPORTES	\$322,354,643.00	5.00%
4	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$444,709,287.00	9.60%
5	GRF (4x1.000)	\$ 23,788,371.47	0.40%
TOTAL		\$ 5,947,092,867.00	100.00%

Fuente. Consorcio Cócora Iballot

A la fecha ya los recursos del anticipo se utilizaron al 100%.

Ilustración 2: Análisis de la inversión del anticipo del contrato de obra 144 de 2022

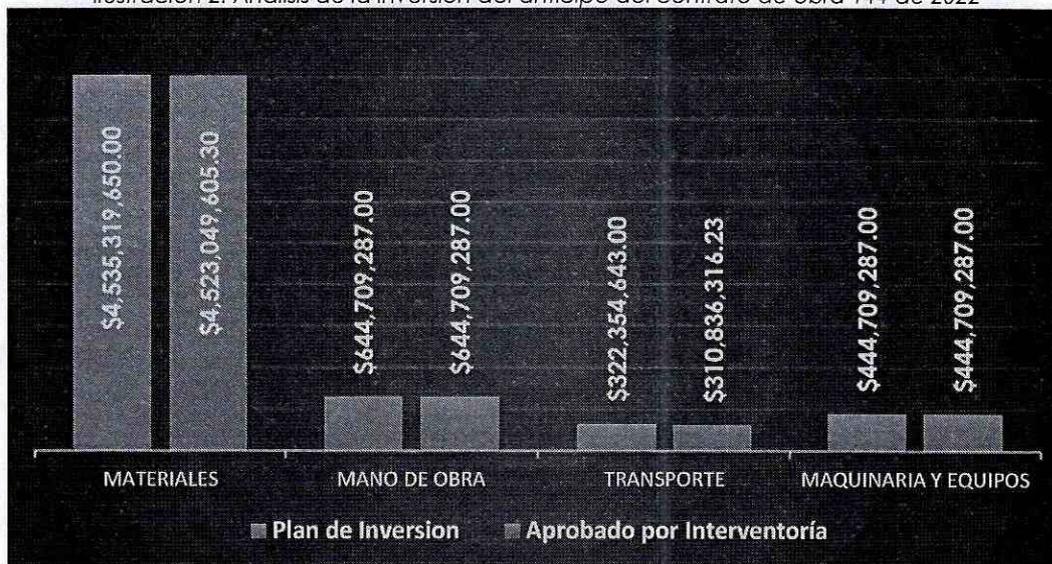

Fuente. Consorcio Interbontrabe

Alianza
Fiduciaria.
SFI - Sistema Financiero Integrado
Módulo Presupuesto

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
Ejecución Presupuestal Acumulada por Grupo y Recurso
111077 FIDEICOMISO ANTICIPO COCORA IBALTOL
 Desde 201701 hasta 202306

Página 1 de 1
 27/06/2023 11:46:12
 Programa: PPMREJAC
 JOHAN AGUDELO

Grupo:	1	RUBROS SIN PPTO								
Recurso:	21	APORTES DEL FIDEICOMITENTE								
Imputación		Descripción	Apropiación Definitiva	Disponibilidad	Registro	Obligaciones	Pago	Saldo x comprometer	% X Ejec.	
1		TOTAL: RUBROS SIN PPTO	0.00	0.00	0.00	5,947,092,887.00	0.00	0.00	0.00	
101		DEVOLUCION EXCEDENTES	0.00	0.00	0.00	5,947,092,887.00	0.00	0.00	0.00	
10102		TRASLADOS O TRASLADO DE IMPUESTOS A SOCIEDAD	0.00	0.00	0.00	5,947,092,887.00	0.00	0.00	0.00	
Grupo:	4	GASTOS NEGOCIOS ANTICIPOS								
Recurso:	21	APORTES DEL FIDEICOMITENTE								
Imputación		Descripción	Apropiación Definitiva	Disponibilidad	Registro	Obligaciones	Pago	Saldo x comprometer	% X Ejec.	
4		TOTAL: GASTOS NEGOCIOS ANTICIPOS	5,923,904,495.53	0.00	0.00	5,923,904,495.53	0.00	0.00	0.00	
401		MATERIALES	4,523,049,605.30	0.00	0.00	4,523,049,605.30	0.00	0.00	0.00	
40101		MATERIALES	4,523,049,605.30	0.00	0.00	4,523,049,605.30	0.00	0.00	0.00	
402		MANO DE OBRA - SALARIOS	644,709,287.00	0.00	0.00	644,709,287.00	0.00	0.00	0.00	
40201		MANO DE OBRA	644,709,287.00	0.00	0.00	644,709,287.00	0.00	0.00	0.00	
403		TRANSPORTE	310,836,316.23	0.00	0.00	310,836,316.23	0.00	0.00	0.00	
40301		TRANSPORTE	310,836,316.23	0.00	0.00	310,836,316.23	0.00	0.00	0.00	
404		MAQUINARIA	444,709,287.00	0.00	0.00	444,709,287.00	0.00	0.00	0.00	
40401		MAQUINARIA	444,709,287.00	0.00	0.00	444,709,287.00	0.00	0.00	0.00	

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 267
 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 268

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 269
 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 270

Formula: REGISTRO
 Usuario: JAGUELO


La ilustración anterior es la información que esta interventoría solicitó formalmente a la fiducia como informe preliminar del manejo de los recursos del fideicomiso No. 111077 suscrito entre el Consorcio cócora Ibaltol y Alianza Fiduciaria S.A.

Durante el transcurso del presente periodo se agotaron los recursos que el contratista de obra recibió por concepto de anticipo los cuales fueron girados por la entidad contratante a la Fiduciaria, Alianza Fiduciaria S.A.

BALANCE DE ANTICIPO APROBADOS		
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	Plan de Inversión	Aprobado por Interventoría
MATERIALES	\$ 4,535,319,650.00	\$ 4,523,049,605.30
MANO DE OBRA	\$ 644,709,287.00	\$ 644,709,287.00
TRANSPORTE	\$ 322,354,643.00	\$ 310,836,316.23
MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 444,709,287.00	\$ 444,709,287.00
GMF (4 X1000)		\$ -
TOTAL GIRADO	\$ 5,947,092,867.00	\$ 5,923,304,495.53

6.8. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE OBRA

Ilustración 3: Análisis del avance físico del contrato de obra 144 de 2022

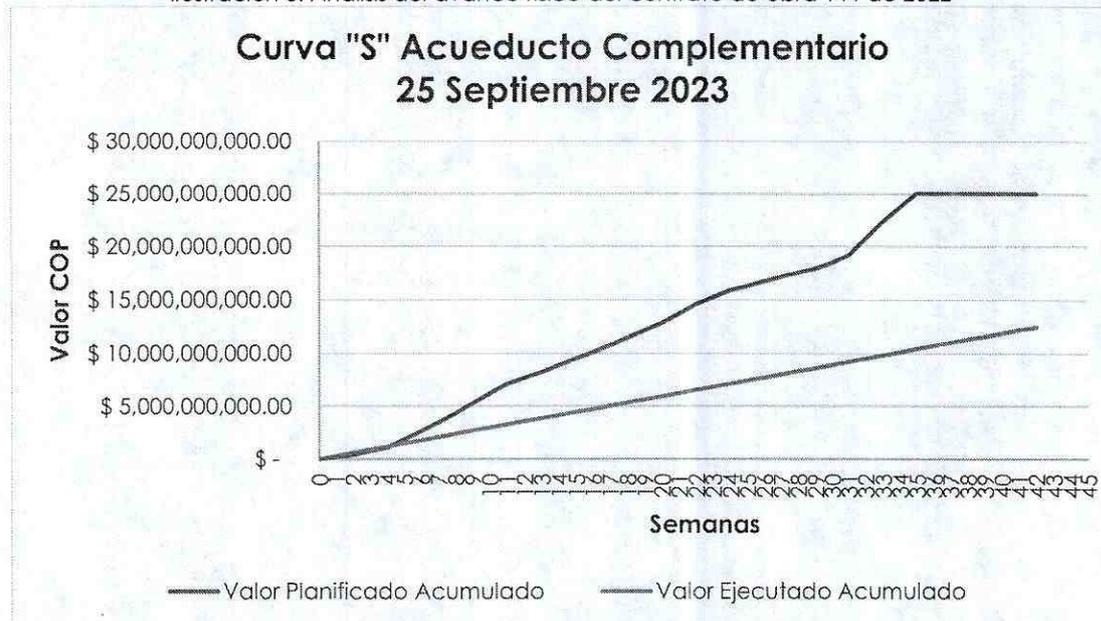



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGÜERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



6.9. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.9.1. ANÁLISIS DE EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

De acuerdo con lo establecido en la cláusula No. 4 Forma de pago del contrato de interventoría se pagará de la siguiente manera: hasta el 90% del valor del contrato será cancelado a través de actas parciales mensuales o acta final, de acuerdo con el porcentaje de avance de ejecución del contrato de obra y el recibo a satisfacción de las actividades desarrolladas dentro del periodo por parte del supervisor

Tabla 28. Ejecución de interventoría.

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1,480,742,466.00	
ADICION No. 1 del 25/08/2023	\$ 133,112,075.00	
VALOR ACTA No. 1 del 5/05/2023		\$ 119,940,139.75
VALOR ACTA No. 2 del 26/06/2023		\$ 199,900,232.91
VALOR ACTA No. 3 del 28/08/2023		\$ 213,226,915.10
SALDO POR EJECUTAR		\$ 1,080,787,253.24
SUMAS IGUALES	\$ 1,613,854,541.00	\$ 1,613,854,541.00

Fuente. Consorcio Interbontrabe.

7. CONCLUSIONES

A continuación, se presenta las conclusiones del informe de interventoría:

- El avance del proyecto en el periodo del 26 de agosto al 25 de septiembre de 2023 según la programación debería estar en el 100%, pero el avance evidenciado es del 51.11%, lo cual equivale a \$ 12.798,941,335.39 MCTE. El atraso del proyecto obra a partir de lo evidenciado en terreno se debe al bajo rendimiento de las actividades que se vienen ejecutando, el retraso en la adquisición y entrega de los suministros que son parte fundamental para el desarrollo y avance del proyecto.
- A partir del análisis a la programación de obra aprobada, esta interventoría ha manifestado continuamente el estado de retraso general en el que se encuentra el proyecto, razón por la cual se ha solicitado al contratista implementar las acciones reales que permitan acrecentar el avance del proyecto incluyendo recomendaciones y solicitudes que se han realizado pero no se evidencia por parte del contratista la ejecución y puesta en marcha de los planes de contingencia que se han planteado y recomendado, así como las solicitudes de trabajos nocturnos y optimización de la compra y llegada de materiales o personal a la obra, esto conlleva el incumplimiento y la insubordinación del contratista a esta interventoría.
- A la fecha las zonas de trabajo activas son seis (6) y están ubicados en las abscisas, también se relacionan los frentes de trabajo por cada zona de trabajo.
 - ✓ K0+000 – K6+380: Construcción de alcantarilla transversales K6+250
 - ✓ K8+311 - K8+366: Rubiela Patiño: Se han ejecutado las actividades de instalación y soldadura de tubería y accesorios WSP 36"; se adelanta la adecuación del terreno para dar paso a la construcción de los anclajes proyectados en el sitio.
 - ✓ K9+007 - K9+794 en el sector se encuentran ejecutando labores de instalación y soldadura de tubería y accesorios en acero al carbón Ø36"se adelanta las actividades de topografía para la construcción del segundo cárcamo el cual abarca los accesorios (H8, H9 y H10).
 - ✓ K11+200 (Túneles) El contratista ha finalizado la intervención en este punto a lo que respecta a la actividades de pavimentación, por el momento se adelantan actividades de construcción de cunetas y andenes. Se permitió el ingreso de vehículos a partir del 20 septiembre 2023.
 - ✓ K12+646 - K12+750 Puente 12: se han ejecutado las actividades de figurado, amarre de aceros e instalación de platinas de soporte en los estribos de la estructura metálica proyectada. Por el momento se ha fundido el estribo del sector cural, se está a la espera de la fundición del estribo boquerón y el izaje de la estructura metálica, la cual ya se



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



encuentran en sitio. Además, han iniciado las actividades de localización y replanteo, excavación e instalación de los 45 ml tubería GRP 36" correspondientes al sector cural.

- ✓ K17+940 - K18+090 Paso combeima: El contratista de obra se encuentra ajustando las silletas que van a soportar la tubería GRP Ø 24" sobre el viaducto. Ya se han instalado Ø 24" GRP 87 ml sobre la estructura metálica.

El contratista cuenta con los frentes de trabajo que cumplen con los mínimos requeridos, aunque se identifica la necesidad de abrir frentes de trabajo en los siguientes puntos.

- ✓ K4+302 - K4+490 (PASO 1-BOX PASO 2 - CERCHA) Suministro e instalación de 26,26m de tubería GRP de 32".
- ✓ Conducción K0+002 – Salida tanque ciudad: cámara de válvulas de salida del tanque ciudad.
- ✓ Construcción de las cámaras en concreto para las válvulas ventosas y purgas.


A la fecha no se ha presentado la totalidad de los exámenes ocupacionales, según los soportes enviados aún falta personal por examen ocupacional, lo que deja al contratista en incumplimiento del decreto 1072 del 2015.

- No se ha presentado la documentación completa con soporte que evidencia la experiencia específica (Residente Ambiental) solicitada en los pliegos; además del cambio de algunos profesionales.
- El contratista de obra ha hecho omisión a los requerimientos realizados por la supervisión y esta interventoría para optimizar y mejorar el avance de la obra.

8. RECOMENDACIONES

A continuación, se presenta las recomendaciones de la interventoría:

- Debido al atraso presentado en el avance de obra, se recomienda dar cumplimiento al plan de choque reformulado para recuperar el avance de obra no ejecutado a la fecha del presente periodo y en el desarrollo completo del contrato.
- Se recomienda ampliar los frentes de trabajo de acuerdo con los puntos de intervención acordados entre la entidad contratante, contratista e interventoría, además de implementar trabajos nocturnos en las zonas más críticas como es túneles y planta de tratamiento la Pola.
- Se debe mejorar y ajustar las normas de seguridad y salud en el trabajo, realizar las correcciones del PEGMA y optimizar todos los frentes de trabajo de acuerdo con los requerimientos y observaciones presentados por esta interventoría.
- Cumplir con lo propuesto en el plan de manejo de tránsito de acuerdo con la implementación de señalización en los frentes de obra.
- Se le recomienda al contratista llevar el orden del desarrollo del proyecto según lo enfatizado en los diferentes comités con gerencia, supervisión e interventoría, donde se le ha enfatizado aunar esfuerzos en garantizar la funcionalidad del proyecto acueducto complementario desde la bocatoma hasta la PTAP POLA.


JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER BONTRABE



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



9. ANEXOS

ANEXO 1: Relación de oficios elaborados

ANEXO 2: Relación de oficios recibidos

ANEXO 3: Bitácora de interventoría

ANEXO 4: Actividades de topografía

ANEXO 5: Informe SST - Interventoría

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

CERTIFICACIÓN PERSONA JURIDICA


El suscrito, **JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO** representante legal, certifica que la sociedad **CONSORCIO INTERBONTRABE**, identificado con Nit. 901.641.469-9, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentre laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide el 02 de noviembre del año Dos Mil veintitrés (2023), en Ibagué (Tol.) ✓



JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO
Representante legal
CONSORCIO INTERBONTRABE
C.C 5.829.473 De Ibagué



YANIR SÁNCHEZ FLOREZ
Contadora Pública
CC. 28.916.026
TP. No. 243136-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **28916026**

SANCHEZ FLOREZ
 APELLIDOS

YANIR
 NOMBRES

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-MAR-1972**


IBAGUE
 (TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **A+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

14-AGO-1990 ROVIRA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


 REGISTRADOR NACIONAL
 IVAN DUQUE ESCOBAR



A-2900100-63092641-F-0028916026-20011129 05928 01332A 02. 119668002

Programa de Educación
Institucional de Contadores Públicos
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
243136-T
TARJETA
SANCHEZ FLOREZ
 C.C. 28918026
 RES. INSCRIPCION 470 DEL 06/06/2018
 FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
 DIRECTOR GENERAL **269932**
250244

Junta Central de Contadores P. S.A. 1997/1918
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57 X1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

 FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

EC5FAP75EEFA1A73

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YANIR SANCHEZ FLOREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 28916026 de ROVIRA (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 243136-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE												
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No			
NIT 901641469	9	CONSORCIO INTER BONTABE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CDA 6 #9 25	IBAGUE-TOLIMA	2762201					
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION												
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	23703857		9457507986	E		2023/10/17	2023/10/10		BANCO DE OCCIDENTE	0	\$10,133,100



RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	-----------	-----------------	----------------	------------------------	---------------

AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	\$3,701,000	\$0	\$0	\$3,701,000
COLPENSIONES		25-14		7	\$2,581,000	\$0	\$0	\$2,581,000
PORVENIR		230301		8	\$560,000	\$0	\$0	\$560,000
PROTECCION		230201		0	\$560,000	\$0	\$0	\$560,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$1,573,100	\$0	\$0	\$1,573,100
ARL SURA		14-11		5	\$1,573,100	\$0	\$0	\$1,573,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$904,000	\$0	\$0	\$904,000
COMERVALCO TOLIMA		CCF50		4	\$904,000	\$0	\$0	\$904,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	\$2,825,000	\$0	\$0	\$2,825,000
NUEVA E.P.S.		EPS037		2	\$612,500	\$0	\$0	\$612,500
SAUD TOTAL		EPS002		4	\$275,000	\$0	\$0	\$275,000
SANTAS		EPS005		6	\$1,937,500	\$0	\$0	\$1,937,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$678,000	\$0	\$0	\$678,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF		2	\$678,000	\$0	\$0	\$678,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$452,000	\$0	\$0	\$452,000
SENA		PASENA		1	\$452,000	\$0	\$0	\$452,000
TOTAL				6	\$10,133,100	\$0	\$0	\$10,133,100

Identificación		dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado, SENAE o ICBF
NIT 901641469		9	CONSORCIO INTER BOMTRABE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 6 #9 25	BIGUIE-TOLIMA	2762201	No
Periodo		Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Limite	Pago	Banco	Pago
Pension	Salud								
2023-09	2023-10	23703857	9457507966	E	2023/10/17	2023/10/10	BANCO DE OCCIDENTE		Dias Mora: 0
RESUMEN DE PAGO									Valor: \$10,133,100

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORIA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	\$3,701,000	\$0	\$0	\$3,701,000
	COBENSIONES	25-14	7	4	\$2,581,000	\$0	\$0	\$2,581,000
	PORVENIR	230301	8	1	\$560,000	\$0	\$0	\$560,000
	PROTECCION	230201	0	1	\$560,000	\$0	\$0	\$560,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$1,573,100	\$0	\$0	\$1,573,100
	ARL SURA	14-11	5	6	\$1,573,100	\$0	\$0	\$1,573,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$904,000	\$0	\$0	\$904,000
	COMENALCO TOLIMA	CCF50	4	6	\$904,000	\$0	\$0	\$904,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	\$2,825,000	\$0	\$0	\$2,825,000
	NUOVA E.P.S.	EPS017	2	2	\$612,500	\$0	\$0	\$612,500
	SALUD TOTAL	EPS002	4	1	\$275,000	\$0	\$0	\$275,000
	SANTAS	EPS005	6	3	\$1,937,500	\$0	\$0	\$1,937,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$678,000	\$0	\$0	\$678,000
	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	2	6	\$678,000	\$0	\$0	\$678,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$452,000	\$0	\$0	\$452,000
	SENA	PASENA	1	6	\$452,000	\$0	\$0	\$452,000
TOTAL				6	\$10,133,100	\$0	\$0	\$10,133,100

	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES		CÓDIGO: GJR-058 FECHA VIGENCIA: 2021/07/15 VERSIÓN: 01 Página 1 de 4
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
Evaluación: _____ Fecha evaluación: 2/11/2023	Reevaluación: <input type="checkbox"/> Fecha reevaluación: _____		
Acta Parcial N° 5	Acta Final _____		
INFORMACION DEL CONTRATO			
NUMERO Y FECHA: 148 del 13 de Octubre de 2022 NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBONTRABE NIT: 901641469-9 C.C. FECHA DE INICIO: 26 de Noviembre de 2022 FECHA DE TERMINACION: 30 de Diciembre de 2023 OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION CANTIDADES DE OBRA NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DESDE LA BOCATOMA CÓCORA HASTA LA PTAP LA POLA Y LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DEL TANQUE SUR EN LA CIUDAD DE IBAGUE.			
CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION 2. SUMINISTRO Y ADQUISICION 3. ARRENDAMIENTO 4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA 5. SERVICIO 6. SEGUROS 7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS 8. OBRA PUBLICA	X	
ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA			
PUNTAJE	2= MALO	3= REGULAR	4= BUENO
4. CONTRATO DE CONSULTORIA E INTERVENTORIA			
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS		4	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE
COBERTURA DEL SERVICIO		5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		4	PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO		5	DISPOSICION DEL SERVICIO
ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS		4	ASIGNACION DE REEMPLAZOS
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES		5	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
TOTAL PROMEDIO		4.50	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES
			ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA
			CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO
IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO		5	4
IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO		4	EVALUACION TOTAL
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO		5	
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO		4	
TOTAL PROMEDIO		4.50	
ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION 4,43 POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con Interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):			
OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION <u>X</u>, REEVALUACION _____ POR PARTE DEL CONTRATISTA:			
INTERPONE RECURSO DE REPOSICION	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		
INTERPONE RECURSO DE APELACION	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		
NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedoras la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.			
La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual término a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).			
Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluación de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripción.			
NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con Interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)			
 JORGE ELMER DIAZ MORALES			
NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA			
 JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO			

Espacio para Logo Corporativo

CONSORCIO INTER BONTRABE
 NIT 901.641.469-9
 CARRERA 6 # 9 - 25 BARRIO BELEN
 Tel: (608) 3153286166
 Ibagué - Colombia
 jcl829@hotmail.com



Factura electrónica de venta
 No. FE 5

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	Teléfono	(608) 27560000
Dirección	CARRERA 4BIS N 3-91	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/11/2023, 10:30
Expedición	02/11/2023, 10:33
Vencimiento	02/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta Parcial No. 5 del Contrato de Interventoría No. 148 del 13 de Octubre del año 2022 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CANTIDADES DE OBRA NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DESDE LA BOCATOMA CÓCORA HASTA LA PTAP LA POLA Y LAS LÍNEAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE SUR EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ.	1.00	200,835,587.81

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Doscientos millones ochocientos treinta y cinco mil quinientos ochenta y siete pesos m/cte con ochenta y uno cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-02 por \$ 200,835,587.81

Observaciones:

Total Bruto	168,769,401.52
IVA 19%	32,066,186.29
Total a Pagar	200,835,587.81

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764040891201 aprobado en 20221206 prefijo FE desde el número 1 al 24 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa
 CUFE: 5b75e4885410735e8857ad82abd96de77c9f690791e68684c313a3f6314e48c3f53c76548acc291ccd3963cd451a1c585

Fabricante Software y Proveedor Tecnología Sligo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software Sligo Nucha. Firma electrónica ver en el XML.
