

ANEXO	RESUMEN DE EJECUCION	JULIO		AGOSTO		SEGUIMIENTO OK - CUMPLE NO - INCUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO	ANALISIS AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
		Cantidad 1 -15	Cantidad 15-31	Cantidad 1 -15	Cantidad 15-30			
	K0+00 A K7+650 (BOCATOMA A PUENTE COELLO)							
	HORIZONTALES	1		2	2	faltan 4 anclajes por construir	-2	PARA LA SEMANA DEL 30 DE AGOSTO SE DEBIO DAR CUMPLIMIENTO A LA CONSTRUCCION DE TODOS LOS ANCLAJES DE ESTA ZONA A LA FECHA FALTAN 4 ANCLAJES
	VERTICALES		2					
	MIXTOS							
	K7+650 A K10+650 (PUENTE COELLO A TUNEL FALSO)							
	HORIZONTALES	3		8	3	faltan 27 anclajes por construir	-2	PARA LA SEMANA DEL 30 DE AGOSTO SE DEBIO DAR CUMPLIMIENTO A LA CONSTRUCCION DE TODOS LOS ANCLAJES DE ESTA ZONA A LA FECHA FALTAN 27 ANCLAJES
	VERTICALES			9	2			
	MIXTOS							
	K10+650 A K19+300 (TUNEL FALSO A IBAL LA POLA)							
	HORIZONTALES	4		3		faltan 25 anclajes por construir	-17	PARA LA SEMANA DEL 30 DE AGOSTO SE DEBIO DAR CUMPLIMIENTO A LA CONSTRUCCION DE TODOS LOS ANCLAJES DE ESTA ZONA A LA FECHA FALTAN 25 ANCLAJES
	VERTICALES							
	MIXTOS	2		4				

RESUMEN DE EJECUCION	JULIO		AGOSTO		SEGUIMIENTO OK - CUMPLE NO - INCUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO	ANALISIS AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	Cantidad		Cantidad				
	1 - 15	15 - 31	1 - 15	15 - 30			
TOTAL ANC.	0	3	2	2			
ADUCCION (13 CAMARAS)							
Camara K6+380 Concreto (VALVULA SOBREVOLOCIDAD)		1			en ejecucion ya deberia estar terminada	-33	CAMARA QUE SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION, PERO DEBIO TERMINARSE LA SEMANA DEL 30 DE JULIO
Accesorios (Brida)			1		NO	-17	SUMINISTROS DE ACCESORIOS QUE DEBIAN ENTREGAR EN OBRA LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTOS ACCESORIOS
Nipleria		1			NO	-33	SUMINISTROS DE ACCESORIOS QUE DEBIAN ENTREGAR EN OBRA LA SEMANA DEL 30 DE JULIO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTOS ACCESORIOS
Suministro valvula			1		NO	-17	SUMINISTROS DE ACCESORIOS QUE DEBIAN ENTREGAR EN OBRA LA SEMANA DEL 15 AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTOS ACCESORIOS

RESUMEN DE EJECUCION	JULIO		AGOSTO		SEGUIMIENTO OK - CUMPLE NO - INCUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO	ANALISIS AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	1-15	15-31	1-15	15-30			
Montaje Valvula			1		NO	-2	INSTALACION DE NIPLERIA Y VALVULERIA QUE DEBIAN EJECUTARSE LA SEMANA DEL 30 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO LA INSTALACION DE ESTOS ACCESORIOS
Camara K7+640 Concreto (VALVULA CHEQUE)			X		NO	-17	CAMARA QUE SE DEBIO HABER EJECUTADO PARA LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA CAMARA
Accesorios Brida				1	NO	-17	SUMINISTROS DE ACCESORIOS QUE DEBIAN ENTREGAR EN OBRA LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTOS ACCESORIOS
Nipleria				1	NO	-17	SUMINISTROS DE ACCESORIOS QUE DEBIAN ENTREGAR EN OBRA LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTOS ACCESORIOS




CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.
R.I JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.

RESUMEN DE EJECUCION	JULIO		AGOSTO		SEGUIMIENTO OK - CUMPLE NO - INCUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO	ANALISIS AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	Cantidad 1 -15	15-31	Cantidad 1 -15	15-30			
Suministro valvula			X		NO	-17	SUMINISTROS DE ACCESORIOS QUE DEBIAN ENTREGAR EN OBRA LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTOS ACCESORIOS
Montaje Valvula			X		NO	-17	INSTALACION DE NIPLERIA Y VALVULERIA QUE DEBIAN EJECUTARSE LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO LA INSTALACION DE ESTOS ACCESORIOS
Camara K8+350 concreto (VALVULA VENTOSA R. PATIÑO)			1		NO	-17	CAMARA QUE SE DEBIO HABER EJECUTADO PARA LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA CAMARA
Accesorios Tornilleria	?						
Nipleria	NA						
Suministro valvula	1				OK		

RESUMEN DE EJECUCION	JULIO		AGOSTO		SEGUIMIENTO OK - CUMPLE NO - INCUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO	ANALISIS AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	Cantidad 1 -15	15-31	Cantidad 1 -15	15-30			
Montaje valvula	?				NO	-48	INSTALACION DE NIPLERIA Y VALVULERIA QUE DEBIAN EJECUTARSE LA SEMANA DEL 15 DE JULIO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO LA INSTALACION DE ESTOS ACCESORIOS
Camara K9+520 Concreto (VALVULA VENTOSA MORROCHUSCO)		1			NO	-33	CAMARA QUE SE DEBIO HABER EJECUTADO PARA LA SEMANA DEL 30 DE JULIO Y A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA CAMARA
Accesorios	?						
Nipleria	NA						
Suministro valvula	1				OK		
Montaje valvula	?				NO	-48	INSTALACION DE NIPLERIA Y VALVULERIA QUE DEBIAN EJECUTARSE LA SEMANA DEL 15 DE JULIO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO LA INSTALACION DE ESTOS ACCESORIOS





CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.

RESUMEN DE EJECUCION	JULIO		AGOSTO		SEGUIMIENTO OK - CUMPLE NO - INCUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO	ANALISIS AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	Cantidad 1 -15	15-31	Cantidad 1 -15	15-30			
Camara K8+923 Concreto (CHEQUE, VENTOSA Y PURGA)			X		NO	-17	CAMARA QUE SE DEBIO HABER EJECUTADO PARA LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA CAMARA
Accesorios Brida			1		NO	-17	SUMINISTROS DE ACCESORIOS QUE DEBIAN ENTREGAR EN OBRA LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTOS ACCESORIOS
Nipleria			1		NO	-17	SUMINISTROS DE ACCESORIOS QUE DEBIAN ENTREGAR EN OBRA LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTOS ACCESORIOS
Suministro valvula			X		NO	-17	SUMINISTROS DE ACCESORIOS QUE DEBIAN ENTREGAR EN OBRA LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTOS ACCESORIOS

RESUMEN DE EJECUCION	JULIO		AGOSTO		SEGUIMIENTO OK - CUMPLE NO - INCUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO	ANALISIS AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	Cantidad 1 - 15	15-31	Cantidad 1 - 15	15-30			
Montaje Valvula			X		NO	-17	INSTALACION DE NIPLERIA Y VALVULERIA QUE DEBIAN EJECUTARSE LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO LA INSTALACION DE ESTOS ACCESORIOS
Camara K10+620 Concreto (VENTOSA TUNEL FALSO)			1		NO	-17	CAMARA QUE SE DEBIO HABER EJECUTADO PARA LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA CAMARA
Accesorios	?						SUMINISTROS DE ACCESORIOS QUE DEBIAN ENTREGAR EN OBRA LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTOS ACCESORIOS
Nipleria			1		NO	-17	SUMINISTROS DE ACCESORIOS QUE DEBIAN ENTREGAR EN OBRA LA SEMANA DEL 15 DE JULIO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTOS ACCESORIOS
Suministro valvula	1				NO	-48	SUMINISTROS DE ACCESORIOS QUE DEBIAN ENTREGAR EN OBRA LA SEMANA DEL 15 DE JULIO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTOS ACCESORIOS

RESUMEN DE EJECUCION	JULIO		AGOSTO		SEGUIMIENTO OK - CUMPLE NO - INCUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO	ANALISIS AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	1 - 15	15-31	1 - 15	15-30			
Montaje valvula	?				NO	-48	INSTALACION DE NIPLERIA Y VALVULERIA QUE DEBIAN EJECUTARSE LA SEMANA DEL 15 DE JULIO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO LA INSTALACION DE ESTOS ACCESORIOS
Camara K12+968 Concreto (MARIPOSA 14" DERIVACION BOQUERON)	1				OK 80%	-33	CAMARA QUE SE ENCUENTRA EN EL 80% DE AVANCE, NO SE HA EJECUTADO LA INSTALACION DE VALVULAS, NIPLERIA Y LA CONEXIÓN DE TUBERIAS, A LA FECHA NO SE HA CULMINADO LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ESTA CAMARA
Accesorios HD				1	NO	-2	SUMINISTROS DE ACCESORIOS QUE DEBIAN ENTREGAR EN OBRA LA SEMANA DEL 30 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTOS ACCESORIOS

RESUMEN DE EJECUCION	JULIO		AGOSTO		SEGUIMIENTO OK - CUMPLE NO - INCUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO	ANALISIS AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	Cantidad 1 - 15	15-31	Cantidad 1 - 15	15-30			
Nipleria			1		NO	-17	SUMINISTROS DE ACCESORIOS QUE DEBIAN ENTREGAR EN OBRA LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTOS ACCESORIOS
Suministro valvula	1				OK		
Montaje valvula							
Camara K12+968 Concreto (MARIPOSA 24" DERIVACION BOQUERON)	1				OK 80%	-33	CAMARA QUE SE ENCUENTRA EN EL 80% DE AVANCE. NO SE HA EJECUTADO LA INSTALACION DE VALVULAS, NIPLERIA Y LA CONEXIÓN DE TUBERIAS, A LA FECHA NO SE HA CULMINADO LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ESTA CAMARA
Accesorios			1		NO	-17	SUMINISTROS DE ACCESORIOS QUE DEBIAN ENTREGAR EN OBRA LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTOS ACCESORIOS

RESUMEN DE EJECUCION	JULIO		AGOSTO		SEGUIMIENTO OK - CUMPLE NO - INCUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO	ANALISIS AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	Cantidad 1 -15	15-31	Cantidad 1 -15	15-30			
Nipleria			1		NO	-17	SUMINISTROS DE ACCESORIOS QUE DEBIAN ENTREGAR EN OBRA LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTOS ACCESORIOS
Suministro valvula		1			OK		INSTALACION DE NIPLERIA Y VALVULERIA QUE DEBIAN EJECUTARSE LA SEMANA DEL 30 DE JULIO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO LA INSTALACION DE ESTOS ACCESORIOS
Montaje valvula				?	NO	-2	CAMARA QUE SE DEBIO HABER EJECUTADO PARA LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA CAMARA
Camara K18+084 concreto (VALVULA CHEQUE)			X		NO	-17	SUMINISTROS DE ACCESORIOS QUE DEBIAN ENTREGAR EN OBRA LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTOS ACCESORIOS
Accesorios					NO	-17	SUMINISTROS DE ACCESORIOS QUE DEBIAN ENTREGAR EN OBRA LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTOS ACCESORIOS

RESUMEN DE EJECUCION	JULIO		AGOSTO		SEGUIMIENTO OK - CUMPLE NO - INCUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO	ANALISIS AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	Cantidad 1 - 15	15-31	Cantidad 1 - 15	15-30			
Nipleria			1		NO	-17	SUMINISTROS DE ACCESORIOS QUE DEBIAN ENTREGAR EN OBRA LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTOS ACCESORIOS
Suministro valvula			X		NO	-17	SUMINISTROS DE ACCESORIOS QUE DEBIAN ENTREGAR EN OBRA LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTOS ACCESORIOS
Montaje valvula			X		NO	-17	INSTALACION DE NIPLERIA Y VALVULERIA QUE DEBIAN EJECUTARSE LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO LA INSTALACION DE ESTOS ACCESORIOS
Camara K18+710 (VALVULA PURGA) definir abscesa		1			NO	-33	CAMARA QUE SE DEBIO HABER EJECUTADO PARA LA SEMANA DEL 30 DE JULIO Y A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA CAMARA

IBAQUE VIBRA
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALGEBARRILLO

IBAL
S.A. EXP. OFICIAL

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.
R.I JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C. 5.829.473 DE IBAGUE.

RESUMEN DE EJECUCION	JULIO		AGOSTO		SEGUIMIENTO OK - CUMPLE NO - INCUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO	ANALISIS AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	1-15	15-31	1-15	15-30			
Accesorios				?	NO		SUMINISTROS DE ACCESORIOS QUE DEBIAN ENTREGAR EN OBRA LA SEMANA DEL 30 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTOS ACCESORIOS
Nipleria			1		NO	-17	SUMINISTROS DE ACCESORIOS QUE DEBIAN ENTREGAR EN OBRA LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTOS ACCESORIOS
Suministro valvula		1			OK		
Montaje valvula				?	NO	-2	INSTALACION DE NIPLERIA Y VALVULERIA QUE DEBIAN EJECUTARSE LA SEMANA DEL 30 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO LA INSTALACION DE ESTOS ACCESORIOS
Camara K19+276 (VALVULA VENTOSA IBAAL POLA)		1			NO	-33	CAMARA QUE SE DEBIO HABER EJECUTADO PARA LA SEMANA DEL 30 DE JULIO Y A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA CAMARA

RESUMEN DE EJECUCION	JULIO		AGOSTO		SEGUIMIENTO OK - CUMPLE NO - INCUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO	ANALISIS AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	1-15	15-31	1-15	15-30			
Accesorios			?		NO	-17	SUMINISTROS DE ACCESORIOS QUE DEBIAN ENTREGAR EN OBRA LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTOS ACCESORIOS
Nipleria	NA				OK		
Suministro valvula	1				OK		
Montaje valvula			?		NO	-17	INSTALACION DE NIPLERIA Y VALVULERIA QUE DEBIAN EJECUTARSE LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO LA INSTALACION DE ESTOS ACCESORIOS
Camara K19+290 (FILTRO EN Y)	1				OK 80%	-48	CAMARA QUE SE ENCUENTRA EN EL 80% DE AVANCE. NO SE HA EJECUTADO LA INSTALACION DE VALVULAS, NIPLERIA Y LA CONEXIÓN DE TUBERIAS, A LA FECHA NO SE HA CULMINADO LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ESTA CAMARA LAS CUALES SE TIENEN PROGRAMADAS PARA TERMINAR LA SEMANA DEL 15 DE JULIO.

RESUMEN DE EJECUCION	JULIO		AGOSTO		SEGUIMIENTO OK - CUMPLE NO - INCUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO	ANALISIS AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	Cantidad 1 -15	15-31	Cantidad 1 -15	15-30			
Accesorios			1		NO	-2	SUMINISTROS DE ACCESORIOS QUE DEBIAN ENTREGAR EN OBRA LA SEMANA DEL 30 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTOS ACCESORIOS
Nipleria			1		NO	-2	SUMINISTROS DE ACCESORIOS QUE DEBIAN ENTREGAR EN OBRA LA SEMANA DEL 30 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTOS ACCESORIOS
Suministro valvula			1		NO	-2	SUMINISTROS DE ACCESORIOS QUE DEBIAN ENTREGAR EN OBRA LA SEMANA DEL 30 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTOS ACCESORIOS
Montaje valvula							



CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.
R.I JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.

RESUMEN DE EJECUCION	JULIO		AGOSTO		SEGUIMIENTO OK - CUMPLE NO - INCUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO	ANALISIS AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	Cantidad	15-31	Cantidad	15-30			
Camara K19+305 (MA CROMEDIIDOR)	1				OK 80%	-48	CAMARA QUE SE ENCUENTRA EN EL 80% DE AVANCE, NO SE HA EJECUTADO LA INSTALACION DE VALVULAS, NIPLERIA Y LA CONEXIÓN DE TUBERIAS, A LA FECHA NO SE HA CULMINADO LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ESTA CAMARA LAS CUALES SE TIENEN PROGRAMADAS PARA TERMINAR LA SEMANA DEL 15 DE JULIO. SUMINISTROS DE ACCESORIOS QUE DEBIAN ENTREGAR EN OBRA LA SEMANA DEL 30 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTOS ACCESORIOS SUMINISTROS DE ACCESORIOS QUE DEBIAN ENTREGAR EN OBRA LA SEMANA DEL 30 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTOS ACCESORIOS
Accesorios				1	NO	-2	SUMINISTROS DE ACCESORIOS QUE DEBIAN ENTREGAR EN OBRA LA SEMANA DEL 30 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTOS ACCESORIOS
Nipleria				1	NO	-2	SUMINISTROS DE ACCESORIOS QUE DEBIAN ENTREGAR EN OBRA LA SEMANA DEL 30 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTOS ACCESORIOS







CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.
R.I JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.

IBAL
14 ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGUENESA DE
ACUEDUCTO Y ALGEBRILLADO

RESUMEN DE EJECUCION	JULIO		AGOSTO		SEGUIMIENTO OK - CUMPLE NO - INCUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO	ANALISIS AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	1-15	15-31	1-15	15-30			
Suministro macromedidor			?		NO	-2	SUMINISTROS DE ACCESORIOS QUE DEBIAN ENTREGAR EN OBRA LA SEMANA DEL 30 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTOS ACCESORIOS
Montaje valvula			?		NO	-2	INSTALACION DE NIPLERIA Y VALVULERIA QUE DEBIAN EJECUTARSE LA SEMANA DEL 30 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO LA INSTALACION DE ESTOS ACCESORIOS
Camara K19+355 (VALVULAS ANULARES)	1				OK 80%	-48	CAMARA QUE SE ENCUENTRA EN EL 80% DE AVANCE, NO SE HA EJECUTADO LA INSTALACION DE VALVULAS, NIPLERIA Y LA CONEXIÓN DE TUBERIAS, A LA FECHA NO SE HA CULMINADO LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ESTA CAMARA LAS CUALES SE TIENEN PROGRAMADAS PARA TERMINAR LA SEMANA DEL 15 DE JULIO.

RESUMEN DE EJECUCION	JULIO		AGOSTO		SEGUIMIENTO OK - CUMPLE NO - INCUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO	ANALISIS AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	Cantidad 1 -15	15-31	Cantidad 1 -15	15-30			
Accesorios			1		NO	-2	SUMINISTROS DE ACCESORIOS QUE DEBIAN ENTREGAR EN OBRA LA SEMANA DEL 30 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTOS ACCESORIOS
Nipleria			1		NO	-2	SUMINISTROS DE ACCESORIOS QUE DEBIAN ENTREGAR EN OBRA LA SEMANA DEL 30 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTOS ACCESORIOS
Suministro valvulas			1		NO	-2	SUMINISTROS DE ACCESORIOS QUE DEBIAN ENTREGAR EN OBRA LA SEMANA DEL 30 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTOS ACCESORIOS
Montaje valvula							
CONDUCCION (5 CAMARAS)							
Camara K4+465 (VALVULA 8" PURGA PASO 2)							



CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



IBAL
14 ESP. OFICIAL
 EMPRESA, IBAGUERENA DE
 ASOCIADOS Y ALCAZARILLADO

RESUMEN DE EJECUCION	JULIO		AGOSTO		SEGUIMIENTO OK - CUMPLE NO - INCUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO	ANALISIS AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	Cantidad	15-31	Cantidad	15-30			
Accesorios			1		NO	-2	SUMINISTROS DE ACCESORIOS QUE DEBIAN ENTREGAR EN OBRA LA SEMANA DEL 30 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTOS ACCESORIOS
Nipleria			1		NO	-2	SUMINISTROS DE ACCESORIOS QUE DEBIAN ENTREGAR EN OBRA LA SEMANA DEL 30 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTOS ACCESORIOS
Suministro valvula	1				OK		
Montaje valvula			?		NO	-2	INSTALACION DE NIPLERIA Y VALVULERIA QUE DEBIAN EJECUTARSE LA SEMANA DEL 30 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO LA INSTALACION DE ESTOS ACCESORIOS
Camara K4+482 (VALVULA VENTOSA 4" PASO 2) solo instalación				NA			
Accesorios				NA			
Nipleria				NA			
Suministro valvula	1				OK		

RESUMEN DE EJECUCION	JULIO		AGOSTO		SEGUIMIENTO OK - CUMPLE NO - INCUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO	ANALISIS AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	Cantidad		Cantidad				
	1 -15	15-31	1 -15	15-30			
Montaje valvula					NO	-2	INSTALACION DE NIPLERIA Y VALVULERIA QUE DEBIAN EJECUTARSE LA SEMANA DEL 30 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO LA INSTALACION DE ESTOS ACCESORIOS
Camara K4+601 (VALVULA COMPUERTA (3) 14" + VALV.REG NIVEL TANQUE SUR)				?	OK EN CONSTRUCCION		
Accesorios							
Nipleria							
Suministro valvula							
Montaje valvula							
Camara K4+586 (VALVULAS MARIPOSA 20")							
Accesorios							
Nipleria							
Suministro valvula							
Montaje valvula							
Camara K1+010 (VALVULAS COMPUERTA 14" DISTRIBUCION)				1	NO	-2	CAMARA QUE SE DEBIO HABER EJECUTADO PARA LA SEMANA DEL 30 DE AGOSTO Y A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA CAMARA
Accesorios							


RESUMEN DE EJECUCION	JULIO		AGOSTO		SEGUIMIENTO OK - CUMPLE NO - INCUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO	ANALISIS AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	1-15	15-31	1-15	15-30			
Niplieria							
Suministro valvula							
Montaje valvula							
TOTAL CAMARAS	8	11	15	13			
K3+800 (OJO)				70	NO	-2	PROGRAMADO PARA LA SEMANA DEL 30 DE AGOSTO SE TIENE PROGRAMADO LA CULMINACION DE LA INSTALACION DE TUBERIA GRP 36" EN LA ZONA DEL K3+800 EL REALINEAMIENTO DE TUBERIA, A LA FECHA NO SE PRESENTA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES EN ESTE FRENTE DE TRABAJO
K8+311 a K8+366 (Tubería WSP)		32			NO	-33	SE TIENE PROGRAMADO LA INSTALACION DEL TOTAL DE LA TUBERIA WSP 36" PARA LA SEMANA DEL 30 DE JULIO, A LA FECHA NO SE HA REALIZADO LA TOTALIDAD DE LA INSTALACION DE LA TUBERIA EN ESTE FRENTE

RESUMEN DE EJECUCION	JULIO		AGOSTO		SEGUIMIENTO OK - CUMPLE NO - INCUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO	ANALISIS AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	1-15	15-31	1-15	15-30			
K9+146 a K9+417 (Tubería WSP)	30	60	60		NO 172 ML	-17	SE TIENE PROGRAMADO LA INSTALACION DEL TOTAL DE LA TUBERIA WSP 36" EN EL FRENTE DE PUENTE 17 PARA LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO, A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO LA TOTALIDAD DE LA INSTALACION DE LA TUBERIA EN ESTE FRENTE
K9+505 a K9+538 (Tubería A.C)		33			NO 6 ML	-33	SE TIENE PROGRAMADO LA INSTALACION DEL TOTAL DE LA TUBERIA AC 36" EN EL FRENTE DE PUENTE 17 PARA LA SEMANA DEL 30 DE JULIO, A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO LA TOTALIDAD DE LA INSTALACION DE LA TUBERIA EN ESTE FRENTE
K9+418 a K9+505 (Tubería GRP carcamo)					OK		
K9+538 a K9+787 (Tubería GRP)			6		NO FALTAN ACCESORIOS	-17	SE TIENE PROGRAMADO LA INSTALACION DEL TOTAL DE LA TUBERIA GRP 36" EN EL FRENTE DE PUENTE 17 PARA LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO, A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO LA TOTALIDAD DE LA INSTALACION DE LA TUBERIA EN ESTE FRENTE

RESUMEN DE EJECUCION	JULIO		AGOSTO		SEGUIMIENTO OK - CUMPLE NO - INCUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO	ANALISIS AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	1-15	15-31	1-15	15-30			
K10+520 a K10+625 (Tubería GRP tunel falso)			105		NO 75 ML	-17	SE TIENE PROGRAMADO LA INSTALACION DEL TOTAL DE LA TUBERIA GRP 36" EN EL FRENTE DE TUNEL FALSO PARA LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO. A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO LA TOTALIDAD DE LA INSTALACION DE LA TUBERIA EN ESTE FRENTE
K12+640 a K12+750 (Tubería GRP puente 12)				110	NO	-2	SE TIENE PROGRAMADO LA INSTALACION DEL TOTAL DE LA TUBERIA GRP 36" EN EL FRENTE DE PUENTE 12 PARA LA SEMANA DEL 30 DE AGOSTO, A LA FECHA NO SE HAN INICIADO LAS ACTIVIDADES DE INSTALACION DE LA TUBERIA EN ESTE FRENTE
K12+960 a K12+990 (Derivación Boqueron)					OK 10 ML	-48	SE TIENE PROGRAMADO PARA LA SEMANA DEL 15 DE JULIO LA INSTALACION DE LA TOTALIDAD DE LA TUBERIA GRP 24" DE LA ZONA DERIVACION BOQUERON, A LA FECHA SE ENCUENTRAN INSTALADOS 10 METROS LINEALES Y A LA FECHA SE ENCUENTRAN A LA ESPERA DE ACCESORIOS DE CONEXION PARA LA TERMINACION DE ACTIVIDADES.

RESUMEN DE EJECUCION	JULIO		AGOSTO		SEGUIMIENTO OK - CUMPLE NO - INCUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO	ANALISIS AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	Cantidad 1 - 15	15-31	Cantidad 1 - 15	15-30			
K17+940 a K18+100 (Paso combeima)	80		67		NO	-17	SE TIENE PROGRAMADO PARA LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO REALIZAR LA INSTALACION TOTAL DE LA TUBERIA QUE SE INSTALARA EN PASO COMBEIMA, A LA FECHA SE ESTAN REALIZANDO CORRECCIONES SOBRE LAS SILLETAS DE APOYO Y NO SE HA REALIZADO LA INSTALACION DE LA TUBERIA.
K19+230 a K19+300 (Planta Ibal)		25			NO	-33	PARA LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO SE TIENE PROGRAMADO LA FINALIZACION DE LA INSTALACION DE LA TUBERIA GRP 24", A LA FECHA DEL ANALISIS NO SE HAN CULMINADO LAS ACTIVIDADES, SE ENCUENTRA PRESENCIA DE ACCESORIO TUBERIA CAY EN EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERIA.

RESUMEN DE EJECUCION	JULIO		AGOSTO		SEGUIMIENTO OK - CUMPLE NO - INCUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO	ANALISIS AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	Cantidad 1-15	Cantidad 15-31	Cantidad 1-15	Cantidad 15-30			
K4+300 a K4+580 (Conduccion tanque sur)			50		NO	-17	PARA LA SEMANA DEL 15 DE JULIO SE TIENE PROGRAMADO LA INSTALACION DE LA TOTALIDAD DE LA TUBERIA DE CONDUCCION TANQUE SUR. A LA FECHA NO SE HAN INICIADO LAS ACTIVIDADES DE INSTALACION DE TUBERIA GRP 32"
TOTAL INSTALACION TUBERIAS	41	230	288	180			
K9+500 Obras estabilización			?		NO	-17	SE TIENE PROGRAMADO PARA LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO REALIZAR LAS OBRAS DE ESTABILIZACION UBICADAS EN EL K9+500, A LA FECHA NO SE HA EJECUTADO LAS OBRAS DE ESTABILIZACION.
K11+100 Construcción alcantarillas			?		NO EN EJECUCION	-17	SE TIENE PROGRAMADO PARA LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO REALIZAR CONSTRUCCION DE LAS ALCANTARILLAS PROPUESTAS EN EL SECTOR DE TUNEL FALSO, A LA FECHA NO SE HA INICIADO CON LA EJECUCION DE ACTIVIDADES EN ESE SECTOR.
O. DE ARTEY PASOS							



EMPRESA IBAQUERÍA DE
ACUEDUCTO Y ALGANTALLADO

IBAL

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.
R.I JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



RESUMEN DE EJECUCION	JULIO		AGOSTO		SEGUIMIENTO OK - CUMPLE NO - INCUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO	ANALISIS AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	Cantidad 1 -15	15-31	Cantidad 1 -15	15-30			
K11+500 Obras pavimentacion tuneles	0.2	0.2	0.2		NO 60%	-17	SE TIENE PROGRAMADO PARA LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO TENER TERMINADO LA PAVIMENTACION DEL SECTOR DE TUNELES. A LA FECHA SE ENCUENTRAN EN UN 60% DE AVANDE DE ACTIVIDADES DE PAVIMENTACION
K12+00 Montaje estructura puente 12			1		NO	-17	LA PROGRAMACION CONTEMPLA LA INSTALACION DE LA ESTRUCTURA DE PUENTE 12 PARA LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO. A LA FECHA LA ESTRUCTURA SE ENCUENTRA ARMADA Y NO SE HA EJECUTADO EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DE PUENTE 12
K4+300 estructura paso 2 (Conduccion tanque sur)		1			NO	-33	LA PROGRAMACION CONTEMPLA LA INSTALACION DE LA ESTRUCTURA DE PASO 2 PARA LA SEMANA DEL 30 DE JULIO. A LA FECHA LA ESTRUCTURA SE ENCUENTRA ARMADA Y NO SE HA EJECUTADO EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DE PASO 2

RESUMEN DE EJECUCION	JULIO		AGOSTO		SEGUIMIENTO OK - CUMPLE NO - INCUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO	ANALISIS AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	Cantidad		Cantidad				
	1-15	15-31	1-15	15-30			
K0+00 Empalme tanque ciudad (conduccion tanque sur)		1			NO	-33	SE TIENE PREVISTO PARA LA SEMANA DEL 30 DE JULIO REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE EMPALME DE TANQUE SUR CON LA LINEA DE CONDUCCION, A LA FECHA NO SE HAN INICIADO LAS ACTIVIDADES DE ESTE FRENTE DE TRABAJO
TOTAL OBRAS ARTE Y PASOS	0.2	2.2	1.2	0			SEGÚN LA PROGRAMACION SE TENIA DISPUESTO SUMINISTRAR LA VALVULA DE SOBREVELOCIDAD PARA LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO, A LA FECHA DEL PRESENTE ANALISIS NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTA VALVULA QUE ES VITAL PARA LA FUNCIONALIDAD DEL PROYECTO
Valvula sobrevelocidad			1		NO	-17	SEGÚN LA PROGRAMACION SE TENIA DISPUESTO SUMINISTRAR LAS VALVULAS ANULARES PARA LA SEMANA DEL 30 DE AGOSTO, A LA FECHA DEL PRESENTE ANALISIS NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTA VALVULAS.
Valvulas anulares				1	NO	-2	SEGÚN LA PROGRAMACION SE TENIA DISPUESTO SUMINISTRAR LAS VALVULAS ANULARES PARA LA SEMANA DEL 30 DE AGOSTO, A LA FECHA DEL PRESENTE ANALISIS NO SE HA REALIZADO EL SUMINISTRO DE ESTA VALVULAS.
SUMINISTROS							



EMPRESA IBAQUERENA DE
AGUODUCTO Y AGUANTARILLADO

IBBAL
SA ESP. OFICIAL

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



RESUMEN DE EJECUCION	JULIO		AGOSTO		SEGUIMIENTO OK - CUMPLE NO - INCUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO	ANALISIS AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	1 -15	15-31	1 -15	15-30			
Valvulas purga y ventosa		1			OK		SEGÚN LA PROGRAMACION SE TENIA DISPUESTO EL SUMINISTRO DE TODA LA TUBERIA Y ACCESORIOS DE WSP, AC Y HD PARA LA SEMANA DEL 30 DE AGOSTO, A LA FECHA DEL PRESENTE ANALISIS HACE FALTA LA ENTREGA DE LA TUBERIA DE HD, Y NIPLERIA PARA CAMARAS DEN AC.
Tubería WSP, AC, HD	0.25		0.25		NO 80%	-2	LA PROGRAMACION PRESENTA EL SUMINISTRO DE LA TUBERIA Y ACCESORIOS DE GRP PARA LA SEMANA DEL 15 DE AGOSTO, A LA FEHA DEL PRESENTE INFORME NO SE HAN SUMINISTRADO LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS.
Tubería GRP	0.3		0.3		NO FALTAN ACCESORIOS	-17	
Automatización							
TOTAL VALVULAS	0	1.55	1.3	1.25			

Fuente: Consorcio CÓCORA IBALTOL



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBACUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.I JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



De acuerdo al análisis realizado por esta interventoría se concluye que los retrasos que presenta el contratista en la construcción e instalación de tuberías y accesorios deriva de la tardía adquisición de los suministros desde el inicio del contrato, esto se refleja que a la fecha todavía no se presenta la totalidad de la adquisición y suministro de todos los elementos necesarios para la funcionalidad y culminación del proyecto conforme a las especificaciones técnicas para la correcta ejecución del contrato.

6.7. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

De acuerdo con el contrato de obra 144 de 2022 la forma de pago establecida en la cláusula No. 8 Forma de pago: se pagará al contratista el valor equivalente al 90% del total del contrato mediante pagos parciales conforme al avance de obra y un valor equivalente al 10% del valor del contrato a través del acta de liquidación.

De acuerdo con lo anterior a la fecha del presenta informe el contratista de obra no ha tramitado cobros mediante actas parciales, a continuación, se presenta el balance del contrato de obra:

Tabla 19. Balance del contrato.

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	\$25,040,391,019	
ACTA PARCIAL No. 1 del 30/03/2023		\$ 2,349,363,000.00
ACTA PARCIAL No. 2 del 14/06/2023		\$ 3,669,196,912.00
ACTA PARCIAL No. 3 del 14/07/2023		\$ 2,700,478,810.00
ACTA PARCIAL No. 4 del 02/08/2023		\$ 1,445,643,607.00
SALDO POR EJECUTAR		\$ 14,875,708,690.00
SUMAS IGUALES	\$25,040,391,019.49	\$25,040,391,019.49

Fuente. Consorcio Interbontrabe

Según la cláusula 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPO del contrato de obra 144 de 2022 el contratista obtendrá un anticipo del 25% del valor del contrato, el cual se desembolsará a través de una fiducia. A continuación, se realiza resumen del balance del anticipo.

Tabla 20. Balance del anticipo del contrato de obra

BALANCE DEL ANTICIPO		
VALOR DEL ANTICIPO 25%	\$ 6,260,097,754.87	
VALOR AMORTIZADO EN ACTA No. 1		\$ 587,340,750.00
VALOR AMORTIZADO EN ACTA No. 2		\$ 917,299,228.00
VALOR AMORTIZADO EN ACTA No. 3		\$ 675,119,702.50
VALOR AMORTIZADO EN ACTA No. 4		\$ 361,410,901.75
ANTICIPO POR AMORTIZAR		\$ 3,718,927,172.62
SUMAS IGUALES	\$ 6,260,097,754.87	\$ 6,260,097,754.87

Fuente. Consorcio Interbontrabe



El contratista de obra apertura una cuenta para el manejo del anticipo con ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS con cuenta de ahorros 040 0000 5314. Además, constituyo póliza de seguro para manejo del anticipo con entidades estatales N-Póliza I- 100015986 de aseguradora COMPAÑÍA MUNDIA DE SEGUROS S.A.

Tabla 21: Plan inversión del anticipo

PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO 1			
No	DESCRIPCION	VALOR TOTAL (EN MILES)	PORCENTAJE
1	COMPRA DE MATERIALES	\$ 4.695.073.316,06	75.00%
2	MANO DE OBRA	\$ 626.009.775,48	10.00%
3	TRANSPORTE	\$ 313.004.887,74	5.00%
4	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 626.009.775,48	10.00%
	TOTAL	\$ 6.260.097.754,75	100.00%

Fuente. Consorcio Cócora Iballol

A la fecha del presente periodo del informe la entidad realizo el desembolso del valor correspondiente al anticipo.

Tabla 22 Balance del giro del anticipo

BALANCE DEL GIRO DEL ANTICIPO		
ANTICIPO 25% DEL VALOR DEL CONTRATO	\$ 6,260,097,755.00	
DESCUENTOS APLICADOS POR LA ENTIDAD - CONTRIBUCION DE OBRA 5%		- \$ 313,004,888.00
VALOR DE GIRO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE		\$ 5,947,092,867.00
SUMAS IGUALES	\$ 6,260,097,755.00	\$ 6,260,097,755.00

Fuente. Consorcio Cócora Iballol

De acuerdo con el valor girado por la entidad contratante **IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL** a la fiduciaria **ALIANZA FIDUCIARIA** por CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CIENTE PESOS M/CTE (**\$ 5.947.092.867,00**), esta última solicito ajustar el plan de inversión del anticipo con relación a este mismo, conservando las descripciones o ítems iniciales e incluyendo el gravamen a los movimientos financieros o 4 por mil, siendo obligación tributaria.

Tabla 23: Plan inversión del anticipo No.0 2 según fiducia

PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO 2 (AJUSTADO SEGÚN FIDUCIA)			
No	DESCRIPCION	VALOR TOTAL (EN MILES)	PORCENTAJE
1	COMPRA DE MATERIALES	\$ 4,460,319,650.25	75.00%
2	MANO DE OBRA Y ADMINISTRACIÓN	\$ 594,709,286.70	10.00%
3	TRANSPORTES	\$ 297,354,643.35	5.00%



IBAL
S.A. ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGÜERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



4	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 570,920,915.23	9.60%
5	GRF (4x1.000)	\$ 23,788,371.47	0.40%
	TOTAL	\$ 5,947,092,867.00	100.00%

Fuente. Consorcio Cócora Iballot


Tabla 24: Plan inversión del anticipo No.03 ajustado por contratista.

PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO 3 (AJUSTADO POR CONTRATISTA)			
No	DESCRIPCION	VALOR TOTAL (EN MILES)	PORCENTAJE
1	COMPRA DE MATERIALES	\$4,535,319,650.00	75.00%
2	MANO DE OBRA Y ADMINISTRACIÓN	\$644,709,287.00	10.00%
3	TRANSPORTES	\$322,354,643.00	5.00%
4	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$444,709,287.00	9.60%
5	GRF (4x1.000)	\$ 23,788,371.47	0.40%
	TOTAL	\$ 5,947,092,867.00	100.00%

Fuente. Consorcio Cócora Iballot

A la fecha ya los recursos del anticipo se utilizaron al 100%.

Ilustración 2: Análisis de la inversión del anticipo del contrato de obra 144 de 2022

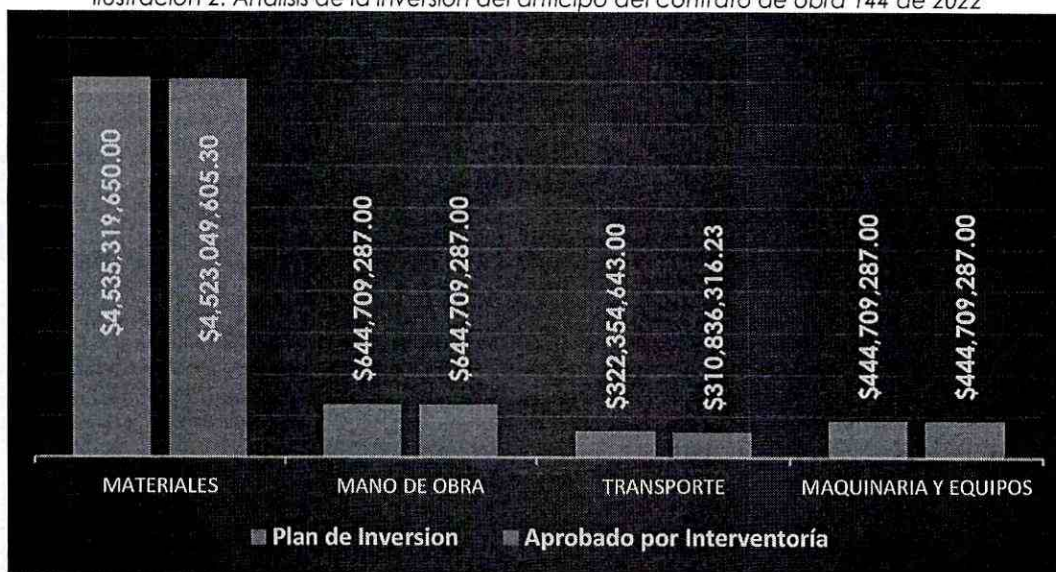

Fuente. Consorcio Interbontrabe
