




Consorcio Cocora Iballol

CONSORCIO COCORA IBALTOL
NIT. 901637146-1

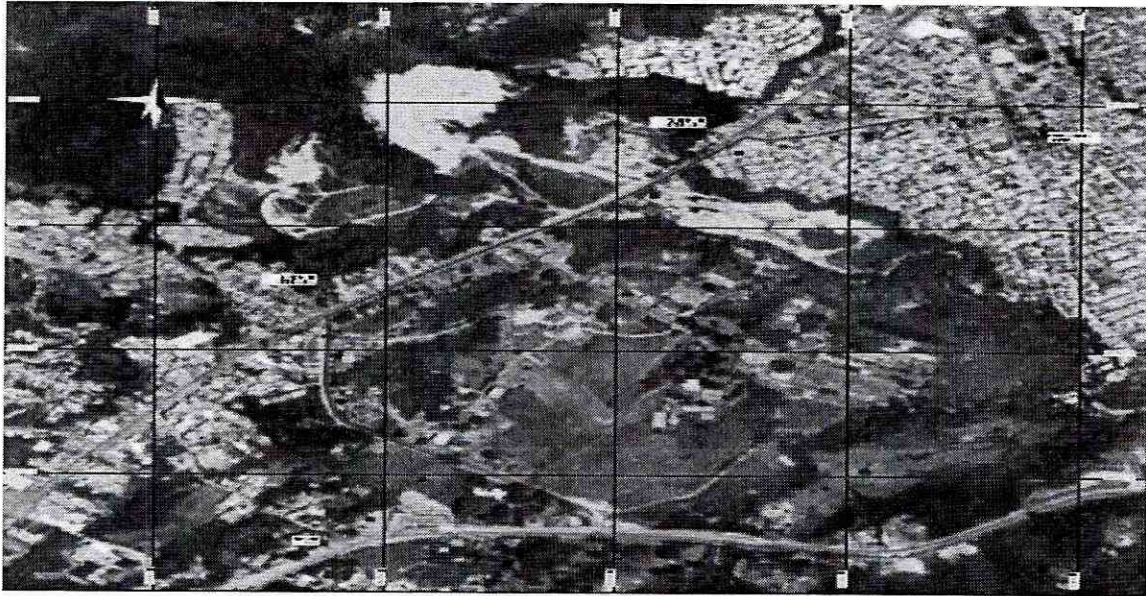

PERSONAL PROPUESTO POR EL IBAL PARA LA SUPERVISION DEL CONTRATO.

CARGO	NOMBRE
Supervisor de Contrato de Obra	JORGE ELMER DIAZ

CARGO	NOMBRE
Director Interventoría	JUAN CARLOS BONILLA



Consorcio Cocora Iballtol

CONSORCIO COCORA IBALTOL
NIT. 901637146-1



CONTRATO DE OBRA No 0144 DE 2022

CONTRATO DE OBRA No	0144 DE 12 DE OCTUBRE DE 2022
OBJETO	CONTRATAR LAS CANTIDADES DE OBRA NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DESDE LA BOCATOMA COCORA HASTA LA PTAP LA POLA Y LAS LÍNEAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE SUR EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ.
CONTRATISTA	CONSORCIO COCORAIBALTOL, identificada con el NIT: 901.637.146-1 REPRESENTANTE LEGAL: ING LUIS EGIMIO BARON VARGAS
PLAZO INICIAL	8 MESES
FECHA DE INICIO	NOVIEMBRE 26 DE 2022
FECHA TERMINACION	JULIO 26 DE 2022
VALOR INICIAL AL CONTRATO DE OBRA	VENTICINCO MIL CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DIECINUEVE PESOS. \$ 25.040.391.019
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	VENTICINCO MIL CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DIECINUEVE PESOS. \$ 25.040.391.019



CONSORCIO COCORA IBALTOL

NIT. 901637146-1



Consorcio Cocora Iballol

Control De Pólizas

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)	
	DESDE	HASTA
Calidad y correcto funcionamiento I-100015986	12/10/2023	12/06/2028
Cumplimiento del Contrato I-100015986	12/10/2022	12/12/2023
Buen Manejo del Anticipo I-100015986	21/11/2022	21/07/2023
Estabilidad de la Obra I-100015986	12/06/2023	12/06/2028
Salario y Prestaciones Sociales I-100015986	12/10/2022	12/06/2026

BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE CONTRATO			
VALOR INICIAL CONTRATO	ACTAS PARCIALES EJECUTADAS	AMORTIZACION	
25,040,391,019.00	1	2,349,363,086.14	587,340,771.54
	2	3,669,196,912.00	917,299,228.00
SUMAS IGUALES 25,040,391,019.00		19,021,831,020.86	1,504,639,999.54

INVERSIÓN ANTICIPO MAYO 2023

DESCRIPCION DEL ITEM	PLAN DE INVERSION	APROBADO POR INTERVENTORIA	SALDO POR GIRAR	PORCENTAJE UTILIZADO
MATERIALES	\$ 4,535,319,650.00	\$ 4,513,713,627.00	\$ 21,606,023.00	99.52%
MANO DE OBRA	\$ 644,709,287.00	\$ 641,816,733.00	\$ 2,892,554.00	99.55%
TRANSPORTE	\$ 322,354,643.00	\$ 296,356,245.00	\$ 25,998,398.00	91.93%
MATERIALES Y EQUIPOS	\$ 444,709,287.00	\$ 439,550,452.00	\$ 5,158,835.00	98.84%
TOTAL GIRADO	\$ 5,947,092,867.00	\$ 5,891,437,057.00	\$ 55,655,810.00	99.06%

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE ACTIVIDADES EN EL MES

Conforme a la programación de actividades y a las necesidades de la vía, el contratista en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Julio 2023.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

REVISIÓN DE DISEÑOS ANCLAJES: De acuerdo a solicitud del consultor e interventoría se debía realizar levantamiento topográfico y dibujo de la geometría de anclajes en sitio, una vez realizada la excavación de cada uno de los dados existentes según planos; en reunión virtual del 28 de diciembre de 2022 entre grucon, supervisión IBAL, interventoría y contratista los datos entregados por el contratista no eran útiles a grucon sin ser correspondientes a su topografía; por lo tanto el contratista informa que al no tener ningún tipo de coordenadas ni topografía desde el principio del contrato tuvo que trabajar con coordenadas arbitrarias en la localización de los dados existentes, por tanto solicito a grucon quien tiene los datos de diseño del proyecto entregar diseño definitivo de anclajes con dimensiones y volúmenes de concreto por utilizar en cada uno para poder realizar en campo la construcción u optimización de los mismos; el día 30 de diciembre de 2022 se recibe por parte de interventoría oficio con 10 anclajes y sus dimensiones; revisados los diseños que observan que las alturas no son

CARRERA 7 No 9-43 OFICINA 302 SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

Correo: consorciococoraibal@gmail.com



CONSORCIO COCORA IBALTOL

NIT. 901637146-1



Consorcio Cocora Iballol

congruentes para el recubrimiento del tubo lo cual se informa de manera verbal a interventoría el día 3 de enero de 2023; el día 05 de enero de 2023 en sitio Coello se informa al supervisor del contrato la misma anomalía en los diseños por tanto se programa reunión el 10 de enero de 2023 con grucon de manera virtual en donde se define que para el día 13 de enero de 2023 se entregaran los diseños corregidos; Para el día 13/01/2023 se recibe un correo con asunto "Segunda entrega anclajes nuevos aducción Cocora", con tabla de dimensiones, pero sin despieces de aceros lo que imposibilitaba la construcción de los mismos, lo cual fue informado a la interventoría para ser trasladado a GRUCON. El 27 de enero de 2023 se recibieron 42 anclajes de los cuales se encuentran aproximadamente 20 desde el K0+000 al K7+500 el excedente se encuentran distribuidos por los tramos de tuberías sin instalar, y tramos donde se realizaron cambio en la línea de instalación que a la fecha se encuentra pendiente por suministro la tubería y accesorios, y se encuentran en construcción encontrando que algunos de los anclajes que están diseñados como nuevos ya se encuentran contruidos.

El 21 de febrero se recibieron 22 anclajes los cuales se encuentran dispersos a lo largo del abcisado y estan proceso de inicio.

En cuanto a Las excavaciones no permiten un rendimiento optimo ya que debe realizarse de manera pausada para no correr el riesgo de dañar la tubería o peor aún en el caso de encontrar anclaje existente afectarlo por un movimiento involuntario. Cabe resaltar que una vez se realiza la excavación debe ubicarse el sentido del accesorio, se calcula el ángulo según la tabla de diseño y se da inicio con la construcción de anclajes; proceso que es dispendioso y teniendo en cuenta que el inicio de los anclajes de este sector presento atrasos por temas de servidumbres las cuales fueron solicitadas por medio de oficios 004 del 10 de noviembre de 2022 para tener la seguridad del aval de inicio de los trabajos por los predios y las vías caso que se ha presentado con la comunidad de cocora quien el 8 de febrero de 2023 se interpuso al inicio de los trabajos por la vía, teniendo que hacer compromiso el ibal y el contratista de corregir los tramos de vía que se encontraban en mal estado; por tal motivo hasta el 17 de febrero se pudo dar inicio con las excavaciones de anclajes por la vía.

A la fecha no se encuentra la definición de los anclajes completa por tanto se presenta demora en la ejecución de esta actividad a lo largo de la línea de instalación de tubería.

K8 +300 VIADUCTO 4

Se recibió diseño el cual fue remitido a interventoria para su aprobación; una vez se recibe el visto bno se da inicio con las actividades el 01 de Junio de 2023, que se refieren a la construcción de zapatas para cimentación H (pórticos) con pilotes de D=0.40 para soporte tubería (vigas de 40x40) y placa en metal Deck para continuación camino peatonal del sector; Caissons (cantidad 3) de D=1.20 y dos anclajes.

Se realizo trabajo de socialización con la comunidad de parte de la ing. Cecilia, mejoramiento de la vía de acceso, adecuación del áreas para stop y trabajo, explanación y corte de talud para asegurar área de trabajo, construcción de terraplén confinado con material de excavación en fibras para recibir la circulación peatonal de



CONSORCIO COCORA IBALTOL

NIT. 901637146-1



Consorcio Cocora Iballtol

entrega de la placa de metal Deck, excavación de zapatas (0.35 de espesor) a profundidad de 2.35 (área =4.10x 1.7) cantidad #3 para soporte de pilotes de D=0.40, excavación manual para anillo de Caissons.

K9+347 – K9+377 TENDONES

Por parte de la interventoría se recibió comunicación en donde se omiten los tendones que se encontraban diseñados

k3+909.54 - PIH-069

Falta diseño de este anclaje.

K3+977.93 y K3+408.75

Ampliación banca para correr tramo entre estos anclajes, exposición de la tubería en talud esta pendiente esta definición

K9+000 – K9+800 COMPENSACIONES

En reunión del 20 de enero de 2023 se informó que la línea de servidumbre no era suficiente para el manejo de material excavado el cual por más que se acordona se está desplazando sobre los cultivos y ocasionando daño a los mismos se informó del tema para pensar en la posibilidad de manejar un ítem por compensaciones, a la fecha no hay definición del ítem.

K19 +176,54 - K19+297.77 DISEÑOS POR CAMBIO DE LINEA

El día 11 de enero de 2023 se envió cambio de alineamiento para diseño de anclajes y ventosa propuesta por cambio de ubicación a la interventoría a la fecha no hay definición del tema.

FRENTE LA POLA

Se entrego a la comunidad por parte del área social el cronograma de reinicio de actividades para culminar con instalación de tubería, se realizó reunión con los lideres del sector para dar inicio con la ejecución de los trabajos el día 25 de Julio con horario dentro de la jornada laboral.

FRENTE TANQUE SUR

Se realiza apique para encontrar tubería de entrada a tanque a sur para realizar ubicación de cajas de válvulas.

CARRERA 7 No 9-43 OFICINA 302 SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

Correo: consorciococoraibal@gmail.com



CONSORCIO COCORA IBALTOL

NIT. 901637146-1



Consorcio Cocora Iballol

• **ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL:**

• **K0+000 – K6+400**

EXCAVACIONES A MANO Y MAQUINA: Se realiza excavación a máquina y perfilación de terreno para ubicar tubería, realizar replanteo, ubicación y armado de anclajes para tubería.

ACERO DE REFUERZO: Armado de acero de refuerzo para anclajes según replanteo y diseños entregados.

CONCRETO DE 300 PSI: En anclaje PIH062 – K3+644 Se termino la construcción del anclaje.

- Personal en frente de Obra

FRENTE ALBANIA	
SIMON MOLANO ORTIZ	OFICIAL DE OBRA
JAIDER HUMBERTO PENUELA LOZANO	AYUDANTE DE OBRA
HERLVER ANDREY LEON MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA
YESID MOLANO TOVAR	MAESTRO DE OBRA
OMAR CULMA	AYUDANTE DE OBRA
SIMON MOLANO TOVAR	MAESTRO DE OBRA
YIMY SALAZAR RODRÍGUEZ	OFICIAL DE OBRA
PAULA ANDREA ALMONACID PENAGOS	PROFESIONAL SST
EDDY BERTULFO CARDOZO	TOPOGRAFO
JENNIFER DANIELA CARDOSO	CADENERO 1
YESID SANCHEZ CONDE	AYUDANTE DE OBRA
DEIVER SALINAS CARANTON	AYUDANTE DE OBRA
DANIEL DONCELL UBAQUE	AYUDANTE DE OBRA



CONSORCIO COCORA IBALTOL

NIT. 901637146-1



Consorcio Cocora Iballol

• **K0+3 + 800 RUBIELA PATIÑO**

EXCAVACIONES A MANO Y MAQUINA: Se realiza excavación a máquina y perfilación de terreno para ubicar tubería, realizar replanteo, ubicación y armado de anclajes para tubería.

ACERO DE REFUERZO: Armado de acero de refuerzo para anclajes según replanteo y diseños entregados.

CONCRETO DE 300 PSI: CIMENTACION PROFUNDA: ZAPATAS (3) con pilotes en pórtico con vigas que reciben la tubería a nivel terreno (h=1.80) en una primera parte. **CAISSONS (3)** a una profundidad de 7 metros.

• **K9+000 – K9+800**

c: Se realiza excavación a máquina y perfilación de terreno para instalación de tubería 36”.

INSTALACION DE TUBERIA 36” WSP – GRP: Se realiza instalación de tubería WSP en el tramo de morro chusco y tubería GRP en la k9+220 aproximadamente de acuerdo a las indicaciones de proveedor, cabe resaltar que la tubería GRP tiene empaque y la Tubería WSP debe ser soldada.

A la fecha sea realizado instalación de 33 tubos GRP Ø 36”, 2 codos, 2 niples 1 und de 4 mtrs, 1und de 2 mtrs, 2 und de 1,5mtrs 1 und de 2.27 mtrs entre el k9+100 al k9+800 de acuerdo a la estructura definida por interventoría.

De la tubería WSP Ø 36” se ha realizado instalación de 170mtrs aproximados de tubería; durante los trabajos de instalación se realiza excavación en roca dando continuidad a la estructura entregada para el tipo de tubería.

TRASCIEGO INTERNO DE MATERIAL: se realiza trasciego de material acopiado para realizar paisajismo de las áreas intervenidas.

LLENOS CON MATERIAL DE EXCAVACION: Se realiza lleno con material de la misma excavación una vez se instala la tubería de 36” de acuerdo a las estructuras de cada tubería.

LLENOS CON TRITURADO: Se realiza cama de tubería y lleno completo según las recomendaciones técnicas de interventoría y proveedor de la tubería.



CONSORCIO COCORA IBALTOL

NIT. 901637146-1



Consorcio Cocora Iballol

CONFORMACION DE LA RASANTE: se realiza lleno a tope con material de la excavación y se mejora el terreno para carreteable de maquinaria y así dar continuidad con la instalación de la tubería.

ACERO DE REFUERZO Se realiza instalación de acero de refuerzo para anclaje de tubería de acero al carbón de 36" en la transición en pte 17

CONCRETO DE 4000 PSI: Se termino cárcamo para tubería GRP 36"

SOLDADURA PARA TUBERIA WSP: Se realiza soldadura para pague de junta traslapada de acuerdo a requerimientos de diseño y a recomendación de proveedor.

SOLDADURA PARA TUBERIA AC: Se realiza soldadura para pague de junta traslapada de acuerdo a requerimientos de diseño y a recomendación de proveedor.

- Personal en frente de Obra

FRENTE PUENTE 17		
1	OSCAR SANCHEZ MANRIQUE	OFICIAL
2	JOSE WILIAM TORRES QUEVEDO	AYUDANTE DE OBRA
3	SERGIO ALEJANDRO MIRANDA	AYUDANTE DE OBRA
4	HENRY SÁNCHEZ	OFICIAL
5	RAFAEL SÁNCHEZ	OFICIAL
6	MARLON ESTEBAN RAMIREZ LOZANO	AYUDANTE DE OBRA
7	LUIS ALFONSO CASTAÑO	OFICIAL DE OBRA
8	ADRIAN RICARDO GOMEZ SANDOVAL	AYUDANTE DE OBRA
9	JOSE LUIS CASTAÑO	AYUDANTE DE OBRA
10	ELIAN DAVID IBAÑEZ YATE	AYUDANTE DE OBRA
MORROCHUSCO		
40	ARSENIO ACOSTA	AYUDANTE DE OBRA
41	GERARDO CHACON	OFICIOS VARIOS
42	FERNANDO CARDOSO GONZALEZ	AYUDANTE DE OBRA
43	RODRIGO CARDOSO	TOPOGRAFO
44	CESAR AGUSTO CARMONA	AYUDANTE DE OBRA
45	GIOVANNI CARDOZO	OFICIAL
46	CARLOS ERNESTO OROZCO	AYUDANTE DE OBRA
47	JEISON RUIZ	AYUDANTE DE OBRA

CARRERA 7 No 9-43 OFICINA 302 SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

Correo: consorciococoraibal@gmail.com



CONSORCIO COCORA IBALTOL

NIT. 901637146-1



Consortio Cocora Iballol

48	FERNEY ROMERO MONTIEL	AYUDANTE DE OBRA
49	CRISTIAN GIOVANNI ROMERO MAYORGA	INGENIERO RESIDENTE
50		
51	LEIDY RODRÍGUEZ JARA	PROFESIONAL SST

• **TUNELES**

Material Granular Filtrante:

Instalación de material granular en túnel 1 al 100% y en túnel 2 al 96%

Pruebas De Presión

Se dio inicio con el corte y soldado de tapones de tubería CCP 36" existente.

- Personal en frente de Obra

FRENTE TUNELES			
24	MANUEL RIBO	5,997,630	OFICIOS VARIOS
25	URIEL MORALES GUTIERREZ	14279645	OFICIOS VARIOS
26	CESAR RIBO	11107009349	AYUDANTE
27	JAIME ROA	13992048	AYUDANTE
28	WILLIAM LIZARAZO	80211339	OFICIOS VARIOS
29	NICOLAS GUTIERREZ	1110527170	TOPOGRAFO
30	MIGUEL ANGEL TIJO SILVA	134645931	CADENERO 1
31	JOSE DANIEL RONDON VARON	1110470709	ING, RESIDENTE
32	MARIA FERNANDA VALDEZ CELIS	1006128005	AUXILIAR



CONSORCIO COCORA IBALTOL

NIT. 901637146-1



Consorcio Cocora Iballol

K12 + 500 FRENTE PUENTE 12

Excavación a Maquina a Cualquier Profundidad:

Se realiza la excavación mecánica de los estribos del puente 12 hasta el nivel de desplante para dar inicio a la excavación manual de los Caissons.

CARGUE DE SOBRANTES A MAQUINA:

Se realiza el cargue de sobrantes a maquina del material de excavación proveniente de los estribos del puente 12.

Acero de Refuerzo de 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY= 420MPA, INCLUYE TRANSPORTE, FIGURADO Y COLOCACION).

Se realiza la instalación de Acero de refuerzo de las siguientes obras:

- Estribo Cural Caissons 1: Acero de refuerzo de 1 anillo.
- Estribo Cural Caissons 2: Acero de Refuerzo de 8 anillos.
- Estribo Boquerón Caissons 1: Acero de Refuerzo de 11 anillos.
- Estribo Boquerón Caissons 1: Acero de Refuerzo núcleo caissons.
- Estribo Boquerón Caissons 2: Acero de Refuerzo de 11 anillos.

PILOTES (CAISSONS) PREEXCAVADOS MANUALMENTE D=1,00 M (INCLUYE EXCAVACIÓN, ENCOFRADOS y CONCRETO (Anillos y Pilotes.) EN CONCRETO REFORZADO SEGÚN DISEÑO y todo lo necesario para su correcta instalación; NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

Se realiza la excavación manual de los siguientes caissons:

- Estribo Cural:
 - Caissons 1: Finalizado
 - Caissons 2: 1 metros para finalizar

- Estribo Boquerón:
 - Caissons 1: 11 metros. Finalizado
 - Caissons 2: 11 metros. Finalizado



CONSORCIO COCORA IBALTOL
NIT. 901637146-1



- Personal en frente de Obra

FRENTE PUENTE 12			
11	BERTULFO OSPINA	5.820.021	AYUDANTE DE OBRA
12	JESUS ARROYO	1.052.083.243	OFICIAL
13	JUAN BAUTISTA MARTINEZ	93180850	OFICIAL
14	OSCAR PEÑA	2.760.420	OFICIAL
15	JHON JAIRO DIAZ BLANCO	1052086498	OFICIAL
16	KAREN QUINTANILLA	1106951391	PROFESIONAL SST

K19 +176,54 - K19+297.77 FRENTE AL POLA

- Se construyen cámaras de filtro y macro medidor y se realizo lleno con recebo a tope.
- Pendiente reinicio instalación de tubería por vía hacia la coqueta.

- Personal en frente de Obra

FRENTE POLA			
1	DAIRO PORTILLO VASQUEZ	1001746108	OFICIAL DE OBRA
2	JHONATAN MAURICIO VERGARA TORRES	1,110,506,083	OFICIAL DE OBRA
3	YEISON ALEJANDRO CELEMIN AYA	1,110,565,573	OFICIAL DE OBRA
4	CRISTIAN CAMILO ECHEVERRY CASTILLO	1,006,504,837	AYUDANTE DE OBRA
5	STEVEN RIASCOS MORENO	1111807474	ING. RESIDENTE
6	LUIS TELLEZ	1005814348	AUXILIAR SST
7	OSCAR ARIAS	1110586757	AYUDANTE DE OBRA

FRENTE COMBEIMA

MOVIMIENTO DE TUBERIA 24" Se realiza montaje e instalación de tubería de 24" sobre puente combeima



CONSORCIO COCORA IBALTOL

NIT. 901637146-1



Consorcio Cocora Iballol

FRENTE DERIVACION BOQUERON

EXCAVACIONES A MANO Y MAQUINA Se realiza excavación para caja de válvula 24", se encuentran atravesadas tuberías de 3" y 2" de los acueductos de boquerón y Miramar las cuales se deben trasladar para poder terminar la caja.

Se realiza de igual modo excavación para caja de válvula de 14" en donde se encuentra una red de alcantarillado de 12" la cual se debe trasladar pues se encuentra en servicio.

DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Se realiza demolición de pavimento rígido para realizar excavaciones.


ACERO DE REFUERZO Se realiza amarre de caja de válvula de 24"

- Personal en frente de Obra

DERIVACION BOQUERON			
17	JOSE YAMID ORTIZ	1005994628	OFICIOS VARIOS
18	HERNANDO BARRAGAN	93011339	OFICIOS VARIOS
19	BRAYAN ALEXIS CAICEDO	1006023766	OFICIOS VARIOS
20	LAURA VERGARA TORRES	1110596277	INGENIEIRO RESIDENTE
21	JEAN CARLOS FRIAS	1124057363	AYUDANTE DE OBRA
22	ALFREDO MARTINEZ	14223604	AYUDANTE DE OBRA
23	ANDRES CALDERON GUAYARA	1024578393	CADENERO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO
FRENTE MORROCHUSCO


SOLDADURA TUBERIA WSP 36"

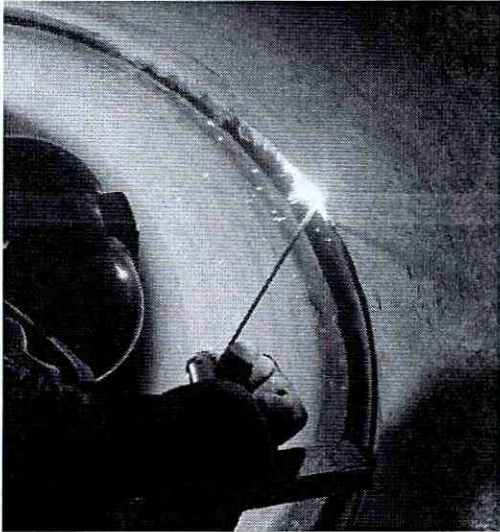







EXCAVACION PARA INSTALACION TUBERIA WSP 36"




EXCAVACION E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBON

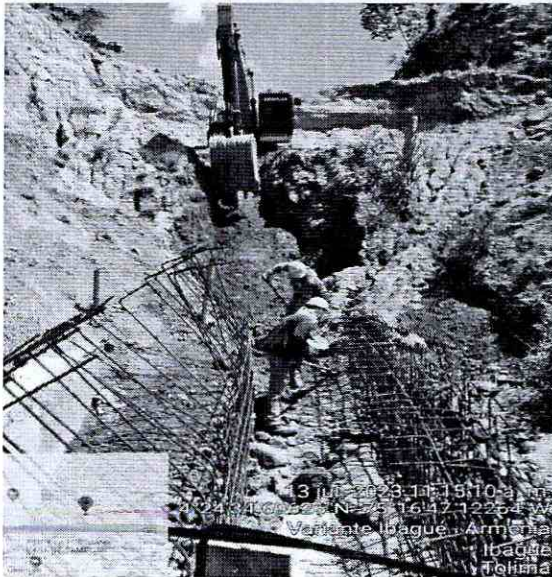



FRENTE MORROCHUSCO RUBIELA PATIÑO (ANCLAJE Y CIMENTACION TIPO CAISSON)

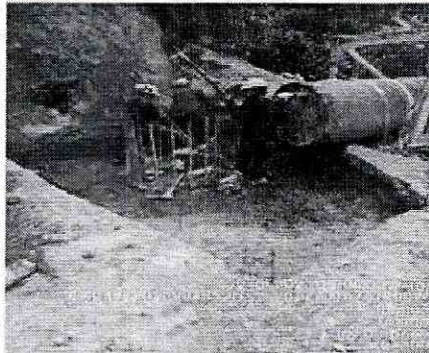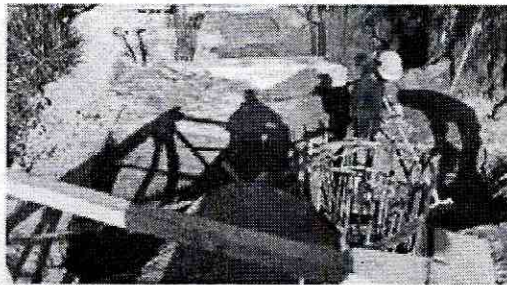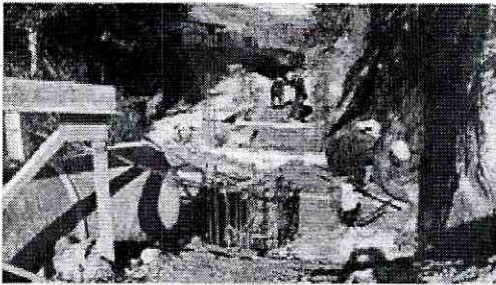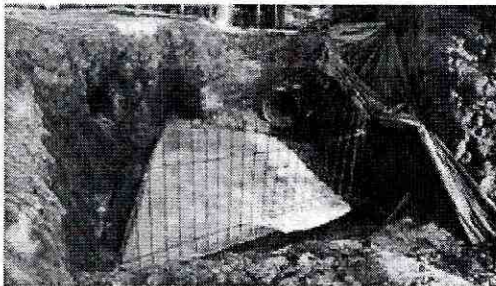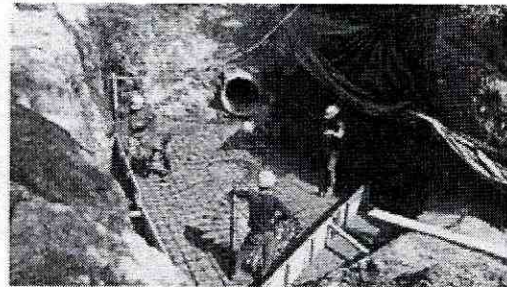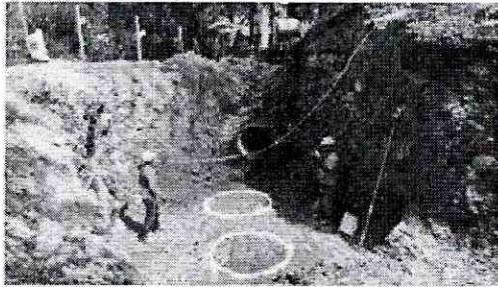



FRENTE K6+535 - UBICACIÓN CAJA VALVULA MARIPOSA

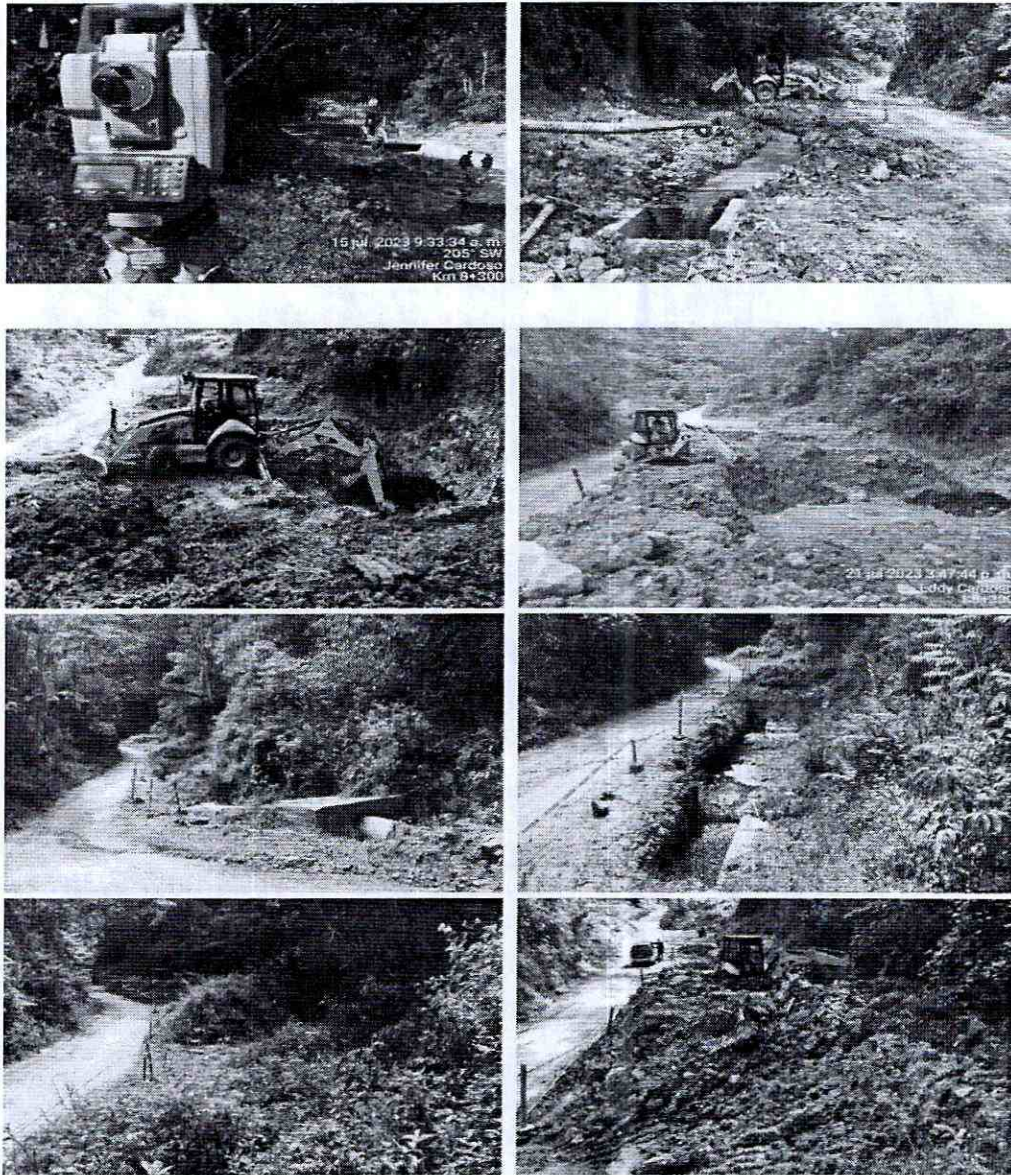

FRENTE DERIVACION BOQUERON

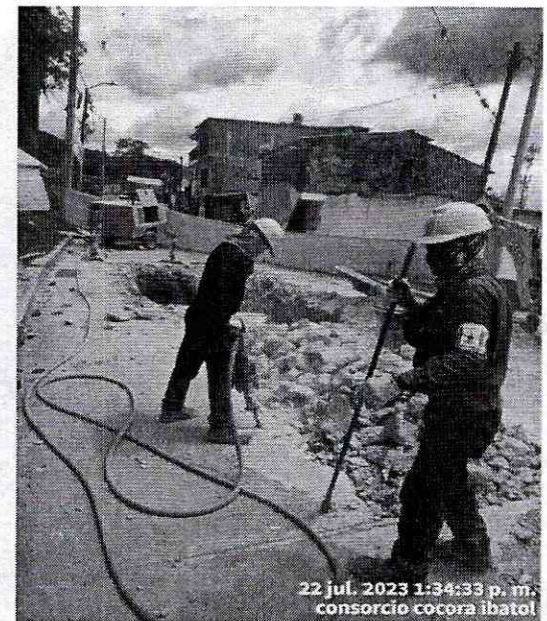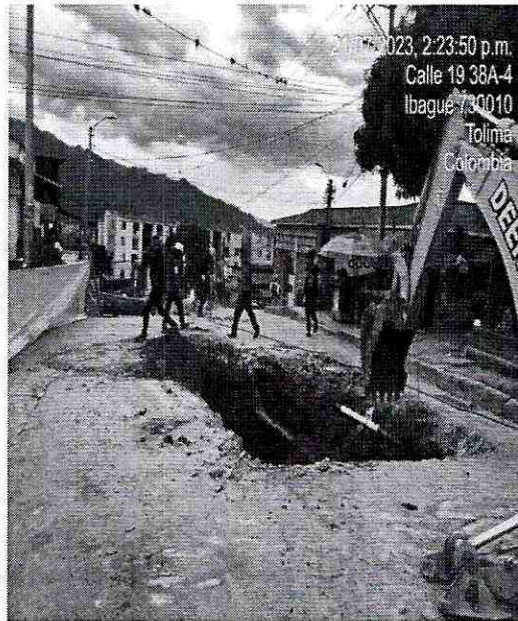

FRENTE PUENTE 12 (CIMENTACION PROFUNDA TIPO CAISSON)

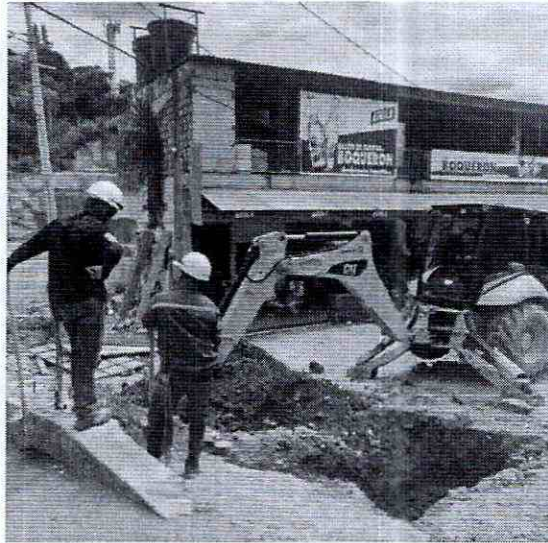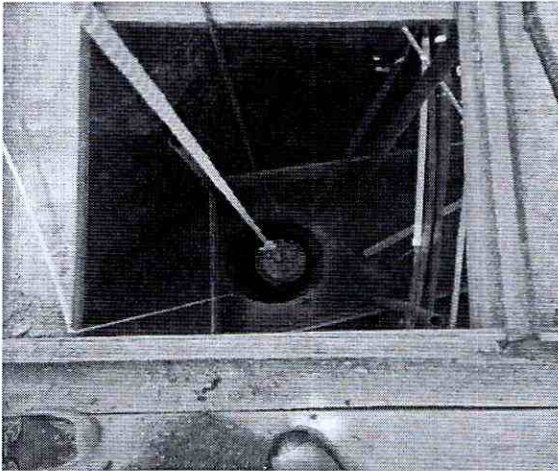



CONSORCIO COCORA IBALTOL


NIT. 901637146-1



Consorcio Cocora Iballol

FRENTE TUNELES BOQUERON


CARGUE, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR FILTRANTE Y APERTURA PARA PRUEBAS HIDRAULICAS

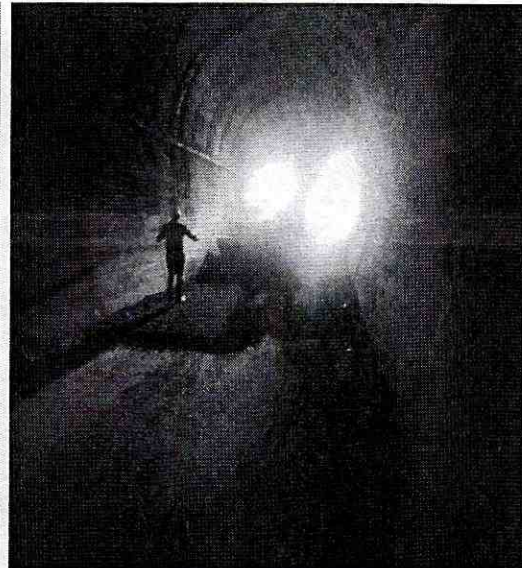

CARRERA 7 No 9-43 OFICINA 302 SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

Correo: consorciococoraibal@gmail.com

FRENTE TANQUES DEL IBAL

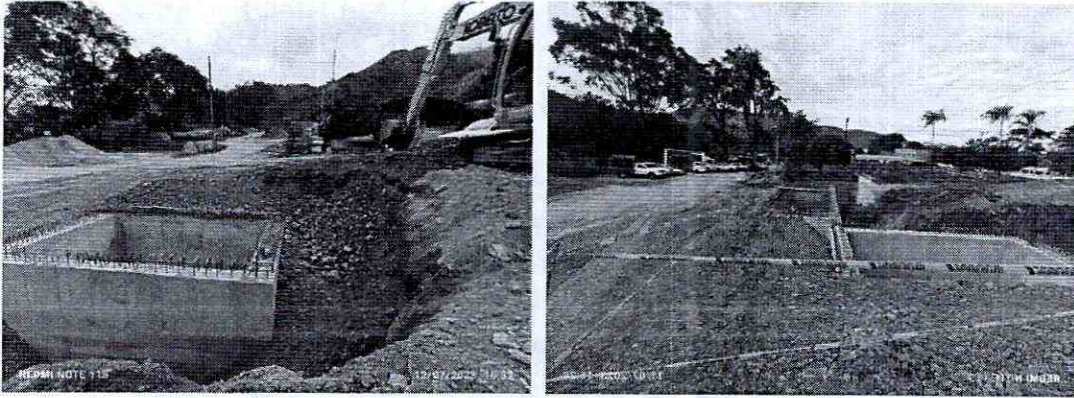





CONSORCIO COCORA IBALTOL

NIT. 901637146-1



Consortio Cocora Ibaltol

FRENTE COMBEIMA

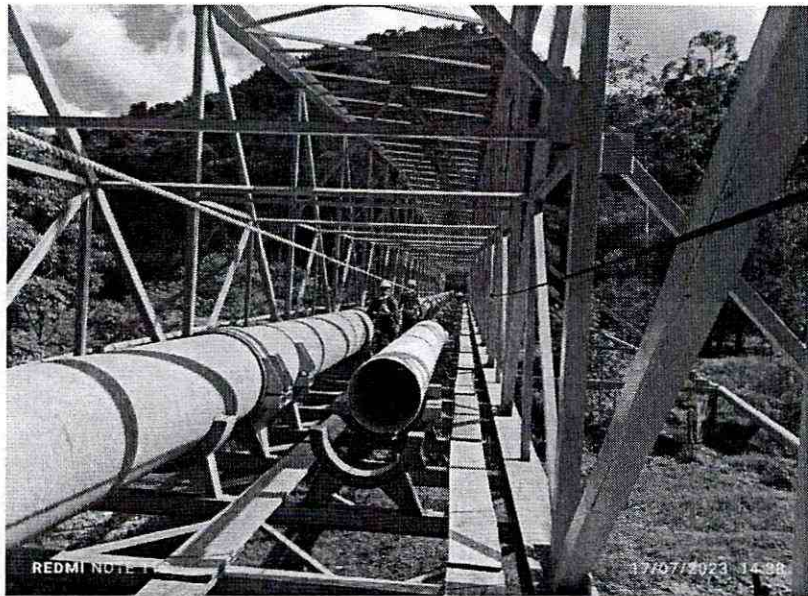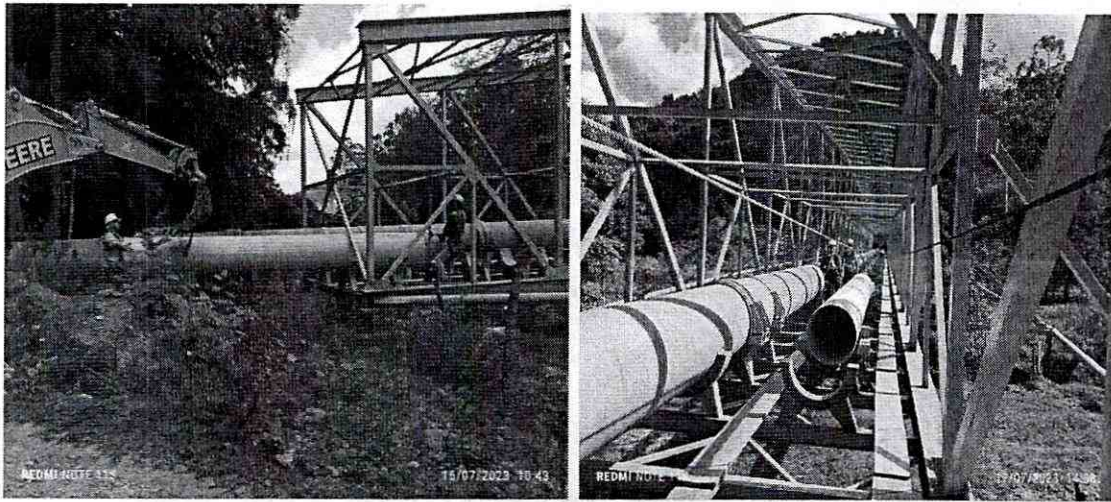

CARRERA 7 No 9-43 OFICINA 302 SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

Correo: consorciococoraibal@gmail.com

✚ **DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.**

El CONSORCIO COCORA IBALTOL, dando cumplimiento a lo establecido en la legislación colombiana y de acuerdo a los requerimientos del decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 del 202019 cuenta con un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, el cual le permite enfocarse en los riesgos críticos identificados y establecer estrategias de control para asegurar un ambiente laboral seguro e incentivar la participación de los trabajadores en la toma de decisiones, hacia una mejora continua los procesos operacionales.

La organización establece un plan de trabajo anual teniendo en cuenta cada una de las actividades de los programas detallados.

A continuación, se presentan las actividades ejecutadas en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el periodo comprendido entre el **20 junio al 22 de julio de 2023**



Foto. REUNION COPASST



CONSORCIO COCORA IBALTOL

NIT. 901637146-1



✦ PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION

La inducción es un requisito de obligatorio cumplimiento para cada nuevo colaborador, previo al inicio de sus labores en las instalaciones, terrenos y proyectos de las empresas; es también requisito para el inicio de labores de todo el personal que desarrollen labores de representación de las empresas y de los contratistas.

A continuación, se da a conocer el temario de la inducción y reinducción:

Temas tratados en la inducción de bienvenida al personal de obra área SST.

- Aspectos generales y legales en Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente:
- Reporte e Investigación de Accidentes de Trabajo
- Reporte de Actos y Condiciones Inseguras.
- Legislación aplicable a la Organización en Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente
- Objetivos del Sistema de Gestión SST
- Protocolo de Bioseguridad covid-19
- Responsabilidad civil del empleador
- Responsabilidad civil del trabajador
- Uso de EPI (elementos de protección individual), mantenimiento y reposición
- Política SST.
- Política No alcohol, No drogas, No tabaquismo
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- Riesgos: Físicos, Químicos, Físico – Químicos, Mecánicos, Locativos, Eléctricos, Biológicos, Biomecánicos, Psico laborales, Públicos, Naturales, Saneamiento Ambiental Básico.
- Factores de riesgo inherentes al cargo, y sus controles.
- Que hacer en caso de una emergencia.

Tabla 1. Identificación de riesgos

RIESGO	FACTOR DE RIESGO
Riesgos Físicos	Exposición a factores ambientales: <ul style="list-style-type: none"> • Ruido. • Radiaciones no ionizantes • Vibraciones. • Di confort térmico. • Humedad.
Riesgos Físico – Químicos	Incendios y/o explosiones generadas por: <ul style="list-style-type: none"> • Incompatibilidad físico-química en el almacenamiento de materias primas. • Presencia de materias y sustancias combustibles. • Presencia de sustancias químicas reactivas.
Riesgos Químicos	<ul style="list-style-type: none"> • Material Particulado. • Exposición a contaminantes químicos.
Riesgos Biológicos	Presencia en el ambiente laboral de: <ul style="list-style-type: none"> • Hongos. • Virus. • Bacterias. • Mordeduras de serpientes. • Covid-19
Riesgos Psico laborales	Factores por condiciones personales y ambiente laboral: <ul style="list-style-type: none"> • Características de organización laboral. • Carga laboral. • Aspectos personales. • Entorno social.
Riesgos Mecánicos	Exposición a factores presentes en maquinaria, equipos y herramientas: <ul style="list-style-type: none"> • Punto de operación. • Partes móviles. • Puntos de atrapamiento. • Proyección de partículas. • Caída de objetos.

Riesgos Locativos	Factores propios de las instalaciones locativas en el punto de trabajo, como: <ul style="list-style-type: none"> • Superficie del piso irregulares, deslizante o en mal estado. • Falta de orden y aseo. • Señalización y demarcación deficiente, inexistente o inadecuada. • Excavaciones abiertas
Riesgos de condiciones de seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Atropellamiento • Trabajo en alturas • Accidentes de tránsito • Excavaciones
Riesgos eléctricos	Exposición a contacto fuentes de baja y media de tensión.
Riesgos Públicos	Factores presentes por agentes externos <ul style="list-style-type: none"> • Alteraciones del orden público. • Hurto. • Secuestro. • Extorción.
Riesgos naturales	Exposición a condiciones del medio ambiente <ul style="list-style-type: none"> • Terremotos. • Derrumbes. • Tormenta eléctrica. • Inundaciones. • Crecientes del río.
Riesgos en saneamiento ambiental básico	Factores presentes por: <ul style="list-style-type: none"> • Disposición de basuras • Inadecuada recolección • Manipulación de residuos peligrosos


El Programa de Inducción y Re inducción lo define el Decreto 1567 de 1998 como los “procesos de formación y capacitación dirigidos a facilitar y a fortalecer la integración del empleado a la cultura organizacional, a desarrollar en éste habilidades gerenciales y de servicio público y suministrarle información necesaria para el mejor conocimiento de la función pública y de la entidad, estimulando el aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional, en un contexto metodológico flexible, integral, práctico y participativo”.

Teniendo en cuenta lo anterior, el CONSORCIO COCORA IBALTOL cumple a modo satisfactorio, buscando desarrollar conocimientos y destrezas necesarias para que todo el personal contratado desempeñe sus funciones de manera segura y saludable, planteando objetivos en dicho programa, definiendo los temas a tratar en el proceso de inducción de los nuevos colaboradores

A continuación, se registran las inducciones que se realizaron durante el periodo:

INDUCCION Y REINDUCCION		
NUMERO DE PERSONAS NUEVAS	NUMERO DE INDUCCION PROGRAMADAS	EMPRESA
6	6	CONSORCIO COCORA IBALTOL

Se presenta la relación de trabajadores que se encuentran vinculados directamente por el Consorcio Cocora Iballol.

 Consortio Cocora Iballol		PERSONAL CONSORCIO	
FRENTE PUENTE 12			
1	BERTULFO OSPINA	5.820.021	AYUDANTE DE OBRA
2	JESUS ARROYO	1.052.083.243	OFICIAL
3	JUAN BAUTISTA MARTINEZ	93180850	OFICIAL
4	OSCAR PEÑA	2.760.420	OFICIAL
5	JHON JAIRO DIAZ BLANCO	1052086498	OFICIAL
6	KAREN QUINTANILLA	1106951391	PROFESIONAL SST
DERIVACION BOQUERON			
7	JOSE YAMID ORTIZ	1005994628	OFICIOS VARIOS
8	HERNANDO BARRAGAN	93011339	OFICIOS VARIOS
9	NORMA PATRICIA COGUA		TOPOGRAFO

10	LAURA VERGARA TORRES	1110596277	INGENIEIRO RESIDENTE
11	JEAN CARLOS FRIAS	1124057363	AYUDANTE DE OBRA
12	PASTOR PIÑEROS		AYUDANTE DE OBRA
13	ALFREDO MARTINEZ	14223604	AYUDANTE DE OBRA
14	JOSE ALBEIRO REYES RINCON		AYUDANTE DE OBRA
15	CRISTIAN GIOVANNI ROMERO MAYORGA	1110520434	INGENIEIRO RESIDENTE
16	DAIRO PORTILLO VASQUEZ	1001746108	OFICIAL DE OBRA
17	JHONATAN MAURICIO VERGARA TORRES	1.110.506.083	OFICIAL DE OBRA
18	LUIS TELLEZ	1005814348	AUXILIAR SST
19	ANDRES CALDERON GUAYARA	1024578393	CADENERO 1
TUNELES			
20	MANUEL RIBO	5.997.630	OFICIOS VARIOS
21	URIEL MORALES GUTIERREZ	14279645	OFICIOS VARIOS
22	CESAR RIBO	11107009349	AYUDANTE
23	JAIME ROA	13992048	AYUDANTE
24	WILLIAM LIZARAZO	80211339	OFICIOS VARIOS
25	NICOLAS GUTIERREZ	1110527170	TOPOGRAFO
26	GINNA TRUJILLO		ING, RESIDENTE
27	MARIA FERNANDA VALDEZ CELIS	1006128005	AUXILIAR
MORROCHUSCO			
28	ARSENIO ACOSTA	13990655	AYUDANTE DE OBRA
29	GERARDO CHACON	5821835	OFICIOS VARIOS
30	FERNANDO CARDOSO GONZALEZ	83.247.769	AYUDANTE DE OBRA
31	RODRIGO CARDOSO	93363980	TOPOGRAFO

32	CESAR AGUSTO CARMONA	1057304678	AYUDANTE DE OBRA
33	BRAYAN ALEXIS CAICEDO	1006023766	OFICIOS VARIOS
34	GIOVANNI CARDOZO	83248036	OFICIAL
35	LEIDY RODRÍGUEZ JARA	1110508329	PROFESIONAL SST
ALBANIA			
36	SIMON MOLANO ORTIZ	14,137,572	OFICIAL DE OBRA
37	JAIDER HUMBERTO PEÑUELA LOZANO	5,994,936	AYUDANTE DE OBRA
38	HERLVER ANDREY LEON MARTINEZ	1104935298	AYUDANTE DE OBRA
39	YESID MOLANO TOVAR	14,215,891	MAESTRO DE OBRA
40	OMAR CULMA	1.110.547.865	AYUDANTE DE OBRA
41	SIMON MOLANO TOVAR	19313051	MAESTRO DE OBRA
42	YIMY SALAZAR RODRÍGUEZ	93020060	OFICIAL DE OBRA
43	PAULA ANDREA ALMONACID PENAGOS	1110551019	PROFESIONAL SST
44	JOHAN SEBASTIAN ROBAYO		
45	EDDY BERTULFO CARDOZO	93127135	TOPOGRAFO
46	JENNIFER DANIELA CARDOSO	1007614033	CADENERO 1
47	YESID SANCHEZ CONDE	1110555187	AYUDANTE DE OBRA
48	DEIVER SALINAS CARANTON	5829164	AYUDANTE DE OBRA
49	BLADIMIR PESCADOR	1130671559	AYUDANTE DE OBRA
50	MANUEL RODRIGUEZ	1110602571	CADENERO 1
51	MICHAEL GRANADOS	1110577591	TOPOGRAFO
52	JUAN CARLOS TOVAR GUZMAN	14239847	INGENIEIRO RESIDENTE
OFICINA			
53	ANDREA CAROLINA CAMACHO	1110541812	ADMINISTRATIVA
54	CARLOS ALARCON	79347679	DIRECTOR DE OBRA
55	DIANA MORA URREA	28550650	ING. RESIDENTE
56	RAMIRO BERNAL	14241362	OFICIOS VARIOS
57	LUIS ALVARO SANCHEZ CUEVAS	13.267.718	TOPOGRAFO



CONSORCIO COCORA IBALTOL

NIT. 901637146-1



58	STEVEN RIASCOS MORENO	1111807474	ING. RESIDENTE
----	-----------------------	------------	----------------

Ver relación trabajadores contratistas del consorcio en Anexo 4

Anexo 2. Listado de personal

Anexo 1. Seguridad social y soportes afiliaciones

✚ **PROGRAMA DE CAPACITACION.**

Tiene como propositito el desarrollo de habilidades y capacidades de todo el personal con el fin de formar un talento humano más competente y hábil. Además, se busca promocionar la salud, el autocuidado y prevenir la enfermedad y los riesgos. Sin embargo, más allá de esto, busca estimular el interés de todos sobre los beneficios de aplicar el sistema de gestión, incentivar la participación en las diferentes actividades sobre autocuidado, factores de riesgo y condiciones inseguras, busca mejorar el clima laboral, la productividad, la salud física y mental, y mejorar la capacidad de los empleados para identificar y reportar factores de riesgos presentes en su labor.

✚ **CAPACITACION Y CHARLAS DE SEGURIDAD DEL PERIODO**

EMPRESA

CONSORCIO COCORA IBALTOL

1. PLANIFICACIÓN	
26/06/2023	Material particulado
27/06/2023	EPI
28/06/2023	Hidratacion
29/06/2023	Riesgo locativo
30/06/2023	Orden y aseo
1/07/2023	Riesgo mecanico
2/07/2023	

CARRERA 7 No 9-43 OFICINA 302 SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

Correo: consorciococoraibal@gmail.com

	Inspeccion de equipos, herramientas y maquinaria
3/07/2023	Picadura y mordedura de animales
4/06/2023	Riesgo biomecanico
5/07/2023	Riesgos y consecuencias en trabajo viales
6/07/2023	Funciones y responsabilidades según el cargo en sst
07/0723	Calzado de Seguridad
8/07/2023	Deberes y obligaciones como trabajadores
9/07/2023	Superficies irregulares y deslizantes
10/07/2023	Compromisos en seguridad vial
11/07/2023	Señales de advertencias
12/07/2023	Estilo de vida saludable
13/07/2023	Riesgos fisicos
14/07/2023	señalizacion de obra (antes,durante y despues)
15/07/2023	Cuidado o estan atentos con los vehiculos en la via
16/07/2023	Politica sst
17/07/2023	Proteccion de manos (guantes de seguridad)
18/07/2023	Riesgo quimico (material particulado)
19/07/2023	Riesgos y peligros al trabajar bajo la lluvia
