

Se da inicio de obra a las 7:00 Am en la calle 28 la Granja, se continua con la excavacion de las cajas de inspeccion, con corte de Pulidora del Anden.

Asi mismo se realiza la señalizacion con cinta Peligro de las cajas de inspeccion que se encuentran abiertas, para seguridad de la comunidad.

Se realiza limpieza en la obra y Retiro de material con Poleros de manera manual.




MARIA VANNESA SOTO

ING. RESIDENTE DE OBRA

DIA (19) - 08 - AGOSTO - 2021 (DOMINGO)

No se laboro en la calle 28 entre Ambala y Guabinal Barrio la Granja.




MARIA VANNESA SOTO

ING. RESIDENTE DE OBRA

DIA (20) - 09 - AGOSTO - 2021 (LUNES)

DIA: SOLEADO

herramienta y equipos: Saltann.

Pulidora.


Herramienta Menor

MATERIAL: Arena

Tubena 5"


PERSONAL: Supervisor (1)
 Residente de Obra (1)
 Residente de Interventoría (1)
 Topógrafo (1)
 Siso (1)
 Obreros (2)
 Maestro (1)

Se da inicio de obra a las 7:00 AM en la Calle 28 la Granja, donde se continua con las excavaciones de domiciliarias y cajas de inspeccion.

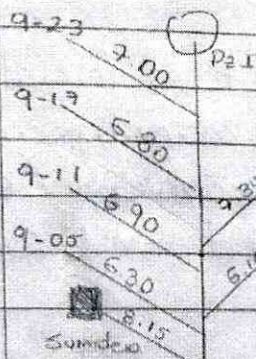

Aquí se puede evidenciar las medidas de las excavaciones de las domiciliarias de Alcantarillado Para cada vivienda.

Se continua con los cortes con Pulidora y las excavaciones de las respectivas cajas de inspeccion.


 MARIA VANNESSA SOTO
 ING. RESIDENTE DE OBRA

DIA (21) - 10 - AGOSTO - 2021 (MARTES)

DIA: SOLEADO.


HERRAMIENTA y EQUIPOS: Soltarin
 Pulidora
 Herramienta Menor

Materiales: Cemento
 Arena
 Hierro.

PERSONAL: Supervisor (1)
 Residente de Interventoria (1)
 Residente de Obra (1)
 Topografo (1)
 Siso (1)
 Obreros (3)
 Maestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja a las 7:00 Am. donde se continua con la excavaciones para las cajas de inspeccion, asi mismo como la excavacion de la domiciliaria del sumidero.

Se realiza el Poñete interior a los Pozos inicial y Final, se realiza retiro de escombros de manera manual, y limpieza en la obra, se realiza la señalizacion con cinta Peligro y tablas para evitar accidentes en la comunidad.



MARIA VANNESSA SOTO
 ING. RESIDENTE DE OBRA

DIA (22) - 11 - AGOSTO - 2021 (MIÉRCOLES)

DIA: (LUVIOSO)

Herramienta y Equipos: Saltarin

Polidora

Herramienta Menor

PERSONAL: Supervisor (1)

Res. Interventoria (1)

Res de obra (1)

Maestro (1)

Topografo (1)

Siso (1)

Obreros (3)

Se da inicio de obra en la Calle 28 la Granja donde se da inicio a las 7:00 AM donde se continua con las excavaciones y construcciones de las cajas de inspeccion de la Calle 28.

Hay no se tuvo mucho avance de obra ya que se tuvo lluvia en el transcurso del tiempo de 9 A 1 PM. Se realiza limpieza en la obra.



MARIA VANESSA SOTO.

ING. RESIDENTE DE OBRA.

DIA (23) - 12 - Agosto - 2021 (JUEVES)

DIA: Lluvioso - Soleado

Herramientos y Equipos: Saltarin

Herramiento Menor.

Personal: Supervisor (1)

Res. Interventoria (1)

Res Obra (1)

Inspector de Interventoria (1)

Topografo (2)

SISO (1)

Obreros (1)

Maestro (1)

Se da inicio de obra a las 7:00 AM en la calle 28 la Granja, donde se continua con la construccion de las cajas de inspeccion, Cortes con Pulidora del Anden, Fundida en Sitio de las Tapas para las cajas de inspeccion, Limpieza en la obra, Se instala Tramos nuevamente de Polisombra Por el Robo que se viene Presentando.



MARIA VANESSA SOTO

DIA (24) - 13-AGOSTO-2021 (VIERNES)

DIA: SOLEADO

HERRAMIENTA y EQUIPOS: Saltarin.

Pulidora

Herramienta y Equipo Menor

PERSONAL: Supervisor (1)

Residente de Interventoria (1)

Residente de Obra. (1)

Inspector de Interventoria (1)

Topografo (2)


SISO. (1)

Obreros (2)

Maestro. (1)

Se da inicio de obra a las 9:00 Am en la calle 28 la Granja, donde continua con las excavaciones de cajas de inspeccion, corte con Pulidora, Fundida en sitio de las tapas de cajas de inspeccion, se termina de instalar Tubera de Acometidas de Alcantarillado, con su respectiva Camada de arena de 10 cms de espesor con su respectiva relleno con recebo, donde la Primera Capa es Apisonada de manera manual, y las sigtes con Saltarin.

Se realiza retiro de material y limpieza en la obra



MARIA VANNESA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA

DIA (25) - 14-AGOSTO-2021 (SABADO)

No se labora en la calle 28 la Granja



VANNESA SOTO

DIA (25) - 15 - AGOSTO - 2021 (DOMINGO)

No se labora en la calle 28 entre Ambala y Guabina la Granja.

MARIA VANNESSA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA

DIA (27) - 16 - AGOSTO - 2021 (LUNES)

DIA: LUVIOSO - SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPOS Saltarin.

Herramienta Menor

PERSONAL: Supervisor (1)

Res. Interventor (1)

Res. Obro (1)

SISO (1)

Topografo (1)

Obreros (2)

Maestro (1)

Se da inicio de obra en la Calle 28 la Granja a las 7:00 AM, donde se continua con la excavacion de las cajas de inspeccion, construccion de las cajas, instalacion de recebo a las Domiciliarias de Alcantarillado, el cual esta compactando con Saltarin.

Se realiza limpieza en la obra, retiro manual de escombros, se debe tener en cuenta que la excavacion del sumidero fue en concreto flexible y Rigido con espesor entre 0.10 y 0.15 mts

MARIA VANNESSA SOTO

DIA (28) - 17 - AGOSTO - 2021 (MARTES)

No se labora en la calle 28 la Granja. Por ser un día Festivo.

✕

MARIA VANNEZA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA

DIA (29) - 18 - AGOSTO - 2021 (MIÉRCOLES)

DIA: SOLEADO.

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Saltarin.
Pulidoro.
Herramienta Menor

MATERIALES: Cemento
Arena Hierro
Triturado.

Se da inicio de obra en la calle 28 la granja a las 7:00 AM, donde se realiza relleno por encima de las cajas ya construidas con su respectiva tapa, donde tiene dicho recebo un espesor de 10 cms.

Asi mismo se funde los andén en concreto.

Donde las cajas de inspeccion se les construye su respectiva base canchales, y se dejan las viviendas conectadas.

Se realiza limpieza de obra, se organiza nuevamente la Polisombra y la señalización de las cajas las cuales se estan excavando.

✕

ING. RESIDENTE OBRA
MARIA VANNEZA SOTO

DIA (30) - 19-AGOSTO-2021 (JUEVES)

DM: SOLANO

HERRAMIENTA y EQUIPOS: Sáltarin
Pulidora

Herramienta Menor

PERSONAL: Supervisor (1)

Residente Interventoria (1)

Residente de Obra (1)

Topografio (2)


Siso (1)

Obreros (3)

Maestro (1)

Se da inicio de obra a las 7:00 Am en la calle 28 la granja, donde se continua con la construccion de las cajas de inspeccion, y las Tapas de las cajas Fundidas en sitio.

Se realiza retiro de escombros con paleros de manera manual y limpieza de la obra

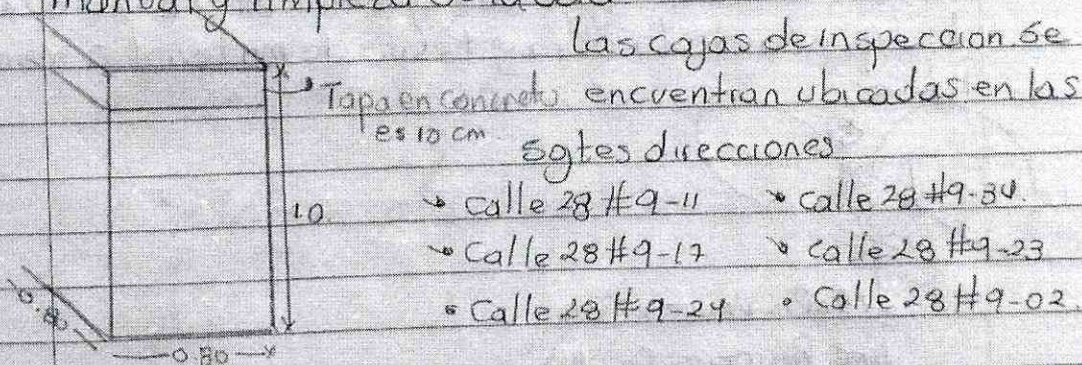

Se realiza limpieza en la obra y se organiza la Señalización con cinta Peligro y las tablas sobre las excavaciones de las cajas de inspeccion.

(Handwritten signature)

ING. MARIA VANNEGA SOFO

ING. RESIDENTE DE OBRA

DIA (31) - 20- AGOSTO - 2021 (VIERNES)

DIA: LUVIOSO - SOLEADO.

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Saltarin.

Pulidora.

Herramienta Menor.

PERSONAL: Supervisor - (1)

Residente Interventoria (1)

Residente Obra (1)

Topografo (2)

SISO (1)

Obreros (3)


Maestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja a las 7.00 Am, donde se termina el relleno de las acometidas de Alcantarillado.

Se continua con los cortes con Pulidora sobre el anden, Fundida de Tapas en concreto en sitio.

Construccion de cajas de inspeccion de 0.80 x 0.80 x 1.0.

Limpieza de la obra y Retiro de material a mano con Palas.



MARIA VANNEOR JOTO

ING. RESIDENTE DE OBRA

DIA (32) - 21- AGOSTO - 2021 (SABADO)

DIA: LUVIOSO.

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Saltarin.


Pulidora

Herramienta Menor

MATERIAL: Cemento.

PERSONAL: Supervisor (1)
 Residente de Obra (1)
 Residente Interentoria (1)
 Topografato (1)
 Siso (2)
 Obreros (2)
 Maestros (1).

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja a las 7:00 Am, donde no se puede adelantar muchas actividades debido a la lluvia interminante todo el dia, se realizo la excavacion de capas de inspeccion y limpieza en la obra, Retiro de material de escombros de manera manual con Paleros.



✱ MARIA VANESSA SOTO
 ING. RESIDENTE DE OBRA

DIA (33) - 22 - AGOSTO - 2021 (DOMINGO)

No se labora en la obra de la calle 28 la granja



✱ MARIA VANESSA SOTO
 ING. RESIDENTE DE OBRA

DIA (34) - 23 - AGOSTO - 2021 (LUNES)

No se labora en la calle 28 Barrio la Granja



✱ MARIA VANESSA SOTO
 ING. RESIDENTE DE OBRA

DIA (35) - 24 - AGOSTO - 2021 (MARTES)

DIA: SOLEADO.

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Salfarin.

Herramienta Menor.

PERSONAL: Supervisor (1)

Residente de Interventoría (1)

Residente de Obra (1)

Topógrafo (2)

Siso (1)


Obreros (3)

Maestro (1)

Se da inicio de obra a las 7:00 AM en la calle 28 la Granja, donde se continua con la excavacion de las cajas de inspeccion de $0.80 \times 0.80 \times 1.0$.

Se realiza plan de contingencia ya que se tuvo daño en la red de gas, donde se le solicita a alcanas la reparacion, se atendio de manera inmediata y asi no afectar a la comunidad en general.

Se realiza limpieza en la obra y Retiro de material de manera manual.



MARIA VANESA SOTO

ING. RESIDENTE DE OBRA

DIA (36) - 25 - AGOSTO - 2021 (MIÉRCOLES)

DIA: SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Salfarin.

Pulidoros

Herramienta Menor


MATERIALES: Cemento - Arena - Hierro.

Personal: Supervisor (1)
 Res. Interventoria (1)
 Res. Obra (1)
 Inspector de obra (1)
 Topografo (2)
 Siso (1)
 Obreros (4)
 Maestros (1)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja a las 7:00 Am en donde se continua con la construccion de las cajas de inspeccion, donde se esta instalando recebo con espesor de 10 a 15 cms para tapar las cajas de inspeccion ya construidas.

Se continua fundiendo en concreto de 2500 P en los andenes con espesor de 10 cms.

Se continua con los cortes de Pulidora sobre los andenes correspondiente donde se estan haciendo las cajas de inspeccion.



MARIA VANESA SOTO
 ING. RESIDENTE DE OBRA

DIA (37) - 26-AGOSTO-2021 (JUEVES)

DIA: LUVIOSO

Herramienta y Equipos: Sulfarin
 Herramienta Menor.

Personal: Supervisor (1)
 Res. Interventoria (1) Maestro (1)
 Res de Obra (1) Obreros (3)
 Topografo (1)
 Siso (1)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja a las 7:00 Am, donde se continua con el corte de Pulidora. Retiro de escombros de manera manual, asi mismo no se puede avanzar debido a las fuertes lluvias que se vienen presentando, se realizar las base cañuelas de las cajas de inspeccion que se vienen realizando



MARIA VANESSA SOTO
ING. PRESIDENTE DE OBRA

DIA (38) - 27 - AGOSTO - 2021 (VIERNES)


DIA: LLOVIDOSO - SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPO: Saltarin
Pulidora
Herramienta Menor.

PERSONAL: Supervisor. (1)
Residente de Obra. (1)
Residente de Interventoria. (1)
Topografo (2)
Sirio (1)
Obreros. (3)
Moestros. (1)

Se da inicio de obra en la calle. 28 la Granja a las 7:00 AM, donde se continua la obra de manera despaciosa por las fuertes lluvias que se vienen presentando, se realiza corte de Pulidora, excavacion de cajas de inspeccion de 0.80 x 0.80 x 1.0.

Limpieza de obra y Retiro de escombros de manera manual



MARIA VANESSA SOTO
ING. PRESIDENTE DE OBRA

DIA (39) - 28 AGOSTO - 2021 (SABADO)

No se realiza obra el día de hoy sobre la calle
28 la Granja

MARIA VANNESA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA

DIA (40) - 29 AGOSTO - 2021 (DOMINGO)

No se labora en la calle 28 entre ambala y
Guabinal Barrio la Granja

MARIA VANNESA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA

DIA (41) - 30 AGOSTO - 2021 (LUNES)

DIA: SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Salfarin

Herramienta Menor

PERSONAL: Supervisor (1)

Res. Interventoria (1)

Res. Obra (1)

Topografo (1)

Siso (1)

Obieros (3)

Moestio. (1)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja a las
7:00 Am, donde se continua construyendo las
cajas de inspeccion de 0.80 x 0.80 x 1.0.

Fundida en Sitio de las Tapas de las cajas de
inspeccion en concreto

Se realiza retiro de escombros con Paleros de manera manual, Limpieza de Obra y Señalización sobre los andenes.



MARIA VANNESSA SOTO.
INC. RESIDENTE DE OBRA.

Interventor
Remberto Interu

DIA. (42) - 31 - AGOSTO - 2021 (MARTES)

DIA. (CUIOSO) - SOLEADO

HERRAMIENTA y EQUIPOS: Saltaron.

Herramienta Menor.

Personal: Supervisor (1)

Res. Interventoria (1)

Res. de Obra (1)

Topografos. (2)

SISO (1)

Obreros. (3)


Maestro. (1)

Se da inicio de obra en la calle 29 Barro la Granja, a las 7:00 Am donde se termina la construcción de cajas de inspección de $0.80 \times 0.80 \times 1.0$ con sus respectivas tapas en concreto de 2500 Psi.

Asi mismo con su respectivo relleno de recebo de $e=0.10$ y la terminación del Anden en concreto con espesor 0.10 y todas las cajas de inspección con sus respectivas

Base Concretas.

Se realiza retiro de escombros manual y limpieza en la obra.



MARIA VANNESSA SOTO.

Interventor
Remberto Interu

(DIA (43)) - 01 - Septiembre - 2021 (MIÉRCOLES)

DIA SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Motomartillo (compresor)

Saltarin

Herramienta Menor

PERSONAL: Supervisor (1)

Residente Interventoria (1)

Residente de Obra (1)

Topografo (1)

SISO (1)

Obreros (2)


Maestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja a las 7:00 AM, donde se inicia la demarcacion de la Red de Acueducto, en compañía del Topografo para sacar los niveles correspondientes.

Se le socializa a la comunidad que se empieza ~~esta~~ la excavacion de la Red de Acueducto.

Se da inicio a realizar la rotura del Pavimento


Flexible con el Motomartillo.



≠

MARIA VANNEZA SOTO

ING. RESIDENTE DE OBRA



DIA (44) - 02 - Septiembre - 2021 (JUEVES)

DIA SOLEADO

HERRAMIENTA MENOR: Compresor

Saltarin

Pulidora

Herramienta Menor


PERSONAL: Supervisor (1)
 Res. Interventor (1)
 Res. de Obra (1)
 Topografato (1)
 Siso. (1)
 Obreros (3)
 Maestro. (1)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja a las 7:00 AM, donde se continua con la rotura del Pavimento Flexible y Rigido.

Se inicia la excavacion de la red de Acueducto con el ancho de 0.50 cm y Profundidad de 1.20 mts

En el koto 4 mts. Inicia la rotura de Pavimento Rigido de 0.15 cm y tambien pavimento Flexible 0.10 cm se retira material de escombros de manera

manual.



MARIA VANNEZA SOTO
 ING. RESIDENTE DE OBRA

Handwritten signature, possibly "Luis Quijano" or similar.

DIA (45) - 03 - Septiembre - 2021 (VIERNES)

DIA: SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Saltarin

Motomartillo

Polidora


Herramienta Menor

PERSONAL: Supervisor (1) Siso (1)
 Res. Interventoria (1) Maestro (1)
 Res. Obra. (1) Obreros (3)
 Topografato (1)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja
a las 7:00 Am donde se continua con la rotura
de Pavimento Flexible y Rigido


- en el koto 47 en el Frente de la vivienda ubicada
Calle 28 # 9-34. Barrio la Granja se derrumba
el sardinel una vez se esta realizando la
excavacion de la red de Acueducto

- Se continua con la excavacion de la red de
acueducto, se tiene daño sobre el tubo de
acueducto existente, sobre el cual se realiza la
reparacion.



MARIA VANEGAS SOTO

ING. RESIDENTE DE OBRA



DIA (46) - 04 - septiembre - 2021 (SABADO)

DIA: SOLEADO -

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Saltarin

LLUVIOSO

Motomartillo

Pulidora

Herramienta Menor.

PERSONAL: Supervisor (1)

Res de Interventoria (1)

Res de Obra (1)

Topografato (2)

SISO (1)

Maestro (1)


Obrero (13)

Se da inicio de obra en la calle 28 la
Granja a las 7:00 Am, donde se esta

Fuertes llovias, por lo cual no se ha podido avanzar rápidamente.

Se realiza con motomartillo la rotura o demolición del Sarrin del cual está sobre la excavación que se está realizando de acueducto.

Se continúa con la excavación de la red de Acueducto Principal de manera manual, Así mismo se realiza limpieza en la obra.




MARIA VANNEGA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA

Vulquez
residente S.N.E

DIA (47) 05-Septiembre-2021 (DOMINGO)

No se labora en la calle 28 la Granja entre ambala y Evabinal.



MARIA VANNEGA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA

DIA (48) 06-Septiembre-2021 (LUNES)

DIA: SOLTADO.

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Salfarin.

Motomartillo

Herramienta Menor.

PERSONAL: Supervisor. (1)

Res. Interventoria (1)

Obreros (3)

Res de Obra. (1)


Macotro. (1)

Topografo. (2)

Se da inicio de obra calle 28 la Granja a las 7:00 Am donde se realiza el retiro de la demolición del sardinel de la excavación de la red principal de Acueducto.

Se continúa con la excavación de la red Principal de Acueducto, y con la rotura de Pavimento Flexible de las domiciliarias.

Se realiza retiro de escombros de manera manual y limpieza en la obra



MARIA VANESA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA

Mulquin
Residente en Obra

DIA (49) 07 - Septiembre - 2021 (MARTES)

DIA: (LUNES) -
SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Saltarin.

Pulidora.

Motomartillo.

Herramienta Menor.

PERSONAL: Supervisor (1)

Residente de Interventoria (1)

Residente de Obra (1)

Topografo (2)

Sico (1)

Obreros (2)

Maestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja a las 7:00 Am, donde se continúa donde se continúa con la excavación manual de Profundidad de 1.20 mts. de la red Principal de Acueducto.

Se continua con la rotura de las domiciliarias con el rotomartillo,
Se realiza retiro de material de manera manual y limpieza de la obra

MARIA VANNESSA SOTOLONGO
ING. RESIDENTE DE OBRA

Wulquiza
Residente

DIA (50) - 08 - septiembre - 2021 (MIÉRCOLES)

DIA: LUVIOSO

Herramienta y Equipos: Salfarin.

Herramienta Menor.

Personal: Supervisor (1)

Res. Interventora (1)

Res. de Obra (1)

Topografo (2)

SISO (1)

Obreros (3)

Moestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja a las 7:00 Am, donde se continua con la excavacion de la red Principal de Acueducto La Guabinal



Tuberia del conjunto

Se tiene daño en la tuberia que conduce al conjunto continuo, se le realiza la reparacion Pertinente con acompañamiento del IBAL
No se Avanza casi por el dia lluvioso

Ave ambato

Wul.

DIA (51) - 09 - Septiembre - 2021 (JUEVES)

DIA: SOLEADO

Herramienta y Equipos: Herramienta Menor.

Personal: Supervisores (1)

Residente de obra (1)

Residente de Interventoria (1)

Topografo. (1)

SISO. (1)


Maestro. (1)

Obreros (3)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja en la ambala a las 7.00 Am, donde se realiza la instalacion de la tuberia de acueducto de 3" con su respectiva cama de arena de 10 cm y se realiza una capa de 10 cm por encima de la tuberia para protegerla antes de realizar los llenos con recebo.

Se realiza la excavaciones de las domiciliarias de Acueducto.

Se realizo limpieza en la obra.

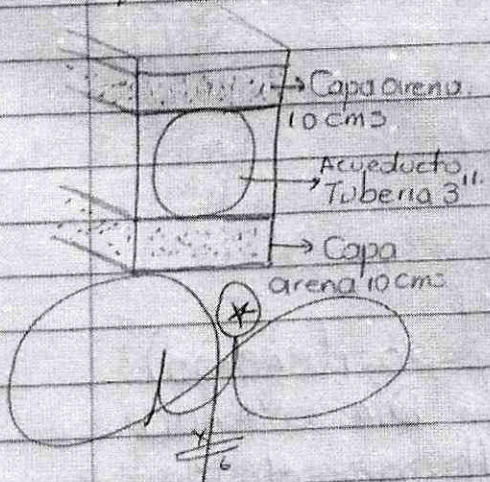

MARIA VANNEGA SOTO.
ING. RESIDENTE DE OBRA

[Handwritten signature]
Residente INT

DIA (52) - 10 - Septiembre - 2021 (VIERNES)

DIA: SOLEADO.

Herramienta y Equipos: Herramienta Menor


Personal: Supervisor (1)
 Residente de obra (1)
 Residente de Interventoría (1)
 Topógrafo (1)
 Siso (1)
 Obreros (3)
 Maestro (1)

Se da inicio de obra a las 7:00 AM en la calle 28 la Granja, donde se continua con la instalación de la toberna de 3, con su respectiva cama de arena de 10 cms, tanto en la parte inferior y superior.

Excavación de domiciliarias de Arveductos con Profundidad de 1 mts.

Se instala relleno de recebo con capas de 20 cm apisonado con saltarin, y la primera capa de manera manual.

Se realizo limpieza de obra



MARIA VANNEESA SOTO
 ING RESIDENTE DE OBRA

Wilquiere
 Residente interventoría

DIA (52) - 11 - Septiembre - 2021 (SABADO)

DIA: SOLEADO


Herramienta y Equipos: Herramienta Menor.

Personal: Supervisor (1)
 Residente obra (1)
 Residente Interventoría (1)
 Topógrafo (2)
 Siso (1) Obreros (3)
 Maestro (1)

Se da inicio de obra a las 7:00 Am a las Calle
28 la Granja, donde se continua con la excavacion
de domiciliarias de Acueducto

Se continua con la instalacion de tuberia de
3", con las capas de arenas de 10 cms y sus
respectivos rellenos con relleno apisonado con
Saltarin

Retiro de material en volqueta de manera manual
y limpieza de obra




Kilquiza R.
Presidente Interventor

MARIA VANNEGA SOTO
ING RESIDENTE DE OBRA

DIA (53) - 12 - Septiembre - 2021 (DOMINGO)

No se labora en la calle 28 entre Ambala
y Guabinal la Granja.



Anal.

MARIA VANNEGA SOTO
ING RESIDENTE DE OBRA

DIA (54) - 13 - Septiembre - 2021 (LUNES)

DIA SOLEADO.

Herramienta y Equipos: Herramienta Menor.
Saltarin.

Pulidora

Personal: Supervisor (1)

Res. Interventoria (1) ESO (1)

Res. Obra (1) Obreros (3)

Topografo (1) Maestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja a las 7:00 AM, donde se continua con la excavacion de las domiciliarias de acueducto.
 Se realiza corte en el andén donde se llegan a los contadores de Agua Potable.
 Se realiza retiro de material de la excavacion proveniente de la Red de Acueducto.
 Se realiza limpieza de obra y señalizacion.



MARIA VANNESSA SOTO

ING. RESIDENTE DE OBRA

Vulquijia

Residente interventoria

DIA (55) - N - Septiembre - 2021 (MARTES)

DIA: SOLEADO

Herramienta y Equipos: Herramienta Menor
 Saltarin

Personal: Supervisor (1)

Residente de interventoria (1)

Residente de Obra (1)

Topografo (1)

Siso (1)

Obreros (3)


Maestro (1)

Se da inicio de obra a las 7:00 AM en la calle 28 la Granja, donde se continua con la excavacion de domiciliarias de acueducto.

Se inicia con la instalacion de accesorios para la red de Acueducto.

Se instala la manguera de PE de 1/2 de cada domiciliaria, collanines, registro, llaves de Poso Adaptadores Macho.

A las Acometidas de Acueducto se les instala cama de arena de espesor de 10 cms. Se realiza retiro de escombros en volquete de manera manual.



MARIA VANNESSA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA

Inalquij
Residente Interventor

DIA (SE) - 15 - Septiembre - 2021 (MIÉRCOLES)

DIA: SOLEADO

Herramienta y Equipos: Saltarin.
Pulidora

Herramienta menor

Personal: Supervisor (1)

Res. Interventoria (1)

Res de Obra (1)

Topografo (1)

SISO (1)

Moestro (1)

Obreros (3)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja a las 7.00 Am, donde se continua con la excavacion de domiciliares de acueducto, instalacion de accesorios.

Instalacion de cama de arena de 10 cms.

Retiro de escombros con volqueta de manera manual y limpieza de la obra. Señalización de los aperturas de andén con anta Peligro.



MARIA VANNESSA SOTO

Inalquij
Residente Interventor

DIA (57) - 16 - Septiembre - 2021 (JUEVES)


DIA: SOLEADO

Herramienta y Equipos: Saltarin
 Pulidora
 Herramienta Menor

Personal: Supervisor (1)
 Res. Interventora (1)
 Res. Obra (1)
 Topografo (1)
 Siso (1)
 Maestro (1)
 Obreros (3)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja a las 9.00 Am, donde se continua con la excavacion de las domiciliarias de las Acometidas de acueducto. Se realizare tiro de escombros en volqueta de manera manual.

Se realiza instalacion de Manguera PF de 1/2", con su respectiva cama de arena de 10 cms, y su relleno de recebo con compactacion con capas de 20 cms apisonado en saltarin.



MARIA VANESA SOTO
 ING. RESIDENTE DE OBRA

Vulquijin R.
 Residente de Interventor

DIA (58) - 17 - Septiembre - 2021 (VIERNES)

DIA: SOLEADO


Herramienta y Equipos: Saltarin
 Pulidora
 Herramienta Menor

Personal: Supervisora (1)
 Residente de Obra (1)
 Residente de Interventoria (1)
 Topografo (1)
 Siso (1)
 Obreros (3)
 Maestro (1)
 Señalización (3)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja a las 7:00 Am, donde se continua con el relleno de escombros recebo para la compactacion con espesor de cada capa de 20 cms

Se realiza la Prueba Hidrostatica donde inicia a las 5:00 Pm, donde se inician Pruebas con 65 lps el cual se sostuvo, las 2 horas correspondiente y no se obtuvieron Perdidas, la Prueba cumple Satisfactoriamente.

Se realiza retiro de escombros en volqueta de manera manual y limpieza en la obra.



MARIA VANESSA SOTO
 ING. RESIDENTE DE OBRA

Vulquiza
 Residente de Interventoria

DIA (59) - 18 - Septiembre - 2021 (SABADO)


DIA: SOLEADO.

Herramienta y Equipos: Saltarin. ; Señalización (2)
 Herramienta y Equipos.

Personal: Supervisor (1)
 Res. Interventoria (1)
 Res. Obra (1) Obreros (3)
 Topografo (1) Maestro (1)
 Siso (1)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja a las 7:00 Am, donde se continua con el relleno de receo con compactacion de 20 cm³.

Se realiza instalacion de manguera de PE 1/2", con sus respectivos accesorios de collarin, registro, llave de Paso, Adaptador macho 1/2", donde esta siendo instalado a la red Principal de Acueducto. Se realiza retiro de material de escombros con manera manual y limpieza de obra.



Se solicita al contratista, emperezar a preparar el lleno de las excavaciones en la zona de orden. Para evitar accidentes de los peatonales, y la


MARA VANNESSA SOTO Respectiva Señalización

ING RESIDENTE DE OBRA

Interventor
Pendiente Interventor

DIA (60) - 19 - Septiembre - 2021 (DOMINGO)

No se labora en la calle 28 la Granja entre ambala y Golabinal.



MARA VANNESSA SOTO

ING RESIDENTE DE OBRA

Interventor

Pendiente Interventor

DIA (61) - 20 - Septiembre - 2021 (LUNES)

DIA: SOLEADO

Herramienta y Equipo: Herramienta Menor.
Saltarin

Personal: Supervisor (1)

Res. Interventoria (1)

Orso (1)

Res. Obra (1)

Obrenos (3)

Topografo (1)


Maestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 28 en la Granja a las 7:00 Am, donde se continua con el relleno de relleno compactado con espesor de 20 cms, Apisonado con saltarin.

Se esta realizando el relleno sobre los andenes los cuales fueron cortados con Pulidora para la instalacion de los accesorios de la manguera Pr 1/2 de Agua Potable.

Retiro de material de escombros de manera manual.

Limpieza en la obra.



MARIA VANNESSA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA

V. Soto
Residente Obra

DIA (62) - 21 - Septiembre - 2021 (MARTES)

DIA: (LUVIOSO)

Herramienta y Equipos: Saltarin.


Pulidora.

Herramienta Menor.

Personal: Supervisor (1) SISO (1)
Res. Interventoria (1) Obreros (3)
Res. obra (1) Maestro (1)
Topografo (1)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja donde se inicia a las 7:00 Am, de manera pausada ya que se presentan lluvias fuertes durante el transcurso del dia.

Se realizan rellenos con relleno compactado con Saltarin de espesor de 20 cms, Retiro de material de escombros a volqueta de manera manual.



MARIA VANNESSA SOTO

Día (63) - 22 Septiembre - 2021 (MIÉRCOLES)

DÍA: SILEADO.

Herramienta y Equipos: Saltarin

Polidora

Herramienta Menor.

Personal: Supervisor (1)

Residente de Interventoría (1)

Residente de Obra (1)

Topógrafo (1)

Siso (1)

Obreros (3)

Maestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja a las 7:00 Am, donde se continua con la instalacion de Arometidas de Acueducto, Relleno con Recebo con sus respectivas copas de 0.20 cms

Asi mismo se recibe visita Técnica del IBAL para revision del empalme, donde nos da a conocer los accesorios que se necesitan para el empalme que se realizara el dia 24-09-2021. Los cuales son los siguientes:

Siguientes:

(15) universales de 3"


(3) Tee de 3" en PVC

(3) Valvulas Sello elastico de 3"

(2) Semicodos de 3" PVC

Asi mismo el Grupo Técnico del IBAL nos da a conocer que se debe tener lista y la explicacion de como se realizara el empalme.

Se realiza limpieza en la Obra en General.



INÉS MARÍA VANNESA SOTO

Vulquiza
Residente Obra

Día (64) - 23 - Septiembre - 2021 (Jueves)

DÍA SILENCIO.

Herramienta y Equipos: Sa Harin

Pulidora Compresor

Motobomba

Herramienta Menor.

Personal: Supervisor. (1)

Res. Interventoria. (1)

Res. de Obra. (1)

Topógrafo (1)

SISO (1)

Obreros (8)

Maestra (2)


Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja donde se realiza labores a las 7:00 AM, donde se inicia las excavaciones para los respectivos empalmes, donde se esta organizando con compresor las roturas de la Ave. Ambala, Guabinal, entrada intermedia, entrada del conjunto.

Se continua con las excavaciones para realizar el empalme, en los 4 puntos donde se realizara al mismo tiempo.

Se tiene visita antes del empalme por parte del IBAL para la revision de que se cuente con todas los accesorios solicitados y las recomendaciones anteriormente dichas.

Asi mismo se inicia el empalme, de los 4 puntos al mismo momento, donde se contaba con:

- Accesorios disponibles
- Motobomba
- Carro disponible.
- Personal disponible (2 x Punto)
- Personal del IBAL e interventoria

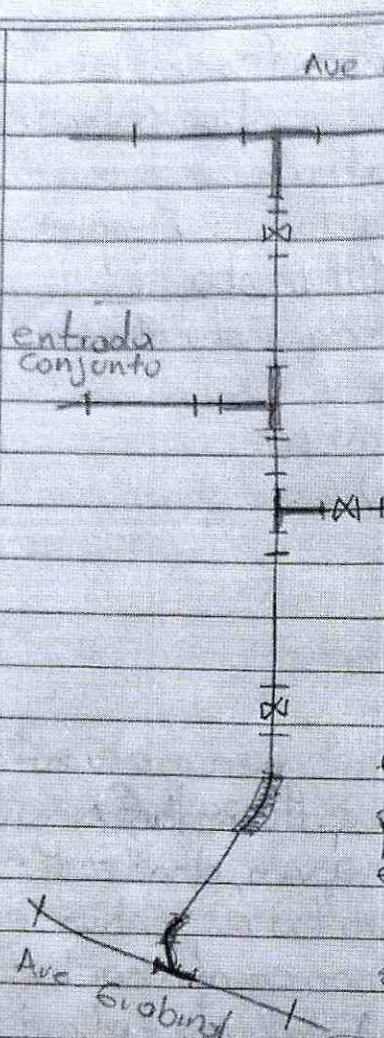

Durante el empalme se utilizaron los sgtes Accesorios

- XI (3) valvulas pello elastico 3"
- I (3) Tee 3" PVC
- (15) universales 3"
- ∩ (2) Semicodos 3"

Durante el empalme solo se conto con un retraso debido a que el empalme que se estaba realizando por la Ave. Guabinal, la tuberia se encontraba en otra direccion, Pero en compania del IBAI y la mtenentura se encontro la solucion, logrando asi un empalme exitoso.

MARIA VANNEGA SOTO
RESIDENTE DE OBRA

Luis Quijano
Residente Obra

DIA (65) - 24-September-2021 (VIERNES)


DIA: Soleado.

Herramienta y Equipos: Herramienta Menor.
Saltarin.
Pulidora.

Personal: Supervisor (1)
Res. Interventoria (1) SUSO (1)
Res. Obra (1) Obreros (3)
Trazante (1)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja a las 7:00 Am, donde se inicia al rellenar con recebo las excavaciones que se realizaron para las empalmes y se empezaron a conectar las viviendas a la nueva red de Acueducto.

Se retiró material de escombro de manera manual debido a que se encuentra sobre la calle 29 una tee que viene de la Calle 28 de la red Principal de Acueducto se hace necesario instalar una nueva Valvula de Sello elastico sobre la calle 28 la Granja

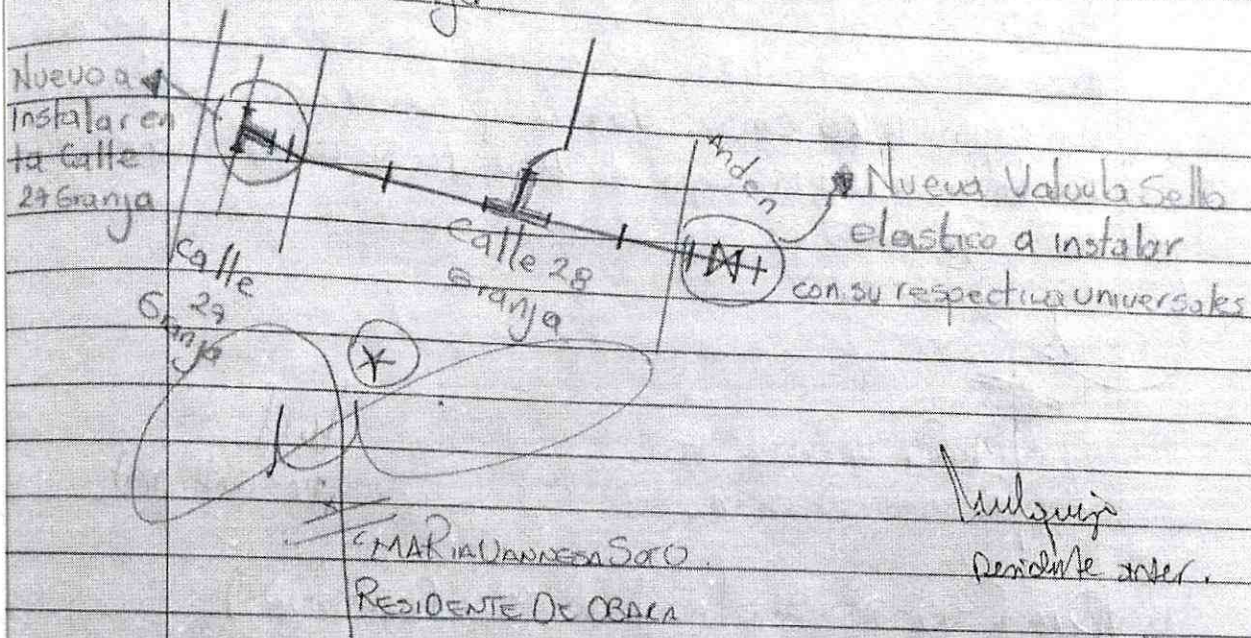

DIA (66) - 25 - Septiembre - 2021 (SABADO)

DIA SOLEADO.

Herramienta y Equipos: Herramienta Menor
Saltarin.

Personal: Supervisor (1)
Res Interventoria (1)
Res de Obra (1)
Topografía (1)
Siso (1)
Obreros (3)
Maestro (1)

Se da inicio de obra en la Calle 28 la Granja a los 7:00 AM donde se continua con la Conexión de las viviendas a la red Principal, donde se realiza la Verificación Correspondiente de que todos los Usuarios queden conectados, esta Supervisión se realiza con la Interventoría.

Por otro lado se esta realizando la excavación para cambiar la tubería del Sumidero el cual se encuentra en 10", ya que por donde se realizo cambio de la tubería de la red de acueducto para el empalme se hace necesario su demolición la cual se encontro en tubería de Gres.

Asi mismo se realizan los respectivos rellenos con recebo con capas de 20 cms cada una apisonada con saltarin, tanto en la red Principal de Acueducto como las domiciliarias.




MARIA VANESSA SOTO
RESIDENTE DE OBRA

Int.
Residente Int

DIA (67) - 26-Septiembre-2021 (DOMINGO)

NO, se realizan labores en la calle 28 entre ambala y Guadabinal la Granja



MARIA VANESSA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA

Día (68) - 27 Septiembre - 2021 (LUNES)

Herramienta y Equipos: Herramienta Menor

Día: Solano

Personal: Supervisor (1)

Res. de Intervención (1)

Res. de Obra (1)

Topografía (1)

SISU (1)

Obreros (3)


Maestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja a las 7:00 Am donde se continua con el arreglo de los andenes, donde en sus respectivos cortes por donde se realizaron las instalaciones de las Acometidas con concreto de 2500 Psi.

Se continua con el relleno de las Acometidas de Acueducto, se realiza la demolición del concreto que protege la tubería del sumidero para respectivo cambio.


Se realiza el retiro de escombros de manera manual.

Se realiza limpieza en la obra de manera general.



MARÍA VANESSA SOTO

ING. RESIDENTE DE OBRA



RESIDENTE INTERVENTO

Día (69) - 28 Septiembre - 2021 (MARTES)

Herramienta y Equipos: Saltarin

Herramienta Menor.


Día: Louroso

Personal: Supervisor (1)
 Res. Interventora (1)
 Residente Obra (1)
 Topografo. (1)
 Siso. (1)
 Obreros (2)
 Maestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja a las 7:00 Am, donde se realiza la instalacion de la tuberia de 10" para el sumidero, donde se le instala su coima de Arena de 10 cms y se realiza su recubrimiento en concreto de 3000 PSI.

Se inicia la excavacion para el sardinel el cual se habia derrumbado en la excavacion de la red Principal de Acaeducto.

Se realiza limpieza General en la obra.



MARIA VANESA SOTO
 ING. RESIDENTE DE OBRA

Vulquez
 Ing. Residente Intervent

DIA (20) - (29) - Septiembre - 2021 (MIÉRCOLES)

DIA: Soleado - lluvioso

Herramienta y Equipos: Saltarin

Herramienta Menor.

Personal: Residente de Obra (1)

Res. Interventora (1)

Supervisor (1)

Topografo (1)

Siso. (1)

Obreros (2)

Maestro (1)

Se inicia labores en la calle 28 la Granja a las 7:00 Am. donde se continua con la excavacion donde se realizara el sardinel.

Se realiza retiro de escombras de manera manual.

Se termina con el arreglo de los andenes en concreto de 2500 Psi. No se adelantaron muchas labores por la fuertes lluvias que se viene presentando en la obra.

Se realiza limpieza en la obra en general.

MARIA VANNESSA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA

Mulquin
ING. RESIDENTE DE OBRA

DIA (21) - (30) - Septiembre 2021 (JUEVES)

DIA: SOLEADO

Herramienta y Equipos: Herramienta Menor
Saltarin

Personal: Res. de Obra (1)
Res. de Intersectorial (1)
Supervisor (1)
Topografos (1)
Biso (1)
Obreros (2)
Maestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja a las 7:00 Am, donde se inicia la fundida en concreto del sardinel que se habia caido al frente de las Propiedades ubicadas en la Calle 28 #9-34 y calle 28 #9-24.

Se realiza el relleno de la tubería del Sumidero.

La tubería en 18" el cual se recubren en concreto

Se realiza retiro de escombros de manera manual y paleros para realizar limpieza en la obra en General



MARIA VANESA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA

Vulquini
ING. Residente Inter.

DIA (32) - 01-OCTUBRE - 2021 (VIERNES)

DIA: SOLEADO

Herramienta y equipos: Sallarin

Herramienta Menor

Personal: Supervisor (1)

Residente de Interventoria (1)

Residente de obra (1)

Topografo (1)

Jiso (1)


Obreros (3)

Moestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja, donde se realiza la reposicion de los Andenes donde se realizaron sus respectivos cortes con concreto de 2500 PSI. Se realiza el llenado correspondiente en donde se realizaron los empalmes con sus respectivas capas de 20 cms apisonadas con sallarin.

Se realiza nivelacion con recebos sobre la zanja Principal de acueducto.

Se realiza retiro de escombros de manera manual y limpieza general de la obra



MARIA VANESA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA

Vulquini
ING. Residente Inter.

DIA (73) - 02-OCTUBRE-2021 (SABADO)

DIA SUELO

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta Menor

PERSONAL Supervisor (1)

Residente de Obra (1)

Residente de Interventoria (1)

Topografo (1)

ESD (1)

Obreros (2)

Moestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja donde se continua con la reposicion donde se realizaron los corte de orden en concreto de 2500 PSI.

Se realiza el retiro de escombros de manera manual, y asi mismo la limpieza general de obra.




MARIA VANNESSA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA

Mulquin

ING. Residente inter.

DIA (74) - 03-OCTUBRE-2021 (DOMINGO)

No se labora en la obra de la calle 28 entre calle Ambala y Eubinal Barro la Granja.



MARIA VANNESSA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA

Mulquin

ING. Residente inter.

DIA (75) - 04-OCTUBRE - 2021 (LUNES)

DIA SOLEADO.

Herramienta y equipos: Herramienta Menor

Personal: Supervisor (1)

Res. de Obra (1)

Res de Interventoria (1)

Topografo (1)

SIS (1)


Obreros (2)

Maestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja, donde se instala la valvula de sello elastico de 3" sobre el andén con sus respectiva uniones universales de 3", Asi mismo se realizo su respectivo chicote, para continuamente realizar el lleno con recebo, y continua la instalacion de la tapavalvula, y la reposicion del andén en concreto de 2500 PSI, para dejar por terminado la reposicion de andenes.

Se realizo el lleno correspondiente al empalme por los lados del conjunto con recebo y compactado con saltarin

Se realiza la limpieza en general de la obra



MARÍA CÁRDENAS SCD
ING. RESIDENTE DE OBRA

Interventor
SAB. REHABILITACIÓN DE OBRAS

DIA (36) - 05 - OCTUBRE - 2021 (MARTES)

DIA: SOLEADO.

HERRAMIENTA y EQUIPOS: Herramienta Menor.

PERSONAL: Supervisor (1)

Res. de Obra (1)

Res. de Interventoria (1)

Topografos. (2)

Siso (1)

Obreros (3)

Maestro. (1)


Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja, donde se terminan las reposiciones de andenes, limpieza general de obra, retiro de escombros, retiro de Pol. sombra, y se habilita la via para su transitabilidad.

ING. VANNESSA SOTO.

RESIDENTE DE OBRA.

SEGURIDAD SOCIAL

DISTRITO 4-2021

	CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PARA CONTRATOS DE OBRA	CÓDIGO: GJ-R-061
		FECHA VIGENCIA: 2019-09-19
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 2
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		

CONTRATO DE OBRA N° 0069 DEL 14 DE MAYO DE 2021	
CONTRATANTE	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
CONTRATISTA	CONSORCIO DISTRITO 4 -2021. R.L. DAVID FERNANDO MARTINEZ GARZÓN

OBJETO	REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO NO. 4 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ
PLAZO INICIAL	CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL	DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	JULIO 06 DE 2021
SUSPENSIÓN 01	DICIEMBRE 21 DE 2021
PRORROGA A LA SUSPENSIÓN 01	ENERO 10 DE 2022
REINICIACIÓN 01	MARZO 15 DE 2022
SUSPENSIÓN 02	MARZO 16 DE 2022
REINICIACIÓN 02	MAYO 16 DE 2022
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	JULIO 25 DE 2022
VALOR INICIAL	\$1.309.436.775 M/CTE.
VALOR CONTRACTUAL	\$ 1.858.845.847 M/CTE.
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL R/L LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ.
SUPERVISOR	LUISA FERNANDA HENAO GARCIA

La suscrita, a saber: **Ing. LUISA FERNANDA HENAO GARCIA**, en su condición de Supervisora, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUEREÑA DE**



**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES
AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES PARA
CONTRATOS DE OBRA**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-061

FECHA VIGENCIA:
2019-09-19

VERSIÓN: 01

Página 2 de 2

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL, identificada con NIT 800.089.809-6, del contrato en mención:

CERTIFICA:

Contratista persona natural	<input type="checkbox"/>	Contratista persona jurídica	X
		2. El contratista presentó planillas correspondientes al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar, así: N°9429753959 del 2022/01/20 N°9429754025 del 2022/01/20 N°9436813838 del 01/07/2022 N°9436813637 del 01/07/2022	

Se expide la presente constancia para efectos del respectivo pago en la ciudad de Ibagué, a los 08 días del mes de agosto del año 2022.

LUISA FERNANDA HENAO GARCIA
PROFESIONAL UNVIERSITARIO GESTION ALCANTARILLADO
Supervisora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 901481420	1	CONSORCIO DISTRITO 4 2021	B - MIEMBROS DE 200 COTIZANTES
Exonerado SENA e ICBF		No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
2021-12	29753959	Y	2022/01/06
2021-12	9429753959	Y	2022/01/20

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$603,100	\$0	\$0	\$603,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	\$603,100	\$0	\$0	\$603,100
TOTAL				5	\$603,100	\$0	\$0	\$603,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901481480	CONSORCIO DISTRITO 4 2021	8 - MIENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 4 EDIFICIO EL PORTAL	IBAGUÉ-TOLIMA	272.3259	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pension	Novedades	Empleo		Salud		Pension		Novedades		CCF		Riesgos		Parafiscales		Total Aportes
				Identificación	Nombre	Identificación	Nombre	Identificación	Nombre	Identificación	Nombre	Identificación	Nombre	Identificación	Nombre	Identificación	Nombre	
2021-12	29754025	9429754025	2022/01/06	2022/01/20	BANCO AV VILLAS	14												\$2,710,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES												EMPLEO		SALUD		PENSION		NOVEDADES		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		Total Aportes					
			ing	ret	tda	tas	tdp	lap	top	cor	vet	sln	lge	lma	vac	avp	vet	lft	vfp	IBC	Dias	IBC	Dias	IBC	Dias	IBC	Dias	IBC		Dias	IBC	Dias	Exonerado SENA e ICBF	
1	CC	93410096															210301	22	\$666,253	\$108,700	EP9002	22	\$666,253	\$83,300	CCF500	22	\$666,253	\$26,700	14-11	22	\$666,253	\$33,400	No	\$296,500
2	CC	1006127165															210301	22	\$666,253	\$108,700	EP9002	22	\$666,253	\$83,300	CCF500	22	\$666,253	\$26,700	14-11	22	\$666,253	\$33,400	No	\$296,500
3	CC	14219239															25-14	11	\$333,127	\$53,400	EP9045	11	\$333,127	\$41,700	CCF500	11	\$333,127	\$13,400	14-11	11	\$333,127	\$16,700	No	\$148,400
4	CC	2374932																0	\$0	\$0	EP9037	22	\$666,253	\$83,300	CCF500	22	\$666,253	\$26,700	14-11	22	\$666,253	\$33,400	No	\$189,800
5	CC	93340791															210301	22	\$666,253	\$108,700	EP9002	22	\$666,253	\$83,300	CCF500	22	\$666,253	\$26,700	14-11	22	\$666,253	\$33,400	No	\$296,500
6	CC	14239504															210201	22	\$666,253	\$108,700	EP9044	22	\$666,253	\$83,300	CCF500	22	\$666,253	\$26,700	14-11	22	\$666,253	\$33,400	No	\$296,500
7	CC	1006125356															210301	22	\$666,253	\$108,700	EP9044	22	\$666,253	\$83,300	CCF500	22	\$666,253	\$26,700	14-11	22	\$666,253	\$33,400	No	\$296,500
8	CC	14396328															210301	22	\$666,253	\$108,700	EP9044	22	\$666,253	\$83,300	CCF500	22	\$666,253	\$26,700	14-11	22	\$666,253	\$33,400	No	\$296,500
9	CC	14232728															210201	11	\$333,127	\$53,400	EP9037	11	\$333,127	\$41,700	CCF500	11	\$333,127	\$13,400	14-11	11	\$333,127	\$16,700	No	\$148,400
10	CC	93391513															210301	11	\$333,127	\$53,400	EP9002	11	\$333,127	\$41,700	CCF500	11	\$333,127	\$13,400	14-11	11	\$333,127	\$16,700	No	\$148,400
11	CC	7730243															210201	11	\$333,127	\$53,400	EP9044	11	\$333,127	\$41,700	CCF500	11	\$333,127	\$13,400	14-11	11	\$333,127	\$16,700	No	\$148,400
12	CC	1110497680															210301	11	\$333,127	\$53,400	EP9002	11	\$333,127	\$41,700	CCF500	11	\$333,127	\$13,400	14-11	11	\$333,127	\$16,700	No	\$148,400
Total																			\$5,663,153	\$907,200			\$6,329,406	\$791,600			\$6,329,406	\$253,900			\$6,329,406	\$317,800		\$2,710,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT-901481420	1	CONSORCIO DISTRITO-4 2021	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Salud	Clave	Tipo
2022-12	2022-01	9409754025	E
Pensión		Pago	Planilla
2022-01		29754025	9409754025
Sucursal Principal		Direccion	Exonerado SENA e ICBF
PRINCIPAL		CARRERA 4 EDIFICIO EL PORTAL	No
Ciudad-Departamento		Telefono	Exonerado SENA e ICBF
IBAGUE-TOLIMA		2723259	No
Pago		Dias Mora	Valor
2022/01/20		14	\$2.710,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFIILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	\$907,200	\$0	\$0	\$907,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$53,400	\$0	\$0	\$53,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$640,300	\$0	\$0	\$640,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$213,500	\$0	\$0	\$213,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$440,800	\$0	\$0	\$440,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	\$440,800	\$0	\$0	\$440,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$253,900	\$0	\$0	\$253,900	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$253,900	\$0	\$0	\$253,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				12	\$791,600	\$0	\$0	\$791,600	
MEDIJMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
MEDIJMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1	\$41,700	\$0	\$0	\$41,700	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$166,600	\$0	\$0	\$166,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$208,300	\$0	\$0	\$208,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$190,000	\$0	\$0	\$190,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	12	\$190,000	\$0	\$0	\$190,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$127,300	\$0	\$0	\$127,300	
SENA	PASENA	899,999,034	1	12	\$127,300	\$0	\$0	\$127,300	
TOTAL				12	\$2.710.800	\$0	\$0	\$2.710.800	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Dias	Valor		
901481420	1	CONSORCIO DISTRITO 4 2021	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	2022/07/01	2022/06/06	BAHCO AV VILLAS		24		\$3,178,900		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pension	Riesgos	Parafiscales
2022-05	2022-06	36813637	9436813637	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES						
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte			
1	CC 1005780853	AMORTEGUI AGATON NELSON ENRIQUE	230301	30	\$1,000,000	\$140,000	EP5041	30	\$1,000,000	\$125,000	CCF50	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$1,000,000	\$50,000
2	CC 1274932	GARCIA MORENO JOSE JOAQUIN		0	\$0	\$0	EP5037	7	\$233,334	\$29,200	CCF50	7	\$233,334	\$9,400	14-11	7	\$233,334	\$16,300	7	\$233,334	\$11,800
3	CC 14239504	GALEANO CARRILLO JOVIN DARIO	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5041	30	\$1,000,000	\$125,000	CCF50	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$1,000,000	\$50,000
4	CC 1006123556	GARCIA ORTEGA JHON FABER	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5041	30	\$1,000,000	\$125,000	CCF50	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$1,000,000	\$50,000
5	CC 14237278	MARRA GOMEZ HERIBERTO	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$125,000	CCF50	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$1,000,000	\$50,000
6	CC 93366556	PATINO CALDERON JUAN CARLOS	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5005	30	\$1,000,000	\$125,000	CCF50	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$1,000,000	\$50,000
7	CC 1110497480	VARGAS DIAZ EDISON JAVIER	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$125,000	CCF50	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$1,000,000	\$50,000
8	CC 110708106	VARGAS DIAZ JUAN DAVID	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$125,000	CCF50	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$1,000,000	\$50,000
Total	Afiliados(8)				\$7,000,000	\$1,120,000			\$7,233,334	\$904,200			\$7,233,334	\$289,400			\$7,233,334	\$503,500		\$7,233,334	\$361,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	\$1,120,000	\$0	\$0	\$1,120,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$640,000	\$0	\$0	\$640,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$503,500	\$0	\$0	\$503,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	\$503,500	\$0	\$0	\$503,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$289,400	\$0	\$0	\$289,400
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	8	\$289,400	\$0	\$0	\$289,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	\$904,200	\$0	\$0	\$904,200
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	2	\$154,200	\$0	\$0	\$154,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	3	\$375,000	\$0	\$0	\$375,000
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	2	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$217,100	\$0	\$0	\$217,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	8	\$217,100	\$0	\$0	\$217,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$144,700	\$0	\$0	\$144,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	8	\$144,700	\$0	\$0	\$144,700
TOTAL				8	\$3,178,900	\$0	\$0	\$3,178,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SEMA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor	IBAGUE-TOLIMA	IBAGUE-TOLIMA	7723259	No		
NIT-901461420	1	CONSORCIO DISTRITO 4 7021	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	2022/06/06	2022/07/01	BANCO AY VILLAS	24						\$445,500

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Periodo	Salud	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor		
2022-05	2022-05	36813838	9436813838	2022/06/06	2022/07/01	BANCO AY VILLAS	24		\$445,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
1	CC 83399334	GONZALEZ BAZURTO DIEGO JAVIER		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		14-11	\$1,000,000	\$69,600	0	\$0	\$0		
2	CC 79733664	MARQUES VARDON MANUEL ANTONIO		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		14-11	\$1,100,000	\$76,600	0	\$0	\$0		
3	CC 1110571936	MARTINEZ GARZON DAVID FERNANDO		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		14-11	\$1,500,000	\$104,400	0	\$0	\$0		
4	CC 1018454974	MENDOZA PALACIOS DIGNORY ANDREA		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		14-11	\$2,800,000	\$194,900	0	\$0	\$0		
Total	Afiliados(4)				\$0	\$0		\$0	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0		\$0	\$6,400,000	\$445,500		\$0	\$0		

RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)											
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	\$445,500	\$0	\$0	\$445,500			
TOTAL				4	\$445,500	\$0	\$0	\$445,500			



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación: Fecha evaluación Agosto 08 de 2022 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____
 Acta Parcial No. 03 Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 069 de 14 de mayo de 2021
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISTRITO 4 2021 R.L DAVID FERNANDO MARTÍNEZ GARZÓN NIT: 901.481.420-1
 FECHA DE INICIO: 06 DE JULIO DE 2021 FECHA DE TERMINACION: 25 DE JULIO DE 2022
 OBJETO DEL CONTRATO: REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO N° 4 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	X

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

8. OBRA PÚBLICA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	N.A	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	3.5
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	4	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL CONTRATADO.	4.5
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS	4	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	3
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	4	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	3.5
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	4
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	0	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	4
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA OPORTUNA DEL PEGMA	3	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	N.A
		PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.5
		ATENCION DE REQUERIMIENTOS	4
TOTAL PROMEDIO	3.17	TOTAL PROMEDIO	3.63

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	EVALUACION TOTAL	3.60
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	4		
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	4		
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	4		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	4		
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	4		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	4		
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y DEMAS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL CONTRATO	4		
TOTAL PROMEDIO	4.00		

Handwritten signature



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION X REEVALUACION _____ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR A LA FECHA EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESTANDARES GENERADOS POR IBAL SA ESP OFICIAL Y LA NORMATIVA VIGENTE PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO.

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION X REEVALUACION _____ POR PARTE DEL CONTRATISTA: NINGUNA.

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucio... El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion. SI NO

CONSORCIO DISTRITO 4 2021. R.L. DAVID FERNANDO MARTÍNEZ GARZÓN Contratista

LUISA FERNANDA HENAO GARCIA Profesional Universitario Gestión Alcantarillado IBAL S.A ESP OFICIAL Supervisora

CONSORCIO DISTRITO 4 2021
 NIT 901.481.420-1
 CRA 15 58 ED EL PORTAL
 Tel: (038) 31057930
 Ibagué - Colombia
 yanito1403@outlook.com



Factura electrónica de venta
 No. FE-4

Fecha y hora Factura

Generación	10/08/2022, 16:26
Expedición	10/08/2022, 16:33
Vencimiento	10/09/2022

Señores	EMPRESA IBAGUERENA DEACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SAS E.S.P.		
NIT	800.089.809-6	Teléfono	(038) 2756000
Dirección	CARRERA 4 BIS No.3-91	Ciudad	Ibagué - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta Parcial No.003 del Contrato de Obra No.069 del 14 de mayo de 2.021 cuyo Objeto es Rehabilitación y/o recuperación y/o Reposición de las redes de Acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendidos para el Distrito Hidráulico No.4 Ubicado dentro del perímetro hidrosanitario del Ibal S.A. E.S.P. Oficial en la ciudad e Ibagué	1.00	240,917,631.46

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Doscientos cuarenta millones novecientos diecisiete mil seiscientos treinta y un pesos m/cte con cuarenta y seis cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-09-10 por \$ 240,917,631.46

Observaciones:

Total Bruto	240,917,631.46
Total a Pagar	240,917,631.46

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S.Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764033312195 aprobado en 20220810 prefljo FE desde el número 1 al 10 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
 CUFE: c32a9e16021a57bd1f74717df40c6f242eed03c7b9af814ca9618c866eefccd0d960fc2db330829269306e2d42e76a3
