

21 DE MAYO DE 2022 SABADO

Condiciones climaticas: Lluvia intenso 09:00 - 09:30 am
Lluvia moderada.

Personal en obra: Residente contratista, suu contratista,
residente interventoria, aspecto interventoria, maestro,
ayudantes 8, oficial 2.

Maquinaria y/o equipos Conguro, herramienta menor.

ALCANTARILLADO

Se prosigue con el lleno con recebo debidamente compactado
sobre red principal. Excavación, lleno con arena e
instalación de tuberío de 6", lleno con recebo compacto.

Se continua con la demolición de andén y excavación
para cajas domiciliarias.

Se realiza limpieza y retiro de material sobrante, actividad
que se ha visto dificultosa ya que la escombrera municipal
sigue sin funcionamiento

Se cumplen con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad
en obra.

Residente Inter.



22 DE MAYO DE 2022 DOMINGO

Condiciones climaticas favorables

Personal en obra: Residente contratista, suu contratista,
residente interventoria, inspector interventoria, maestro, oficial,
ayudantes 8.

Maquinaria y/o equipos: Conguro, herramienta menor, cotadora

ALCANTARILLADO

Domiciliarias: se realiza fundida de cajas domiciliarias,
lleno con arena, instalación de tubería de 6" y lleno

Se realiza marcación y corte para posterior construcción de sumideros.

Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

Analiquin
Residente SIA

28 DE MAYO DE 2022 LUNES

Condiciones climáticas favorables

Personal en obra: Residente contratista, topógrafo contratista, SIAO contratista, residente interventoria, inspector interventoria, maestro, ayudantes 8, oficial.

Maquinaria y/o equipos: Compresor, canchero, herramienta menor.

ALCANTARILLADO.

Se realiza rotura de pavimento, excavación manual, lleno con arena, instalación de tubería de 10" para sumideros, lleno compacto con recebo.

Red principal: Debido a las condiciones de la red principal se realiza construcción de pozo 1. (Excavación manual, construcción de cancheta).

Se prosigue fundiendo cajas domiciliarias y realizando lleno compacto con recebo para domiciliarias.

Debido a las condiciones climáticas existentes se ha trabajado en el transcurso del tramo con material saturado, lo cual ha complicado las actividades, además de eso en la red principal se presentaron derrumbes.

Se cumple con todos los protocolos de seguridad.

24 DE MAYO DE 2022 MARTES

Condiciones climáticas: Lluvia moderada.

Personal en obra: Residente contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, maestro, ayudantes 8, Oficial 1.

Maquinaria y equipos: Conguro, herramienta menor
ALCANTARILLADO

Se prosigue con la construcción del pozo No. 2, para las domiciliarias se realiza instalación de tapas sobre cajas, lleno con recebo y recuperación de andenes en concreto.

Se termina de realizar lleno con recebo en red principal y sumideros, posterior a esto se retira cerramiento.

Limpieza y retiro de material proveniente de excavación.

Se cumplen con todos los protocolos de seguridad en obra.

[Firma]
Residente obra

[Firma]

24 DE MAYO DE 2022 MIÉRCOLES

Condiciones climáticas: Lluvia moderada

Personal en obra: Residente contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, maestro, ayudantes 8, Oficial 1.

Maquinaria y/o equipos: Conguro, herramienta menor, retroexcavadora, cortadora, compresor.

ALCANTARILLADO

Se da inicio a actividades correspondientes al tramo comprendido entre el pozo 2 y el pozo 3.

Se realiza cerramiento y señalización, marcación, corte y rotura de pavimento para red principal y domiciliarias, se continúa con excavación mecánica.

Se inician actividades de excavación manual para las domiciliarias,

NKA

debido a las condiciones climáticas existentes se trabajó con material saturado.

Se cumplen con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

Andrés Quijón
Residente en obra

26 DE MAYO DE 2022 (JUEVES)

Condiciones climáticas favorables

Personal en obra: Residente contratista, topógrafo contratista, sico contratista, residente interventoria, inspector interventoria, topógrafo interventoria, maestro, ayudante 7, oficial 1.

Maquinaria y/o equipo: Retroexcavadora, cargador, herramienta menor.

ALCANTARILLADO

Pozo 2-3: Se realiza excavación mecánica sobre red principal, debido a las condiciones climáticas existentes y a las condiciones saturadas del material se generan deslizamientos ocasionando sobreesfuerzos en la red. Se realiza entibado, excavación manual para repleto, lleno con entubado, instalación de tubería de 14" con sus respectivas silla yee de 14" a 6". Lleno con relleno debidamente compactado, se hace limpieza y retiro de escombros o material sobrante de excavación.

Domiciliarias: Se continúa con excavaciones manuales. Se realizan todos los protocolos de seguridad y bioseguridad.

Andrés Quijón
Residente en obra

27 DE MAYO DE 2022 (VIERNES)

Condiciones climáticas: Lluvia moderada.


Personal en obra: Residente contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, maestro, ayudantes 7, oficial.

Maquinaria y/o equipos: Canguro, herramienta menor.

ALCANTARILLADO

Red principal Se continuo con lleno compacto con recebo.

A continuación se presenta esquema de domiciliarias encontradas:

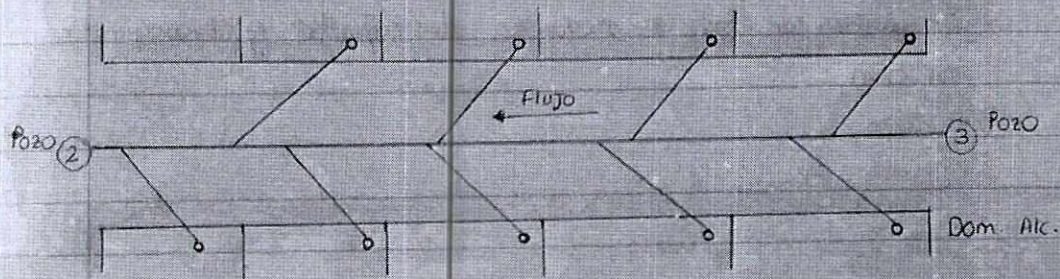

Domiciliarias: Se prosigue con la excavación manual, lleno con arena, instalación de tubería de 6", lleno compacto con recebo. Se realiza fundido de cajas para domiciliarias. Se realiza limpieza y retiro de material sobrante, esta actividad presenta complicaciones ya que por las condiciones climáticas la escombrera municipal no está en funcionamiento, por lo cual se han buscado nuevas escombreras que se encuentren certificadas y que estén en funcionamiento.

Se cumplen con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad.

Andrés Quiroz
Asesor de Obra

Quiroz

28 DE MAYO DE 2022 (SABADO)

Condiciones climáticas: Lluvia moderada.

Personal en obra: Residente de obra contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, maestro, 7 ayudantes, oficial.

Maquinaria y/o equipos: Herramienta menor, conguero.

Dormitorias: Se prosigue con fundida de cajas dormitorias, lleno compacto con recebo.

Somidero: Se realiza excavación manual, lleno con arena, instalación de tubería de 10" y lleno debidamente compactado con recebo.

Se cumplen con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

Ambrosio
Residente obra
2022

[Signature]

29 DE MAYO DE 2022 (DOMINGO)

Personal en obra: Residente de obra contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, maestro, oficial, ayudantes 7.

Maquinaria y/o equipos: Herramienta menor, conguero.

Dormitorias: Se realiza lleno con recebo compacto y recuperación de andenes. Limpieza y retiro de material proveniente de excavación. Retiro de corramiento.

Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad.

Ambrosio
Residente obra

[Signature]

30 de mayo de 2022 (LUNES)

Personal en obra: Residente de obra contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, maestro, oficial, ayudantes 7


Maquinaria y/o equipos: Herramienta menor, conchavo, conguero
Se inician actividades de pozo 3 a pozo 4.

Se realiza cenamiento y señalización, marcación de red principal y domiciliarias, corte.

Se cumplen con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

Condiciones climáticas: Favorables.

Indulgencia
Residente obras



31 DE MAYO DE 2022 (MARTES)

Condiciones climáticas: Lluvia moderada.


Personal de obra: Residente de obra contratista, siso contratista, topógrafo contratista, residente de interventoria, inspector de interventoria, maestro, oficial, ayudantes 7.

Maquinaria y/o equipos: Herramienta menor, conguero, retroexcavadora.

Se inicia actividad de excavación mecánica para red principal, instalación de entibado, excavación manual para replanteo, instalación de tubería de 14" con sus respectivas silla yee de 14" a 6" (antes de esto se realiza ataque de tubería con triturado). Lluvia compacta con recebo.

Domiciliarias: Se inicia actividades de excavación manual. Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad.

Indulgencia
Residente obras



NKA

01 DE JUNIO DE 2022 (MIÉRCOLES)

Condiciones climáticas: Lluvia moderada.

Personal en obra: Residente contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventorio, maestro, ayudantes 7, oficial.

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora, cangui, herramienta menor.

Red principal: Se finaliza excavación mecánica, se realiza entibado, excavación manual para replanteo, lleno con triturado, instalación de tubería de 14" y silla yee de 14" a 6", lleno compacto con recebo.

Domiciliarias: Se continua con excavación manual, lleno con arena, instalación de tubería de 6", lleno compacto con recebo.

Fundida de cajas de inspección.

Se realiza limpieza y retiro de material de excavación lo cual se ha complicado debido a que la escombrera municipal esta cerrada.

Se cumplen con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

[Firma]
Residente

[Firma]

02 DE JUNIO DE 2022 (JUEVES)

Condiciones climáticas favorables

Personal en obra: Residente contratista, inspector interventoria, siso contratista, residente interventorio, maestro, ayudantes 7, oficial.

Maquinaria y/o equipos: Cangui, herramienta menor.

ALCANTARILLADO

Red principal: Se realiza demolición de m...

existente debido a las malas condiciones del mismo. Se realiza construcción de pozo nuevo que incluye: construcción de cuevela, cilindro y cono, instalación de pasos y pañete.

Domiciliares. Se finaliza fundida de cajas domiciliarias. Se realiza retiro del material proveniente de excavación. Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

Ingeniero
Residente

03 DE JUNIO DE 2022 (VIERNES)


Condiciones climáticas: Lluvia moderada.

Personal en obra: Residente contratista, Inspector interventoria, residente interventoria, SIO contratista, maestro, ayudantes, oficial.

Maquinaria y/o equipos: Cangui, herramienta menor.

ALCANTARILLADO

Se presenta a continuación esquema de reposición de domiciliario para el tramo comprendido entre el pozo 3 y 4.

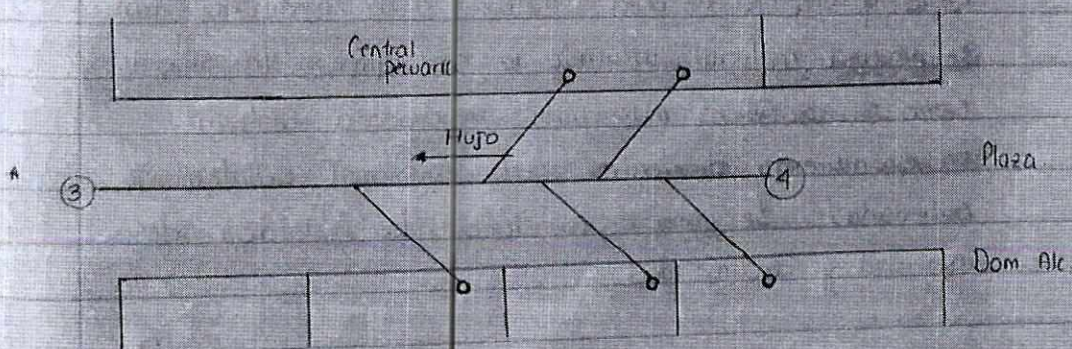

Domiciliares. Se realiza llena con relleno compactado y recuperación de ardenes.

NKA

Red principal. Se realiza instalación de paneles en pozo, retiro de cerramiento, limpieza de obra.
Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

Bautista
Residente Interventor



04 DE JUNIO DE 2022 (SABADO)

Condiciones climáticas favorables

Personal en obra: Residente de obra contratista, inspector interventoría, residente interventoría, maestro, ayudante, 7, oficial

Maquinaria y/o equipos: Cortadora, compresor, rancho, herramienta menor.

ALBUERTO

Se inicia construcción de alcantarilla (Ubicación pozo 1 a 2)

Se realiza cerramiento y señalización, localización y replanteo tanto para red principal como para domiciliarias (identificación de domiciliarias).

Corte, rotura y excavación de pavimento. Se encuentra red de 8".

Retiro y limpieza de obra. Debido a las condiciones climáticas se presenta material saturado lo cual cumplirá las labores y cierre de escombrera municipal, se deposita material en escombreras diferentes a la municipal debidamente certificadas. Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad.

Bautista
Residente Interventor



05 DE JUNIO DE 2022 (DOMINGO)

Condiciones climáticas favorables

Personal en obra: Residente de obra contratista, SSO contratista, residente interventora, inspector de interventora, maestro, ayudantes 7.


Maquinaria y/o equipos: Conguro, herramienta menor.

Acueducto.

Se prosigue con la excavación manual (1.30 m de profundidad), lleno con arena, instalación de tubería de 3" Pvc presión, lleno compacto con recebo. (Red principal).

Domiciliares: Se continúa con excavación manual y corte de andén.

Se presenta a continuación esquema con domiciliares de pozo 1 a pozo 2 (Referenciando con alcantarillado).

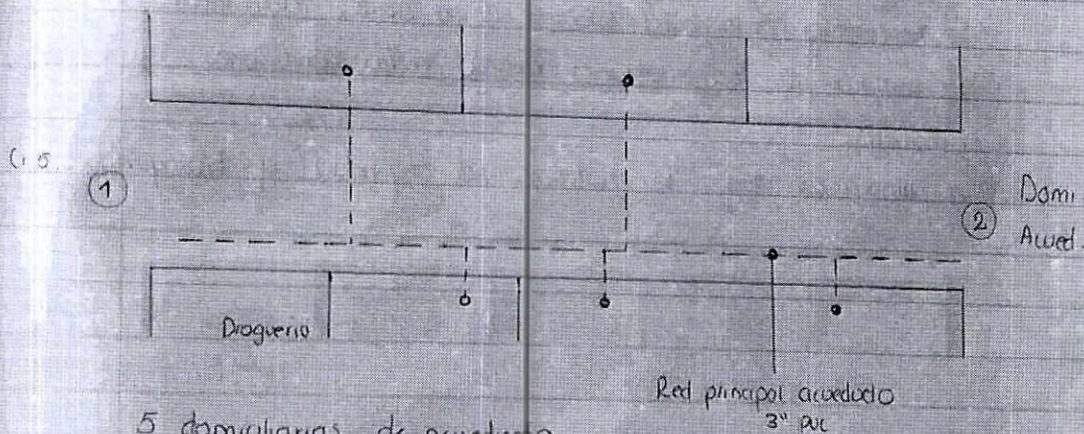

5 domiciliares de acueducto

↳ 3 cortas, 2 largas.

Se realizan todas las protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

Residente Interventora

[Signature]

06 DE JUNIO DE 2022 (LUNES)

Condiciones climáticas: Lluvia moderada.

Personal en obra: Residente de obra contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, maestro, ayudantes y, oficial.

Maquinaria y/o equipos: Canguro, herramienta menor.


ACUEDUCTO:

Red principal: Se continua con la excavación manual, lleno con arena, instalación de tubería de 3" pvc presión, lleno con relleno debidamente compactado.

Domicilarias: Se continua con excavación manual, instalación de collarin pvc 3" a 1/2", instalación de registro de incorporación, PF, llave y manguera. (Se deja manguera en contacto pero sin conexión).

Se hace retiro de material sobrante de la obra, actividad que continua con complicaciones debido a las condiciones climáticas.

Se cumplen con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad


Residente Interventor



07 DE JUNIO DE 2022 (MARTES)

Condiciones climáticas: Lluvia moderada

Personal en obra: Residente de obra contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, maestro, ayudantes y, oficial.

Maquinaria y/o equipos: Canguro, herramienta menor.

ACUEDUCTO:

Red principal: Se continua con excavación manual, lleno con arena, instalación de tubería pvc presión 3", instalación de

collarines de 3" a 1/2", rejilla de incorporación, manguera, PF, llave de paso (Se dejan dentro del contenedor pero no se realiza conexión).

Debido a las condiciones climáticas se trabaja con material saturado y se completa el tema de Retiro de exambro. Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

Luis Quiroz
Residente interventor



08 DE JUNIO DE 2022 (MIÉRCOLES)

Condiciones climáticas: Lluvia moderada.

Se han presentado fuertes lluvias en horas de la noche y madrugada durante el mes lo que ocasiona que el material se sature completamente afectando al desarrollo de actividades en obra.

Personal en obra: Residente de obra contratista, socio contratista, residente interventoria, inspector interventoria, maestro, ayudantes 7. Oficial.

Maquinario y/o equipos: Herramienta menor, Canguro.

AUFDUCTO:

Red principal se finaliza actividad de excavación, lleno con arena, instalación de manguera y debidos accesorios, se realiza lleno con relleno debidamente compactado.

Dornicharias: Se finaliza la excavación, lleno con arena, instalación de manguera y accesorios. Se realiza reparación de andenes en concreto.

Se realiza limpieza y retiro de material sobrante. Se cumplen con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad.

Luis Quiroz
Residente interventor



NKA

09 DE JUNIO DE 2022 (JUEVES)

Condiciones climáticas favorables

Personal en obra: Residente contratista, siso contratista, inspector de interventoría, residente de interventoría, maestro, ayudantes 7, oficial.


Maquinaria y/o equipos: Canguro, Retroexcavadora, Herramienta menor, cortadora, compresor.

ALVEDUCTO

Pozo 1-2: Se realiza retiro de ceramiento.

Pozo 2-3: Se instala cerramiento, se hace marcación, corte y rotura de pavimento en red principal y domiciliarias.

Se comienza con la excavación manual. A continuación se presenta esquema con domiciliarias encontradas para este tramo.

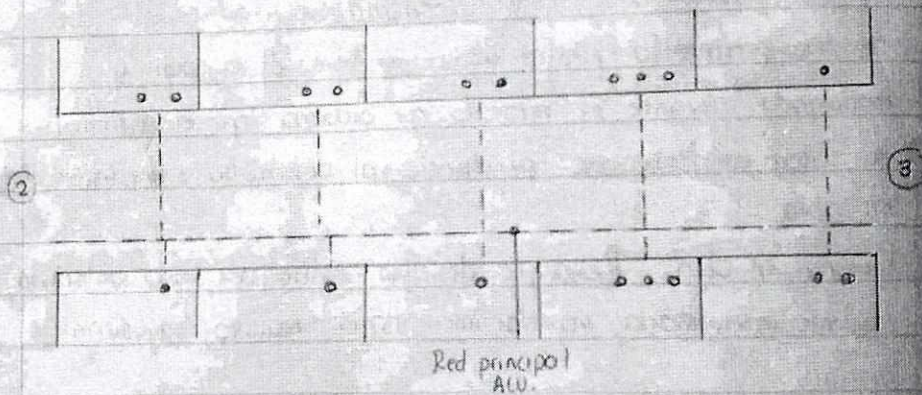

Total Domiciliarias 18

Cortas 8, largas 10

Se realizan todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

Integrante
Residente obra

NKA

10 DE JUNIO DE 2022 (VIERNES)

Condiciones climáticas favorables.

Personal en obra: Residente contratista, siso contratista, inspector interventoria, residente interventoria, maestro, 7 ayudantes, oficial.

Maquinaria y/o equipos: Canguro, contadora, compresor, herramienta menor.

ALUEDUCTO:

Pozo 2-3: Se continuo con excavación manual, lleno con arena, instalación de tubería de 3" PVC presión, lleno con relleno debidamente compactado.

Domiciliaria: Se prosigue con excavación manual.

Se cumple con todos los protocolos de bioseguridad y seguridad en obra.

Pozo 3-4: Se realiza cerramiento parcial en este tramo para inicio de trabajos sobre red principal.

Luis Quijano
Residente antes



11 DE JUNIO DE 2022 (SABADO)

Condiciones climáticas favorables.

Personal en obra: Residente contratista, siso contratista, inspector interventoria, residente interventoria, maestro, oficial, 7 ayudantes.

Maquinaria y/o equipos: Contadora, compresor, canguro, herramienta menor.


ALUEDUCTO:

Pozo 2-3: Se realiza corte sobre andenes, se prosigue con la excavación manual, lleno con arena, instalación de tubería de 3" PVC presión, lleno compacto con relleno.

Domicliarias. Se prosigue con la excavación manual y construcción de domicliarias.

Pozo 3-4. Se realiza marcación, corte y rotura de pavimento, posterior a esto se inicia actividad de excavación manual en el tramo.

A continuación se evidencia ilustración con domicliarias encontradas:

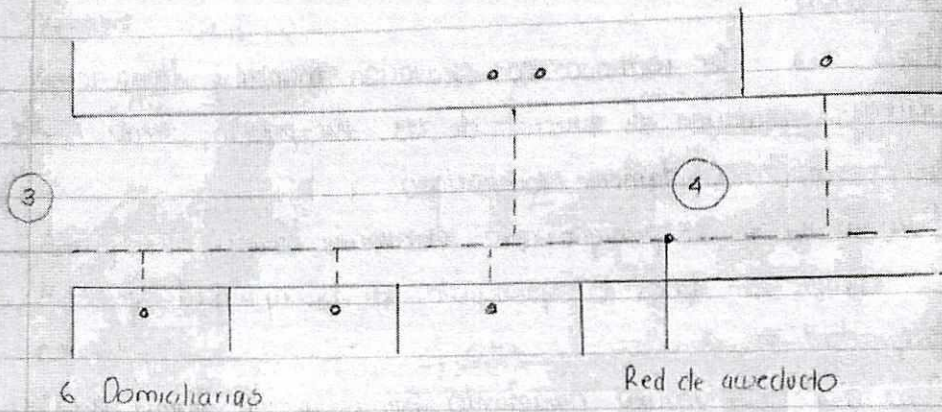

3 largas, 3 cortas

Debido a las fuertes lluvias se prosigue con los problemas de botaderos. Se cumplen con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

Interventor
Residente Interventor

12 DE JUNIO DE 2022 (DOMINGO)

Condiciones climáticas: Lluvia moderada.

Personal en obra: Residente de obra contratista, SMO contratista, residente interventoria, inspector interventoria, maestro, ayudantes 9, oficial.

Maquinaria y/o equipos: Cangullo, herramienta menor

ALCANTARILLADO

Pozo 3-4: Se continua con excavación manual sobre red principal, instalación de cerna en zanja, instalación de tuberío, lleno con recebo debidamente compactado.

Se realiza marcación y cortes sobre andenes.

Pozo 2-3: Se continua con excavación manual para red principal y domiciliarias, instalación de arena, instalación de tubería de 3" pvc presión y construcción de domiciliarias (incluye accesorios).

Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

L. Urbani
Residente Interventor



13 DE JUNIO DE 2022 (LUNES)

Condiciones climáticas: Lluvia moderada.

Personal en obra: Residente de obra contratista, sro contratista, residente interventoria, inspecta interventoria, maestro, ayudantes 7, oficial.

Maquinaria y/o equipos: Canguro, herramienta menor.

Pozo 2-3: Se finaliza la excavación manual de la red principal y domiciliarias. Se finaliza lleno compacto con recebo.


Pozo 3-4: Se continua con excavación manual, se hace cerramiento completo y se marca, corta y demuele pavimento).

Se realiza excavación manual para domiciliarias y finaliza corte sobre anden.

Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad.

L. Urbani
Residente Interventor



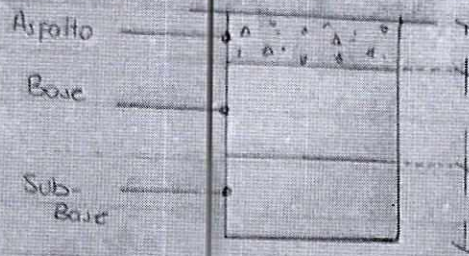

Estructura sumnistrada por interventoria con base en los diseños existentes de infraestructura.

Se realizan todas las protecciones de seguridad y bioseguridad en obra.

Antequiera R
Residente interventoria

15 DE JUNIO DE 2022 (MIÉRCOLES)

Condiciones climáticas favorables

Personal en obra: Residente de obra contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, maestro, ayudantes 7, oficial.

Mquinaria y/o equipos: Carro, herramienta menor.

ALVEDOCTO

Pozo 3-4

Se finalizó con la instalación de la tubería de la red principal, instalación de domiciliarias y demás accesorios. Se realiza lleno compacto con recebo.

Se toman las pruebas de presión respectivas a la red que ya está instalada en su totalidad.

Se realiza limpieza y retiro de material sobrante de la excavación, se continúa con la dificultad de la disposición final de escombros debido al clima.

Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

Indaguija
Residente interventor.

16 DE JUNIO DE 2022 (JUEVES)

condiciones climáticas favorables

Personal en obra: Residente contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, maestro, ayudantes 4, oficial.

Maquinaria y/o equipos: Canguro, retroexcavadora, herramienta menor, vibrocompactador.


ACUEDUCTO

Se realiza recorrido en compañía de la interventoria y el IBAL para definir los accesorios necesarios para realizar empalme.

PAVIMENTACIÓN

Se realiza cercamiento y señalización del tramo que comprende al pozo 1 y 2, se inician actividades de cajeo (según diseño), marcación y corte de pavimento, se retira el material de la excavación, se realiza suministro e instalación de subbase debidamente compactado por capas.

En horas de la noche se realiza empalme, a continuación se presenta esquema con los accesorios instalados: (acueducto).

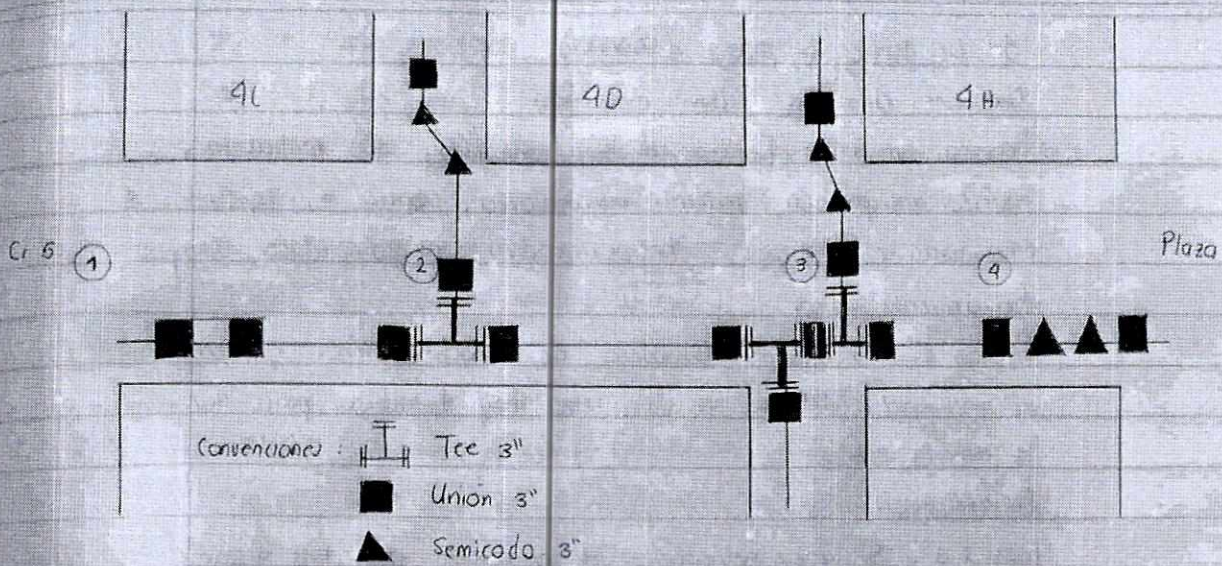

Intervención
Resolución Intervención

[Signature]

17 DE JUNIO DE 2022 (VIERNES)

Condiciones climáticas: favorables

Personal en obra: Residente contratista, síndico contratista, residente interventoria, inspector interventoria, maestro, ayudantes 4, oficial.

Maquinaria y/o equipos: Canguro, retroexcavadora, vibracom-pactador, herramienta menor.

ALVEDUCTO

Se realiza revisión de arden se hace revisión corroborando que no hay fugas

PAVIMENTACIÓN.

Se prosigue en tramo 1-2 (pozo), se realiza lleno por capas con sub-base debidamente compactado

Se realizan todos los protocolos de seguridad y bioseguridad

[Signature]

MCB

18 DE JUNIO DE 2022 (SABADO)

Condiciones climáticas: Lluvia moderada

Personal en obra: Residente de obra contratista, sus contratista,
inspector interventora, residente interventora, oficial 1, ayudantes 4

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora, vibracompactor, conguo,
herramienta menor.

Debido a las condiciones climáticas de la noche anterior y parte de
la madrugada del día en curso no hay botaderos para depositar
la materia sobrante.

PAVIMENTACIÓN:

Pozo 2-3: Se inician actividades de excavación para este segundo
tramo debido a que el cajeo se hace solo en las líneas de redes
principales y domiciliarias intervenidas por lo cual el material
sobrante sera menor.

Después de realizado el cajeo se procede a realizar lleno,
para agilizar el tema y garantizar a los propietarios de los
locales que la calle no quedara cerrada se llenan capas debidamente
compactadas solo con base.

Se realiza acopio de material sobrante debidamente señalizado.

Se cumplen con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad
en obra.




19 DE JUNIO DE 2022 (DOMINGO)

Condición climáticas: Lluvia moderada.

Debido a condiciones climáticas no se labora.





26 DE JUNIO DE 2022 (DOMINGO)

Día no laborable.

Wf

Dup

27 DE JUNIO DE 2022 (LUNES)

Día festivo, no laborable.

ant.

Dup

28 DE JUNIO DE 2022 (MARTES)

Condiciones climáticas favorables.

Personal en obra: Residente contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, oficial, ayudantes 3.

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora, motoniveladora, vibrocompactador, terramanta menor.

Pavimentación:

Tramo 3 (Pozo 3-4). Se realiza cerramiento y señalización, se inician actividades de cajeo y retiro de material.

Tramo 1 (Pozo 1-2). Se realiza extendida, nivelación y compactación de base.

Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad.

Wf

Dup

29 DE JUNIO DE 2022 (MIÉRCOLES)

Condiciones climáticas: Lluvia moderada

Personal en obra: Residente contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, oficial, 2 ayudantes.

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora, motoniveladora, vibrocompactador, terramanta menor.

Pavimentación

Tramo 1 (Pozo 1-2): Se continua con el suministro, extendida, nivelación y compactación de base.

Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

by



30 DE JUNIO DE 2022 (JUEVES)

Condiciones climáticas favorables

Personal en obra: Residente contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, oficial, ayudantes

2.

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora, motoniveladora, vibrocompactador, herramienta menor.

PAVIMENTACIÓN.

Tramo 3 (Pozo 3-4): Se continua con el rajo y retiro de material, aparece tubería superficial de 3" eléctrica (Frente a central pecuaria).

Tramo 1 (Pozo 1-2): Se prosigue con la extendida, nivelación y compactación de base.

Se cumple con todos los temas de seguridad en obra.

by Se encontro tubería de Movistar muy superficial se le solicito a los de Central Pecuaria profundizar tubería manifestaron haberse comunicado con oficina de Movistar.

by



01 DE JULIO DE 2022 (VIERNES)

Condiciones climáticas: favorables

Personal en obra: Residente contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, oficial, ayudantes

2.

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora, motoniveladora, vibrocompactador, herramienta menor.

NKB

ALVEDUCTO:


Se inician actividades de alveducto, a continuación se presenta esquema con domiciliarias encontradas:



CII 40-G.3

3°

Red aaved.



Total domiciliarias: 26

Domiciliarias cortas: 13

Domiciliarias largas: 13

Se inicia con marcación y corte de pavimento rígido, tanto para domiciliarias como para red principal, se prosigue con la rotura de pavimento.

Se cumple con todos los protocolos de bioseguridad y seguridad en obra.

✓

[Firma]

01 DE JUNIO DE 2022 (MIÉRCOLES)

Condiciones climáticas: Lluvia moderada

Personal en obra: Residente de obra contratista, sus contratista, residente interventoria, inspector interventoria, maestro, oficial, ayudantes 7.

Maquinaria y/o equipos: Compresor, herramienta menor, Cangui.

ALVEDUCTO:

Se prosigue con la rotura de pavimento rígido. Se inician actividades de escaración manual tanto para red principal como para domiciliarias.

Se cumple con todos los protocolos de bioseguridad y seguridad en obra.

[Signature]

02 DE JUNIO DE 2022 (JUEVES)

Condiciones climáticas: favorables.

Personal en obra: Residente contratista, siso contratista, residente interventoría, inspector interventoría, maestro, oficial, ayudantes 7.

Maquinaria y/o equipos: Herramienta menor, rancho.

Acueducto: Se prosigue con actividad de excavación manual, lleno con arena, instalación de tubería de 6" pvc presión, lleno con arena, lleno con relleno debidamente compactado.

Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

[Signature]

[Signature]

03 DE JUNIO DE 2022 (VIERNES)

Condiciones climáticas: Lluvia moderada.

Personal en obra: Residente contratista, siso contratista, residente interventoría, inspector interventoría, maestro, oficial, ayudantes 7.

Maquinaria y/o equipos: Herramienta menor, rancho.

Acueducto: Se prosigue con actividad de excavación manual, lleno con arena, instalación de tubería de 6" pvc presión, instalación de collarín y accesorios (collarín no se perfora), lleno con relleno debidamente compactado.

Se realiza limpieza y retiro de material sobrante.

NKEB

esta actividad se ha realizado con dificultad debido a que por las condiciones climáticas las escombreras no se encuentran en funcionamiento.
Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

ad

ad

04 DE JUNIO DE 2022 (JABADO)

Condiuones climaticas favorables.

Personal en obra: Residente contratista, sus contratista, residente interventora, inspector interventora, maestro, oficial, ayudantes ?

Maquinaria y/o equipos: Herramiento menor, paquero.

Se prosigue con la actividad de excavación manual tanto para la red principal como para domiciliarios.

Red principal: Instalación de tubería de 6" PVC presión, lleno con arena, instalación de collarín de 6" a 1/2" y demás accesorios (llave de paso, registro de incorporación, instalación de manguera PT). Se deja manguera en contador sin conexión.

Se realizan todos los protocolos de seguridad y bioseguridad.

ad

ad

05 DE JUNIO DE 2022 (DOMINGO)

Día no laboral.

ad

ad

06 DE JUNIO DE 2022 (LUNES)

Condiciones climáticas: Lluvia moderada.

Personal en obra: Residente de obra contratista, SISO contratista, residente interventoria, inspector interventoria, maestro, oficial, ayudantes 7.

Maquinaria y/o equipos: Herramienta menor, canguro.

ALVEDUCTO

Red principal: Se continua con la excavación manual, lleno con arena, instalación de tubería de 6" PVC presión, instalación de collarines de 6" a 1/2", lleno compacto con rezebo.

Domiciliares: Se prosigue con excavación manual, instalación de manguera pp y demás accesorio, lleno con rezebo debidamente compactado. En la casa con dirección 39A-15 existe caja sin contador por lo cual no se instala domiciliaria (Punto sin uso).

Debido a las condiciones climáticas existentes se ha dificultado el retiro de escombros de la obra.

Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

[Firma]

[Firma]

07 DE JUNIO DE 2022 (MARTES)

Condiciones climáticas: Lluvia moderada.

Personal en obra: Residente de obra contratista, SISO contratista, residente interventoria, inspector interventoria, maestro, oficial, ayudantes 7.

Maquinaria y/o equipos: Herramienta menor, canguro.

ALVEDUCTO

Red principal: Se prosigue con la excavación manual, acorreo interno en obra para acopio de material procedente de la excavación, lleno con arena, instalación de tubería de 6" PVC presión, lleno compacto con rezebo.

Domiciliares: Se prosigue con la excavación manual, lleno

NKB

con arena, instalación de manguera pf 112", lleno con rebo debidamente compactado.

Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

08 De JUNIO De 2022 (MIÉRCOLES)

Condiciones climáticas: Lluvia moderada.

Personal en obra: Residente contratista, SISO contratista, residente interventora, inspector interventora, maestro, oficiales, ayudantes γ .

Maquinaria y/o equipos: Herramienta menor, canguro.

Red principal: Se finaliza actividad de excavación manual, se prosigue con el lleno compacto con rebo. Se realiza acanto interno en obra con material proveniente de la excavación.

Domiciliarias: Se continua la excavación manual, instalación de manguera pf 112", lleno con arena, lleno compacto con material (Recebo).

Se realiza limpieza y retiro de material de obra.

Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

09 De JUNIO De 2022 (JUEVES)

Condiciones climáticas favorables

Personal en obra: Residente de obra contratista, SISO contratista, residente interventora, inspector interventora, maestro, ayudantes γ , oficial.

Maquinaria y/o equipos: Herramienta menor, canguro.

ACUEDUCTO

Se prosigue con el lleno compacto de recabo en la red principal.

Domiciliarias: Excavación manual, retiro de escombros y arqueo del mismo por medio de arqueo interno, lleno con arena, instalación de Manguera P.F. 1/2" y demás accesorios.

Se realiza limpieza y retiro de escombros.

Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

cul

10 DE JUNIO DE 2022 (VIERNES)

Condiciones climáticas: favorables.

Personal en obra: Residente de obra, siso contratista, residente interventoria, Inspector interventoria, maestro, oficial, ayudantes 7.

Maquinaria y/o equipos: Herramienta menor, canguro.

ALVEDUCTO

Se finaliza actividad de excavación manual para domiciliarias.

Se prosigue con el lleno compacto con recabo.

Limpieza y retiro de escombros. Se realizan todos los protocolos de seguridad.

cul

11 DE JUNIO DE 2022 (SABADO)

Condiciones climáticas favorables.

Personal en obra: Residente contratista, siso contratista, residente interventoria, Inspector interventoria, maestro, oficial, ayudantes 7.

Maquinaria y/o equipos: Herramienta menor, canguro.

ALVEDUCTO.

Se prosigue con el lleno compacto con recebo.
Se realizan todas los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

WJ

Duf

12 DE JUNIO DE 2022 (DOMINGO)

Día no laborable.

Duf

13 DE JUNIO DE 2022 (LUNES)

Condiciones climáticas: Lluvia moderada

Personal en obra: Residente de obra, siso contratista, inspector interventoria, residente interventoria, maestro, ayudantes 7: oficial.

Maquinaria y/o equipos: Herramienta menor, canguro, equipo para prueba de presión.

ACUEDUCTO.

Se realiza instalación de 3 collarines, se soldan 2 tapones a cada lado de tubo y se llena con agua. Se realiza prueba de presión.

Se finaliza actividades en el tramo. A la espera de empalme.

Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad.

WJ

Duf

18 DE JUNIO DE 2022 (SABADO)

Debido a que no se han realizado más actividades, en el tramo, la comunidad presenta molestias por los cerramientos que se dejaron a cada lado de la red (Esquinas en las cuales se realizaría el empalme), retirándolos y dejando expuesta la zanja. Se realiza por parte del contratista el llenado de dichos tramos para evitar riesgos de accidentalidad.

Inf.

Inf.

20 DE JUNIO DE 2022 (LUNES)


Condiciones climáticas: Lluvia moderada.

Personal en obra: Residente contratista, suso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, maestro, oficial, ayudantes 4.

Maquinaria y/o equipos: Herramienta menor, conguero.

Se realiza excavación para empalmes. A continuación

se presenta esquema:

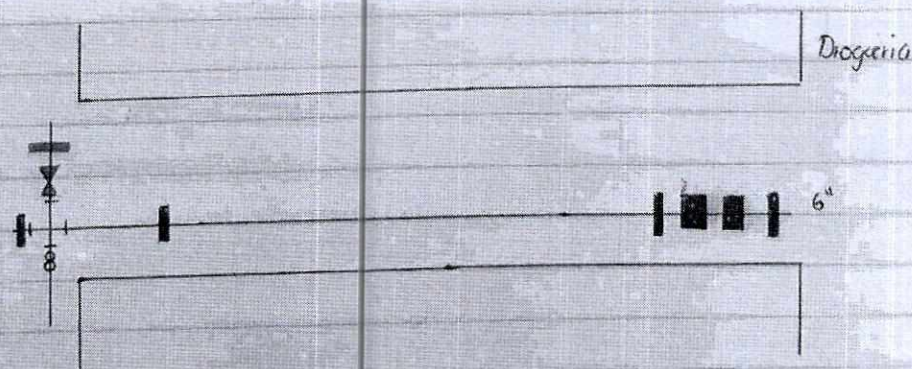

Convenciones

+	Cruz 6" a 4"	1
—	Unión 6"	1
⋈	Reducción de 4" a 3"	1
—	Unión 3"	1
∞	Unión pesante 4"	1
■	Semicodo por 6"	2

Cantidad

1
1
1
1
1
2

NKA

Se realiza lleno compacto con recibo y recuperación de andenes, así mismo se realizan conexiones de todas las domiciliarias dejando a los usuarios utilizando la red nueva. Se realizan todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Tramo 1 (Pozo 1-2): Se continua con el suministro, extendida, nivelación y compactación de base.
Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

laf

30 DE JUNIO DE 2022 (JUEVES)

Condiciones climáticas favorables

Personal en obra: Residente contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, oficial, ayudantes

2.

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora, motoniveladora, vibracompactor, herramienta menor.

PAVIMENTACIÓN.

Tramo 3 (Pozo 3-4): Se continua con el cojeo y retiro de material, aparece tubería superficial de 3" eléctrica (frente a central pecuaria).

Tramo 1 (Pozo 1-2): Se prosigue con la extendida, nivelación y compactación de base

Se cumple con todos los temas de seguridad en obra.

laf Se encontró tubería de 110v en muy superficial se le solicitó a los de Central Pecuaria profundizar tubería manifestando haberse comunicado con oficina de mantenimiento.

laf

01 DE JULIO DE 2022 (VIERNES)

Condiciones climáticas: favorables

Personal en obra: Residente contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, oficial, ayudantes

2.

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora, motoniveladora, vibracompactor, herramienta menor.

NCA

Tramo 1. Se finaliza la extendida, nivelación y compactación con base, se abre calle para dar paso vehicular.

Tramo 3. Se prosigue con cajeo.

Se cumplen con todos los protocolos de seguridad.

Debido a la vibración al momento de la compactación se genera daño en tubería antigua de alcantarillado 3". Se informa al IBAI y se realiza la debida reparación haciendo uso de dos uniones de 3" y 1.5 m de tubo Pvc presión de 3".

Inf.

Inf.

02 DE JULIO DE 2022 (SABADO)

Condiciones climáticas favorables.

Personal en obra: Residente contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, oficial, ayudantes 3.

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora, canguro, motoniveladora, vibracompactor, herramienta menor.

PAVIMENTACIÓN

Tramo 3. Se realiza extendida y compactación de sub-base.

Se cumple con todos los protocolos de seguridad en obra.

Inf.

Inf.

03 DE JULIO DE 2022 (DOMINGO) Suspendido

Día no laboral.

Inf.

Inf.

04 DE JULIO DE 2022 (LUNES) Suspendido

Día no laboral

Inf.

Inf.

05 DE JULIO DE 2022 (MARTES)

Condiciones climáticas favorables. Soleado

Personal en obra: Residente contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, oficial, ayudantes 3.

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora, carguro, motoniveladora, vibractor, herramienta menor.

PAVIMENTACIÓN

Tramo 3: Se prosigue con extendido, nivelación y compactación de subbase.

Se finalizo el rajeo del tramo dejando acceso provisionales y debidamente señalizados para dar paso vehicular a callejón.

Se cumple con todos los protocolos de seguridad en obra. Se encontro tubería de cemento la cual se demuele.

Inf.

Inf.

06 DE JULIO DE 2022 (MIÉRCOLES)

Soleado

Condiciones climáticas: Favorables

Personal en obra: Residente contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, oficial, ayudantes 3.

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora, carguro, motoniveladora, vibractor, herramienta menor.

PAVIMENTACIÓN

Tramo 3: Se finalizo la extendido, nivelación y compactación de subbase, se trae carrotanque con agua para humedecer el material.

Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad

Inf. Residente anterior

Inf.

NKA

09 DE JULIO DE 2022 (JUEVES)

Condiciones climáticas favorables

Personal en obra: Residente contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, oficial, ayudantes 3.

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora, cangui, motoniveladora, vibrocompactador, herramienta menor.

PAVIMENTACIÓN

Tramo 3: Se inicia extendida, nivelación y compactación de base.

Se cumple con todos los protocolos de seguridad.

Andrés Quiroz
Residente Interventoria

08 DE JULIO DE 2022 (VIERNES)

Condiciones climáticas favorables

Personal en obra: Residente contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, oficial, ayudantes 3.

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora, cangui, motoniveladora, vibrocompactador, herramienta menor.

PAVIMENTACIÓN

Tramo 3: Se prosigue con el suministro, extendida, nivelación y compactación de base.

Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad.

Andrés Quiroz
Residente Interventoria

09 DE JULIO DE 2022 (SABADO)

Condiciones climaticas favorables

Personal en obra: Residente contratista, siso contratista,
residente interventoria, inspector interventoria, oficial,
ayudantes 3.

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora, motoniveladora,
herramienta menor, vibrocompactador, conguero.

PAVIMENTACIÓN

Después de realizar recorrido en compañía de interventoria
se decide para el tramo 2 realizar la demolición de
pavimento existente en un tramo del mismo (5,3 m
al finalizar la calle hacia la plaza), decisión que se
tomo debido al estado del pavimento existente.

El contratista procederá entonces a realizar el cajeo
y respectivo lleno compacto del tramo.

Tramo 3: Se finaliza lleno compacto con recebo, se
hace chequeo de niveles.

Se cumple con todos los protocolos de seguridad.

Antiquia
Residente obra



10 DE JULIO DE 2022 (DOMINGO)

Día No laborable.



11 DE JULIO DE 2022 (LUNES)

Condiciones climaticas favorables.

Personal en obra: Residente contratista, siso contratista,
residente interventoria, inspector interventoria, oficial,
ayudantes 3.

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora, conguero,

NKB

motoniveladora, vibrocompactador, herramienta menor.

PAVIMENTACIÓN

Se realiza toma de densidades a los 3 tramos, el resultado arroja densidades por encima del 99% en todos los puntos.

Se realiza cajes de tramo extra, se realiza nivelación y compactación del mismo, se hace lleno con sub-base.

Se cumple con todos los protocolos de seguridad.

Andrés Quijón

Residente intervent

(Dij)

12 DE JULIO DE 2022 (MARTES)

Condiciones climáticas favorables.

Personal en obra: Residente contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, oficial, ayudantes 2.

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora, motoniveladora, vibrocompactador, canguro.

PAVIMENTACIÓN

Se realiza lleno compacto con base en el tramo faltante.

Se cumple con todos los protocolos de seguridad.

Andrés Quijón

Residente intervent

(Dij)

13 DE JULIO DE 2022 (MIÉRCOLES)

Condiciones climáticas favorables

Personal en obra: Residente contratista, siso

contratista, residente interventoria, inspector interventoria, ayudantes 2.

Maquinaria y/o equipos: Vibrocompactador, herramienta menor.

PAVIMENTACIÓN

Se realiza compactación a todo el tramo 1 y 3.

Tramo 2: Se aplica asfalto de 10 cm de espesor sobre la espina de peacado (Red principal de cuervo, alcantarillado y domiciliarias). Antes de este proceso se realizó limpieza de tramo y barrida del mismo además de imprimación, según lo aprobado por interventoría.

Se cumple con todos los protocolos de seguridad.

Antequiera
Residente interventoría

14 DE JULIO DE 2022 (JUEVES)

Condiciones climáticas: favorables

Personal en obra: Residente contratista, seis contratista, residente interventoría, inspector interventoría, ayudantes 2.

Maquinaria y/o equipos: Asfáltadora, vibracompactador de rodillo y llanta, herramienta menor.

Pavimentación

Tramo 1, 2 y 3: Se realiza imprimación

Se realiza pavimentación de los tres tramos con un ancho de 5 m, para el primero de ellos se hace con espesor de 0.10 m, el segundo con $e = 0.05$ m (Recarpeteo).

y el tercero de 0.10 m. Entre el tramo 1 y 2 es necesario realizar transición de 2 cm de espesor para aliviar diferencia de altura entre ellos. Lo mencionado anteriormente se realiza con aprobación de interventoría.

Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad.

Antequiera
Residente interventoría

15 DE JULIO DE 2022 (VIERNES)

Condiciones climáticas favorables

Personal en obra: Residente contratista, seis contratista, residente interventoría, inspector interventoría, ayudantes 2.

Maquinaria y/o equipos: Asfáltadora, vibracompactador de

rodillo y llanta, herramienta menor.

Se finaliza actividad de pavimentación en los 3 tramos designados, en el proceso se chequean niveles, espesores y demás condiciones necesarias para cumplir con lo propuesto.

Se cumplen con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad.

Se realiza instalación de zanja del costado izquierdo, se verifican niveles de las tapas de las 4 pozos.

Visita y recorrido por parte de gerencia del IBAI.


Se hace traspaso de fijo derecha de la 4ª.

Debido a las actividades realizadas se cuencian 2 puntos de los ancleros los cuales se repararan.

se termina de pavimentar a las 4:24 y pasa compactador de llanta a lo largo de la vía.


Analquis

Dependiente interventoría



REGISTO FOTOGRAFICO

CLL 28 ENTRE 5 Y 4H HIPODROMO

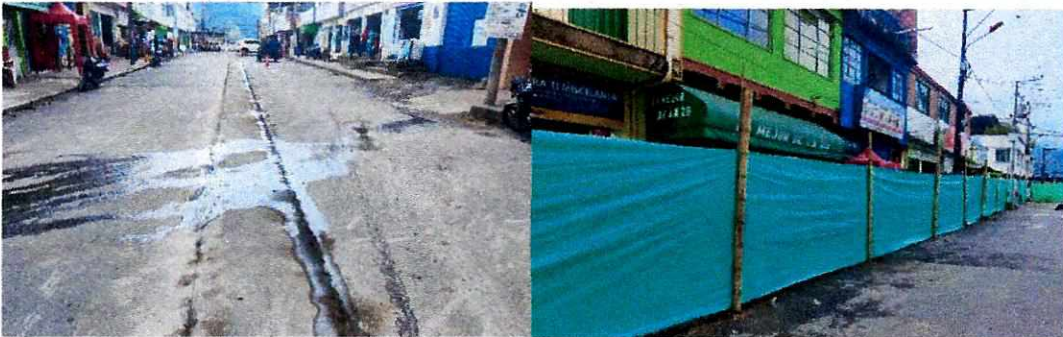

CONSORCIO DISTRITO 4 2021



CONSORCIO DISTRITO 4 2021



CRA 7 ENTRE CLL 39B Y 40 RESTREPO



CONSORCIO DISTRITO 4 2021



CONSORCIO DISTRITO 4 2021



CONSORCIO DISTRITO 4 2021

