


Se da inicio de obra a las 7:00 Am a las Calle.
28 la Granja, donde se continua con la excavacion
de domiciliarias de Acueducto.

Se continua con la instalacion de tuberia de
3", con las capas de arenas de 10 cms y sus
respectivos rellenos con relleno apisonado con
Saltarin.

Retiro de material en valqueta de manera manual
y limpieza de obra.




Kilguy R.
Residente Interventor

MARIA VANNESSA SOTO.
ING RESIDENTE DE OBRA

DIA (53) - 12 - Septiembre - 2021 (DOMINGO)

No se laboro en la calle 28 entre Ambala
y Guabinol la Granja.



Val.

MARIA VANNESSA SOTO.
ING RESIDENTE DE OBRA

DIA (54) - 13 - Septiembre - 2021 (LUNES)

DIA. SOLTADO.

Herramienta y Equipos: Herramienta Menor.
Saltarin.
Pulidora.

Personal: Supervisor (1)
Res. Interventora (1) 360 (1)
Res. Obra (1) Obreros (3)
Topografo (1) Maestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja a las 7:00 Am, donde se continua con la excavacion de las domiciliarias de acueducto.

Se realiza Corte en el onden donde se llegan a los contadores de Agua Potable.

Se realiza retiro de material de la excavacion proveniente de la Red de Acueducto.

Se realiza limpieza de obra y señalizacion.



MARIA VANESA SOTO

ING. RESIDENTE DE OBRA

Vulquini
Residente interventoria

DIA (55) - 14 - Septiembre - 2021 (MARTES)

DIA: SOLEADO

Herramienta y Equipos: Herramienta Menor
Saltarin

Personal: Supervisor. (1)
Residente de interventoria (1)
Residente de Obra (1)
Topografo. (1)
Siso. (1)
Obreros (3)
Maestro. (1)

Se da inicio de obra a las 7:00 Am en la calle 28 la Granja, donde se continua con la excavacion de domiciliarias de acueducto.

Se inicia con la instalacion de accesorios para la red de Acueducto.

Se instala la manguera de PF de 1/2 de cada domiciliaria, collornes, registro, llaves de Poso. Adaptadores Macho.

A las Acometidas de Acueducto. se les instala cama de arena de espesor de 10 cms. Se realiza retiro de escombros en volqueta de manera manual.

MARIA VANNESSA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA

Mulquiján
Residente Interventor

DIA (SE) - 15 - Septiembre - 2021 (MIÉRCOLES)

DIA: SOLEADO.

Herramienta y Equipos: Salfarin.

Pulidora.

Herramienta menor.

Personal: Supervisor. (1)

Res. Interventoria (1)

Res de obra (1)

Topografo (1)

SISO. (1)

Moestro (1)

Obreros (3).

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja a las 7:00 Am, donde se continua con la excavacion de domiciliarias de acueducto, instalacion de accesorios. Instalacion de cama de arena de 10 cms.

Retiro de escombros con volqueta de manera manual y limpieza de la obra, Señalización de los aperturas de andén con cinta Peligro.

MARIA VANNESSA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA.

Mulquiján
Residente Interventor

DIA (57) - 16 - Septiembre - 2021 (JUEVES)

DIA: SOLEADO

Herramienta y Equipos: Saltarin.

Pulidora.

Herramienta Menor.

Personal: Supervisor (1)

Res. Interventora (1)

Res. Obra (1)

Topografo (1)

Siso. (1)

Maestro (1)

Obreros. (3).

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja a las 7.00 Am, donde se continua con la excavacion de las domiciliarias de las Acometidas de acueducto. Se realizo retiro de escombros en volqueta de manera manual.

Se realiza instalacion de Manguera PE de 1/2", con su respectiva cama de arena de 10 cms, y su relleno de recebo con compactacion con capas de 20 cms apisonado en saltarin.



MARIA VANESA SOTO.
ING. RESIDENTE DE OBRA

Vulquiza R.
Residente de Intervento

DIA (58) - 17 - Septiembre - 2021 (VIERNES)

DIA: SOLEADO

Herramienta y Equipos: Saltarin.

Pulidora.


Herramienta Menor

Personal: Supervisora (1)
 Residente de Obra (1)
 Residente de Interventoria (1)
 Topografo (1)
 Siso (1)
 Obreros (3)
 Maestro (1)
 Señalización (3).

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja a las 7:00 Am, donde se continua con el relleno de ~~escombros~~ relleno para la compactacion con espesor de cada capa de 20 cms.

Se realiza la Prueba Hidrostatica donde inicia a las 5:00 Pm, donde se inician Pruebas con 65 LPS el cual se sostuvo, las 2 horas correspondiente y no se obtuvieron Perdidas, la Prueba cumplio Satisfactoriamente.

Se realiza retiro de escombros en volqueta de manera manual y limpieza en la obra.



MARIA VANNEZA SOTO
 ING. RESIDENTE DE OBRA

Vallqui
 Residente de Interventoria

DIA (59) - 18 - Septiembre - 2021 (SABADO)

DIA: SOLEADO.

Herramienta y Equipos: Saltarin. ; Señalización (2)
 Herramientary Equipos.

Personal: Supervisor (1)
 Res. Interventoria (1)
 Res. obra (1) Obreros (3)
 Topografo (1) Maestro (1)
 Siso (1)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja a las 7:00 Am, donde se continua con el relleno de receo con compactacion de 20 cms.

Se realiza Instalacion de manguera de PE 1/2", con sus respectivos accesorios de collarin, registro, llave de Paso, Adaptador macho 1/2", donde esta siendo instalado a la red Principal de Acueducto. Se realiza retiro de material de escombros con manera manual y limpieza de obra.

Se solicita al contratista, empesar a priorizar el lleno de las excavaciones en la Zona de andes Para evitar accidentes de los peatonales. y la

MARIA VANNESSA SOTO

Respectiva Señalización

ING RESIDENTE DE OBRA

Ingluzin
Residente Interventor

DIA (50) - 19 - Septiembre - 2021 (DOMINGO)

No se labora en la calle 28 la Granja entre ambala y Goabinal.

MARIA VANNESSA SOTO

ING RESIDENTE DE OBRA

Ingluzin

Residente Interventor

DIA (61) - 20 - Septiembre - 2021 (LUNES)

DIA: SOLEADO

Herramienta y Equipo: Herramienta Menor.
Saltarin

Personal: Supervisor (1)

Res. Interventoria (1)

Siso. (1)

Res. Obra (1)

Obremos (3)


Topografo. (1)

Maestro. (1)

Se da inicio de obra en la calle 28 en la Granja a las 7:00 Am, donde se continua con el relleno de recebo compactado con espesor de 20 cms, Apisonado con saltarin.

Se esta realizando el relleno sobre los andenes los cuales fueron cortados con Pulidora para la instalacion de los accesorios de la manguera PF 1/2 de Agua Potable.

Retiro de material de escombros de manera manual Limpieza en la obra.



#6

MARIA VANNEZA SOTO.
ING. RESIDENTE DE OBRA.

[Handwritten signature]
Residente Intervent

DIA (62) - 21 - Septiembre - 2021 (MARTES)

DIA: (CULIOSO)


Herramienta y Equipos: Saltarin.
Pulidora.

Herramienta Menor.

Personal: Supervisor (1) SISO (1)
Res. Interventoria (1) Obreros (3)
Res. obra (1) Maestro (1)
Topografo (1)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja donde se inicia a las 7:00 Am, de manera pausada ya que se presentan lluvias fuertes durante el transcurso del dia.

Se realizan rellenos con recebo compactado con Saltarin de espesor de 20 cms, Retiro de material de escombros a volqueta de manera manual.



#6 MARIA VANNEZA SOTO.
ING. RESIDENTE DE OBRA.

DIA (63) - 22 - Septiembre - 2021 (MIÉRCOLES)

DIA: SOLEADO.

Herramienta y Equipos: Saltarin.

Polidora.

Herramienta Menor.

Personal: Supervisor (1)

Residente de Interventor (1)

Residente de Obra (1)

Topografo (1)

SISO (1)

Obreros (3)

Maestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja a las 7:00 Am, donde se continua con la instalacion de Acometidas de Acueducto, Relleno con Recebo con sus respectivas capas de 0.20 cms.

Asi mismo se recibe visita Tecnica del IBAL para revision del empalme, donde nos da a conocer los accesorios que se necesitan para el empalme que se realizara el dia 24-09-2021. Los cuales son los siguientes:

(15) universales de 3"

(3) Tee de 3" en PVC.

(3) Valvulas Sello elastico de 3"

(2) Semicodos de 3" PVC

Asi mismo el Grupo Tecnico del IBAL nos da a conocer que se debe tener listo y la explicacion de como se realizara el empalme.

Se realiza limpieza en la obra en General.



ING. MARIA VANESA SOTO
RESIDENTE DE OBRA

Vulquez
Residente Obra

Día (64) - 23 - Septiembre - 2021 (JUEVES)

DÍA: SOLEADO.

Herramienta y Equipos: Saltarin

Pulidora, Compresor

Motobomba.

Herramienta Menor.

Personal: Supervisor. (1)

Res. Interventoria. (1)

Res. de Obro. (1)

Topografu (1)

Siso (1)

Obreros. (8)

Maestra. (2)


Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja donde se realiza labores a las 7:00 Am, donde se inicia las excavaciones para los respectivos empalmes, donde se esta organizando con compresor las roturas de la Ave. Ambala, Guabinal, entrada intermedia, entrada del conjunto.

Se continua con las excavaciones para realizar el empalme, en los 4 puntos donde se realizara al mismo tiempo.

Se tiene visita antes del empalme por parte del IBAL para la revision de que se cuente con todos los accesorios solicitados y las recomendaciones anteriormente dichas.

Asi mismo se inicia el empalme, de los 4 puntos, al mismo momento, donde se contaba con:

- Accesorios disponibles
- Motobomba
- Carro disponible.
- Personal disponible (2 x Punto)
- Personal del IBAL e interventoria.

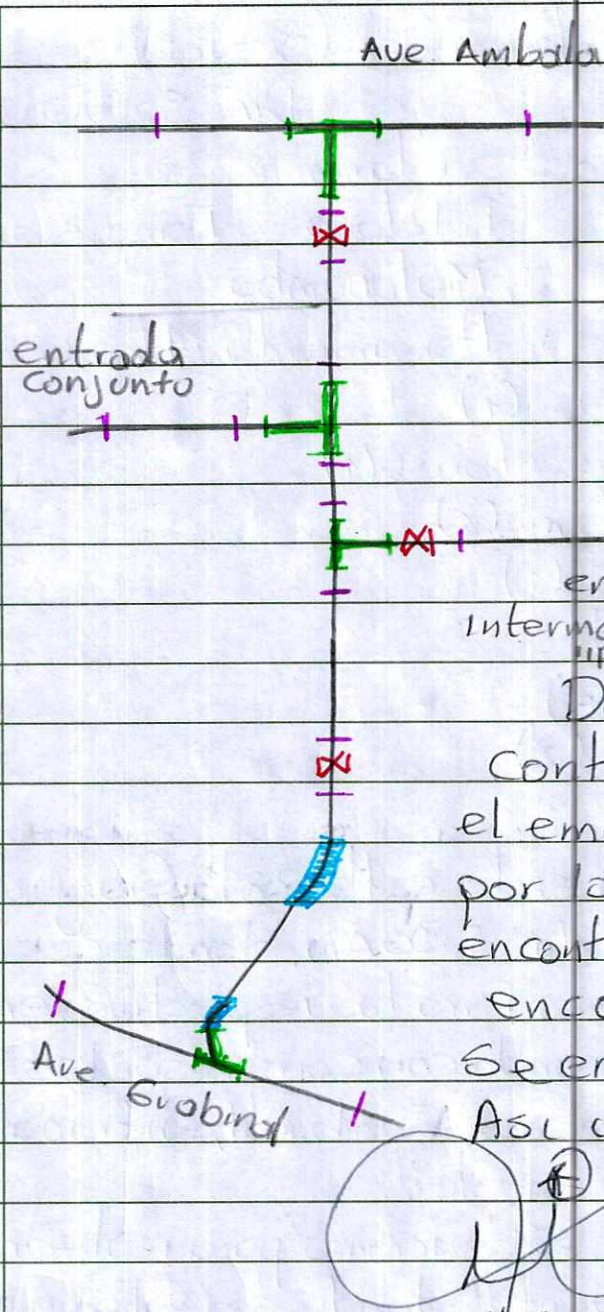

Durante el empalme se utilizaron los sgtes. Accesorios.

⊗ (3) valvulas pello elastico 3"


T (3) Tee 3" PVC

- (15) universales 3"

⤵ (2) Semicodos 3"

entrada intermedio "Policia"

Durante el empalme solo se conto con un retraso debido a que el empalme que se estaba realizando por la Ave. Guobind, la tubería se encontraba en otra dirección, Pero en compañía del IBAI y la interventoria se encontró la solución, logrando así un empalme exitoso.



MARIA VANNESSA SOTO
RESIDENTE DE OBRA

Valquiria
Residente Jorles

DIA (SS) - 24-Septiembre-2021 (VIERNES)

DIA: SOLEADO.

Herramienta y Equipos: Herramienta Menor.

Saltarin.

Pulidora.

Personal: Supervisor. (1)


Res. Interventoria (1) SUSO. (1)

Res. Obra. (1) Obreros (3)

Topografica (1) Maestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja a las 7:00 Am, donde se inicia a rellenas con recebo las excavaciones que se realizaron para los empalmes y se empezaron a conectar las viviendas a la nueva red de Acueducto.

Se retira material de escombros de manera manual. debido a que se encuentra sobre la calle 29 una tee que viene de la Calle 28 de la red Principal de Acueducto se hace necesario instalar una nueva Valvula de Sello elastico sobre la calle 28 la Granja.

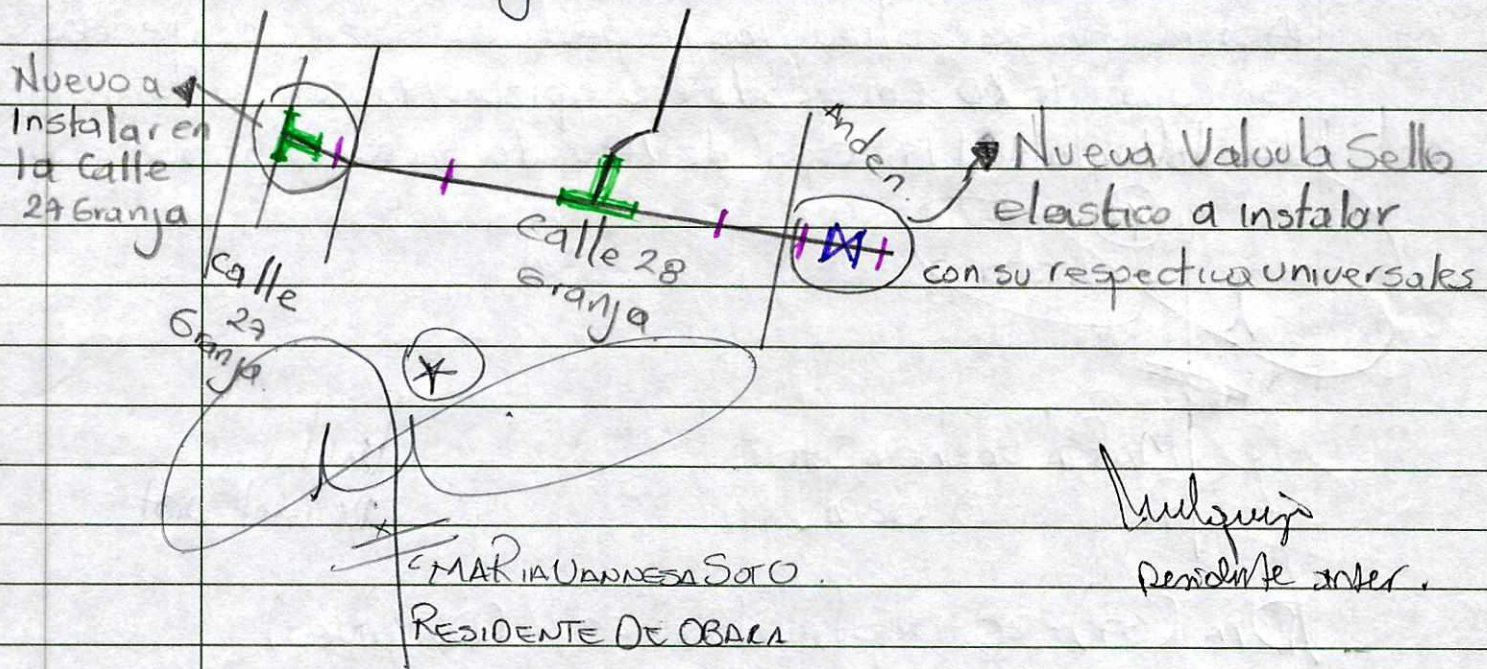

DIA (66) - 25 - Septiembre - 2021 (SABADO)

DIA SOLEADO.


Herramienta y Equipos: Herramienta Menor
Saltarin.

Personal: Supervisor (1)
Res. Interventoria (1)
Res de Obra (1)
Topografia (1)
Siso (1)
Obreros (3)
Maestro (1)

Se da inicio de obra en la Calle 28 la Granja a las 7:00 Am. donde se continua con la Conexion de las viviendas a la red Principal, donde se realiza la Verificacion Correspondiente de que todos los Usuarios queden conectados, esta Supervision se realiza con la Interventoria.

Por otro lado se esta realizando la excavacion para cambiar la tuberia del Sumidero el cual se encuentra en 10", ya que por donde se realizo cambio de la tuberia de la red de acueducto para el empalme se hace necesario su demolicion la cual se encontraba en tuberia de Gres.

Asi mismo se realizan los respectivos rellenos con recebo con capas de 20 cms cada una apisonada con saltarin, tanto en la red Principal de Acueducto como las domiciliarias.




MARIA VANNESA SOTO
RESIDENTE DE OBRA

Int.
residente mt

DIA (67) - 26 - Septiembre - 2021 (DOMINGO)

NO, se realizan labores en la calle 28 entre ambala y Guabinal la Granja.



MARIA VANNESA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA

DIA (68) - 27 Septiembre - 2021 (LUNES)

DIA: SOLEADO

Herramienta y Equipos: Herramienta Menor.

Salfarin

Personal: Supervisor (1)

Res. de Interventoria (1)

Res de Obra (1)

Topografo (1)

SISO (1)


Obreros (3)

Maestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja a las 7:00 Am donde se continua con el arreglo de los andenes, donde en sus respectivas cortes por donde se realizaron las instalaciones de las Acometidas con concreto de 2500 Psi.

Se continua con el relleno de las Acometidas de Acueducto, se realiza la demolición del concreto que protege la tubería del sumidero para respectivo cambio.

Se realiza el retiro de escombros de manera manual.
Se realiza limpieza en la obra de manera General.



~~✗~~

MARIA VANNESSA SOTO

ING. RESIDENTE DE OBRA

Julquije
Residente Interventor

DIA (69) - 28 Septiembre - 2021 (MARTES)

DIA: LLOUVOSO

Herramienta y Equipos: Salfarin


Herramienta Menor.

Personal: Supervisor (1)
 Res. Interventora (1)
 Res. de Obra (1)
 Topógrafo (1)
 Siso. (1)
 Obreros (2)
 Maestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja a las 7:00 Am, donde se realiza la instalación de la tubería de 10" para el sumidero, donde se le instala su coima de Arena de 10 cms, y se realiza su recubrimiento en concreto de 3000 PSI.

Se inicia la excavación para el sardinel el cual se había derrumbado en la excavación de la red Principal de Acueducto.

Se realiza limpieza General en la obra.



MARIA VANESSA SOTO
 ING. RESIDENTE DE OBRA

Vulquiza
 Ing. Residente Intervent

DIA (70) - (29) - Septiembre - 2021 (MIÉRCOLES)

DIA: SOLEADO - LLUVIOSO


Herramienta y Equipos: Saltarin
 Herramienta Menor.

Personal: Residente de Obra (1)
 Res. Interventora (1)
 Supervisor (1)
 Topógrafo (1) Maestro (1)
 Siso. (1)
 Obreros (2)

Se inicia labores en la calle 28 la Granja a las 7:00 Am donde se continua con la excavacion donde se realizara el sardinel.

Se realiza retiro de escombros de manera manual, Se termina con el arreglo de los andenes en concreto de 2500 Psi. No se adelantan muchas labores por la fuertes lluvias que se vienen presentando en la obra.

Se realiza limpieza en la obra en general.



MARIA VANNESSA SOTO.
ING. RESIDENTE DE OBRA.

Amilquis
ING. RESIDENTE DE OBRA

DIA (71) - (30) - Septiembre 2021 (JUEVES)

DIA: SOLEADO.


Herramienta y Equipos: Herramienta Menor
Saltarin.

Personal: Res. de Obra (1)
Res de Intersectorial (1)
Supervisor. (1)
Topografico (1)
Biso (1)
Obreros. (2)
Maestro. (1)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja a las 7:00 Am, donde se inicia la fundida en concreto del sardinel que se habia corrido al frente de las Propiedades ubicadas en la Calle 28 #9-34 y calle 28 #9-24.

Se realiza el relleno de la tubería del Sumidero. la cual se instalo en 10" el cual se recubrio en concreto.

Se realiza retiro de escombros de manera manual y paleros para realizar limpieza en la obra en General.



MARIA VANESSA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA

Vulquini
Ing. Residente Intero.

DIA (72) - 01 - OCTUBRE - 2021 (VIERNES).

DIA: SOLEADO.

Herramienta y equipos: Saltarin.

Herramienta Menor

Personal: Supervisor (1)

Residente de Interventoria (1)

Residente de obra (1)

Topografo (1)

Jiso (1)

Obreros (3)

Maestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja, donde se realiza la reposicion de los Andenes donde se realizaron sus respectivos cortes con concreto de 2500 PSI.

Se realiza el Heno correspondiente en donde se realizaron los empalmes con sus respectivas capas de 20 cms opisonadas con saltarin.

Se realiza nivelacion con recebo sobre la zanja Principal de acueducto.

Se realiza retiro de escombros de manera manual y Limpieza general de la obra



MARIA VANESSA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA

Vulquini
Ing. Residente Intero.

DIA: (73) - 02 - OCTUBRE - 2021 (SABADO)

DIA: SOLEADO

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta Menor.

PERSONAL: Supervisor (1)

Residente de Obra (1)

Residente de Interventoria (1)

Topografo (1)

Siso (1)

Obreros (2)

Maestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja donde se continua con la reposicion donde se realizaron los corte de andén en concreto de 2500 PSI.

Se realiza el retiro de escombros de manera manual, y asi mismo la limpieza general de obra.

$\frac{x}{6}$
 MARIA VANNESA SOTO
 ING. RESIDENTE DE OBRA

Vulquiza

#06. Residente Inter.

DIA (74) - 03 - OCTUBRE - 2021 (DOMINGO)

No se labora en la obra de la calle 28 entre calle Ambala y Eubinal Barro la Granja.

$\frac{x}{6}$
 MARIA VANNESA SOTO
 ING. RESIDENTE DE OBRA

Vulquiza

#06. Residente Inter.

DIA (75) - 04 - OCTUBRE - 2021 (LUNES)

DIA SOLEADO.

Herramienta y equipos: Herramienta Menor

Personal: Supervisor (1)

Res. de Obra (1)

Res de Interventoria (1)

Topografos (1)

SISO (1)


Obreros (2)

Maestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja, donde se instala la valvula de sello elastico de 3" sobre el andén con sus respectiva uniones universales de 3", Asi mismo se realiza su respectivo chicote, para continuamente realizar el lleno con recebo, y continua la instalacion de la tapa valvula, y la reposicion del andén en concreto de 2500 PSI, para dejar por terminado la reposicion de andenes.

Se realizo el lleno correspondiente al empalme por los lados del conjunto con recebo y compactado con saltarin.

Se realiza la limpieza en general de la obra



MARIA VANNESSA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA

Daniel Quijano
SAB. Residente Intervent

DIA (76) - 05 - OCTUBRE - 2021 (MARTES)

DIA: SOLEADO.

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta Menor.

PERSONAL: Supervisor (1)

Res. de Obra (1)

Res. de Interventoria (1).

Topografos. (2)

Siso (1)

Obreros. (3)

Maestro. (1).

Se da inicio de obra en la calle 28 la Granja, donde se terminan las reposiciones de andenes, limpieza general de obra, retiro de escombros, retiro de Polisombra, y se habilita la via para su transitabilidad.

~~6~~
6

ING. VANNESA SOTO.

RESIDENTE DE OBRA.

CONTRATO No 069 DEL 14 DE
MAYO DE 2021.

OBJETO:

Rehabilitación y/o Recuperación y/o Reparación de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendidos para el distrito hidráulico hidrosanitario N. 4 del IBAL SAS ESP oficial en la ciudad de Ibagué.

UBICACIÓN:

Barrio Hipodromo
Acueducto + Alcantarillado
Cl 28 entre 5 y 4 H

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 15
DE 15/05/2015

OBJETO

O presente contrato tem por objeto a locação de um imóvel residencial situado na Rua ... nº ... bairro ... cidade de ... estado de ... para fins de moradia, com prazo de validade de ... meses, a contar da data de assinatura deste instrumento.

PARTE LOCATÁRIA

Nome: ...

CPF: ...

Assinatura: ...

16 DE MAYO DE 2022 LUNES


Condiciones climáticas : Lluvia moderada 08:00 - 08:30

Personal en obra : Residente de obra contratista, siso contratista, topógrafo contratista, residente interventoria, inspector interventoria, maestro, oficial 1, ayudantes 8.


ALCANTARILLADO

Se realizó cerramiento y señalización en el primer tramo.

A continuación se presenta esquema de los tramos a intervenir:

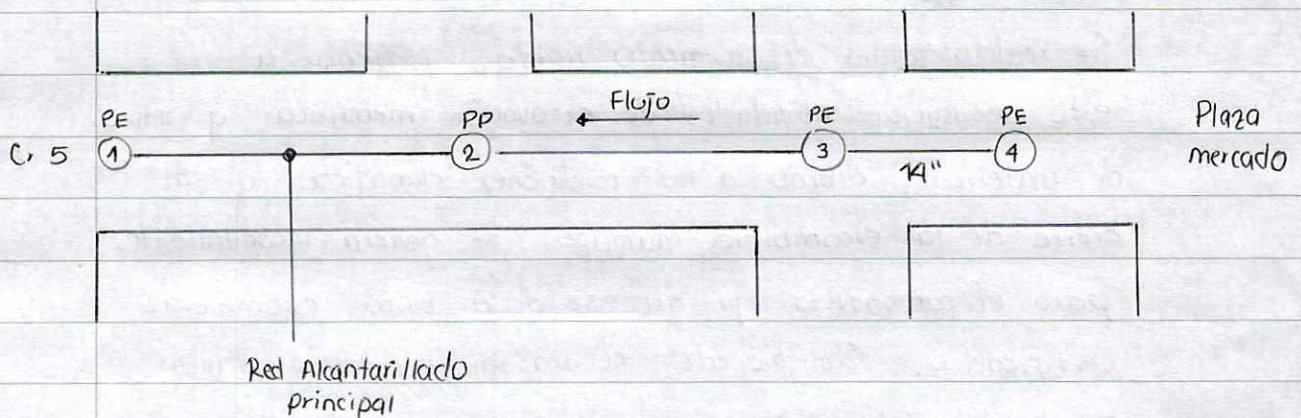

Como se hizo mención anteriormente se realizó cerramiento de pozo existente 1 a pozo proyectado 2, posterior a esto se hizo marcación y corte con cortadora de la red principal y las domiciliarias existentes.

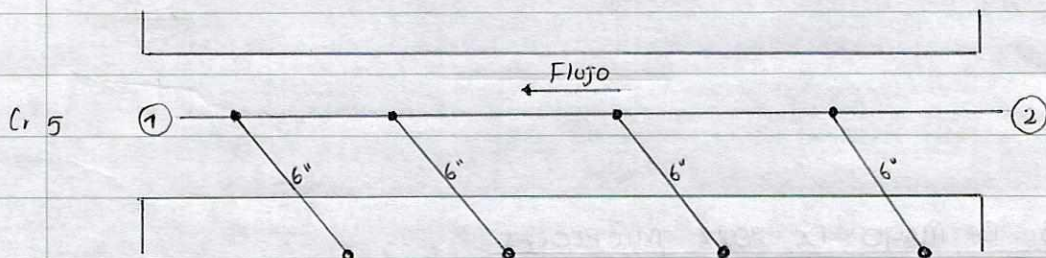

Para este tramo se encontraron 4 domiciliarias de alcantarillado, información que se debe corroborar al momento de realizar la excavación mecánica. (Localización y replanteo).

Se realizan todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

Valderrama R
Residente Interventoria

17 DE MAYO DE 2022 MARTES

Condiciones climáticas: Lluvia intensa 07:00 - 07:30

Lluvia moderada 03:00 - 04:00 pm.

Personal en obra: Residente de obra contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, maestro, oficial 1, ayudantes 8, topografo cont.

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora, compresor, ranuro, herramienta menor.

ALCANTARILLADO.

Se realiza rotura de pavimento rígido, posterior a esto se inician actividades de excavación mecánica y retiro de material, debido a las condiciones climáticas y al cierre de la escombrera municipal se genera inconvenientes para el contratista ya que se deben buscar escombreras certificadas. Se procede a realizar excavación manual en domiciliarias.

Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

Andrés Quijía R.
Residente Intervento



18 DE MAYO DE 2022 MIÉRCOLES

Condiciones climáticas: Lluvia moderada

Personal en obra: Residente de obra, siso contratista, topografo contratista, residente interventoria, topografo interventoria, inspector interventoria, maestro, oficial 1, ayudantes 8.

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora, ranuro, compresor, herramienta menor.

ALCANTARILLADO.

Se finaliza con actividad de rotura de pavimento 110 cm de

espesor).

Se continua con la excavación mecánica sobre la red principal, se construye e instala el entibado, posterior a esto se realiza excavación manual para replanteo, lleno con triturado e instalación de tubería para alcantarillado de 14", lleno compacto con recebo.

Se prosigue con la excavación manual para construcción de domiciliarias. Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

Se presentan dificultades al momento de retirar el material proveniente de excavación debido a que la escombrera municipal se encuentra sin actividad.

Indignación
Residente 2012

19 DE MAYO DE 2022 JUEVES

Condiciones climáticas: Lluvia moderada.

Personal en obra: Residente contratista, suyo contratista, residente interventoria, inspector interventoria, maestro, oficial 1, ayudantes 8.

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora, canguero, compresor, herramienta menor.

ALCANTARILLADO


Se continua con excavación mecánica, construcción de entibado, excavación manual para replanteo, lleno con triturado, instalación de tubería de 14", instalación de silla yee de 14" a 6", lleno compacto con recebo.

Se realiza limpieza y retiro de escombros, dicha actividad se ha complicado debido a que la escombrera municipal no esta en funcionamiento por lo cual fue necesario la búsqueda de escombreras certificadas.

Se cumple con todos los protocolos de seguridad y

bioseguridad

Andrés Quiroz
Residente obra



20 DE MAYO DE 2022 VIERNES

Condiciones climáticas: Lluvia moderada

Personal en obra: Residente de obra contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, maestro, oficial, ayudantes 8.

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora, carguero, herramienta menor.

ALCANTARILLADO

Se finaliza la excavación mecánica perteneciente a la red principal, se construye entibado en la longitud excavada, se realiza lleno con triturado, instalación de tubería de 14", instalación de silla yee de 12" a 6", lleno con reecho debidamente compactado.

Se continúa con la excavación de domiciliarias, lleno con arena, instalación de tubería de 6" (sobre vía). Se realiza rotura y corte de arden y excavación manual, lleno compacto con reecho.

Retiro y limpieza de tramo

Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

Andrés Quiroz
Residente obra



21 DE MAYO DE 2022 SABADO

Condiciones climaticas: Lluvia intenso 07:00 - 07:30 am
Lluvia moderada.

Personal en obra: Residente contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, maestro, ayudantes 8, oficial 2.

Maquinaria y/o equipos: Canguiro, herramienta menor.

ALCANTARILLADO

Se prosigue con el lleno con recebo debidamente compactado sobre red principal. Excavación, lleno con arena e instalación de tubería de 6", lleno con recebo compacto.

Se continua con la demolición de andén y excavación para cajas domiciliarias.

Se realiza limpieza y retiro de material sobrante, actividad que se ha visto dificultosa ya que la escombrera municipal sigue sin funcionamiento.

Se cumplen con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

Belquisa P.
Residente Inter.



22 DE MAYO DE 2022 DOMINGO

Condiciones climaticas Favorables

Personal en obra: Residente contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, maestro, oficial, ayudantes 8.

Maquinaria y/o equipos: Canguiro, herramienta menor, cortadora
ALCANTARILLADO

Domiciliarias: Se realiza fundida de cajas domiciliarias, lleno con arena, instalación de tubería de 6" y lleno compacto con recebo.

Se realiza marcación y cote para posterior construcción de sumideros.

Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

Andrés Quijano
Residente

23 DE MAYO DE 2022 LUNES

Condiciones climáticas favorables.

Personal en obra: Residente contratista, topógrafo contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, maestro, ayudantes 8, oficial.

Maquinaria y/o equipos: Compresor, canchero, herramienta menor.

AICANTARILLADO.

Se realiza rotura de pavimento, excavación manual, lleno con arena, instalación de tubería de 10" para sumideros, lleno compacto con recebo.

Red principal: Debido a las condiciones de la red principal se realiza construcción de pozo 2. (Excavación manual, construcción de cuñeta).

Se prosigue fundiendo cajas domiciliarias y realizando lleno compacto con recebo para domiciliarias.

Debido a las condiciones climáticas existentes se ha trabajado en el transcurso del tramo con material saturado, lo cual ha complicado las actividades, además de esto en la red principal se presentaron derrumbes.

Se cumple con todos los protocolos de seguridad.

24 DE MAYO DE 2022 MARTES

Condiciones climáticas: Lluvia moderada.

Personal en obra: Residente contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, maestro, ayudantes 8, Oficial 1.


Maquinaria y equipos: Canguiro, herramienta menor
ALCANTARILLADO

Se prosigue con la construcción del pozo No. 2, para las domiciliarias se realiza instalación de tapas sobre cajas, lleno con recebo y recuperación de andenes en concreto.

Se termina de realizar lleno con recebo en red principal y sumideros, posterior a esto se retira cerramiento.

Limpieza y retiro de material proveniente de excavación.

Se cumplen con todos los protocolos de seguridad en obra.


Residente obra



24 DE MAYO DE 2022 MIÉRCOLES

Condiciones climáticas: Lluvia moderada

Personal en obra: Residente contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, maestro, ayudantes 8, Oficial 1.

Maquinaria y/o equipos: Canguiro, herramienta menor, retroexcavadora, cortadora, compresor.

ALCANTARILLADO

Se da inicio a actividades correspondientes al tramo comprendido entre el pozo 2 y el pozo 3.

Se realiza cerramiento y señalización, marcación, corte y rotura de pavimento para red principal y domiciliarias, se continúa con excavación mecánica.

Se inician actividades de excavación manual para las domiciliarias,

debido a las condiciones climáticas existentes se trabaja con material saturado.

Se cumplen con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

Amador Quijón
Residente Intel



26 DE MAYO DE 2022 (JUEVES)

Condiciones climáticas favorables

Personal en obra: Residente contratista, topógrafo contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, topógrafo interventoria, maestro, ayudantes 7, oficial 1.

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora, conguo, herramienta menor.

ALCANTARILLADO

Pozo 2-3: Se realiza excavación mecánica sobre red principal, debido a las condiciones climáticas existentes y a las condiciones saturadas del material se generan desplazamientos ocasionando sobreesfuerzos en la red. Se realiza entibado, excavación manual para replanteo, lleno con triturado, instalación de tubería de 14" con sus respectivas silla yee de 14" a 6", lleno con relleno debidamente compactado, se hace limpieza y retiro de escombros o material sobrante de excavación.

Domiciliarias: Se continúa con excavaciones manuales.

Se realizan todos los protocolos de seguridad y bioseguridad.

Amador Quijón
Residente Intel



27 DE MAYO DE 2022 (VIERNES)

Condiciones climáticas: Lluvia moderada.


Personal en obra: Residente contratista; siso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, maestro, ayudantes 7, oficial.

Maquinaria y/o equipos: Canguro, herramienta menor.

ALCANTARILLADO:

Red principal: Se continua con lleno compacto con recebo.

A continuación se presenta esquema de domiciliarias encontradas:

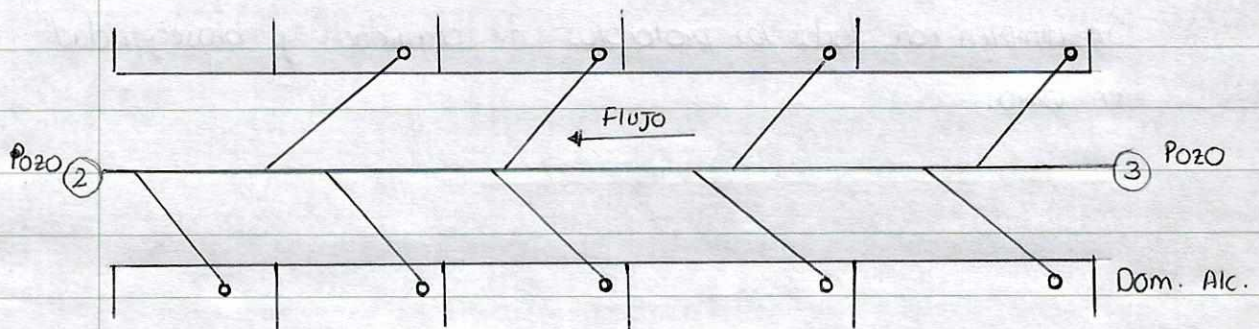

Domiciliarias: Se prioriza con la excavación manual, lleno con arena, instalación de tubería de 6", lleno compacto con recebo. Se realiza fundida de cajas para domiciliarias.

Se realiza limpieza y retiro de material sobrante, esta actividad presenta complicaciones ya que por las condiciones climáticas la escombrera municipal no está en funcionamiento, por lo cual se han buscado nuevas escombreras que se encuentren certificadas y que estén en funcionamiento.

Se cumplen con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad.

Arbuzo
Residente contratista

[Firma]

28 DE MAYO DE 2022 (SABADO)

Condiciones climáticas: Lluvia moderada.

Personal en obra: Residente de obra contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, maestro, 7 ayudantes, oficial.

Maquinaria y/o equipos: Herramienta menor, carquo.

Domiciliarias: Se prosigue con fundida de cajas domiciliarias, lleno compacto con recebo.

Sumidero: Se realiza excavación manual, lleno con arena, instalación de tubería de 90° y lleno debidamente compactado con recebo.

Se cumplen con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

Andrés
Residente
#026



29 DE MAYO DE 2022 (DOMINGO)

Personal en obra: Residente de obra contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, maestro, oficial, ayudantes 7.

Maquinaria y/o equipos: Herramienta menor, carquo.

Domiciliarias: Se realiza lleno con recebo compacto y recuperación de andenes. Limpieza y retiro de material proveniente de excavación. Retiro de cerramiento.

Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad.

Andrés
Residente #026



30 DE MAYO DE 2022 (LUNES)

Personal en obra: Residente de obra contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventorio, maestro, oficial, ayudantes 7.

Maquinaria y/o equipos: Herramienta menor, cortadora, conguero.
Se inician actividades de pozo 3 a pozo 4.

Se realiza cerramiento y señalización, marcación de red principal y domiciliarias, corte.

Se cumplen con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

Condiciones climáticas: Favorables.

Andrés Quiroz
Residente obras



31 DE MAYO DE 2022 (MARTES)

Condiciones climáticas: Lluvia moderada.

Personal de obra: Residente de obra contratista, siso contratista, topógrafo contratista, residente de interventoria, inspector de interventoria, maestro, oficial, ayudantes 7.

Maquinaria y/o equipos: Herramienta menor, conguero, retroexcavadora.
Se inicia actividad de excavación mecánica para red principal, instalación de entibado, excavación manual para replanteo, instalación de tubería de 14" con sus respectivas silla yee de 14" a 6" (antes de esto se realiza atraque de tubería con triturado). Lleno compacto con recebo.

Domiciliarias: Se inician actividades de excavación manual. Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad.

Andrés Quiroz
Residente obras



01 DE JUNIO DE 2022 (MIÉRCOLES)

Condiciones climáticas: Lluvia moderada.

Personal en obra: Residente contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventorio, maestro, ayudantes 7, oficial.

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora, canguio, herramienta menor.

Red principal: Se finaliza excavación mecánica, se realiza entibado, excavación manual para replanteo, lleno con triturado, instalación de tubería de 14" y silla yee de 14" a 6", lleno compacto con recebo.

Domiciliarias: Se continúa con excavación manual, lleno con arena, instalación de tubería de 6", lleno compacto con recebo.

Fundida de cajas de inspección.

Se realiza limpieza y retiro de material de excavación lo cual se ha complicado debido a que la escombrera municipal está cerrada.

Se cumplen con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

*José Joaquín
Fernández*

02 DE JUNIO DE 2022 (JUEVES)

Condiciones climáticas favorables.

Personal en obra: Residente contratista, inspector interventoria, siso contratista, residente interventorio, maestro, ayudantes 7, oficial.

Maquinaria y/o equipos: Canguio, herramienta menor.

ALCANTARILLADO

Red principal: Se realiza demolición de pozo 4

existente debido a las malas condiciones del mismo. Se realiza construcción de pozo nuevo que incluye: construcción de cañuela, cilindro y cono, instalación de pasos y pañete.

Domiciliarias. Se finalizó fundida de cajas domiciliarias.

Se realiza retiro del material proveniente de excavación.

Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

Arce,
Residente

03 DE JUNIO DE 2022 (VIERNES)


Condiciones climáticas: Lluvia moderada.

Personal en obra: Residente contratista, inspector interventoria, residente interventoria, siso contratista, maestro, ayudantes, oficial.

Maquinaria y/o equipos: Canguiro, herramienta menor.

ALCANTARILLADO

Se presenta a continuación esquema de reposición de domiciliarias para el tramo comprendido entre el pozo 3 y 4.

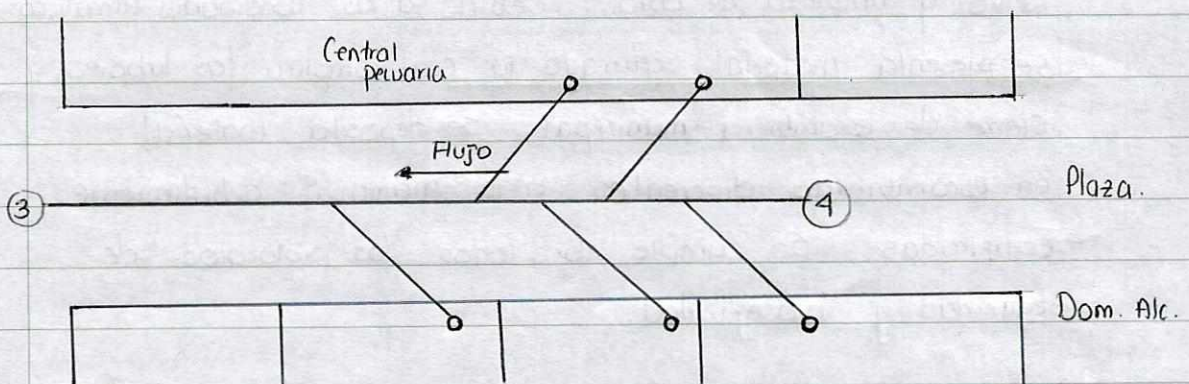

Domiciliarias: Se realiza lleno con relleno compactado y recuperación de andenes.

Red principal: Se realiza instalación de pañete en pozo, retiro de cerramiento, Limpieza de obra.

Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

Luis Quijano
Residente Interventor.



04 DE JUNIO DE 2022 (SABADO)

Condiciones climáticas favorables.

Personal en obra: Residente de obra contratista, inspector interventoría, residente interventoría, maestro, ayudante 7, oficial.

Maquinaria y/o equipos: Cortadora, compresor, ranquero, herramienta menor.

ACUEDUCTO.

Se inicia construcción de acueducto (Ubicación pozo 1 a 2).

Se realiza cerramiento y señalización, localización y replanteo tanto para red principal como para domiciliarias (identificación de domiciliarias).

Corte, rotura y excavación de pavimento. Se encuentra red de 3".

Retiro y limpieza de obra. Debido a las condiciones climáticas se presenta material saturado lo cual complica las labores y cierre de escombrera municipal, se deposita material en escombreras diferentes a la municipal debidamente certificadas. Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad.

Luis Quijano
Residente Interventor.



05 DE JUNIO DE 2022 (DOMINGO)

Condiciones climáticas favorables.

Personal en obra: Residente de obra contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector de interventoria, maestro, ayudantes 7.


Maquinaria y/o equipos: Canguro, herramienta menor.

ACUEDUCTO:

Se prosigue con la excavación manual (1.30 m de profundidad), lleno con arena, instalación de tubería de 3" Pvc presión, lleno compacto con recebo. (Red principal).

Domiciliares: Se continúa con excavación manual y corte de andén.

Se presenta a continuación esquema con domiciliares de pozo 1 a pozo 2 (Referenciando con alcantarillado).

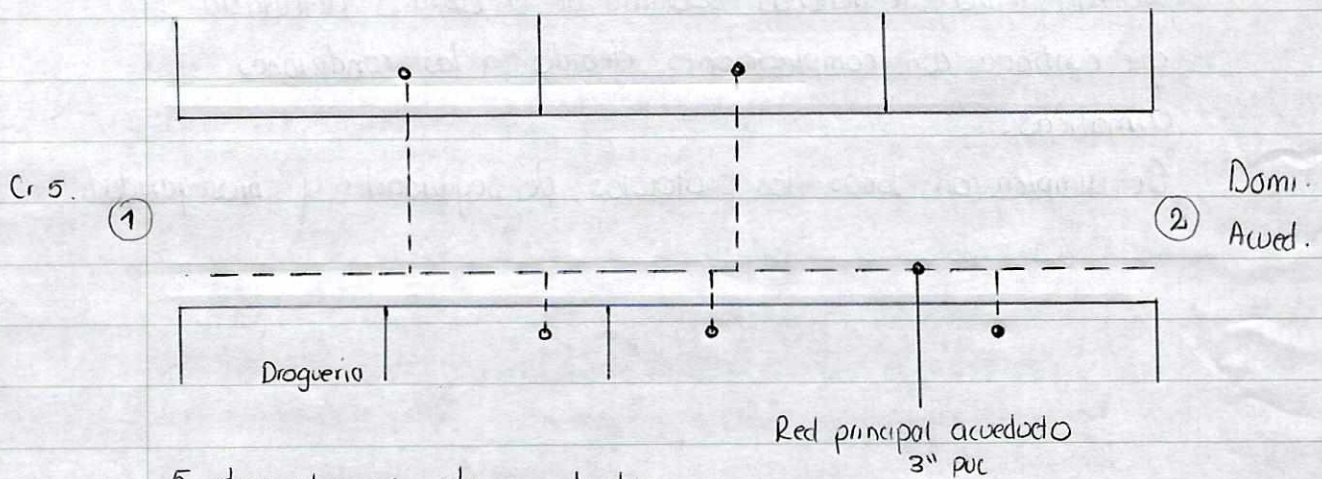

5 domiciliares de acueducto

↳ 3 cortas, 2 largas.

Se realizan todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

Residente Interventor

[Firma]

06 DE JUNIO DE 2022 (LUNES)

Condiciones climáticas: Lluvia moderada.

Personal en obra: Residente de obra contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, maestro, ayudantes 7, oficial.

Maquinaria y/o equipos: Canguro, herramienta menor.

ACUEDUCTO:

Red principal: Se continua con la excavación manual, lleno con arena, instalación de tubería de 3" pvc presión, lleno con recebo debidamente compactado.

Domicilarias: Se continua con excavación manual, instalación de collarín PVC 3" a 1/2", instalación de registro de incorporación, PF, llave y manguera. (Se deja manguera en contacto pero sin conexión).

Se hace retiro de material sobrante de la obra, actividad que continua con complicaciones debido a las condiciones climáticas.

Se cumplen con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad

Lambiqueri
Residente interventor



07 DE JUNIO DE 2022 (MARTES)

Condiciones climáticas: Lluvia moderada

Personal en obra: Residente de obra contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, maestro, ayudantes 7, oficial.

Maquinaria y/o equipos: Canguro, herramienta menor.

ACUEDUCTO:

Red principal: Se continua con excavación manual, lleno con arena, instalación de tubería pvc presión 3", instalación de

collarines de 3" a 1/2", registro de incorporación, manguera, PF, llave de paso (Se dejan dentro del contenido pero no se realiza conexión).

Debido a las condiciones climáticas se trabaja con material saturado y se complica el tema de Retiro de escombros.

Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

Luis Quijón
Residente Interventor

[Signature]

08 DE JUNIO DE 2022 (MIÉRCOLES)

Condiciones climáticas: Lluvia moderada.

Se han presentado fuertes lluvias en horas de la noche y madrugada durante el mes lo que ocasiona que el material se sature completamente afectando al desarrollo de actividades en obra.

Personal en obra: Residente de obra contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, maestro, ayudantes 7. Oficial.

Maquinaria y/o equipos: Herramienta menor, canguro.

ALUVEDUCTO:

Red principal: Se finaliza actividad de excavación, lleno con arena, instalación de manguera y debidos accesorios, se realiza lleno con relleno debidamente compactado.

Domiciliarias: Se finaliza la excavación, lleno con arena, instalación de manguera y accesorios. Se realiza reparación de andenes en concreto.

Se realiza limpieza y retiro de material sobrante. Se cumplen con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad.

Luis Quijón
Residente Interventor

[Signature]

09 DE JUNIO DE 2022 (JUEVES)

Condiciones climáticas favorables

Personal en obra: Residente contratista, siso contratista, inspector de interventoría, residente de interventoría, maestro, ayudantes 7, oficial.


Maquinaria y/o equipos: Canguiro, Retroexcavadora, Herramienta menor, cortadora, compresor.

ALVEDUCTO

Pozo 1-2: Se realiza retiro de cerramiento.

Pozo 2-3: Se instala cerramiento, se hace marcación, corte y rotura de pavimento en red principal y domiciliarias. Se comienza con la excavación manual.

A continuación se presenta esquema con domiciliarias encontradas para este tramo.

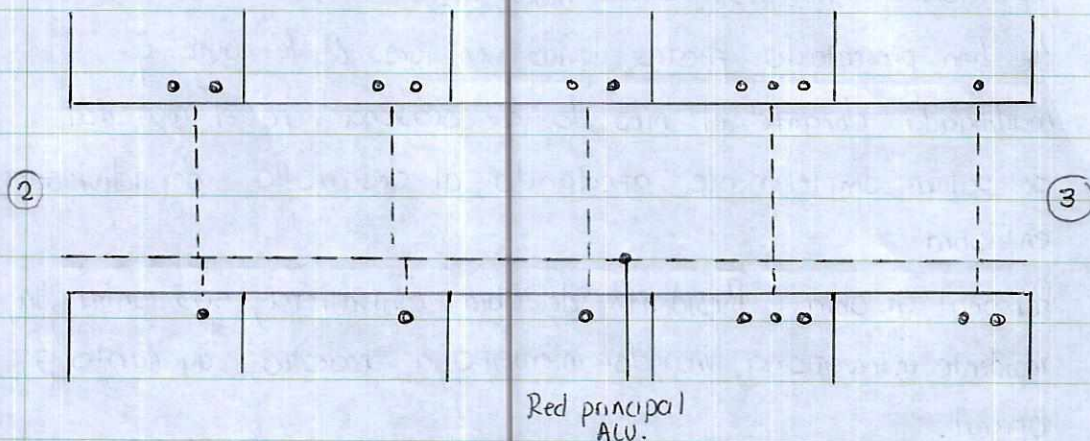

Total Domiciliarias 18

Cortas 8, largas 10.

Se realizan todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

Andrés
Residente

[Signature]

10 DE JUNIO DE 2022 (VIERNES)

Condiciones climáticas favorables.

Personal en obra: Residente contratista, siso contratista, inspector interventoria, residente interventoria, maestro, 7 ayudantes, oficial.

Maquinaria y/o equipos: Canguro, cortadora, compresor, herramienta menor.

ACUEDUCTO:

Pozo 2-3: Se continua con excavación manual, lleno con arena, instalación de tubería de 3" PUC presión, lleno con recebo debidamente compactado.

Domiciliarias: Se prosigue con excavación manual.

Se cumple con todos los protocolos de bioseguridad y seguridad en obra.

Pozo 3-4. Se realiza cerramiento parcial en este tramo para inicio de trabajos sobre red principal.

Luis Quijano
Residente obras



11 DE JUNIO DE 2022 (SABADO)

Condiciones climáticas favorables.

Personal en obra: Residente contratista, siso contratista, inspector interventoria, residente interventoria, maestro, oficial, 7 ayudantes.

Maquinaria y/o equipos: Cortadora, compresor, canguro, herramienta menor.


ACUEDUCTO:

Pozo 2-3: Se realiza corte sobre andenes, se prosigue con la excavación manual, lleno con arena, instalación de tubería de 3" PUC presión, lleno compacto con recebo.

Domiciliarias. Se prosigue con la excavación manual y construcción de domiciliarias.

Pozo 3-4: Se realiza marcación, corte y rotura de pavimento, posterior a esto se inicia actividad de excavación manual en el tramo.

A continuación se evidencia ilustración con domiciliarias encontradas:

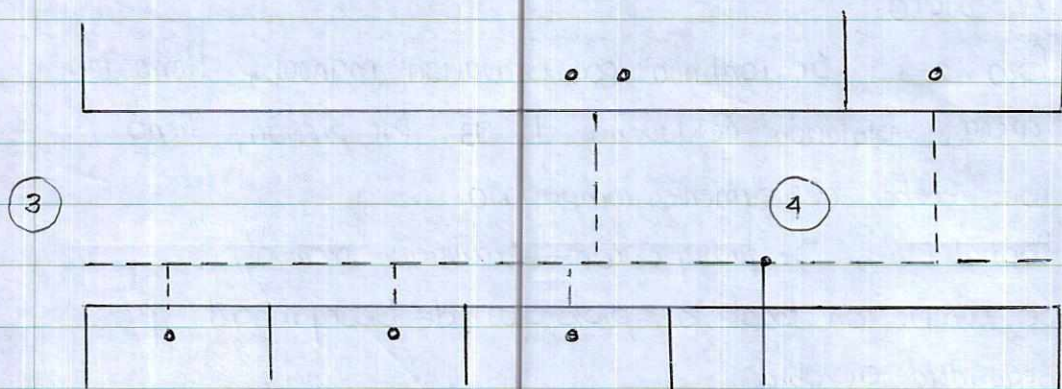

6 Domiciliarias

Red de acueducto.

3 largas, 3 cortas

Debido a las fuertes lluvias se prosigue con los problemas de botaderos. Se cumplen con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

Ambruzzi
René Iván

12 DE JUNIO DE 2022 (DOMINGO)

Condiciones climáticas: Lluvia moderada.

Personal en obra: Residente de obra contratista, SISO contratista, residente interventoria, inspector interventoria, maestro, ayudantes 7, Oficial.

Maquinaria y/o equipos: Canguro, herramienta menor
ACUEDUCTO.

Pozo 3-4: Se continua con excavación manual sobre red principal, instalación de arena en zanja, instalación de tubería, lleno con relleno debidamente compactado.

Se realiza marcación y cortes sobre andenes.

Pozo 2-3: Se continua con excavación manual para red principal y domiciliarias, instalación de arena, instalación de tubería de 3" PUC presión y construcción de domiciliarias (incluye accesorios).

Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

L. Urbina
Residente Interventor



13 DE JUNIO DE 2022 (LUNES)

Condiciones climáticas: Lluvia moderada.

Personal en obra: Residente de obra contratista, SISO contratista, residente interventoria, inspector interventoria, maestro, ayudantes 7, oficial.

Maquinario y/o equipos: Canguro, herramienta menor.

Pozo 2-3: Se finaliza la excavación manual de la red principal y domiciliarias. Se finaliza lleno compacto con relleno.

Pozo 3-4: Se continua con excavación manual, se hace cerramiento completo y se marca, corta y demuele ~~paralelamente~~.

Se realiza excavación manual para domiciliarias y finaliza corte sobre andén.

Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad.

L. Urbina
Residente Interventor




14 DE JUNIO DE 2022 (MARTES)

Condiciones climáticas favorables.

Personal en obra: Residente de obra contratista, siso contratista, residente interventoría, inspector interventoría, maestro, ayudantes 7, oficial.


Maquinaria y/o equipos: Canguiro, herramienta menor.

Se realiza visita de obra por parte de la supervisora del contrato, Ing. Luisa F. Henao, en conjunto con interventoría se determinó la pavimentación del sector Hipodromo según esquema:

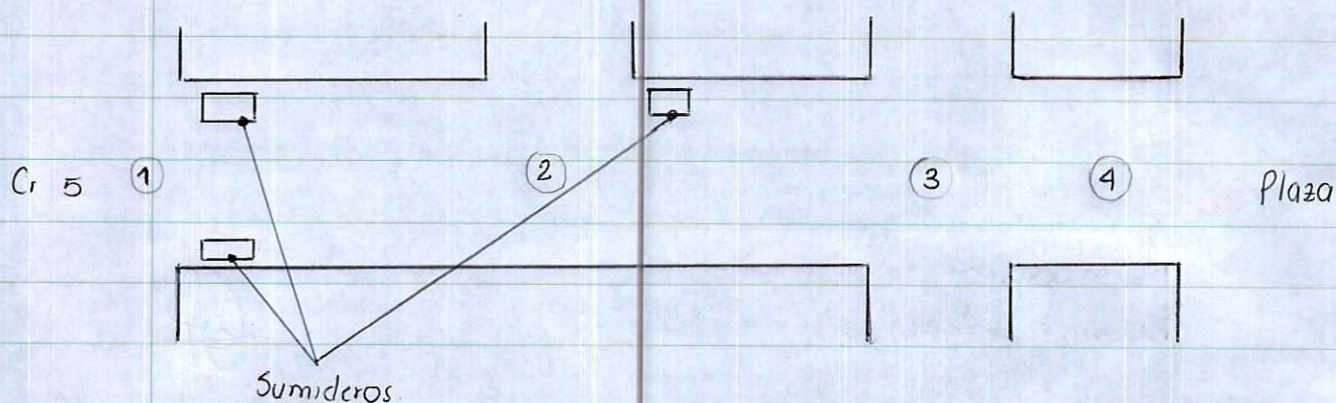

Para el primer tramo comprendido entre pozo 1 y 2 al igual que para el último 3 a 4. Se realizará pavimentación, ya que según lo presente las condiciones del pavimento existente son muy malas. Para el tramo central comprendido entre pozos 2 y 3 (como se muestra en la imagen anterior se realizará un reparcho tanto en redes principales como domiciliarias de acueducto y alcantarillado, después de esto se construirá una carpeta en todo el tramo, esto ya que la estructura del pavimento existente se encuentra en buenas condiciones. El contratista procederá entonces a ejecutar lo decidido por las partes.

Además de esto se presenta la estructura con la cual se trabajará dicha actividad.

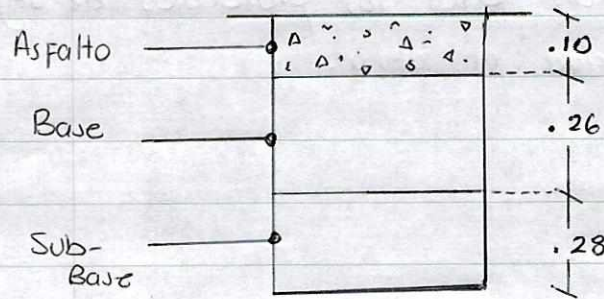

Estructura suministrada por interventoria con base en los diseños existentes de infraestructura.

Se realizan todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

Interventoria R
Residente interventoria

Deleg

15 DE JUNIO DE 2022 (MIÉRCOLES)

Condiciones climáticas favorables

Personal en obra: Residente de obra contratista, sivo contratista, residente interventoria, inspector interventoria, maestro, ayudantes 7, oficial.

Maquinaria y/o equipos: Canchero, herramienta menor.

ACUEDUCTO

Pozo 3-4:

Se finalizo con la instalación de la tubería de la red principal, instalación de domiciliarias y demás accesorios. Se realiza lleno compacto con recebo.

Se toman las pruebas de presión respectivas a la red que ya esta instalada en su totalidad.

Se realiza limpieza y retiro de material sobrante de la excavación, se continúa con la dificultad de la disposición final de escombros debido al clima.

Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

Budquijn
Residente Intervento,



16 DE JUNIO DE 2022 (JUEVES)

Condiciones climáticas favorables

Personal en obra: Residente contratista, siso contratista, residente interventoría, Inspector interventoría, maestro, ayudantes 4, Oficial.

Maquinario y/o equipos: Canguro, retroexcavadora, herramienta menor, vibrocompactador.

ACUEDUCTO


Se realiza recorrido en compañía de la interventoría y el IBAL para definir los accesorios necesarios para realizar empalme.

PAVIMENTACIÓN

Se realiza cerramiento y señalización del tramo que comprende al pozo 1 y 2, se inician actividades de cajeo (según diseño), marcación y corte de pavimento, se retira el material de la excavación, se realiza suministro e instalación de sub-base debidamente compactado por capas.

En horas de la noche se realiza empalme, a continuación se presenta esquema con los accesorios instalados: (acueducto).



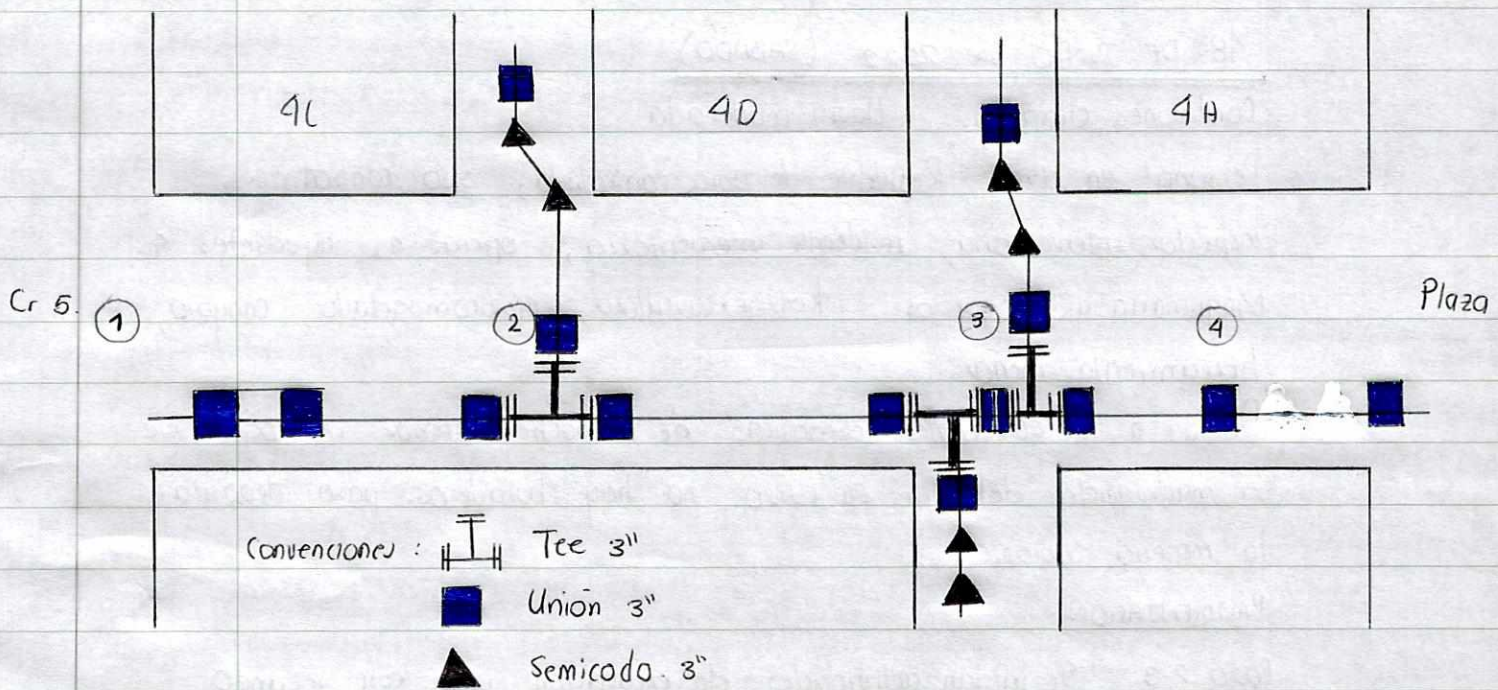

Andrés
Departamento Interventoría

Depp

17 DE JUNIO DE 2022 (VIERNES)

Condiciones climáticas: favorables.

Personal en obra: Residente contratista, síndico contratista, residente interventoría, inspector interventoría, maestro, ayudantes 4, oficial.

Maquinaria y/o equipos: Canguiro, retroexcavadora, vibrocompactador, herramienta menor.

ACUEDUCTO

Se realiza vesanes de andén, se hace revisión corroborando que no hay fugas.

PAVIMENTACIÓN.

Se prosigue en tramo 1-2 (pozos), se realiza lleno por capas con sub-base debidamente compactado.

Se realizan todos los protocolos de seguridad y bioseguridad

Depp

18 DE JUNIO DE 2022 (SABADO).

Condiciones climáticas: Lluvia moderada.

Personal en obra: Residente de obra controlista, suso contratista, inspector interventoria, residente interventoria, oficial 1, ayudantes 4.

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora, vibrocompactador, conguo, herramienta menor.

Debido a las condiciones climáticas de la noche anterior y parte de la madrugada del día en curso no hay botaderos para depositar la materia sobrante.

PAVIMENTACIÓN:

Pozo 2-3: Se inician actividades de excavación para este segundo tramo debido a que el cajeo se hace solo en las líneas de redes principales y domiciliarias intervenidas por lo cual el material sobrante sera menor.

Después de realizado el cajeo se procede a realizar lleno, para agilizar el tema y garantizar a los propietarios de los locales que la calle no quedara cerrada se llenan capas debidamente compactadas solo con base.

Se realiza acopio de material sobrante debidamente señalizado.

Se cumplen con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

hpl

Duff

19 DE JUNIO DE 2022 (DOMINGO)

Condiciones climáticas: Lluvia moderada.

Debido a condiciones climáticas no se labora.

Duff

20 DE JUNIO DE 2022 (LUNES)

Condiciones climáticas: Favorables.

Personal en obra: Residente contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, oficial 1, ayudantes 4.

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora, vibrocompactador, canguro, herramienta menor, costadora.

PAVIMENTACIÓN:

Se realizó corte de pavimento en los 3 tramos.

Paso 2-3: Se prosigue con la excavación para domocharias y lleno con base por capas debidamente compactado.

Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad

se recomienda al contratista no ^{Acopiar} depositar material en la base de la vía





21 DE JUNIO DE 2022 (MARTES)

Condiciones climáticas: Lluvia moderada.

Personal en obra: Residente contratista, siso contratista, residente interventoria, inspector interventoria, oficial 1, ayudantes 4.

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora, vibrocompactador, canguro, herramienta menor.

PAVIMENTACIÓN:

Debido a las condiciones climáticas no se realizan trabajos. El material se encuentra saturado y las escombreras no prestan servicio.

Se realizan todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra





22 DE JUNIO DE 2022 (MIÉRCOLES)

Condiciones climáticas favorables.

Personal en obra: Residente de obra contratista, residente de obra interventoria, SISO contratista, Inspector Interventoria, Oficial 1, ayudantes 3.

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora, motoniveladora, Vibrocompactador, herramienta menor.

PAVIMENTACIÓN

Debido a las condiciones climáticas de la madrugada, se inician labores a las 2:00 pm.

Tramo 1 (Pozo 1-2). Se realiza extensión, nivelación y compactación de sub-base.

Se cumple con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad en obra.

Inf.

Duff

23 DE JUNIO DE 2022 (JUEVES)

Condiciones climáticas: Lluvia moderada.

Personal en obra: Residente de obra contratista, SISO contratista, Residente interventoria, Inspector interventoria, Oficial 1, ayudantes 3.

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora, motoniveladora, vibrocompactador, herramienta menor.

PAVIMENTACIÓN

Debido a las condiciones climáticas presentes no se pueden realizar labores.

Inf.

Duff
