

DOCUMENTOS A CTA 2 CONT 78-21 EDGAR AMURY GARCÍA




De <dolly.camacho@ibal.gov.co>

Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>

Fecha 2021-08-13 15:19

 DOCUMENTOS ACTA 02 CONT 78-21 EDGAR AMAURY GARCÍA.PDF (~294 KB)

 IBAL SIG <small>SA ESP OFICIAL</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>	SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA	CÓDIGO: GJ-R-050
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
		VERSIÓN: 02
		Página 1 de 1

Ibagué, 04 de agosto de 2021

Doctora
OLGA LUCIA LIEVANO RODRIGUEZ
Secretaria General
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
Ciudad

Doliva C
05-08-21
3:23

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 078 DEL 21 DE MAYO DE 2021


Cordial Saludo:


Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL N° 01:


ACTA PARCIAL
INFORME DE ACTIVIDADES
CUENTA DE COBRO
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
FICHA TECNICA DE EVALUACION

Atentamente,


HAROLD ROSENBERG RODRIGUEZ SANCHEZ
Director Operativo
Supervisor

	ACTA PARCIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-033
		FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 06
		Página 1 de 2

Contrato No.	078 de prestación de servicios profesionales del 21 de mayo de 2021		
Objeto	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL JUNIOR 1 QUE APOYE LA DIRECCION OPERATIVA Y A LOS GRUPOS OPERATIVOS DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL		
Valor total	DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$16.800.000.00) MCTE		
Contratista	EDGAR AMAURY GARCIA GUZMAN		
Supervisor	DIRECTOR OPERATIVO		
Fecha de Inicio	01 DE JUNIO DE 2021		
Fecha de terminación	31 DE NOVIEMBRE DE 2021		
Plazo de Ejecución	SEIS (6) MESES		
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL	Año	Mes	Día
	2021	08	04
En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.02 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.			
Periodo informado	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021		
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	<ul style="list-style-type: none"> Diseño de modelos o proyecciones para optimización de equipos con segmentación de datos con tablas dinámicas y Tablero de Control con base de datos de diagnósticos del estado operativo actual de los sistemas mecánicos y electromecánicos en PTAP 1 y 2 y BOCATOMA CHEMBE, CAI, COMBEIMA, COLINAS SUR y PTAR AMERICAS, anexo documento Excel. 		
Evidencias de la ejecución del contrato	<ul style="list-style-type: none"> Apoyo a supervisiones y revisiones de los equipos mecánicos propiedad del IBAL. Realización de reportes de anomalías o afectaciones en los equipos o infraestructuras mecánicas. Apoyo en el control y mantenimiento de los equipos mecánicos y electromecánicos del IBAL. Elaboración de informes por locación de mantenimiento. Apoyo en elaboración de estimaciones, cotizaciones y análisis de materiales y costos. 		



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:

2021-07-15

VERSIÓN: 06

Página 2 de 2

ESTADO DE CUENTA			
Valor Contrato	16.800.000.00		
Valor Acta No. 01	2.800.000.00		
Valor Acta No. 02	2.800.000.00		
Saldo pendiente (Valor para pago)	11.200.000.00		
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
PERSONA JURIDICA			
El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.			
APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
PERSONA NATURAL			
Entidad en donde se realiza el pago.	BANCOLOMBIA	Valor total del aporte	\$ 341.600.00
Planilla No.	8614567456	Salud	\$ 140.000.00
Periodo cotizado	De:	01/07/21	Pensión
	Hasta:	31/07/21	ARL
			\$ 0
ANEXOS:			Marque con x
Recibo de pago de seguridad social			
Copias planillas de aporte			
(Describir los otros anexos que hacen parte del acta parcial que se está tramitando)			
Firma			
Nombre	EDGAR AMAURY GARCIA GUZMAN		HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ
	Contratista		Supervisor
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO		



IBAGUÉ VIBRA

Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola
– Pbx: (8)2756000 – Fax: (8) 2618982
P.Q.R: Carrera 5 No. 41-16 edificio F25 Piso 2
CANALES DE ATENCIÓN (116) Ibagué – Tolima /
www.ibal.gov.co – ventanilla.unica@ibal.gov.co

Ibagué, Tolima 30 de junio de 2021

Asunto: Diagnostico técnico situación actual y estado del sistema de floculado de la PTAP 1 La Pola de la EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

Ingeniero Harold Rosembert Rodríguez Sánchez

Director Operativo IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

EXPOSICIÓN DE HECHOS

El 28 de julio de 2021, se realizó nuevamente inspección y taxonomía de equipos en compañía de los operarios en la PTAP 1 específicamente en el sistema de floculación para determinar el estado funcional y operatividad de cada equipo que hace parte de este sistema.

ANALISIS

Se realiza inspección visual con acompañamiento del 9º Adalber Rodríguez Oviedo para el recorrido de estado de la maquinaria y equipos que conforman el sistema de floculado de la PTAP 1, en donde se procede a hacer registro fotográfico de cada componente en este caso sistema de floculado vertical y horizontal para conocer y dejar evidencia del estado actual de cada uno de sus componentes para así evitar fallas mecánicas a futuro, en donde se encuentra de acuerdo al tablero de control que surge a través de la segmentación de datos con gráficos dinámicos en Excel, que más del 50% de equipos y componentes que hacen parte de este grupo de elementos en general se encuentran en estado no funcionales, regulares y no operables.



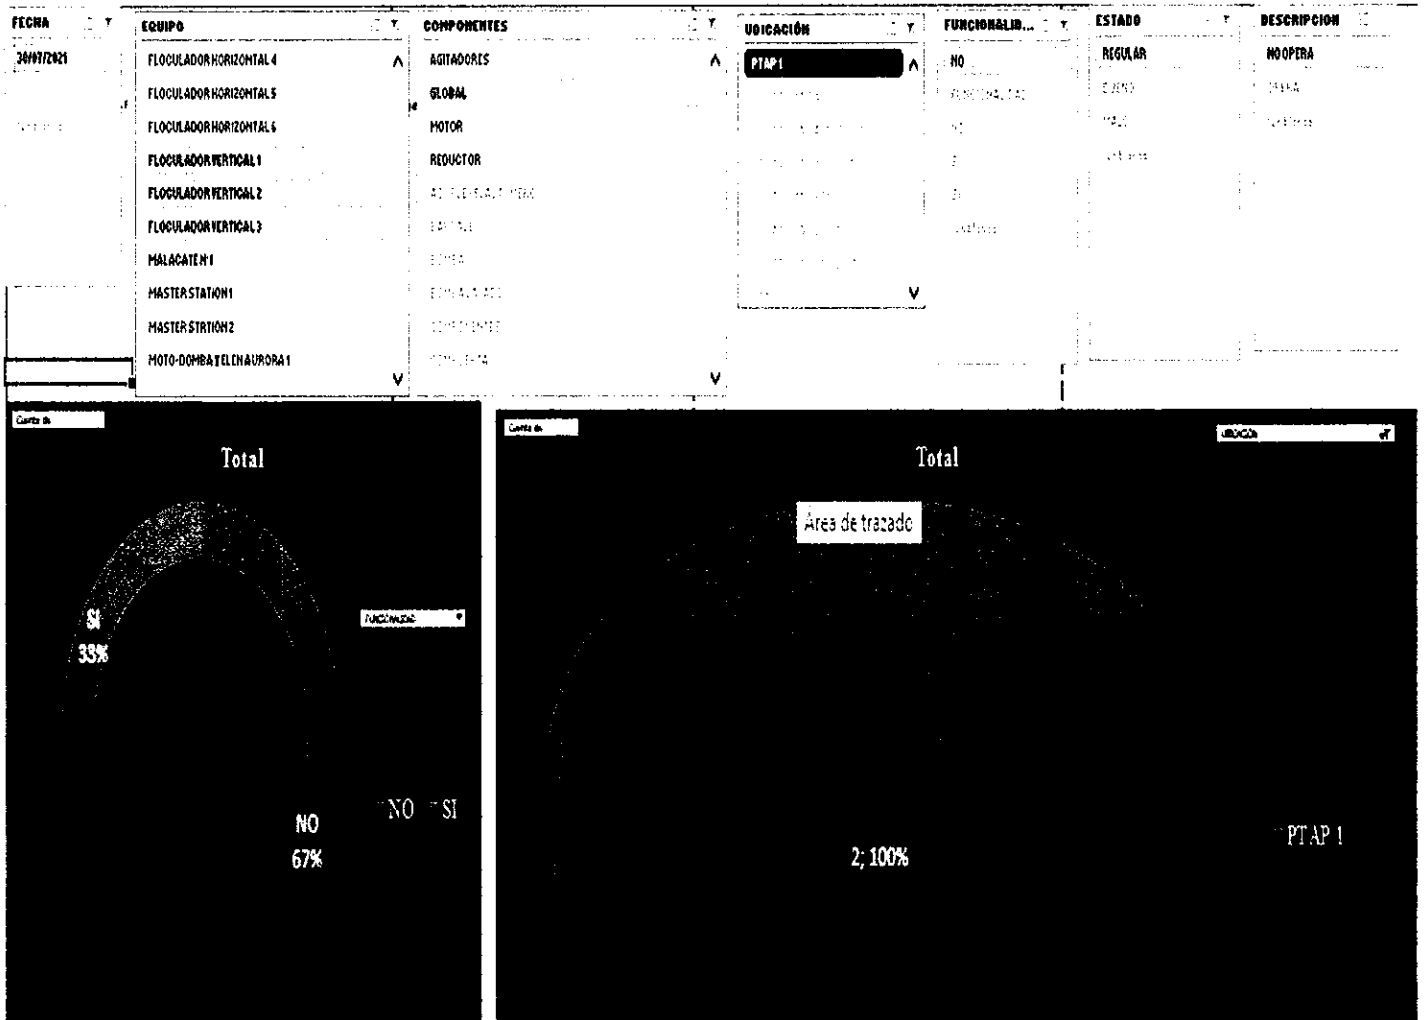


Figura 1. Gráficos Dinámicos con segmentación de datos – Tablero de Control Equipos Mecánicos y Electromecánicos IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

Módulos:

Floculador Vertical 1 = Funcional en estado regular y en operación.



Figura 2. Floculador Vertical Modulo 1 PTAP 1.

Floculador Vertical 2=No Funcional en estado regular y en operación.



Figura 3. Floculador Vertical Modulo 2 PTAP 1.

Floculador Vertical 3 = No opera en estado regular.



Figura 4. Floculador Vertical Modulo 3 PTAP 1.

Floculador Horizontal N°1: Funcional en estado regular y en operación.



Figura 5. Floculador Horizontal 1 Modulo 1 PTAP 1.

Floculador Horizontal N°2: No opera en estado regular.



Figura 6. Floculador Horizontal 2 Modulo 1 PTAP 1.

Floculador Horizontal N°3: No funcional en estado regular.

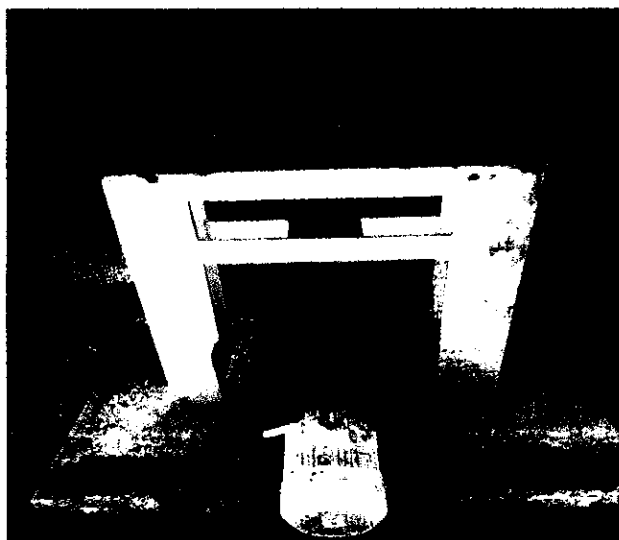


Figura 7. Floculador Horizontal 3 Modulo 2 PTAP 1.

Floculador Horizontal N°4: Funcional en estado regular y en operación.



Figura 8. Floculador Horizontal 4 Modulo 2 PTAP 1.

Floculador Horizontal N°5: No opera en estado regular.



Figura 9. Floculador Horizontal 5 Modulo 3 PTAP 1.

Floculador Horizontal N°6: No opera en estado regular.

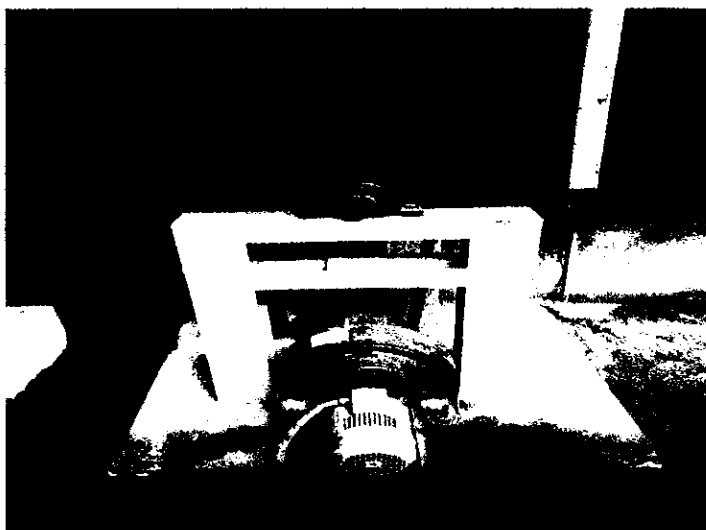



Figura 10. Floculador Horizontal 6 Modulo 3 PTAP 1.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Es importante realizar un cronograma de programación para mantenimientos preventivos y predictivos con el fin de que no se tengan que realizar solamente mantenimientos correctivos y parar el sistema de floculado para trabajar a un 100% ya que al día de hoy están funcionales menos del 50% de los equipos por elementos y componentes averiados de los mismos, específicamente en los floculadores verticales están funcionales dos de tres, modulo uno y tres, y en los Floculadores horizontales, solo dos están funcionales en estado regular y en operación.

Se hace entrega del presente Informe Técnico en Ibagué Tolima, el 30/07/2021 siendo las 2:00 pm en la Oficina de la Dirección Operativa de la EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

Atentamente



Ingeniero Mecánico Amaury García Guzmán

Encargado Profesional Junior 1





CODIGO	FECHA	LUGAR	EQUIPO ELEMENTO	DE MANTENIMIENTO		DESCRIPCION	(Observación)
				Correctivo	Preventivo		
1	2/06/2021	PTAP I La Pola IBAL S.A. E.S.P.	Válvula de cheque retención Bomba 2	X		Fractura del pin del eje de la palanca de la bomba N°2	Instalación del nuevo pin del eje de la válvula de cheque de retención de la palanca del elemento de la Bomba N°2, con modificación del suplemento extremo del eje con la finalidad de no dejar inestabilidad (juego).
2	10/06/2021	PTAP I La Pola IBAL S.A. E.S.P.	Válvula de cheque retención Bomba 2	X		Reinsidencia de fractura del pin del eje de la palanca de la bomba N°2	Instalación de tornillos Catapillar como pin para el eje por ser de un material mas resistente para un mejor funcionamiento de la válvula quedando sin sello el cheque porque la teneja presenta desgaste por fricción con el soporte en Y, dejando como resultado provisional una cuña en tubo de 3/8 para suplir la emergencia presentada.
3	28/06/2021	PTAP I La Pola IBAL S.A. E.S.P.	Motor-Bomba 1	X		Mantenimiento correctivo del motor de la bomba N°1	Retiro de motor Siemens e instalación de motor weg con actividad de nivelación con la bomba ademas de las conexiones electricas del motor puesta en marcha.
4	28/07/2021	PTAP I La Pola IBAL S.A. E.S.P.	Floculador Vertical línea 1	X		Mantenimiento correctivo Floculación Vertical Línea 1	Lavado de Línea 1 de Floculación para cambio total de tornillería de la estructura Floculador Vertical 1

EDGAR AMAURY
CC-111052156

Ibagué, Tolima 30 de junio de 2021

Asunto: Informe para mantenimiento correctivo urgente y de prioridad para las líneas del sistema de Floculado verticales y horizontales de la PTAP 1 La Pola de la EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

Ingeniero Harold Rosembert Rodríguez Sánchez

Director Operativo IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

EXPOSICIÓN DE HECHOS

De acuerdo a la base de datos de diagnóstico de criticidad de los equipos mecánicos y electromecánicos de la empresa, principalmente de acuerdo a las inspecciones realizadas en junio y julio se requiere con urgencia y prioridad el mantenimiento correctivo de todas las líneas de sedimentación en los módulos del sistema de floculación vertical y horizontal en la PTAP 1 La Pola.

ANALISIS

Con base a la necesidad de urgencia y prioridad latente que se presenta en la PTAP 1 La Pola se debe tomar acción oportuna e inmediata para mejorar y evitar daños, pérdidas o paradas más críticas en un futuro predictivo de medio plazo, teniendo en cuenta la criticidad y el estado actual de las diferentes estructuras y componentes de todo el sistema sedimentador de floculación para el proceso de Potabilización.

Se realiza la debida inspección, investigación y cotización(anexo) pertinente específicamente de una línea de sedimentación global de floculación en diferentes talleres de la ciudad de Ibagué-Tolima con la finalidad de empezar la gestión administrativa para que la gestión y calidad operativa de la empresa evite riesgos laborales mayores y la prestación del servicio del recurso hídrico sea optima y eficiente.

Listado de fabricación, componentes y elementos mecánicos para solución y mantenimiento correspondiente de línea de sedimentación global del sistema de floculado tanto vertical como horizontal PTAP 1 La Pola:

- Tornillería en general de bridas y soportes 5/8" x 3 ½ cantidad 24 Unidades.
- Fabricación sección de acoplamiento (Buje en teflón 100 Y/O NYULON 66) cantidad 3.
- Fabricación ejes para sección de acoplamiento en acero 1045 de 2 ½" cantidad 6.
- Reparación paleta en ángulo de 1 1/2x3x16 sección transversal 1980 MM cantidad 1.
- Montaje acoples y ejes.
- Accesorios de instalación para soportes partidos de brida agitador vertical.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Es de vital importancia la ejecución y realización del mantenimiento correctivo para todo el sistema de floculado de la PTAP 1 La Pola para una mejora continua con calidad en el proceso de potabilización prediciendo daños latentes más críticos a corto plazo.

Se hace entrega del presente informe técnico en Ibagué Tolima, el 30/07/2021 siendo las 2:00 pm en la oficina de la Dirección Operativa de la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

Atentamente



Ingeniero Mecánico Amaury García Guzmán

Encargado Profesional Junior 1



SC INDUSTRIALES SAS

NIT : 900333225- 4
CRA 2 No.60 A-20
2777797 - 3176655388
IBAGUE - COLOMBIA

Ibague, 28 de julio de 2021

Señores

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. ESP. OFICIAL
Atn: ING AMAURY
AVDA. 15 6-38

Ibague . Colombia

Ref : Cotización V - 002 - 2331

Es grato para nosotros poner a su consideración la siguiente propuesta

Cod	Descripción producto	Can	Valor Unit.	Valor Tot.
0010002010004	LINEA DE AGITACION TANQUE IBAL - X UNIDAD	1	3,680,000	3,680,000.00
	CAMBIO DE TORNILLERIA EN GENERAL BRIDAS Y SOPORTES 5/8" X 3 - 1/2. CANT 24 UNIDADES. FABRICACION SECCION DE ACOPLAMIENTO (BUJE EN TEFLON 100 Y/O NYLON 66). CANT 3. FABRICACION EJES PARA SECCION DE ACOPLAMIENTO EN ACERO 1045 DE 2 1/2". CANT 6. REPARACION PALETA EN ANGULO DE 1 1/2X3/16 SECCION TRANSVERSAL X 1980MM. CANT 1. MONTAJE ACOPLER Y EJES. PTE REVISION DE ACCESORIOS DE INSTALACION PARA SOPORTE PARTIDO, BRIDA Y MANTENIMIENTO AGITADOR VERTICAL TANQUE 2.			



SC INDUSTRIALES SAS

NIT : 900333225- 4
CRA 2 No.60 A-20
2777797 - 3176655388
IBAGUE - COLOMBIA

Ibague, 28 de julio de 2021

Señores

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. ESP. OFICIAL
Atn: ING AMAURY
AVDA. 15 6-38

Ibague . Colombia

Ref : Cotización V - 002 - 2331

Es grato para nosotros poner a su consideración la siguiente propuesta

Cod	Descripcion producto	Can	Valor Unit.	Valor Tot.
			Total Bruto	3,680,000.00
			Descuento	0.00
			Descuento	0.00
			Retefuente	0.00
				0.00
				0.00
			Total a Pagar	\$3,680,000.00

VALOR ANTES DE I.V.A.
DIAS HABLES DE ENTREGA.

CONDICIONES DE PAGO: 50% INICIAL

Entrega: 15 días despues de recibir su orden de compra o pedido
Forma de Pago : A Convenir
Validez de la oferta: 30 días a partir de la fecha, julio 28 2021

Cordialmente,

Sc Industriales Sas
Nilopez
SC INDUSTRIALES SAS

**SC INDUSTRIALES SAS**

NIT : 900333225- 4
CRA 2 No.60 A-20
2777797 - 3176655388
IBAGUE - COLOMBIA

Ibague, 28 de junio de 2021

Señores

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. ESP. OFICIAL
Atn: ING AMAURI
AVDA. 15 6-38

Ibague . Colombia

Ref : Cotización V - 002 - 2302

Es grato para nosotros poner a su consideración la siguiente propuesta

Cod	Descripción producto	Can	Valor Unit.	Valor Tot.
0010002010004	REPARACION Y MODIFICACION CLAPETA VALVULA CONTROL DE FLUJO	1	570,000	570,000.00
	-fabricacion y montaje de anillo en bronce SAE 64 -mecanizado eje clapeta			
0010002010004	INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS 2" Y 1 1/2" EN CUARTO DE BOMBEO PARA EL SISTEMA DE CLORACION	1	590,000	590,000.00
0010002010004	GALAPAGO EN ACERO DE 16" CON SALIDA ROSCADA DE 2"	1	260,000	260,000.00
	Total Bruto			1,420,000.00
	Descuento			0.00
	Descuento			0.00
	Retefuente			0.00
				0.00
				0.00
				0.00
	Total a Pagar			\$1,420,000.00

Elaborado e Impreso por Sitigo

VALOR ANTES DE I.V.A.
DIAS HABILES DE ENTREGA

Entrega: 5 días después de recibir su orden de compra o pedido
Forma de Pago : Credito
Validez de la oferta: 30 días a partir de la fecha, junio 28 2021

Cordialmente,

Sc Industriales Sas
Nilopez
SC INDUSTRIALES SAS



RAZON SOCIAL:	EDGAR AMAURY GARCIA GUZMAN
IDENTIFICACION:	CC-1110521563
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-08-03
FECHA DE PAGO:	2021-08-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2021-07
PERIODO SALUD:	2021-07
NUMERO PLANILLA:	8614567456
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8652716231
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 140,000	\$ 140,000
230201	800229739	PROTECCIDN	1	\$ 0	\$ 179,200	\$ 179,200
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	1	\$ 0	\$ 22,400	\$ 22,400
Total a pagar				\$ 0	\$ 341,600	\$ 341,600



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación: Fecha evaluación 4/07/2021

Reevaluación: Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial N° 02

Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 078 del 21 de mayo de 2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: EDGAR AMAURY GARCIA GUZMAN

NIT: C.C.1.110.521.563

FECHA DE INICIO: 01 DE JUNIO DE 2021

FECHA DE TERMINACION: 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL JUNIOR 1 QUE APOYE LA DIRECCION OPERATIVA Y A LOS GRUPOS OPERATIVOS DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	X
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. DBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	5	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
TOTAL PROMEDIO	5,00	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
		CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	5,00
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5		
TOTAL PROMEDIO	5,00	EVALUACION TOTAL	5,00

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION _____ REEVALUACION _____ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas)

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION _____ REEVALUACION _____ POR PARTE DEL CONTRATISTA:

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendra los siguientes

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripción.

SI

NO


HAROLD ROSEM BERT RODRIGUEZ SANCHEZ
SUPERVISOR

EDGAR AMAURY GARCIA GUZMAN

CONTRATISTA

CUENTA DE COBRO N. 02

**EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL S.A E.S.P.
OFICIAL**

NIT: 800.089.809-6

DEBE A:

**EDGAR AMAURY GARCIA GUZMAN
C.C. 1.110.521.563**

LA SUMA DE: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$ 2.800.000,00) M/CTE.

POR CONCEPTO DE: Honorarios del mes de julio en virtud del contrato de prestación de servicios profesionales N. 078 del 21 de Mayo de 2021, cuyo objeto es: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL JUNIOR GRADO 01 QUE APOYE LA DIRECCION OPERATIVA Y A LOS GRUPOS OPERATIVOS DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P. OFICIAL.

Ibagué, miércoles 04 de agosto de 2021



**EDGAR AMAURY GARCIA GUZMAN
C.C. 1.110.521.563 de Ibagué**
