


## ACTIVIDADES:

## BARRIO RICAURTE

\* Se continúa con la demolición de la placa, con la excavación manual, con la instalación de la Tubería, y con el lleno y compactación del relleno y Base. Se realiza levantamiento de Escombros. Se deja Señalizado el área de Trabajo. Se realiza corte del Pavimento Flexible.

## \* BARRIO ESTACIÓN - ARADO

Se atendió el llamado de fuga, de una Arometida domiciliaria de Arueducto. Se deja solucionada la fuga.




contralista

MIERCOLES 19 DE OCTUBRE DE 2022

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 5:00 pm


PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); MAESTRO (1); OFICIAL (1); FONTANERO (1); AYUDANTES (9); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1); OPERARIO VOLQUETA (1); DIRECTOR (1)

EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1); VOLQUETA (1); RETROEXCAVADORA (1); SALTARIN (1)

## ACTIVIDADES:

## \* BARRIO RICAURTE

Se continúa con las excavaciones manuales para la Red Principal de Arueducto. Se instala Tubería, con su cama de arena; luego se realiza el lleno y compactación de la zanja, con material Relleno y Base. Se hace levantamiento de Escombros provenientes de dichas excavaciones. Se deja Señalizado el área de Trabajo.




contralista



1 JUEVES 20 DE OCTUBRE DE 2022

2

3 ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), MAESTRO (1),

6 FONTANERO (1), OFICIAL (1), AYUDANTES (9), OPERARIO RETROEXCAVADORA (1), OPERARIO

7 MINICARGADOR (1), DIRECTOR DE OBRA (1), OPERARIO VOLQUETA (1)

8 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1), CORTADORA (1), PLANTA ELECTRICA (1), MARTILLO (1),

9 RETROEXCAVADORA (1), SALTARIN (1), VOLQUETA (1)

10

11 ACTIVIDADES:

12

13 \*BARRIO RICARTE

14 Se continua con el corte con cortadora del pavimento flexible y con la demolición

15 de este. Se realiza Acopio de material. Se deja señalizado el Area de Trabajo.

16 Se presentan lluvias durante toda la jornada.

17

18

19 \*BARRIO PAN DE AZUCAR - MALABAR

20 Se realiza limpieza en general, y se realiza la demolición del pavimento flexible para

21 el respectivo empizme. Se evidencia que la Tubería después de la Valvula existente

22 de 6" se encuentra en PVC, por tanto no se va a realizar la reposición de esta.

23


24

25

26

27

 Contralista

  
Int. P. Int.

28 VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 2022

29

30 ESTADO DEL TIEMPO: Seco

31 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

32 PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), MAESTRO (1), FONTANERO (1),

33 OFICIAL (1), AYUDANTES (9), OPERARIO RETROEXCAVADORA (1), OPERARIO VOLQUETA (1),

34 DIRECTOR DE OBRA (1),

35 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1), CORTADORA (1), PLANTA ELECTRICA (1), MARTILLO (1),

36 RETROEXCAVADORA (1), SALTARIN (1), VOLQUETA (1),

37

38

39

40




ACTIVIDADES:

\* BARRIO RICARTE

Se continúa con la excavación manual para la Red principal de Acueducto, con la Instalación de Tubería y su respectiva cama de Arena, y Se Finaliza con el lleno y compactación del Receo y Base Granular. Se realiza levantamiento de escombros y se deja señalizado el área de Trabajo. Se radica nuevamente un oficio a la Sede Azucararte, para la solicitud de los planes, para evitar daños.

 Contratista



SABADO 22 DE OCTUBRE DE 2022

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias

HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 12:00 pm

PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); MAESTRO (1);

FONTANERO (1); OFICIAL (1); AYUDANTES (9); DIRECTOR DE OBRA (1); OPERARIO RETROEXCAVADOR

EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); SACTARIO (1); CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1);

RETROEXCAVADORA, COMPRESOR (1)

ACTIVIDADES:


\* BARRIO LA POLA

Se realiza la demolición de la placa existente del Andén, Sobre El Tanque No 2 del IGA. Se deja señalizado el área de Trabajo:

\* BARRIO RICARTE

Se realiza la instalación de la tapa válvula, debido a que había quedado mal instalada, anteriormente.

 Contratista





1 (UNES 24 DE OCTUBRE DE 2022

2

3 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 12:00 pm

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); MAESTRO (1);  
6 OFICIAL (1); FONTANERO (1); AYUDANTES (9); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1); OPERARIO  
7 MINICARGADOR (1); DIRECTOR DE OBRA (1)

8 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1); SALTARIN (1);  
9 RETROEXCAVADORA (1); MARTILLO (1).

10

11 ACTIVIDADES:

12 \*BARRIO RICARDE

13 Se continua con la demolición del pavimento flexible con el martillo; luego con la  
14 excavación manual de la Red principal de Acueducto. Se instala Tuberia, con su  
15 respectiva cama de Arena, y se realiza el lleno y compactación del Recebo y base  
16 Granular. Se deja Señalizado con polisombra y Conducos.

17

18

19 \*BARRIO PAN DE AZUCAR - MALABAR

20 Se realizó el empalme respectivo sobre la camera 10 con calle 12, frente al  
21 Batallon, se deja con atragues en piedra los Accesorios instalados. Se termina  
22 bloques a media noche. Se señala el area de trabajo.

23 \*MATERIAL EN ATRAQUES EN CONCRETO.

24

25

26

27



CONTRATISTA

Julio

28 MARTES 25 DE OCTUBRE DE 2022

29

30 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

31 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 5:00 pm

32 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); MAESTRO (1); OFICIAL (1);  
33 FONTANERO (1); AYUDANTES (4); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1); OPERARIO VOLQUETA (1);  
34 DIRECTOR DE OBRA (1); OPERARIO MARTILLO (1)

35 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1); SALTARIN (1);  
36 RETROEXCAVADORA (1); MARTILLO (1); VOLQUETA (1); MEZCLADORA (1)

37

38

39

40




## ACTIVIDADES:

## \* BARRIO PAN DE AZUCAR-MALABAR


Se presenta fuga en una universal instalada, la cual se soluciono en seguida, y de continuo con el revestimiento de la tubería; se conecta las acometidas domiciliarias de Acueducto de dicha zona. Se deja costales de arena sobre los accesorios; para evitar levantamiento de estos, debido a la presión de la zona. Se toma las muestras de concreto. y se deja señalizado el area.

## \* BARRIO RICAURTE

Se continua con la domesticación del pavimento flexible; con la excavación manual de la red principal de Acueducto; con la instalación de tubería; y con el lleno y compactación del Recebo y Base Granular. Se realiza levantamiento de Escombras. Se deja señalizado el area de Trabajo.



Contratista



MIERCOLES 26 DE OCTUBRE DE 2022

ESTADO DEL TIEMPO: (LUVIAS 12:00 am - 2:00 pm)

HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 5:00 pm

PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); MAESTRO (1); OFICIAL (1); AYUDANTES (9); DIRECTOR OBRA (1); FONTANERO (1); OPERARIO VIBROCOMPACTADOR (1); OPERARIO VOIQUETA (1)

EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1); VIBROCOMPACTADOR (1); VOIQUETA (1); SALTARIN (1).

## ACTIVIDADES:

## \* BARRIO PAN DE AZUCAR-MALABAR

Se Finaliza con el cajeo de las acometidas domiciliarias de Acueducto; se realiza la aplicación de la emulsion y la mezcla mdc-1a sobre la red principal y acometidas; se le da la respectiva compactación con el vibrocompactador.

## \* BARRIO LA POLA


Se realiza la entrega al IBAL, de los accesorios retirados existentes sobre los empalmes de la vuelta del chivo y Pan de Azucar-Malabar.



# BARRIO RICAURTE

Se continua con la excavación manual de la Red Principal de Aquecedo.

  
contratista

  
ING. RESIDENTE.

JUEVES 27 DE OCTUBRE DE 2022

ESTADO DEL TIEMPO:

HORARIO DE TRABAJO: 7:00AM-5:00PM

PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), MAESTRO (1), OFICIAL (1), FONTANERO (1), AYUDANTES (9), DIRECTOR OBRA (1), OPERARIO RETROEXCAVADORA (1), OPERARIO VOLQUETA (1), OPERARIO MINICARGADOR (1)

EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1), CORTADORA (1), PLANTA ELÉCTRICA (1), VOLQUETA (1), SALTARIN (1), MINICARGADOR (1), RETROEXCAVADORA (1),

ACTIVIDADES:


# BARRIO RICAURTE

Se continua con la excavación manual, instalación de tubería, cama de arena, y con el lleno y compactación del relleno y base para la red principal de Aquecedo. Se realiza levantamiento de escombros. Se deja señalizado el material de acopio y la excavación.

# BARRIO PAN DE AZÚCAR - MALABAR

Se deja señalizado el cajeo realizado para la aplicación de la mezcla.

  
contratista

  
ING. RESIDENTE.



1 VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 2022

3 ESTADO DEL TIEMPO: (Luvia) 3:30 pm - 4:45 pm

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), DIRECTOR DE OBRA (1);  
6 MAESTRO (1), OFICIAL (1), AYUDANTES (10), OPERARIO RETROEXCAVADORA (1), OPERARIO  
7 MARTILLO (1), FONTANERO (1)


8 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1), CORTADORA (1), PLANTA ELECTRICA (1), MARTILLO (1),  
9 RETROEXCAVADORA (1), SALTARIN (1)

11 ACTIVIDADES:

12 \*BARRIO RICARTE

13 Se continúa con la demolición de la placa existente, la cual se evidencia que tiene  
14 doble capa de ASFALTO. Se sigue con la excavación e instalación de tubería, y se  
15 finaliza con el lleno y compactación del Recebo y Base. Se deja señalizado el  
16 área de Trabajo.

20   
21 contratista



24 SABADO 29 DE OCTUBRE DE 2022

26 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

27 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 3:00 pm

28 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), DIRECTOR DE  
29 OBRA (1), MAESTRO (1), OFICIAL (1), FONTANERO (1), AYUDANTES (10), OPERARIO RETROEXCAVADORA (1),  
30 OPERARIO MARTILLO (1).

31 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1), CORTADORA (1), PLANTA ELECTRICA (1), MARTILLO (1), SALTARIN (1),  
32 RETROEXCAVADORA (1).

34 ACTIVIDADES:

35 \*BARRIO RICARTE

36 Se continúa con la demolición del pavimento flexible, con la excavación manual,  
37 con la instalación de tubería con su respectiva cama de arena, y con el lleno  
38 y compactación del Recebo y Base. Se deja señalizado el área de Trabajo.


39


40



1 \* BARRIO PAN DE AZUCAR - MALABAR

2 Se Instalan las 2 Tapavalvulas correspondientes a las valvulas de 6" se  
3 deja saneado con polisombra. —

4  
5  
6  
7  contrataista

8  Ing. des. Int.

9  
10 LUNES 31 DE OCTUBRE DE 2022

11  
12 ESTADO DEL TIEMPO:

13 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

14 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), MAESTRO (1),  
15 OFICIAL (1), FONTANERO (1), DIRECTOR DE OBRA (1), AYUDANTES (10), OPERARIO  
16 RETROEXCAVADORA (1), OPERARIO MARTILLO (1), VIBROCOMPACTADOR (1)

17 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1), CORTADORA (1), PLANTA ELECTRICA (1), MARTILLO (1),  
18 BALTARIN (1), RETROEXCAVADORA (1), VIBROCOMPACTADOR (1)


19  
20  
21 ACTIVIDADES:


22 \* BARRIO PAN DE AZUCAR - MALABAR

23 Se Finaliza con la aplicación de la Emulsion y la mezcla asfáltica  
24 MDC-19 sobre la Red principal de Acueducto entre las Calles 12-13  
25 con carrera 10; quedando Terminado dicho Tramo. Se realizo levantamiento  
26 de Escombros. —

27  
28  
29 \* BARRIO LA FOJA

30 Se Finaliza con la Recuperación en general de la via sobre la carrera 3,  
31 aplicando MEZCLA MDC-19, y posterior Compactandola con el Vibro compactador.

32  
33  
34  
35  
36  contrataista

37  Ing. des. Int.



1 MARTES 01 DE NOVIEMBRE DE 2022

2

3 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 5:00 PM

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), DIRECTOR  
6 DE OBRA (1), OPERARIO RETROEXCAVADORA (1), OPERARIO VOLQUETA (1), MAESTRO (1),  
7 FONTANERO (1), OFICIAL (1), AYUDANTES (3),

8 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1), CORTADORA (1), PLANTA ELECTRICA (1), VOLQUETA (1),  
9 RETROEXCAVADORA (1), SALTARIN (1),

10

11 ACTIVIDADES:

12 \*BARRO RICARTE


13 Se continua con la demolición del pavimento flexible. Se realiza el cajeo de  
14 la base para la respectiva aplicación del asfalto. Se toman las respectivas  
15 densidades. Se realiza levantamiento de escombros. Se deja señalizado el  
16 area de trabajo y el acopio de materiales. Se realiza corte con cortadora

17

18

19

20

  
Contratista



21

22 MIÉRCOLES 02 DE NOVIEMBRE DE 2022

23

24 ESTADO DEL TIEMPO: (Lluvia) 3:00 PM - 5:00 PM

25 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 5:00 PM

26 PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), DIRECTOR  
27 DE OBRA (1), OPERARIO RETROEXCAVADORA (1), TALADRO DEMOLIDOR (1), MAESTRO (1),  
28 FONTANERO (1), OFICIAL (1), AYUDANTES (3)

29 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1), CORTADORA (1), PLANTA ELECTRICA (1), RETROEXCAVADORA (1),  
30 SALTARIN (1)

31

32 ACTIVIDADES:

33 \*BARRO RICARTE

34 Se continua con el corte con cortadora y la demolición del pavimento flexible.  
35 Se deja señalizado. Se continua con la excavación manual de la ped principal.

36

37 \*BARRO LA POLA

38 Se inicia con la demolición de la placa del Tanque No 2, interno en el IBAE.

39

40



1 \*BARRIO ESTACIÓN - ARADO

2 Se realiza la excavación sobre el Empalme de la CRA 1A con calle 21, donde  
3 Se ejecutó el sondeo de la Tubería de 4"; encontrándose a 1.60 metros una Tee  
4 de 10" x 4"; luego Se deja unido Nuevamente la Tubería de 4"; Se encuentra  
5 a la espera de orden Para el Tapanamiento de la Red. de 4".

6  
7  
8  
9  
10  Contratista

11  
12 JUEVES 03 DE NOVIEMBRE DE 2022

13  
14 ESTADO DEL TIEMPO: Seco

15 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 5:00 pm

16 PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR (1);  
17 OPERARIO RETROEXCAVADORA (1); OPERARIO MARTILLO (1); MAESTRO (1); OFICIAL (1);  
18 AYUDANTES (7); FONTANERO (1)

19 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); SALTARIN (1); PLANTA ELECTRICA (1); CORTADORA (1);  
20 RETROEXCAVADORA (1); MARTILLO(1)

21  
22 ACTIVIDADES:

23 \*BARRIO RICAURTE

24 Se continúa con el cajeo de la Base Para la Aplicación del ASFALTO. Se realiza  
25 demolición del pavimento flexible. Se deja Señalizado el área de Trabajo. Se  
26 Sigue con la excavación de la Red principal. Se da saltarin al Área de cajeo.

27  
28 \*BARRIO LA POJA


29 Se realiza excavación de la línea de 16" para verificación de Accesorios a  
30 Instalar. Se deja Señalizado el área.

31  
32  
33 \*BARRIO ESTACIÓN - ARADO

34 Se realiza Nuevo apique Sobre la Carrera 2 Sur con calle 20a Para  
35 encontrar la Tubería de 4" existente. Se deja Tapado y compactado la excavación  
36 Realizada. Para el sondeo de la Tubería.

37 \*BARRIO CERRO BORDO

38 Se Inicia con el apique #1 Sobre la Diagonal 13, Frente a ascensor del  
39 Tanque, Para inspeccionar la Tubería existente.

40  Contratista



1 VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2022

2

3 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00AM - 5:00PM

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR DE OBRA (1);

6 OPERARIO RETROEXCAVADORA (1); OPERARIO VOQUETA (1); OPERARIO MARTILLO (1);

7 MAESTRO (1); OFICIAL (1); FONTANERO (1); AYUDANTES (7); OPERARIO VIBROCOMPACTADOR (1)

8 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); SACTARIO (1); CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1); VOQUETA (1);

9 RETROEXCAVADORA (1); MARTILLO (1); VIBROCOMPACTADOR

10

11 ACTIVIDADES:

12

13 \*BARRIO PKAURTE

14 Se realiza aplicación de emulsión y mezcla MDC-19 sobre la Red

15 Principal de Avedojo; entre la Carrera 11a Sur y CRA 11 Bis Sur con calle 20

16 carril subiendo. Se realiza la instalación de tubería; continuando con el

17 lleno y compactación de esta. Se hace levantamiento de escombros. Se deja

18 señalizado el área de trabajo. ←

19

20

21 \*BARRIO ESTACIÓN - ARAJO

22 Se continúa con el APIQUE de la CRA 2 Sur con calle 20 de; aun no se

23 encuentra la tubería. Se deja señalizado —

24

25 \*BARRIO CERRO GORDO

26 Se finaliza con el APIQUE NO 1 sobre las escaleras del Tanque, en la

27 Diagonal 13. Se deja señalizado. —

28

29

30

31

32

33

34

35

36


37

38

39

40

  
Contratista





1 SABADO 05 DE NOVIEMBRE DE 2022

2

3 ESTADO DEL TIEMPO: Seco

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 1:00 pm

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR  
6 DE OBRA (1); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1); OPERARIO VOLQUETA (1); OPERARIO  
7 MARTILLO (1); MAESTRO (1); OFICIAL (1); FONTANERO (1); AYUDANTES (9)

8 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); SALTARIN (1); COBATADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1);  
9 RETROEXCAVADORA (1); VOLQUETA; MARTILLO

10

11 ACTIVIDADES:

12 \* BARRIO RICACURIE

13 Se continua con la demolición del pavimento flexible. Se realiza levantamiento  
14 de Escombros. Se realiza rajpo de la via entre la Carrera 11 Bis sur y  
15 la CRA 11 C sur con calle 20. Se deja Señalizado dicho rajpo y los  
16 materiales de ACOPIO.

17

18

19 \* BARRIO ESTACIÓN - ARADO

20 NO Se encontro ninguna tubería sobre la cra 2 sur con calle 20 a. Se  
21 inicia con un nuevo apique para encontrar la tubería sobre la CRA 1 A  
22 con calle 21; al otro costado de la via. Se deja Señalizados dichos  
23 Apiques. Se realiza limpieza de Bodegas.

24

25

26 \* BARRIO CERRO GORDO

27 Se realiza el lleno y compactación de 1 Apique # 1; Se inicia con el  
28 # 2 sobre la Diagonal 13 con carrera BA Sur. Se deja Señalizado  
29 dicho apique.

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

  
Contratista






1 LUNES 07 DE NOVIEMBRE DE 2022

3 NO SE REALIZAN LABORES.

6  Contratista



8 MARTES 08 DE NOVIEMBRE DE 2022

10 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

11 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 4:00 pm

12 PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR DE OBRA (1);

13 OPERARIO RETROEXCAVADORA (1); OPERARIO VOLQUETA (1); OPERARIO MARTILLO (1); MAESTRO (1);

14 OFICIAL (1); FONTANERO (1); AYUDANTES (7)

15 EQUIPO DE TRABAJO: HERRAMIENTA MENOR (1); CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1); SALTARIN (1);

16 MARTILLO (1); RETROEXCAVADORA (1); VOLQUETA (1)

18 ACTIVIDADES:

19 \* BARRIO RICAUARTE

20 Se realiza compactación del Area de cajeo; Se continua con las excavaciones manuales,  
21 Instalación de tubería con su respectiva cama de arena, y se finaliza con el  
22 lleno y compactación del Recebo y Base. Se realiza limpieza en general; Se levantan los  
23 escombros. Se continua con el corte del pavimento flexible y su demolición.  
24 Se deja señalizado el area de Trabajo.


27 \* BARRIO CERRO GORDO

28 Se finaliza con el Apique #2 Sobre la Diagonal 13 con Carrera BA B Sur.  
29 Se encuentra a la espera de indicaciones por parte del IBAI del tubo que sale  
30 del Tanque.

33 \* BARRIO ESTACION - ARADO

34 Aun no se encuentra la Tubería existente Sobre la Cra 1A con calle 21 (arril)  
35 subiendo; y en el Apique de la Cra 2 Sur con calle 20a Arado, Se continua con  
36 dichos Apiques.

39  Contratista





1 MIERCOLES 09 DE NOVIEMBRE DE 2022

2

3 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 5:00 PM

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR DE  
6 OBRA (1); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1); OPERARIO MARTILLO (1); OPERARIO VOLQUETA (1);  
7 MAESTRO (1); OFICIAL (1); FONTANERO (1); AYUDANTES (7)

8 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); SALTARIN (1); CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1);  
9 RETROEXCAVADORA (1); VOLQUETA (1); MARTILLO (1); TALADRO (1)

10

11 ACTIVIDADES:

12 \* BARRIO RICAURTE

13 Se continua con la demolición y corte de la placa existente; con la  
14 excavación e instalación de tubería para la Red Principal de Arqueobio, sobre  
15 la calle 20 entre calle 12 Sur y carrera 13 Sur. Se deja Señalizado el  
16 material y la excavación.

17

18


19 \* BARRIO LA POLA

20 Se realiza demolición del muro del Tanque no<sup>2</sup> Interno en el JBAI. Se continuo  
21 con la instalación del Pasamuros y el Semicodo de 14", y las universales.  
22 Se aplicaron los Productos SIKAS para evitar la filtración del Agua, y Por ultimo se  
23 Impermeabilizo la zona Interna del Tanque. Se Terminan labores a las 3:00 am. Se deja  
24 Señalizado.

25

26

27

 Contratista



28

29 JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

30

31 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

32 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 5:00 PM

33 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR DE OBRA (1);  
34 OPERARIO RETROEXCAVADORA (1); OPERARIO MARTILLO (1); OPERARIO VOLQUETA (1); MAESTRO (1);  
35 OFICIAL (1); AYUDANTES (6); FONTANERO (2); OPERARIO VIBROCOMPACTADOR (1)

36 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); SALTARIN (1); CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1);  
37 RETROEXCAVADORA (1); VOLQUETA (1); MARTILLO (1); VIBROCOMPACTADOR

38

39

40



ACTIVIDADES:

\* BARRIO RICAURTE


Se continua con la demolición del pavimento flexible y con la excavación de la Red Principal de Arueducto. Se realiza la aplicación de la Emulsión y la Mezcla Asfáltica sobre la calle 20 entre las Carreras 11 Bis Sur y Cía 11C Sur. Se hace la respectiva compactación con el Vibrocompactador. Se deja Señalizado el área de Trabajo.

\* BARRIO LA POLA

Se verifica unas Fugas en las universales, las cuales se les realizo el respectivo ajuste.

✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓

 Contralista



VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2022

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00 PM

PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR DE OBRA (1); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1); OPERARIO MARTILLO (1); OPERARIO VOLQUETA (1); MAESTRO (1); OFICIAL (1); AYUDANTES (6); FONTANERO (2)

EQUIPO EN OBRA: HERDAMIENTA MENOR; SALTARIN (1); CORTAORA (1); PLANTA ELECTRICA (1); MARTILLO (1); VOLQUETA (1); RETROEXCAVADORA (1)

ACTIVIDADES:


\* BARRIO RICAURTE


Se continua con el corte del pavimento flexible; con la demolición del mismo; con la excavación manual; con la instalación de tubería con su cama de arena; y por ultimo por el lleno y compactación del Rococho y Base granular. se realiza levantamiento de escombros. Se deja con Señalización la excavación y el material.

/ / / / / / / / / / / /

\* BARRIO GAITAN

Se realiza recorrido por el sector; y se Identifican los puntos a realizar los diferentes Arriques Para la respectiva sectorización de los Distritos.

 Contralista





1 SABADO 12 DE NOVIEMBRE DE 2022

3 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 5:00 PM

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR  
6 DE OBRA (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); OPERADOR RETROCAVADORA (1); OPERADOR  
7 MARTILLO; MAESTRO (1); OFICIAL (1); FONTANERO (2); AYUDANTES (6);

8 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); SALTARIN (1); CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1);  
9 RETROCAVADORA (1); MARTILLO (1); MEZCLADORA (1)

11 ACTIVIDADES:

13 \* BARRIO RICAURTE

14 Se realiza corte del pavimento flexible; se continua con la excavación manual, con la  
15 instalación de la tubería. Se hace el revestimiento de una parte de la tubería, debido  
16 a un cableado eléctrico encontrado. Se deja Señalizado el área de trabajo.

18 \* BARRIO GAITAN


19 Se inicia a realizar el Apique N°1 sobre la cca 4B entre calles 39B-39C. se  
20 deja Señalizado el área de trabajo.


23   
24 Contratista


22 

26 LUNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

28 No se Realizaron Actividades en ninguno de los puntos.

31   
34 contratista

30 





1 MARTES 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

2  
3 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am-5:00pm

5 PERSONAL OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR DE OBRA (1);

6 FONTANERO (1); MAESTRO (1); OFICIAL (1); AYUDANTES (6); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1); OPERARIO

7 MARTILLO (1); OPERARIO VOLQUETA (1); OPERARIO VIBROCOMPACTADOR (1)

8 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); SALTARIN (1); CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1);

9 RETROEXCAVADORA (1); MARTILLO (1); VOLQUETA (1); VIBROCOMPACTADOR (1)

10  
11 ACTIVIDADES:

12  
13 \* BARRIO RICAURTE

14 Se realiza la aplicación de la Emulsión y la Mezcla asfáltica MDC-19 entre

15 la Carrera 11 Bis Sur - Cra 12 Sur con Calle 12, llegando hasta Torno Vaquiro,


16 Se le dio la debida compactación con el vibro; se deja habilitado dicho Tramo. Se

17 continúa con la demolición del Pavimento Flexible. Se deja señalizado el área de Trabajo.

18 Se realiza rajeo de Base hasta la mitad de la cuadra entre la cra 13 Sur - Cra 12 Sur, Luego

19 se continúa con la compactación de dicho Rajeo.

20  
21  
22  Contralista

20  
21  
22 

23  
24 MIERCOLES 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

25  
26 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

27 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am-5:00pm

28 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR DE OBRA (1);

29 MAESTRO (1); OFICIAL (1); AYUDANTES (6); FONTANERO (1); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1);

30 OPERARIO VOLQUETA (1); OPERARIO MARTILLO (1); OPERARIO VIBROCOMPACTADOR (1)

31 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); SALTARIN (1); CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1);

32 RETROEXCAVADORA (1); MARTILLO (1); VOLQUETA (1); VIBROCOMPACTADOR (1)

33  
34 ACTIVIDADES:

35 \* BARRIO RICAURTE

36 Se realiza la aplicación de la Emulsión y la Mezcla MDC-19 Sobre la Red

37 Principal de Acueducto entre la Carrera 12 Sur - Carrera 13 Sur con Calle 20;

38 continuando con la compactación de la misma; la cual queda aplicada hasta la

39 Coordinadora. Se continúa con la demolición del Pavimento Flexible; se realiza

40 excavación de la Red Principal y se instala Tubería con su cama de arena;



1 Finalizando con el lleno y compactación del material de lleno de la zanja. Se  
2 hace levantamiento de escombros y se deja señalizado el material y la excavación.

3 / / / / / / / / / /  
4

5 \* BARRIO GAITAN

6 Se continúa con los apiques de la zona. Se encontró tubería PVC sobre  
7 la cra 9B entre calles 39B-39C, el otro apique se realiza sobre la  
8 Calle 39B entre las carreras 10 - Carrera 11. Cada uno debidamente  
9 Señalizado. —

11  
12  Contralista



14 JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DE 2022

16 ESTADO DEL TIEMPO: Seco

17 HORARIO DE TRABAJO: 7:00AM - 5:00PM

18 PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR DE OBRA (1);  
19 MAESTRO (1); OFICIAL (1); FONTANERO (1); AYUDANTES (6); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1);  
20 OPERARIO VOLIQUETA (1); OPERARIO MARTILLO (1).

21 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); SALTARIN (1); CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICAL (1); RETROEXCAVADORA (1);  
22 VOLIQUETA; MARTILLO;

24 ACTIVIDADES:

25 \* BARRIO GAITAN

26 En el APIQUE NO 2 ubicado sobre la Calle 39B entre Carreras 10-11 Se encontró  
27 Tubería de 3" en asbesto-cemento. Se inicia con el apique no 3 sobre la  
28 Carrera 10 entre calles 39B-39C. Se deja señalizado los apiques. —

31 \* BARRIO RICARTE

32 Se realiza corte con cortadora y se continúa con la demolición del pavimento  
33 flexible. Se continúa con la excavación manual de la red principal. Se deja  
34 Señalizado con polisombra el área de Trabajo. —

37  
38  Contralista





1 VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2022

3 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00AM - 5:00PM

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR DE  
 6 OBRA (1); MAESTRO (1); FONTANERO (1); OFICIAL (1); AYUDANTE (1); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1);  
 7 OPERARIO VOLQUETA; OPERARIO MARTILLO (1).

8 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); SALTARIN (1); CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1); MARTILLO (1);  
 9 RETROEXCAVADORA (1); VOLQUETA (1).

11 ACTIVIDADES:

13 \* BARRIO RICAURTE

14 Se continua con la demarcación del pavimento flexible; con el corte del ASFALTO;  
 15 con la excavación manual de la Red Principal; y Se realiza la instalación de  
 16 Tubería con su cama de arena; y Se finaliza con el lleno y compactación de la  
 17 Zanja. Se hace levantamiento de Escombros. Se deja Señalizado el are de Trabajo.



20 \* BARRIO CAITAN


21 Se encontro Tubería en PVC de 3" Sobre el APIQUE Nº 3 realizado Sobre la Carrera  
 22 10 entre calles 39B-39C. Se deja Señalizado El apique. ←

24 \* BARRIO ESTACION - ARADO

25 Se realizo un 3 APIQUE Sobre el Carril Subiendo de la carrera 1A SUR (con calle 2), via  
 26 Terminal; Se encontro el Tubo que cruza la via; el cual esta en PVC de 3"; Se realizo  
 27 el respectivo cierre y se Taponó a ambos costados, dicho Taponamiento fue autorizado  
 28 por la Supervisión. Se realiza el respectivo lleno y compactación del mismo. Se levanta el  
 29 exombro. ←

30 *[Handwritten signature]*

34 *[Handwritten signature]* contratista.

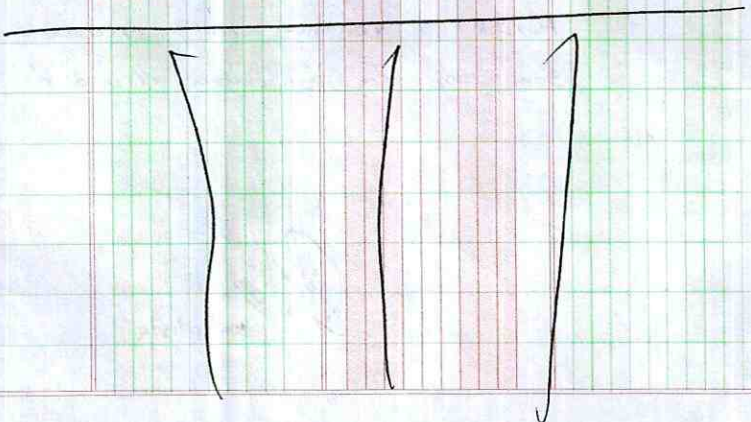



1 SABADO 19 DE NOVIEMBRE DE 2022

3 ESTADO DEL TIEMPO: Seco

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 5:00 PM

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR DE OBRA (1);  
6 MAESTRO (1); FONTANERO (1); OFICIAL (1); AYUDANTES (6); OPERARIO RETROEXCAVADOR (1);  
7 OPERARIO VOLQUETA; OPERARIO MARTILLO (1); OPERARIO BOCAT (1)

8 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); SACTARIN (1); CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1);  
9 MARTILLO; BOCAT (1); RETROEXCAVADORA; VOLQUETA (1)

11 ACTIVIDADES:

12 \*BARRIO CAITAN

13 SE INICIA CON EL APIQUE NO 4 SOBRE LA CALLE 39A ENTRE CARRERAS 11 Y CARRERA 12.  
14 SE DEJAN SEÑALIZADOS LOS APIQUES.

16 \*BARRIO RICAURTE

17 SE CONTINUA CON LA EXCAVACION MANUAL; CORTE DEL PAVIMENTO; DEMOLICION DEL MISMO,  
18 PARA LA RED PRINCIPAL DE ACUEDUACION, ENTRE LAS CARRERA 14 SUR CON CARRERA  
19 13 SUR; SE INSTALA TUBERIA CON SU RESPECTIVA RAMA DE ARENA; FINALIZANDO CON EL  
20 LLENO Y COMPACTACION DE LA ZANJA; SE REALIZA LEVANTAMIENTO DE ESCOMBROS Y SE DEJA  
21 HABILITADO LAS VIAS; Y CON POMOMBRA ENCERRADO LA EXCAVACION Y EL MATERIAL.  
22 SE ENCONTRO TUBERIA DE 3" EN PVC SOBRE LA CARRERA 14 SUR, Y SEGUN INFORMACION  
23 DEL FONTANERO DE ACUARICAURTE, ESTA RED PERTENECE AL IBAL; POR LO TANTO SE VA A  
24 VERIFICAR CON LA ENTIDAD PARA LA RESPECTIVA CONEXION.

27 \*BARRIO ESTACION-ARADO

28 SE REALIZO EL LLENO Y COMPACTACION DEL APIQUE REALIZADO SOBRE LA CARRERA  
29 2 SUR CON CALLE 20A; EN EL CUAL NO SE PUDO ENCONTRAR LA TUBERIA EXISTENTE.

33  CONTRATISTA

33 



1 LUNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2022

3 ESTADO DEL TIEMPO: (Lluvias 2:00pm - 3:15pm)

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), DIRECTOR DE OBRA (1),

6 MAESTRO (1), FONTANERO (1), OFICIAL (1), AYUDANTES (6), OPERARIO RETROEXCAVADORA (1)

7 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1), SALTARIN (1), CORTADORA (1), PLANTA ELÉCTRICA (1),

8 RETROEXCAVADORA (1), CAMIONETA (1)

10 ACTIVIDADES:

11 \* BARRIO ESTACION - ARADO

12 Se inicia con la excavación sobre la CRA 1A con calle 21, para la realización del  
13 empalme a la Red existente. Se deja señalizado el área.

16 \* BARRIO GAITAN

17 Se continúa con el Arqueo N° 4; encuentran tubería en Asbesto-Cemento. Se deja señalizado  
18 el Arqueo.

21 \* BARRIO RICARTE

22 Se realizó la consulta sobre la Red existente; la cual pertenece a la entidad del  
23 ICBAL; por lo tanto se autorizó la conexión de esta. Se inicia con la excavación  
24 para la instalación de la tubería. Se deja señalizado el área de trabajo y los  
25 materiales del llenado de zanja.

27 

27 

31 MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 2022

33 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

34 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

35 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), DIRECTOR DE OBRA (1),

36 MAESTRO (1), FONTANERO (1), OFICIAL (1), AYUDANTES (6), OPERARIO RETROEXCAVADORA (1),

37 OPERARIO VOLQUETA (1)

38 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR, SALTARIN (1), CORTADORA (1), PLANTA ELÉCTRICA (1), RETROEXCAVADORA (1),

39 VOLQUETA (1), CAMIONETA (1)

40



## 1 ACTIVIDADES

2

## 3 \*BARRIO ESTACIÓN-ARADO

4 Se Finaliza con la excavación sobre la CRA 1A con calle 2ª carril bajando, en el cual  
 5 Se realizó el empalme respectivo y taponando el otro extremo del tubo; con el fin de  
 6 Independizar la Tubería de 10" con la de 4" sobre este sector. Se deja un  
 7 muerto en concreto sobre dicho empalme; Se Inicia con el lleno de la zanja. Se  
 8 deja Señalizada la excavación. \_\_\_\_\_

9

10

## 11 \*BARRIO RICARTE

12 Se instala la Tee sobre la carrera 14 Sur entre calles 20-2ª, continuando con la  
 13 Instalación de la Tubería. Se encontró una caja de Red Telefónica; Por lo tanto  
 14 hasta allí se deja la Tubería de 8" de la Red Principal; con su tapon. Se Finaliza  
 15 con el lleno y compactación de dichas redes. Se deja Señalizado el área. se Inicia  
 16 con el corte de la Base desde la CRA 12 Sur - CRA 13 Sur con calle 2ª carril subiendo.

17

## 18 \*BARRIO GAITAN

19 Se encuentra tubería de 3" en asbesto-cemento sobre la calle 39A entre las  
 20 Carreras 11 y Carrera 12. Se inicia con el Apique #75 sobre la calle 39 en las  
 21 Carreras 11 y Carrera 12. ~~Se deja Señalizado el área.~~

21

22

23

24

25



ARTISTA



26 MIERCOLES 23 DE NOVIEMBRE DE 2022

27

28 ESTADO DEL TIEMPO: (LUVIA) 11:30 AM - 1:00 PM

29 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 5:00 PM

30 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR DE OBRA (1);  
 31 MAESTRO (1); FONTANERO (1); OFICIAL (6); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1); OPERARIO  
 32 BOCATT (1); OPERARIO VOLQUETA (1); OPERARIO VIBROCOMPACTADOR.

33 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR; SALTARIN (1); COPIADORA (1); PLANTA ELÉCTRICA (1); BOCATT (1);  
 34 VOLQUETA (1); RETROEXCAVADORA (1); VIBRO COMPACTADOR (1)

35

## 36 ACTIVIDADES:

## 37 \*BARRIO GAITAN

38 Se continúa con la excavación del Apique #75 sobre la calle 39 con carrera  
 39 11 y carrera 12. Se deja Señalizado dicho Apique. \_\_\_\_\_

40




## \* BARRIO RICAURTE

Se Finalizó con el corte de la Base y con la compactación del Tramo. Se realiza la aplicación de la Emulsión y Mezcla MDC-19 Sobre la Red principal de Acueducto, Sobre la Cra 12 Sur - CRA 13 Sur con calle 20. Finalizando con la compactación del ASFALTO, se deja habilitado la vía. Se Inicia con apiques Sobre la Cra 18 Sur entre calles 20-21, Para la Instalación de Tubería. —

## \* BARRIO ESTACIÓN-ARADO

Se Finaliza con el lleno y compactación del Empalme realizado Sobre la CRA 1A con calle 21 Carril Bergando. Se realiza levantamiento de escombros. —

  
contratista



JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), DIRECTOR DE OBRAS (1), MAESTRO (1), OFICIAL (1), AYUDANTES (6), FONTANERO (1), OPERARIO RETROEXCAVADORA (1), OPERARIO UDIQUETA (1), OPERARIO BOCATI (1).

EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR, SALTARIN (1), PLANTA ELECTRICA (1), CORTADORA (1), BOCATI (1), RETROEXCAVADORA (1), UDIQUETA (1)

## ACTIVIDADES:

## \* BARRIO RICAURTE

UNA VEZ REALIZADO LOS DIFERENTES APIQUES; Se da Inicio con la excavación de la Red principal sobre la CRA 13 Sur entre calles 20-21. Se realiza levantamiento de escombros. Se deja señalizado el área. Se continúa con el corte del Pavimento Flexible. —


## \* BARRIO GATÁN

Se Finaliza con el Apique N° 5; encontrando Tubería en Asbesto-cemento, se deja señalizado el área de trabajo. Se Inicia con el Apique N° 6 Sobre la Carrera 11A con calle 37a Bis. —

## \* BARRIO LA POLA

Se reanuda ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN Para la Red de 16" ubicada Sobre el Parque Belén. Se deja señalizado el área. —

  
contratista





1 VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

3 ESTADO DEL TIEMPO: SOLO

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 5:00 pm

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), DIRECTOR DE OBRA (1),  
 6 MAESTRO (1), OFICIAL (1), FONTANERO (1), AYUDANTES (6), OPERARIO BOCATT (1), OPERARIO  
 7 RETROEXCAVADORA (1), OPERARIO VOLQUETA (1);

8 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR; SALTARIN (1), CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1), BOCATT (1),  
 9 RETROEXCAVADORA (1), VOLQUETA (1)

11 ACTIVIDADES:

12 \* BARRIO RICAURTE

13 Se continua con la excavacion de la red principal, Se instala tubería y se  
 14 realiza el lleno y compactación de la zanja. Se continua con el corte con  
 15 cortadora del pavimento flexible. Se deja señalizado el area de trabajo.


16 Se realiza excavación para instalar el collarin para el lleno de la tubería instalada de  
 17 8", con el fin de realizar las pruebas hidraulicas. —————


18 \* BARRIO GAITAN

19 Se encuentra tubería en PVC sobre el APIQUE #6. Se deja señalizado. —————

21 \* BARRIO LA POLA

22 Se reanuda actividades de limpieza de tubería para la instalación de accesorios para  
 23 la línea de 16". —————

25  contratista



29 SABADO 26 DE NOVIEMBRE DE 2022

31 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

32 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 3:00 pm

33 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), DIRECTOR DE OBRA (1),  
 34 MAESTRO (1), OFICIAL (1), FONTANERO (1), AYUDANTES (7), OPERARIO RETROEXCAVADORA (1),  
 35 OPERARIO VOLQUETA (1), OPERARIO VIBROCOMPACTADOR (1), OPERARIO BOCATT (1)

36 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR; SALTARIN (1), PLANTA ELECTRICA (1), BOCATT, VOLQUETA (1),  
 37 RETROEXCAVADORA; VIBROCOMPACTADOR (1)

38 } { }

39 } { }

40 } { }



## ACTIVIDADES:

## \*BARRIO RICAURTE

Se Finaliza con el rajeo y compactación de la Base, entre las carreras 13 Sur y 14 Sur con calle 20 Camil Subiendo; Se continúa con la aplicación de la emulsión y de la mezcla MOC-19, Se realiza la correspondiente compactación en el vibro; se deja Habilitada la vía. Se Inicia con la demolición de la placa en concreto encontrada sobre la excavación que se viene ejecutando para la Red Principal de Aquecías sobre la Cra 13 Sur entre calles 20-21. —

## \*BARRIO CERRO GORDO

Se realiza un nuevo apique frente a la casa 4 con transversal 13, en pavimento flexible, para ubicar la tubería que sale del Tanque del IBAI.

DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE DE 2022

ESTADO DEL TIEMPO: lluvioso 5:00am - 10:00 am

HORARIO DE TRABAJO: 10:00am - 6:30 pm

PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); MAESTRO (1); OFICIAL (1); FONTANERO (1); AYUDANTE (2); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1)

EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR; RETROEXCAVADORA; PLANTA ELECTRICA

## ACTIVIDADES:

## \* LA POLA

Se Realizó el desmonte de la válvula existente de 16", luego se inicia con la instalación de los accesorios y tubería, se deja Señalizado el área de Trabajo. Se hace apertura y no se evidencia fuga en lo instalado. —


 Contrataista



LUNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2022

ESTADO DEL TIEMPO: Seco

HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 5:00 pm

PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR DE OBRA (1); MAESTRO (1); OFICIAL (1); AYUDANTES (3); OPERARIO VOLIQUETA (1); OPERARIO MARTILLO (1); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1).



1 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1), SALTARIN (1), PLANTA ELECTRICA (1), COMADORA (1),  
 2 MAESTRO (1), VOLQUETA (1), RETROEXCAVADORA (1)


4 ACTIVIDADES:

5 \* BARRIO RICAURTE

6 Se Finaliza con el corte del pavimento flexible, Se continua con la excavación,  
 7 Instalación de Tubería con su cama de Arena y con el lleno y compactación de  
 8 Recibo y Base Granular sobre la Red principal de Acueducto. Se realiza pausas  
 9 Activas y charlas. Se deja Señalizado el area de Trabajo.

12 \* BARRIO GAITAN

13 Se continua con los Apiques para la Inspección de la Tubería Existente. Se dejan  
 14 Señalizado el area de Trabajo. Se realizaron el lleno de los Primeros Apiques realizados  
 15 debido a que se reubicaron con el fin de empujar las Redes; con autorización de la  
 16 Supervisión.

17   
 18 Contralista

17 

20 MARTES 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

22 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

23 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am-5:00pm

24 PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), MAESTRO (1), DIRECTOR  
 25 DE OBRA (1), OFICIAL (1), AYUDANTES (4), OPERARIO RETROEXCAVADORA (1), OPERARIO  
 26 VOLQUETA (1), FONTANERO (1), OPERARIO MINICARGADOR (1)

27 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1), SALTARIN (1), PLANTA ELECTRICA (1), RETROEXCAVADORA (1),  
 28 VOLQUETA (1), MINICARGADOR (1)

30 ACTIVIDADES:

31 \* BARRIO RICAURTE

32 Se continua con la excavación e Instalación de Tubería; con el lleno y compactación de  
 33 dicha Zanja. Se deja Señalizado el area. Se realiza levantamiento de material sobre  
 34 la c/a 13 Sur entre calles 20-21.

36 \* BARRIO LA POCA

37 Se evidencia fuga sobre la Red Existente de 16"; Por lo tanto se autoriza Realizar un  
 38 Filtro; el cual contiene material muerto; Geotextil; Triturado y material de Sitio,  
 39 dichas Aguas son conducidas a una Zanja Existente de Acueducto.




\*BARRIO GAITAN

Se continúa con los Apiques.


\*BARRIO VERSALLES

Se realiza visita y se demarca los Apiques a realizar. —

  
Contralista



MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

ESTADO DEL TIEMPO:  (Lluvia) 7:00AM - 11:00PM

HORARIO DE TRABAJO: 7:00AM - 5:00PM

PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), DIRECTOR DE OBRA (1), MAESTRO (1), OFICIAL (1), AYUDANTES (7), FONTANERO (1), OPERARIO RETROEXCAVADORA (1), OPERARIO VOLQUETA (1), OPERARIO BOCATT (1)

EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTAS MENOR, SALTARIN (1), CORTADORA (1), PLANTA ELÉCTRICA (1), BOCATT, VOLQUETA (1), RETROEXCAVADORA (1)

ACTIVIDADES:

\*BARRIO RICARTE

Se realiza levantamiento de Escombros. Se deja Señalizada la obra y el material de lleno. —


\*BARRIO GAITAN

Se continúa con la Abertura de los Apiques para la respectiva Sectorización, cada apique cuenta con su respectivo Cerramiento. —

\*BARRIO LA POLA

Se Finaliza con las Actividades correspondientes con la línea de 16", ubicada Sobre el Parque de la Pola - Belén, Se deja Señalizado el Escombros. —

  
Contralista





1 JUEVES 01 DE DICIEMBRE DE 2022

3 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

4 HORARIO DE TRABAJO = 7:00am - 5:00pm

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), DIRECTOR DE  
6 OBRA (1), MAESTRO (1), OFICIAL (1), AYUDANTES (7), FONTANERO (1), OPERARIO  
7 RETROEXCAVADORA (1), OPERARIO VOLQUETA (1)

8 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1), SALTARIN (1), CORTADORA (1), PLANTA ELCTRICA (1),  
9 RETROEXCAVADORA (1), VOLQUETA (1)

11 ACTIVIDADES:

12 \* BARRIO VERSALLES

13 Se inicia con las excavaciones para la ubicación de la tubería existente;  
14 por medio de APIQUES, los cuales van desde la calle 48 entre la calle 46  
15 y Carrera 2, des la calle 48 hasta la carrer 2a y por ultimo  
16 la calle 49, cada una cuenta con su respectiva señalización. Se realiza  
17 descapote sobre la calle 49 para la ampliación de la vía, y se aplica Recebo. →

18 \* BARRIO GAITAN

19 Se continua con los APIQUES para la respectiva sectorización. →



22 \* BARRIO LA POLA

23 Se inicia con la construcción de la caja para el Accesorio instalado para  
24 la conexión del Tanque La Pola N° 2.

26 [Signature] Contratorista [Signature]

29 VIERNES 02 DE DICIEMBRE DE 2022

31 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

32 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 5:00 pm

33 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR DE OBRA (1),  
34 MAESTRO (1), OFICIAL (1), FONTANERO (1), AYUDANTES (7); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1),  
35 OPERARIO VOLQUETA (1)

36 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1), SALTARIN (1), CORTADORA (1), PLANTA ELCTRICA (1),  
37 RETROEXCAVADORA (1), VOLQUETA (1)



## ACTIVIDADES:

## \* BARRIO RICAURTE

Se realiza el corte de la Red Principal sobre la carrera 13 Sur entre Calles 20-21; Se le dio la debida coordinación. Se realiza la toma de densidades sobre dicho Tramo. Se deja señalizado el material y el corte realizado. \_\_\_\_\_

## \* BARRIO VERSALLES


Se continúa con la reparación de los Apiques, Se evidencia tubería de 4" en concreto - cemento. Se tuvo una reunión con el Presidente de la junta y parte del congreso, en el cual se tuvo la compañía de la Interventoría; Se les explico el proceso a realizar y se aclararon dudas, el día lunes se levantara un acta de dicha reunión. \_\_\_\_\_

## \* BARRIO GAITAN

Se realiza con los Apiques; Se espera autorización para dos respectivos empalmes. Se presentan inconvenientes para la apertura de nuevos Apiques; ya que no dejan intervenir algunos tramos los propietarios; Se le informa a la Interventoría. \_\_\_\_\_



contratista



SABADO 03 DE DICIEMBRE DE 2022

ESTADO DEL TIEMPO: SOLO

HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 3:00 PM

PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR DE OBRA (1); MAESTRO (1); OFICIAL (1); FONTANERO (1); AYUDANTES (3);

EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR; SALTARIN (1); CORTADORA (1); PLANTA ELÉCTRICA (1); CAMIONETA (1)


## ACTIVIDADES:

## \* BARRIO VERSALLES

Se continúa con los Apiques en la zona; Se inicia con el corte del Pavimento Flexible; sobre la calle 48 entre la carrera 3a y calle 46. Se deja señalizado los Apiques. \_\_\_\_\_



contratista





1 LUNES 05 DE DICIEMBRE DE 2022

2

3 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 5:00 pm

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR DE OBRA (1);  
6 MAESTRO (1); OFICIAL (1); FONTANERO (1); AYUDANTES (7); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1);  
7 OPERARIO VOLQUETA (1).

8 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); SALTARIN (1); CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1); CAMIONETA (1)  
9 VOLQUETA (1); RETROEXCAVADORA (1).

10

11 ACTIVIDADES:

12

13 A LA POLA

14 Se continúa con la construcción de la caja para las reparaciones  
15 futuras sobre los accesorios instalados; sobre el Tanque No 2, ubicado  
16 internamente en el IBAL.

17

18 \* BARRIO RICAURTE

19 Se finaliza con el cajeo de la base granular y con la compactación de  
20 esta; sobre la carrera 13 sur entre calles 20-21. Se deja el material  
21 acopiado y debidamente señalizado.

22

23 \* BARRIO VERSALCES

24 Se continúa con los apiques en la zona, los cuales se encuentran señalizados.  
25 Se inicia con las excavaciones manuales de la Red Principal.

26

27

28  Contralista

29

30 MARTES 06 DE DICIEMBRE DE 2022

31

32 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

33 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 5:00 pm

34 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR DE  
35 OBRA (1); MAESTRO (1); OFICIAL (1); FONTANERO (1); AYUDANTES (7); OPERARIO  
36 RETROEXCAVADORA (1); VOLQUETA (1); OPERARIO VIBROCOMPACTADOR (1)

37 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); SALTARIN (1); CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1);  
38 CAMIONETA (1); VOLQUETA (1); VIBROCOMPACTADOR (1)

39

40
