







IBAGÜE
VIBRA



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGÜERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.





	FIGURADO Y COLOCACIÓN)		SANCHEZ - AYUDANTES OSCAR SANCHEZ - AYUDANTES NICOLAS PORTILLA - AYUDANTE		INSTALARON SIN PREVIA CONSULTA A LA INTERVENTORIA, SE INFORMA AL CONTRATISTA QUE ESTE ANCLAJE DEBE SER REVISADO Y REALIZAR LAS CORRECCIONES Y ADECUACIONES PARA LA FUNDIDA.
					
VIA BOCATOMA - COELLO		SE REALIZA ARREGLO Y ADECUACION DE VIA CON MAQUINARIA PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES		RETRO EXCAVADORA 310 HERRAMIENTA MENOR	
					



IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBACUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



<p>K7+558.20 - K7+565.04</p>	<p>3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MPA, INCLUYE TRANSPORT E, FIGURADO Y COLOCACIÓN)</p>	<p>SE REALIZA INSTALACION DE ACEROS PARA EL ANCLAJE VS 10 Y CH85D</p>	<p>simón molano Ortiz - oficial Simón Molano - maestro Yimmy Salazar - oficial Jaider Peñuela-ayudante Jhonathan Barrero ayudante Yesid molado-Maestro Néstor Bonilla - ayudante Johan Robayo - ayudante Juan Carlos Tovar - residente</p>	<p>TALADROS, HERRAMIENTA MENOR.</p>	<p>SE REALIZA REVISION DE ACEROS PARA LA FUNDIDA, LOS ACEROS SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE INSTALANDO O SE TOMAN MEDIDAS CON EL RESIDENTE DE OBRA</p>		
		<p>K19+176 al K19+297</p>	<p>2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD</p>	<p>SE REALIZA ADECUACION DE TUBERIA PARA INSTALACION, SE REALIZA LIMPIEZA Y ENTIBADO DE EXCAVACION, POR SOCAVACION QUE SE PRESENTA EN LA ZONA DEL DAÑO DE LA TUBERIA DE 24 PULGADAS.</p>	<p>DAIRO PORTILLO - OFICIAL LUIS LOPEZ - AYUDANTE LEONARDO ROMERO - AYUDANTE LUIS TELLEZ - SST Andrés Calderón - cadenero ANA SOFIA LEON - TOPOGRAFA JHON ALEXANDER</p>	<p>CORTADORA DE PAVIMENTO Y RETRO EXCAVADORA CAT 416, PLANTA, PULIDORAS, HERRAMIENTA MENOR</p>	







IBA&UE
VIBRA



IBAL
LA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.

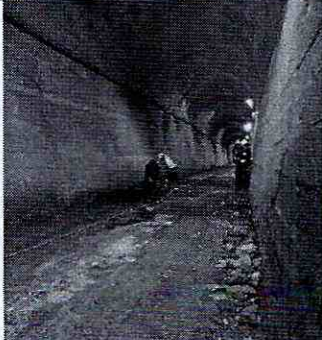

			CANDIA - OPERADOR		
					
K10+880 - K11+100	2.5.4 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO	SE REALIZA DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO DEL TUNEL ADYACENTE AL TUNEL FALSO, SE REALIZA CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION	Topógrafo Rodrigo Cardoso Andrés Calderón Ayudantes obra Ramiro Bernal Arsenio Acosta Operador Jhon vitela Demoledor Jhon Gutiérrez Dos controladores viales María Fernanda Valdez Gerardo Chacón SST Leidy Rodríguez	RETRO EXCAVADO RA 310 RETRO EXCAVADO RA PAJARITA HERRAMIEN TA MENOR	
					



**IBAGUÉ
VIBRA**



IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



K9+130 - K9+800		SE REALIZA EL TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA INSTALACION EN LA PARTE ALTA DEL VIADUCTO Y FINCA PLINIO ESTO POR QUE SE REQUIERE REALIZAR UN ACOPIO DE MATERIALES PARA AVANZAR CON LAS ACTIVIDADES, SE REALIZA FIGURADO DE ACEROS PARA ESTRUCTURAS DELA ZONA.	Jeison Ruiz-ayudante Giovanni Cardozo- oficial Edwin Oviedo - operador retro Édison Gutiérrez - operador oruga Daniel Hernández - ayudante Arsenio Acosta-ayudante	RETROEXCAVADORA 320	
--------------------	--	---	---	---------------------	--



ACTIVIDADES DE OBRA 10 DE FEBRERO DEL 2023

UBICACIÓN DE ACTIVIDADES	ITEM CONTRACTUAL	ACTIVIDADES Y/O DESCRIPCIÓN DIARIA	PERSONAL EN OBRA POR PARTE DE CONTRATISTA	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN OBRA	NOVEDADES
K19+176 al K19+297	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD 4.17.4 Instalación	SE REALIZA INSTALACION DE TUBERIA DE 5.6 ML DE LA TUBERIA DE 24 PULGADAS INSTALACION DE GRAVILLA POR HUMEDAD	DAIRO PORTILLO - OFICIAL LUIS LOPEZ - AYUDANTE LEONARDO ROMERO - AYUDANTE LUIS TELLEZ - SST	CORTADORA DE PAVIMENTO Y RETRO EXCAVADORA CAT 416, PLANTA, PULIDORAS,	



**IBAGÜE
VIBRA**



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGÜERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGÜE.**



	tubería GRP de 24" 2.2.2I SUMINISTRO DE RECEBO EN ZANJA COMPACTADO C/15 CMS MEDIO MECANICO	DE TERRENO Y EXTENDIDA Y COMPACTACION DE RECEBO PARA PROTECCION DE LA TUBERIA.	Andrés Calderón - cadenero ANA SOFIA LEON - TOPOGRAFA JHON ALEXANDER CANDIA - OPERADOR	HERRAMIENTA MENOR	
K7+558.20 - K7+565.04	3.1.2.5I INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO DE 20,7 Mpa (3,000 PSI)	SE REALIZA FUNDIDA PARA EL ANCLAJE VS 10 Y CH85D	Mateo Quiñones Otálvaro - ayudante Leónidas castro-ayudante Hernando Barrera-ayudante Leydy Rodríguez - Sst Jaider Peñuela-ayudante Jhonathan Barrero ayudante Leonardo Moreno-ayudante Yesid molado-Maestro Néstor Bonilla - ayudante Ronaldo Quiroga - ayudante Johan Robayo - ayud	VIBRADOR DE CONCRETO, AUTO BOMBA, MIXERS DE 10 Y 7 M3	SE REALIZA LA TOMA DE DOS CILINDROS DE PRUEBA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y TOMA DE CUATRO CILINDROS POR PARTE DEL CONTRATISTA



IBAL
SA ESP OFICIAL
 EMPRESA IBACUERENA DE
 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.
 R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
 C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



			ante Juan Carlos Tovar - residente	
K10+880 - K11+100	2.5.4 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO	SE REALIZA DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO DEL TUNEL ADYACENTE AL TUNEL FALSO, SE REALIZA CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION	Topógrafo Rodrigo Cardoso Andrés Calderón Ayudantes obra Ramiro Bernal Arsenio Acosta Operador Jhon vitela Demoledor Jhon Gutiérrez Dos controladores viales María Fernanda Valdez Gerardo Chacón SST Leidy Rodríguez	RETRO EXCAVADO RA 310 RETRO EXCAVADO RA PAJARITA HERRAMIEN TA MENOR



**IBAGÜE
VIBRA**




IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGÜERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.I. JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGÜE.



K1+723.95 - K1+838.52	3.1.2.5I INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO DE 20,7 Mpa (3,000 PSI)	SE REALIZA FUNDIDA PARA EL ANCLAJE PIH 32	ALVARO GOMEZ SUAREZ - AYUDANTE LUIS ALFONZO CASTAÑO - OFICIAL DIEGO GOMEZ - OPERADOR MICHAEL SERGEY - CADENERO RUBEN DARIO HERRERA - AYUDANTE YEISON SANCHEZ - AYUDANTES OSCAR SANCHEZ - AYUDANTES NICOLAS PORTILLA - AYUDANTE	VIBRADOR DE CONCRETO, AUTO BOMBA, MIXERS DE 10 Y 7 M3	SE REALIZA FUNDIDA SIN LA DESINSTALACION DE LOS ACEROS DE LAS PARRILLAS INTERMEDI AS QUE IDENTIFICA LA INTERVENT ORIA.
--------------------------	--	--	--	---	---

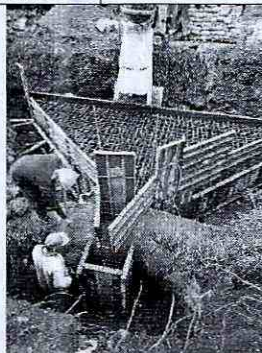

ACTIVIDADES DE OBRA 11 DE FEBRERO DEL 2023



UBICACIÓN DE ACTIVIDADES	ITEM CONTRACTUAL	ACTIVIDADES Y/O DESCRIPCIÓN DIARIA	PERSONAL EN OBRA POR PARTE DE CONTRATISTA	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN OBRA	NOVEDADES
K1+723.95 - K1+838.52	3.1.2.5I INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO DE 20,7 Mpa (3,000 PSI)	SE CONTINUA LA FUNDIDA PARA EL ANCLAJE PIH 32	ALVARO GOMEZ SUAREZ - AYUDANTE LUIS ALFONZO CASTAÑO - OFICIAL DIEGO GOMEZ - OPERADOR MICHAEL	VIBRADOR DE CONCRETO, AUTO BOMBA, MIXERS DE 10 Y 7 M3	



IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.

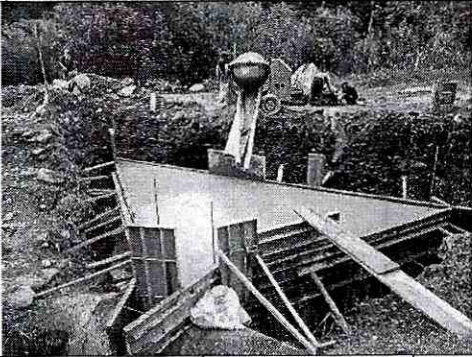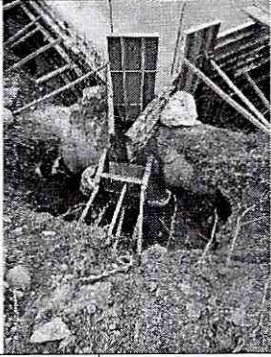

			SERGEY - CADENERO RUBEN DARIO HERRERA - AYUDANTE YEISON SANCHEZ - AYUDANTES OSCAR SANCHEZ - AYUDANTES NICOLAS PORTILLA - AYUDANTE		
					
CAMPAMEN TO 6400		SE REALIZA TRANSPORTE DE HEXAPOSOS HASTA LA BOCATOMA PARA SU POSTERIOR INSTALACION EN LAS ZONAS ADECUADAS	ALVARO GOMEZ SUAREZ - AYUDANTE LUIS ALFONZO CASTAÑO - OFICIAL DIEGO GOMEZ - OPERADOR MICHAEL SERGEY - CADENERO RUBEN DARIO HERRERA - AYUDANTE YEISON SANCHEZ - AYUDANTES OSCAR SANCHEZ - AYUDANTES NICOLAS PORTILLA - AYUDANTE	RETRO EXCAVADO RA 310 VOLQUETA	









IBAGÜE VIBRA



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA ITRACUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



				
K19+176 al K19+297	2.2.2I SUMINISTRO DE RECEBO EN ZANJA COMPACTAD O C/15 CMS MEDIO MECANICO	SE REALIZA EXTENDIDA Y COMPACTACI ON DE RECEBO EN ZANJA, HASTA EL BORDE DE LA VIA PARA PODER DAR PASO DE VEHICULOS Y PODER TRABAJAR ADECUADAME NTE YA QUE LAS PROXIMAS EXCAVACIONE S CRUZARAN LA VIA Y PREVIENDO LA SITUACION VEHICULAR	DAIRO PORTILLO - OFICIAL LUIS LOPEZ - AYUDANTE LEONARDO ROMERO - AYUDANTE LUIS TELLEZ - SST Andrés Calderón - cadenero ANA SOFIA LEON - TOPOGRAFA JHON ALEXANDER CANDIA - OPERADOR	CORTADOR A DE PAVIMENTO Y RETRO EXCAVADO RA CAT 416, PLANTA, PULIDORAS, HERRAMIE NTA MENOR
				
K9+130 - K9+800		SE REALIZA FIGURADO DE ACEROS PARA	Jeison Ruiz- ayudante Giovanni	RETROEXCA VADORA 320




IBAQUE VIBRA



IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



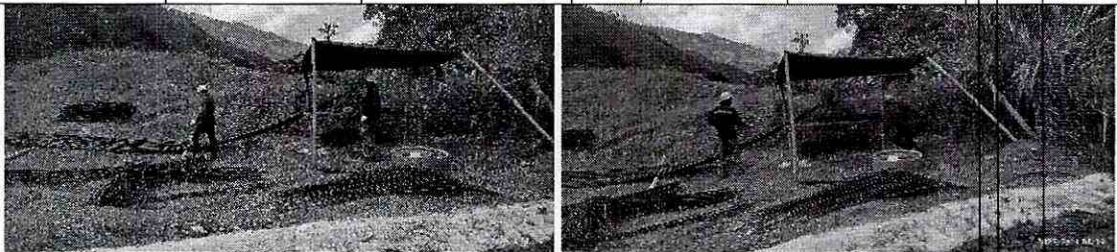



		ESTRUCTURAS DELA ZONA.	Cardozo- ofici al Edwin Oviedo - operador retro Édison Gutiérrez - operador oruga Daniel Hernández - ayudante Arsenio Acosta- ayudante		
					
K7+558.20 - K7+565.04		SE REALIZA CURADO DE LOS ELEMENTOS FUNDIDOS EL DIA ANTERIOR	Mateo Quiñones Otálvaro - ayudante Leónidas castro- ayudante Hernando Barrera- ayudante Leydy Rodríguez - Sst Jaider Peñuela- ayudante Jhonathan Barrero ayudante Leonardo Moreno- ayudante Yesid molado- Maestro Néstor Bonilla - ayudante Ronaldo	VIBRADOR DE CONCRETO, AUTO BOMBA, MIXERS DE 10 Y 7 M3	DETIENEN ACTIVIDAD ES.



IBAL
 SA ESP OFICIAL
 EMPRESA IBAGÜEÑA DE
 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
 R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
 C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



			Quiroga - ayudante Johan Robayo - ayud ante Juan Carlos Tovar - residente	
				
K10+880 - K11+100	2.5.4 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO	SE REALIZA DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO DEL TUNEL ADYACENTE AL TUNEL FALSO, SE REALIZA CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION	Topógrafo Rodrigo Cardoso Andrés Calderón Ayudantes obra Ramiro Bernal Arsenio Acosta Operador Jhon vitela Demoledor Jhon Gutiérrez Dos controladores viales María Fernanda Valdez Gerardo Chacón SST Leidy Rodríguez	RETRO EXCAVADO RA 310 RETRO EXCAVADO RA PAJARITA HERRAMIEN TA MENOR
				



**IBAGÜE
VIBRA**




IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGÜERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.
R.L. JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C. 5.829.473 DE IBAGÜE.




ACTIVIDADES DE OBRA 13 DE FEBRERO DEL 2023

UBICACIÓN DE ACTIVIDADES	ITEM CONTRACTUAL	ACTIVIDADES Y/O DESCRIPCIÓN DIARIA	PERSONAL EN OBRA POR PARTE DE CONTRATISTA	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN OBRA	NOVEDADES
K7+558.20 - K7+565.04		SE REALIZA FIGURADO DE ACEROS PARA ESTRUCTURAS DELA ZONA.	simón Molano Ortiz - oficial Yimy Salazar - oficial Luis Téllez - Sst Jhonathan Barrero ayudante Yesid molado-Maestro Simón Molano - Maestro Juan Carlos Tovar - residente	HERRAMIENTA MENOR	DETIENEN ACTIVIDADES.
					
K1+060		SE REALIZA REVISION DEL TRASLADO DE LAS ESTRUCTURAS HEXAPODOS LOS CUALES LLEGAN CON FISURAS Y DAÑOS CONSIDERABLES LOS CUALES NO SE PODRAN INSTALAR EN LA ZONA DESIGNADA			NO SE EVIDENCIA N ACTIVIDADES EN EL FRENTE DE TRABAJO





IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



K1+838.52		SE REALIZA DESFORMALETE O DEL ELEMENTO PIH 032 QUE SE FUNDIO ANTERIORMENTE	ALVARO GOMEZ SUAREZ - AYUDANTE LUIS ALFONZO CASTAÑO - OFICIAL DIEGO GOMEZ - OPERADOR MICHAEL SERGEY - CADENERO RUBEN DARIO HERRERA - AYUDANTE YEISON SANCHEZ - AYUDANTES OSCAR SANCHEZ - AYUDANTES NICOLAS PORTILLA - AYUDANTE	HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA	SE EVIDENCIA EN HORMIGUEROS EN EL CONCRETO O LO CUAL SE SOLICITA RESANAR PARA SU TERMINADO O ADECUADO.
K1+723.95	3.1.2.11 INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO DE 13,8 Mpa (2.000 PSI) PARA SOLADO	SE REALIZA FUNDIDA DE SOLADO DE LIMPIEZA PARA EL ELEMENTO PIH 030	ALVARO GOMEZ SUAREZ - AYUDANTE LUIS ALFONZO CASTAÑO - OFICIAL DIEGO GOMEZ - OPERADOR MICHAEL	HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA	





**IBAGUÉ
VIBRA**




IBAL

SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



			SERGEY - CADENERO RUBEN DARIO HERRERA - AYUDANTE YEISON SANCHEZ - AYUDANTES OSCAR SANCHEZ - AYUDANTES NICOLAS PORTILLA - AYUDANTE		
					
K9+130 - K9+800		SE REALIZA FIGURADO DE ACEROS PARA ESTRUCTURAS DELA ZONA.	Jeison Ruiz- ayudante Giovanni Cardozo- ofici al Edwin Oviedo - operador retro Édison Gutiérrez - operador oruga Daniel Hernández - ayudante Arsenio Acosta- ayudante	RETROEXCA VADORA 320	



IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBACUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



K10+880 - K11+100	2.5.4 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO	SE REALIZA DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO DEL TUNEL ADYACENTE AL TUNEL FALSO, SE REALIZA CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION	Topógrafo Rodrigo Cardoso Andrés Calderón Ayudantes obra Ramiro Bernal Arsenio Acosta Operador Jhon vitela Demoledor Jhon Gutiérrez Dos controladores viales María Fernanda Valdez Gerardo Chacón SST Leidy Rodríguez	RETRO EXCAVADO RA 310 RETRO EXCAVADO RA PAJARITA HERRAMIEN TA MENOR					
				K19+176 al K19+297	2.1.4.1 EXCAVACIÓ NA MAQUINA A CUALQUIER	SE REALIZA EXCAVACION PARA LA INSTALACION DE TUBERIA DE	DAIRO PORTILLO - OFICIAL LUIS LOPEZ - AYUDANTE	CORTADOR A DE PAVIMENTO Y RETRO EXCAVADO	



**IBAGÜE
VIBRA**




IBAL
LA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGÜERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



	PROFUNDIDA D	24 PULGADAS EN LA ZONA DE LA POLA CON CIÉRRES INTERMITENTES PARA EL PASO DE VEHICULOS.	LEONARDO ROMERO - AYUDANTE LUIS TELLEZ - SST Andrés Calderón - cadenero ANA SOFIA LEON - TOPOGRAFA JHON ALEXANDER CANDIA - OPERADOR	RA CAT 416, PLANTA, PULIDORAS, HERRAMIE NTA MENOR	
--	-----------------	--	--	---	--

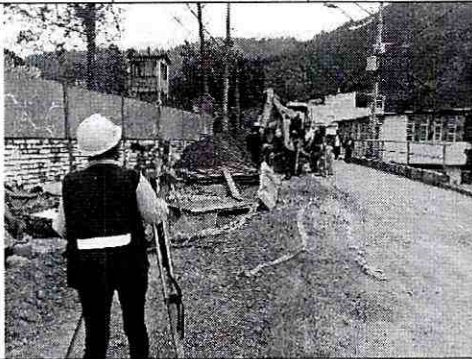

ACTIVIDADES DE OBRA 14 DE FEBRERO DEL 2023

UBICACIÓN DE ACTIVIDADES	ITEM CONTRACTUAL	ACTIVIDADES Y/O DESCRIPCIÓN DIARIA	PERSONAL EN OBRA POR PARTE DE CONTRATISTA	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN OBRA	NOVEDADES
K19+176 al K19+297	2.1.4.1 EXCAVACI ÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDA D	SE REALIZA LA INSTALACION DE TUBERIA DE 24 PULGADAS, SE REALIZA EXTENDIDA Y COMPACTACI ÓN DE RECEBO, EN LA ZONA DE LA POLA CON CIERRES INTERMITENTES PARA EL PASO DE VEHICULOS.	DAIRO PORTILLO - OFICIAL LUIS LOPEZ - AYUDANTE LEONARDO ROMERO - AYUDANTE LUIS TELLEZ - SST Andrés Calderón - cadenero ANA SOFIA LEON - TOPOGRAFA JHON ALEXANDER	CORTADOR A DE PAVIMENTO Y RETRO EXCAVADO RA CAT 416, PLANTA, PULIDORAS, HERRAMIE NTA MENOR	SE PRESENTA DAÑO EN LA TUBERIA DE DISTRIBUCI ÓN DE 32 QUE SE ENCUENTR A EN EL SECTOR, SE REALIZA LA REPARACI ÓN DE ESTA CON MATERIALE S SUMINISTR



IBAL
SA ESP. OFICIAL
 EMPRESA IBAGUERENA DE
 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
 R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
 C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



			CANDIA - OPERADOR		ADOS POR EL IBAL Y MANO DE OBRA DEL CONTRATIS TA, SE DEJA SEÑALIZAD O Y ORGANIZA DO EL AREA DE TRABAJO A LAS 8:30 PM
K10+880 - K11+100	2.5.4 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO	SE REALIZA DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO DEL TUNEL ADYACENTE AL TUNEL FALSO, SE REALIZA CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION	Topógrafo Rodrigo Cardoso Andrés Calderón Ayudantes obra Ramiro Bernal Arsenio Acosta Operador Jhon vitela Demoledor Jhon Gutiérrez Dos controladores viales María Fernanda Valdez Gerardo Chacón SST Leidy Rodríguez		RETRO EXCAVADO RA 310 RETRO EXCAVADO RA PAJARITA HERRAMIE NTA MENOR



IBAQUE VIBRA



IBALE
LA ESP. OFICIAL
 EMPRESA IBAGUERENA DE
 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
 R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
 C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



		K9+130 - K9+800	SE REALIZA FIGURADO DE ACEROS PARA ESTRUCTURAS DELA ZONA. SE REALIZA DESMONTE DE ENRAMADA DE LA VIVIENDA UBICADA SOBRE LA LINEA DE LA TUBERIA PARA LA POSTERIOR INSTALACION, SE REALIZA EL REPLANTEO DE LA ESTRUCTURA DE CARCAMO QUE SE CONSTRUIRA EN LA ZONA	Jeison Ruiz-ayudante Giovanni Cardozo- oficial al Edwin Oviedo - operador retro Édison Gutiérrez - operador oruga Daniel Hernández - ayudante Arsenio Acosta-ayudante	RETROEXCAVADORA 320	
		K1+060	SE REALIZA REVISION DEL TRASLADO DE LAS ESTRUCTURAS HEXAPODOS			NO SE EVIDENCIA N ACTIVIDADES EN EL







**IBAGÜE
VIBRA**



IBAL
SA ESP. ESPECIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.

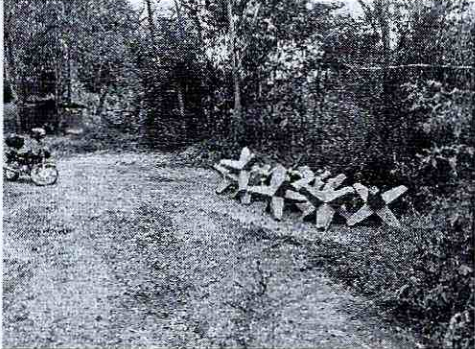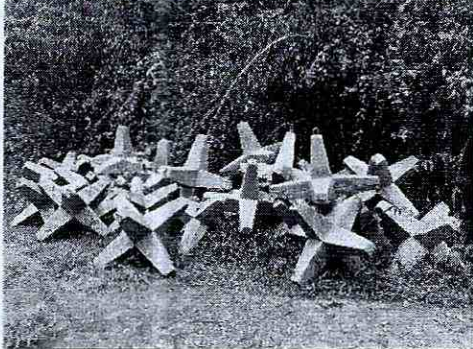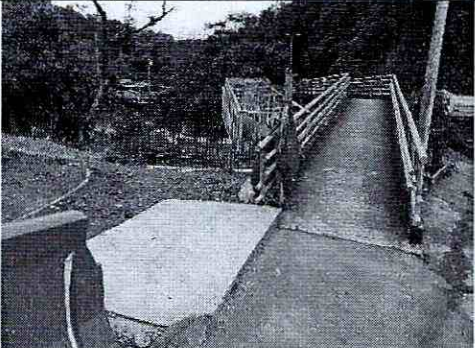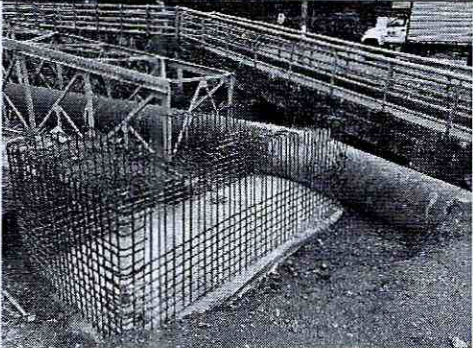


		LOS CUALES LLEGAN CON FISURAS Y DAÑOS CONSIDERABLES LOS CUALES NO SE PODRAN INSTALAR EN LA ZONA DESIGNADA			FRENTE DE TRABAJO
					
K7+558.20 - K7+565.04		NO SE EVIDENCIAN ACTIVIDADES EN ESTE FRENTE DE TRABAJO.		HERRAMIENTA MENOR	DETIENEN ACTIVIDADES.
					
K17+980 - +18+080					NO SE EVIDENCIA N ACTIVIDADES EN EL FRENTE DE TRABAJO



IBAL


SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.

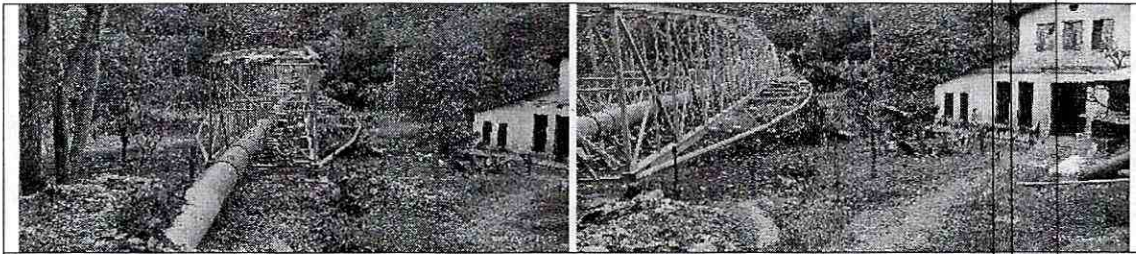

ACTIVIDADES DE OBRA 15 DE FEBRERO DEL 2023

UBICACIÓN DE ACTIVIDADES	ITEM CONTRACTUAL	ACTIVIDADES Y/O DESCRIPCIÓN DIARIA	PERSONAL EN OBRA POR PARTE DE CONTRATISTA	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN OBRA	NOVEDADES
K2+381.48	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZA EXCAVACION PARA EL ELEMENTO PIH 040	ALVARO GOMEZ SUAREZ - AYUDANTE LUIS ALFONZO CASTAÑO - OFICIAL DIEGO GOMEZ - OPERADOR MICHAEL SERGEY - CADENERO RUBEN DARIO HERRERA - AYUDANTE YEISON SANCHEZ - AYUDANTES OSCAR SANCHEZ - AYUDANTES NICOLAS PORTILLA - AYUDANTE	HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA RETROEXCAVADORA 320	
K1+060		SE REALIZA REVISION DEL TRASLADO DE LAS			NO SE EVIDENCIA ACTIVIDAD







IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA INACUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



		ESTRUCTURAS HEXAPODOS LOS CUALES LLEGAN CON FISURAS Y DAÑOS CONSIDERABLES LOS CUALES NO SE PODRAN INSTALAR EN LA ZONA DESIGNADA			ES EN EL FRENTE DE TRABAJO
					
K1+723.95	3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MPA, INCLUYE TRANSPORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN)	SE REALIZA FIGURADO E INSTALACION DE ACEROS PARA EL ANCLAJE PIH 030	ALVARO GOMEZ SUAREZ - AYUDANTE LUIS ALFONZO CASTAÑO - OFICIAL DIEGO GOMEZ - OPERADOR MICHAEL SERGEY - CADENERO RUBEN DARIO HERRERA - AYUDANTE YEISON SANCHEZ - AYUDANTES OSCAR SANCHEZ - AYUDANTES NICOLAS PORTILLA - AYUDANTE	HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA	



**IBAGÜE
VIBRA**



IBAL

SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.





K7+558.20 - K7+565.04		SE REALIZA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PROVISIONAL PARA POSTERIOR DEMOLICION DEL PUENTE EXISTENTE Y TERMINACION DEL ANCLAJE VS10	simón Molano Ortiz - oficial Yimy Salazar - oficial Luis Téllez - Sst Jhonathan Barrero ayudante Yesid molado- Maestro Simón Molano - Maestro Juan Carlos Tovar - residente	EQUIPO DE SOLDADUR A HERRAMIENTA MENOR	
K9+130 - K9+800		SE REALIZA FIGURADO DE ACEROS PARA ESTRUCTURAS DELA ZONA. SE REALIZA DESMONTE DE ENRAMADA DE LA VIVIENDA UBICADA SOBRE LA LINEA DE LA TUBERIA PARA LA POSTERIOR INSTALACION, SE REALIZA EL REPLANTEO DE	Jeison Ruiz-ayudante Giovanni Cardozo- oficial Edwin Oviedo - operador retro Édison Gutiérrez - operador oruga Daniel Hernández - ayudante Arsenio Acosta-ayudante	RETROEXCAVADORA 320	



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAQUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



		LA ESTRUCTURA DE CARCAMO QUE SE CONSTRUIRA EN LA ZONA			
					
K19+176 al K19+297	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZA CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION, SE REALIZA SEÑALIZACION Y ACOPIO DE LOS MATERIALES QUE SE ENCUENTRAN EN LA ZONA	DAIRO PORTILLO - OFICIAL LUIS LOPEZ - AYUDANTE LEONARDO ROMERO - AYUDANTE LUIS TELLEZ - SST Andrés Calderón - cadenero ANA SOFIA LEON - TOPOGRAFA JHON ALEXANDER CANDIA - OPERADOR	CORTADOR A DE PAVIMENTO Y RETRO EXCAVADO RA CAT 416, PLANTA, PULIDORAS, HERRAMIENTA MENOR	SE EVIDENCIA QUE EL CERRAMIENTO QUE SE INSTALA ES MUY POCO Y LA VIA QUEDA CON MUCHO MATERIAL, SE SOLICITA AL CONTRATISTA HACER LA LIMPIEZA ADECUADA Y MEJORAR EL CERRAMIENTO SOBRE LOS MATERIALES QUE QUEDAN EN LA ZONA



IBAQUE VIBRA



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



K10+880 -
K11+100

2.5.4
DEMOLICIÓN
DE
PAVIMENTO
RÍGIDO

SE REALIZA
DEMOLICION
DE PAVIMENTO
RIGIDO DEL
TUNEL
ADYACENTE AL
TUNEL FALSO.
SE REALIZA
CARGUE Y
RETIRO DE
MATERIAL DE
DEMOLICION

Topógrafo
Rodrigo
Cardoso
Andrés
Calderón
Ayudantes
obra
Ramiro Bernal
Arsenio Acosta
Operador
Jhon vitela
Demoledor
Jhon Gutiérrez
Dos
controladores
viales
María
Fernanda
Valdez
Gerardo
Chacón
SST
Leidy
Rodríguez

RETRO
EXCAVADO
RA 310
RETRO
EXCAVADO
RA
PAJARITA
HERRAMIE
TA MENOR






IBAL
S.A. ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L. JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



ACTIVIDADES DE OBRA 16 DE FEBRERO DEL 2023

UBICACIÓN DE ACTIVIDADES	ITEM CONTRACTUAL	ACTIVIDADES Y/O DESCRIPCIÓN DIARIA	PERSONAL EN OBRA POR PARTE DE CONTRATISTA	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN OBRA	NOVEDADES
K3+008.21	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZA EXCAVACION DEL ANCLAJE PIH 048 CON MAQUINA Y PERSONAL DE APOYO PARA CONTROL VIAL	DAIRO PORTILLO - OFICIAL LUIS LOPEZ - AYUDANTE LEONARDO ROMERO - AYUDANTE Andrés Calderón - cadenero ANA SOFIA LEON - TOPOGRAFA	RETRO EXCAVADORA 320, PLANTA, PULIDORAS, HERRAMIENTA MENOR	
					
K2+381.48	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZA EXCAVACION A MANO PARA EL ELEMENTO PIH 040 NIVELACION Y PERFILACION DE LA EXCAVACION	ALVARO GOMEZ SUAREZ - AYUDANTE LUIS ALFONZO CASTAÑO - OFICIAL DIEGO GOMEZ - OPERADOR MICHAEL SERGEY - CADENERO RUBEN DARIO HERRERA - AYUDANTE YEISON SANCHEZ - AYUDANTES OSCAR SANCHEZ - AYUDANTES NICOLAS	HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA RETRO EXCAVADORA 320	







**IBAGÜE
VIBRA**



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGÜERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.
R.L. JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C. 5.829.473 DE IBAGÜE.

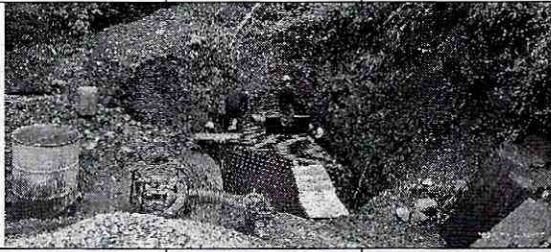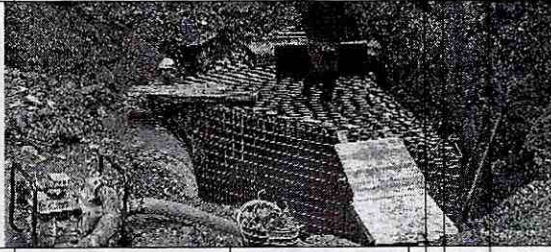

			PORTILLA - AYUDANTE			
						
K1+723.95	3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MPA, INCLUYE TRANSPORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN)	SE REALIZA FIGURADO E INSTALACION DE ACEROS PARA EL ANCLAJE PIH 030	ALVARO GOMEZ SUAREZ - AYUDANTE LUIS ALFONZO CASTAÑO - OFICIAL DIEGO GOMEZ - OPERADOR MICHAEL SERGEY - CADENERO RUBEN DARIO HERRERA - AYUDANTE YEISON SANCHEZ - AYUDANTES OSCAR SANCHEZ - AYUDANTES NICOLAS PORTILLA - AYUDANTE	HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA		
						
K7+558.20 - K7+565.04		SE REALIZA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PROVISIONAL PARA POSTERIOR	simón Molano Ortiz - oficial Yimy Salazar - oficial Luis Téllez - Sst Jhonathan Barrero	EQUIPO DE SOLDADURA HERRAMIENTA MENOR		







IBAQUE VIBRA



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBACUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



		DEMOLICION DEL PUENTE EXISTENTE Y TERMINACION DEL ANCLAJE VS10	ayudante Yesid molado- Maestro Simón Molano - Maestro Juan Carlos Tovar - residente		
					
K10+880 - K11+100	2.5.4 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO	SE REALIZA DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO DEL TUNEL ADYACENTE AL TUNEL FALSO, SE REALIZA CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION	Topógrafo Rodrigo Cardoso Andrés Calderón Ayudantes obra Ramiro Bernal Arsenio Acosta Operador Jhon vitela Demoledor Jhon Gutiérrez Dos controladores viales María Fernanda Valdez Gerardo Chacón SST Leidy Rodríguez	RETRO EXCAVADO RA 310 RETRO EXCAVADO RA PAJARITA HERRAMIENTA MENOR	SE REALIZA EXTENDIDA DE RECEBO PARA TUNEL 1 YA QUE PRESENTA EMPIZAMIENTOS DE AGUA CONSIDERABLES DIFICULTANDO EL PASO DE MATERIALES EQUIPOS Y PERSONAS
					



**IBAGÜE
VIBRA**



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGÜERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



<p>PUENTE COELLO</p>		<p>SE REALIZA REUNION CON LA COMUNIDAD PARA ACLARAR LAS DUDAS Y LA SITUACION DE LA DEMOLICION DE LA RAMPA PEATONAL YA QUE LA COMUNIDAD EXPUSO SU INCONFORMIDAD Y SUS INSERTIDUMBRES POR EL PASO PROVISIONAL, SE AUTORIZA POR PARTE DE IBAL LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PROVISIONAL INTERNO POR ENCIMA DE LA CUNETA.</p>	<p>PERSONAL DEL IBAL, CONTRATISTA E INTERVENTORIA, PERSONAS DE LA COMUNIDAD EN GENERAL Y FUERZA PUBLICA.</p>		
--------------------------	--	--	--	--	--



ACTIVIDADES DE OBRA 17 DE FEBRERO DEL 2023

UBICACIÓN DE ACTIVIDADES	ITEM CONTRACTUAL	ACTIVIDADES Y/O DESCRIPCIÓN DIARIA	PERSONAL EN OBRA POR PARTE DE CONTRATISTA	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN OBRA	NOVEDADES
K1+723.95	3.1.2.5I INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO DE 20,7 Mpa (3,000 PSI)	SE RFUNDIDA DE CONCRETO PARA EL ANCLAJE PIH 030	ALVARO GOMEZ SUAREZ - AYUDANTE LUIS ALFONZO CASTAÑO - OFICIAL DIEGO GOMEZ	HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA	




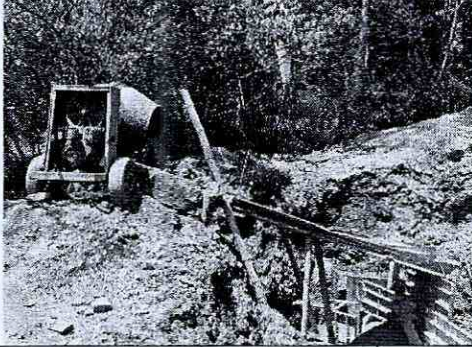
IBAGÜE
VIBRA



IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBACUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



			- OPERADOR MICHAEL SERGEY - CADENERO RUBEN DARIO HERRERA - AYUDANTE YEISON SANCHEZ - AYUDANTES OSCAR SANCHEZ - AYUDANTES NICOLAS PORTILLA - AYUDANTE		
					
K1+304.40	2.1.4.1 EXCAVACIÓN NA MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDA D	SE REALIZA EXCAVACION DEL ANCLAJE PIH 023 CON MAQUINA Y PERSONAL DE APOYO PARA CONTROL VIAL	ALVARO GOMEZ SUAREZ - AYUDANTE LUIS ALFONZO CASTAÑO - OFICIAL DIEGO GOMEZ - OPERADOR MICHAEL SERGEY - CADENERO RUBEN DARIO HERRERA - AYUDANTE YEISON SANCHEZ - AYUDANTES OSCAR SANCHEZ - AYUDANTES NICOLAS	RETRO EXCAVADO RA 320 HERRAMIE NTA MENOR	



**IBAGÜE
VIBRA**



IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



			PORTILLA - AYUDANTE		
					
K3+008.21	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDA D	SE REALIZA EXCAVACION DEL ANCLAJE PIH 048 CON MAQUINA Y PERSONAL DE APOYO PARA CONTROL VIAL	DAIRO PORTILLO - OFICIAL LUIS LOPEZ - AYUDANTE LEONARDO ROMERO - AYUDANTE Andrés Calderón - cadenero ANA SOFIA LEON - TOPOGRAFA	RETRO EXCAVADO RA 320, PLANTA, PULIDORAS, HERRAMIE NTA MENOR	
					
K10+880 - K11+100	2.5.4 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO	SE REALIZA DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO DEL TUNEL ADYACENTE AL TUNEL FALSO, SE REALIZA CARGUE Y	Topógrafo Rodrigo Cardoso Andrés Calderón Ayudantes obra Ramiro Bernal Arsenio Acosta	RETRO EXCAVADO RA 310 RETRO EXCAVADO RA PAJARITA HERRAMIE NTA MENOR	SE REALIZA EXTENDIDA DE RECEBO PARA TUNEL 1 YA QUE PRESENTA EMPIZAMIE NTOS DE



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGÜEÑA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGÜE.



		RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION	Operador Jhon vitela Demoledor Jhon Gutiérrez Dos controladores viales María Fernanda Valdez Gerardo Chacón SST Leidy Rodríguez		AGUA CONSIDER ABLES DIFICULTAN DO EL PASO DE MATERIALE S EQUIPOS Y PERSONAS
--	--	----------------------------------	---	--	--



ACTIVIDADES DE OBRA 20 DE FEBRERO DEL 2023

UBICACIÓN DE ACTIVIDADES	ITEM CONTRACTUAL	ACTIVIDADES Y/O DESCRIPCIÓN DIARIA	PERSONAL EN OBRA POR PARTE DE CONTRATISTA	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN OBRA	NOVEDADES
K7+558.20 - K7+565.04		SE REALIZA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PROVISIONAL PARA POSTERIOR DEMOLICION DEL PUENTE EXISTENTE Y TERMINACION DEL ANCLAJE VS10 CON NUEVA APROBACION DE TRAZADO	simón Molano Ortiz - oficial Yimy Salazar - oficial Luis Téllez - Sst Jhonathan Barrero ayudante Yesid molado- Maestro Simón Molano - Maestro Juan Carlos Tovar - residente	EQUIPO DE SOLDADUR A HERRAMIENTA MENOR	



**IBAGÜE
VIBRA**



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.
R.L. JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C. 5.829.473 DE IBAGÜE.



		POR PARTE DEL IBAL			
COELLO		SE REALIZA VISITA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS LEVANTAMIENTOS DE LAS VIVIENDAS QUE SE COMPROMETIERON VISITAR EN LA REUNION DEL PASADO JUEVES 16 YA QUE PRESENTAN DAÑOS QUE IBAL REQUIERE REVISION Y ACTA DE VECINDAD.	SORLEY HERNANDEZ PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA, JUAN CARLOS TOVAR RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA INTERVENTORIA		SE REALIZA LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD PARA ENTREGA A IBAL
K3+008.21	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZA EXCAVACION DEL ANCLAJE PIH 048 CON MAQUINA Y PERSONAL DE APOYO PARA CONTROL VIAL	DAIRO PORTILLO - OFICIAL LUIS LOPEZ - AYUDANTE LEONARDO ROMERO - AYUDANTE Andrés	RETRO EXCAVADO RA 320, PLANTA, PULIDORAS, HERRAMIENTA MENOR	



**IBAGÜE
VIBRA**



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGÜERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGÜE.**



			Calderón - cadenero ANA SOFIA LEON - TOPOGRAFA		
K2+381.48	3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MPA, INCLUYE TRANSPORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓ N)	SE REALIZA FIGURADO E INSTALACION DE ACEROS PARA EL ANCLAJE PIH 040	ALVARO GOMEZ SUAREZ - AYUDANTE LUIS ALFONZO CASTAÑO - OFICIAL DIEGO GOMEZ - OPERADOR MICHAEL SERGEY - CADENERO RUBEN DARIO HERRERA - AYUDANTE YEISON SANCHEZ - AYUDANTES OSCAR SANCHEZ - AYUDANTES NICOLAS PORTILLA - AYUDANTE	HERRAMIE NTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOM BA RETRO EXCAVADO RA 320	




**IBAGUÉ
VIBRA**




IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.

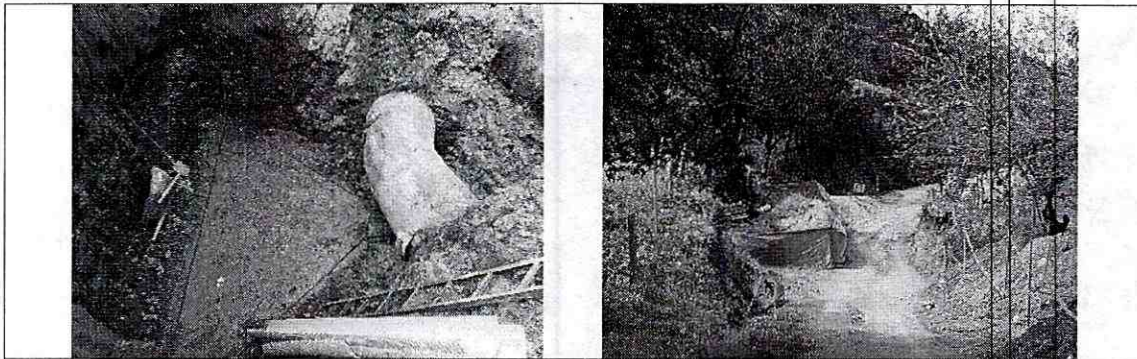

K3+053.62	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDA D	SE REALIZA EXCAVACION DEL ANCLAJE PIH 049 CON MAQUINA Y PERSONAL DE APOYO PARA CONTROL VIAL	DAIRO PORTILLO - OFICIAL LUIS LOPEZ - AYUDANTE LEONARDO ROMERO - AYUDANTE Andrés Calderón - cadenero ANA SOFIA LEON - TOPOGRAFA	RETRO EXCAVADO RA 320, PLANTA, PULIDORAS, HERRAMIE NTA MENOR	
-----------	---	--	--	--	--

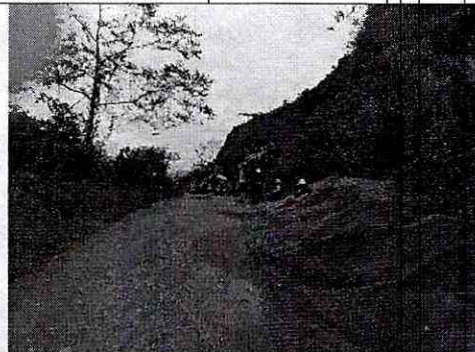

ACTIVIDADES DE OBRA 21 DE FEBRERO DEL 2023

UBICACIÓN DE ACTIVIDADES	ITEM CONTRACTUAL	ACTIVIDADES Y/O DESCRIPCIÓN DIARIA	PERSONAL EN OBRA POR PARTE DE CONTRATISTA	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN OBRA	NOVEDADES
K10+880 - K11+100	2.5.4 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO	SE REALIZA DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO DEL TUNEL ADYACENTE AL TUNEL FALSO,	Topógrafo Rodrigo Cardoso Andrés Calderón Ayudantes obra	RETRO EXCAVADO RA 310 RETRO EXCAVADO RA PAJARITA	SE PRESENTA DAÑO EN TUBERIA DE 3 PULGADAS COSTADO




IBAGÜE
VIBRA



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGÜERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO


CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGÜE.




		SE REALIZA CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION	Ramiro Bernal Arsenio Acosta Operador Faustino Sarmiento Dos controladores viales María Fernanda Valdez Gerardo Chacón SST Leidy Rodríguez	HERRAMIENTA MENOR	IZQUIERDO DEL TUNEL SE REALIZA EL ARREGLO CORRESPONDIENTE CON AYUDA DEL PLOMERO DEL ACUEDUCTO
					
FRABRICA DE HORNAMEN TACION WILINTECH SAS	3.3.2I ACERO ESTRUCTURAL	EN EL LUGAR SE ESTA REALIZANDO LA CONSTRUCCION DE LOS VIADUCTOS REQUERIDOS PARA EL PROYECTO	PERSONAL DE FABRICA.	EQUIPO DE SOLDADUR A HERRAMIENTA MENOR	SE REALIZA VISITA A FABRICA DONSE SE ESTAN REALIZAND O LOS VIADUCTO S DEL PROYECTO SE ENCUENTR A EN FABRICACION EL VIADUCTO ...



CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.

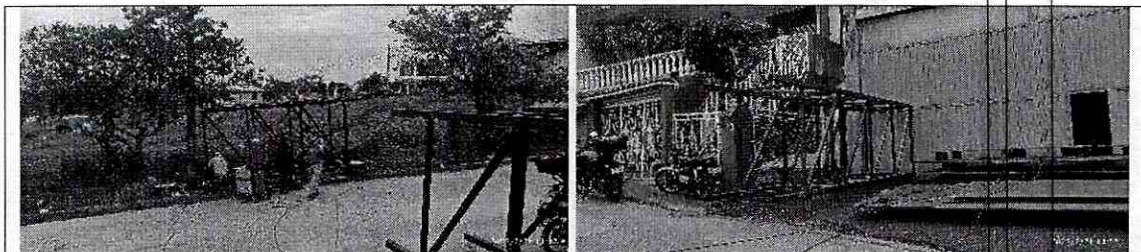

K7+558.20 - K7+565.04		SE REALIZA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PROVISIONAL PARA POSTERIOR DEMOLICION DEL PUENTE EXISTENTE Y TERMINACION DEL ANCLAJE VS10 CON NUEVA APROBACION DE TRAZADO POR PARTE DEL IBAL	Simón Molano: maestro Simón Molano Ortiz: oficial Yesid Molano: maestro Yimy Salazar R: oficial Jonatan Villamil: ayudante	EQUIPO DE SOLDADUR A HERRAMIENTA MENOR	
--------------------------	--	---	--	--	--

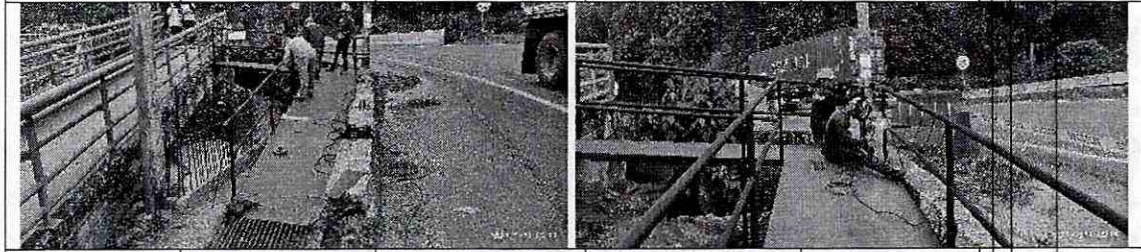

K3+053.62	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZA EXCAVACION DEL ANCLAJE PIH 049 CON MAQUINA Y PERSONAL DE APOYO PARA CONTROL VIAL	DAIRO PORTILLO - OFICIAL LUIS LOPEZ - AYUDANTE JONATHAN VERGARA - AYUDANTE ANTRES CALDERON - CADENERO ANA SOFIA LEON - TOPOGRAFA	RETRO EXCAVADO RA 320, PLANTA, PULIDORAS, HERRAMIENTA MENOR	
-----------	--	---	--	---	--



IBAQUE VIBRA



IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.I JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



			JHON ALEXANDER CANDIA - OPERADOR		
K9+130 - K9+800	3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MPA, INCLUYE TRANSPORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN)	SE REALIZA FIGURADO DE ACEROS PARA ESTRUCTURAS DE LA ZONA. SE REALIZA EL REPLANTEO DE LA ESTRUCTURA DE CARCAMO QUE SE CONSTRUIRA EN LA ZONA, SE REALIZA TRANSPORTE DE MATERIALES DE EXCAVACION A SITIO DE ACOPPIO	Edwin Oviedo: operador de pajariña - retro excavadora Édison Gutiérrez: operador de oruga Yiovany Cardozo: oficial Jeison Ruiz: ayudante Daniel Hernández: ayudante Fernando Cardoso: ayu dante Luis Téllez - Sst	RETROEXCA VADORA 320 RETRO EXCAVADO RA DE ORUGA	



IBAQUE VIBRA



IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBACUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



K1+159.12	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZA EXCAVACION DEL ANCLAJE PIH 20 CON MAQUINA Y PERSONAL DE APOYO PARA CONTROL VIAL	ALVARO GOMEZ SUAREZ - AYUDANTE LUIS ALFONZO CASTAÑO - OFICIAL JULIO CARDENAS - OPERADOR MICHAEL SERGEY - CADENERO JOSE ORTIZ - CADENERO RUBEN DARIO HERRERA - AYUDANTE YEISON SANCHEZ - AYUDANTES OSCAR SANCHEZ - AYUDANTES NICOLAS PORTILLA - AYUDANTE WILLIAM TORRES - AYUDANTE JUAN CARLOS TORRES - AYUDANTE RICARDO GOMEZ - AYUDANTE FELIPE GAITAN - AYUDANTE




**IBAGÜE
VIBRA**



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGÜERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.I JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.




			<p>JUAN CARLOS IBAÑES - AYUDANTE DAVID IBAÑEZ - AYUDANTE BRAYAN IBAÑEZ - AYUDANTE PAULA ALMONACAL - SST</p>		
					
K1+304.40	<p>2.1.4.1 EXCAVACIÓN A CUALQUIER PROFUNDIDAD</p>	<p>SE REALIZA EXCAVACION DEL ANCLAJE PIH 23 CON MAQUINA Y PERSONAL DE APOYO PARA CONTROL VIAL</p>	<p>ALVARO GOMEZ SUAREZ - AYUDANTE LUIS ALFONZO CASTAÑO - OFICIAL JULIO CARDENAS - OPERADOR MICHAEL SERGEY - CADENERO JOSE ORTIZ - CADENERO RUBEN DARIO HERRERA - AYUDANTE YEISON SANCHEZ - AYUDANTES OSCAR SANCHEZ - AYUDANTES</p>	<p>RETRO EXCAVADO RA 320, PLANTA, PULIDORAS, HERRAMIENTA MENOR</p>	



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



			NICOLAS PORTILLA - AYUDANTE WILLIAM TORRES - AYUDANTE JUAN CARLOS TORRES - AYUDANTE RICARDO GOMEZ - AYUDANTE FELIPE GAITAN - AYUDANTE JUAN CARLOS IBAÑES - AYUDANTE DAVID IBAÑEZ - AYUDANTE BRAYAN IBAÑEZ - AYUDANTE PAULA ALMONACAL - SST		
					
K2+381.48	3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MPA, INCLUYE TRANSPORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN)	SE REALIZA FIGURADO E INSTALACION DE ACEROS PARA EL ANCLAJE PIH 040	ALVARO GOMEZ SUAREZ - AYUDANTE LUIS ALFONZO CASTAÑO - OFICIAL JULIO CARDENAS - OPERADOR MICHAEL SERGEY - CADENERO	HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA RETRO EXCAVADORA 320	



IBAGUÉ
VIBRA




IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBACUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



			JOSE ORTIZ - CADENERO RUBEN DARIO HERRERA - AYUDANTE YEISON SANCHEZ - AYUDANTES OSCAR SANCHEZ - AYUDANTES NICOLAS PORTILLA - AYUDANTE WILLIAM TORRES - AYUDANTE JUAN CARLOS TORRES - AYUDANTE RICARDO GOMEZ - AYUDANTE FELIPE GAITAN - AYUDANTE JUAN CARLOS IBAÑES - AYUDANTE DAVID IBAÑEZ - AYUDANTE BRAYAN IBAÑEZ - AYUDANTE PAULA ALMONACAL - SST	
--	--	--	---	--

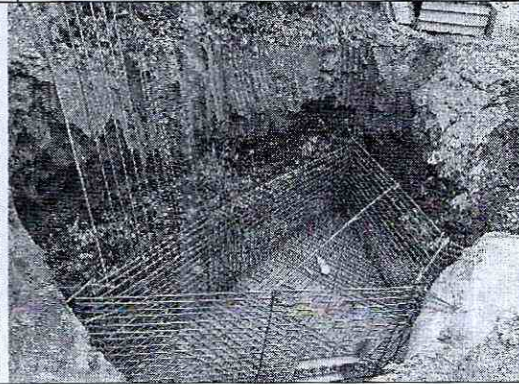



**IBAGÜE
VIBRA**





IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGÜERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



ACTIVIDADES DE OBRA 22 DE FEBRERO DEL 2023




UBICACIÓN DE ACTIVIDADES	ITEM CONTRACTUAL	ACTIVIDADES Y/O DESCRIPCIÓN DIARIA	PERSONAL EN OBRA POR PARTE DE CONTRATISTA	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN OBRA	NOVEDADES
K9+130 - K9+800	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZA EXCAVACION DE CARCAMO PARA TUBERIA SECTOR PUEBLO 17 SE REALIZA TRASLADO DE MATERIAL DE EXCAVACION Y TRITURADOS PARA LAS OBRAS DEL CARCAMO.	Edwin Oviedo: operador de pajarita - retro excavadora Édison Gutiérrez: operador de oruga Yiovany Cardozo: oficial Jeison Ruiz: ayudante Daniel Hernández: ayudante Fernando Cardoso: ayudante Luis Téllez - Sst	RETROEXCAVADORA 320 RETRO EXCAVADORA DE ORUGA	
					
K7+558.20 - K7+565.04	3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MPA, INCLUYE TRANSPORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN)	SE REALIZA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PROVISIONAL PARA POSTERIOR DEMOLICION DEL PUENTE EXISTENTE Y TERMINACION DEL ANCLAJE VS10 CON NUEVA	Simón Molano: maestro Simón Molano Ortiz: oficial Yesid Molano: maestro Yimy Salazar R: oficial Jonatan Villamil: ayudante	EQUIPO DE SOLDADURA A HERRAMIENTA MENOR	



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.
R.L. JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C. 5.829.473 DE IBAGUE.



		<p>APROBACION DE TRAZADO POR PARTE DEL IBAL, SE REALIZA FIGURADO DE ACEROS PARA ANCLAJE VS10</p>			
					
<p>K10+880 - K11+100</p>	<p>2.5.4 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO</p>	<p>SE REALIZA LIMPIEZA DE CUNETAS PERIMETRALES EN LOS TUNELES</p>	<p>Topógrafo Rodrigo Cardoso Andrés Calderón Ayudantes obra Ramiro Bernal Arsenio Acosta Operador Faustino Sarmiento Dos controladores viales María Fernanda Valdez Gerardo Chacón SST Leidy Rodríguez</p>	<p>RETRO EXCAVADO RA 310 RETRO EXCAVADO RA PAJARITA HERRAMIENTA MENOR</p>	<p>SE DETINEN ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN YA QUE NO HAY VOLQUETAS PARA CARGAR, EKL PARO DE TAXISTAS RESTRINGE EL PASO DE LAS VOLQUETAS.</p>
					



IBAGÜE
VIBRA



IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



K2+381.48	3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MPA, INCLUYE TRANSPORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN)	SE REALIZA FIGURADO E INSTALACION DE ACEROS PARA EL ANCLAJE PIH 040	ALVARO GOMEZ SUAREZ - AYUDANTE LUIS ALFONZO CASTAÑO - OFICIAL JULIO CARDENAS - OPERADOR MICHAEL SERGEY - CADENERO JOSE ORTIZ - CADENERO RUBEN DARIO HERRERA - AYUDANTE YEISON SANCHEZ - AYUDANTES OSCAR SANCHEZ - AYUDANTES NICOLAS PORTILLA - AYUDANTE WILLIAM TORRES - AYUDANTE JUAN CARLOS TORRES - AYUDANTE RICARDO GOMEZ - AYUDANTE FELIPE GAITAN - AYUDANTE JUAN CARLOS IBAÑES - AYUDANTE DAVID IBAÑEZ - AYUDANTE BRAYAN IBAÑEZ - AYUDANTE PAULA ALMONACAL - SST	HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA RETRO EXCAVADORA 320	
-----------	--	---	--	---	--



IBAQUE VIBRA



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBACUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



K3+053.62	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZA EXCAVACION DEL ANCLAJE PIH 028 CON MAQUINA Y PERSONAL DE APOYO PARA CONTROL VIAL	DAIRO PORTILLO - OFICIAL LUIS LOPEZ - AYUDANTE JONATHAN VERGARA - AYUDANTE ANTRES CALDERON - CADENERO ANA SOFIA LEON - TOPOGRAFA JHON ALEXANDER CANDIA - OPERADOR	RETRO EXCAVADO RA 320, PLANTA, PULIDORAS, HERRAMIENTA MENOR	
K3+008.21	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZA EXCAVACION DEL ANCLAJE PIH 048 CON MAQUINA Y PERSONAL DE APOYO PARA CONTROL VIAL	DAIRO PORTILLO - OFICIAL LUIS LOPEZ - AYUDANTE JONATHAN VERGARA - AYUDANTE ANTRES	RETRO EXCAVADO RA 320, PLANTA, PULIDORAS, HERRAMIENTA MENOR	



**IBAGUÉ
VIBRA**



IBAL

SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBACUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



CALDERON -
CADENERO
ANA SOFIA
LEON -
TOPOGRAFA
JHON
ALEXANDER
CANDIA -
OPERADOR



ACTIVIDADES DE OBRA 23 DE FEBRERO DEL 2023

UBICACIÓN DE ACTIVIDADES	ITEM CONTRACTUAL	ACTIVIDADES Y/O DESCRIPCIÓN DIARIA	PERSONAL EN OBRA POR PARTE DE CONTRATISTA	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN OBRA	NOVEDADES
K3+008.21	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZA EXCAVACION DEL ANCLAJE PIH 048 CON MAQUINA Y PERSONAL DE APOYO PARA CONTROL VIAL	DAIRO PORTILLO - OFICIAL LUIS LOPEZ - AYUDANTE JONATHAN VERGARA - AYUDANTE ANTRES CALDERON - CADENERO ANA SOFIA LEON - TOPOGRAFA JHON ALEXANDER CANDIA - OPERADOR	RETRO EXCAVADORA 320, PLANTA, PULIDORAS, HERRAMIENTA MENOR	



IBAQUE
VIBRA



IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.I JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



			K2+381.48	3.1.2.5I INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO DE 20,7 Mpa (3,000 PSI)	SE REALIZA FUNDIDA DE CONCRETO PARA EL ANCLAJE PIH 040	ALVARO GOMEZ SUAREZ - AYUDANTE LUIS ALFONZO CASTAÑO - OFICIAL JULIO CARDENAS - OPERADOR MICHAEL SERGEY - CADENERO JOSE ORTIZ - CADENERO RUBEN DARIO HERRERA - AYUDANTE YEISON SANCHEZ - AYUDANTES OSCAR SANCHEZ - AYUDANTES NICOLAS PORTILLA - AYUDANTE WILLIAM TORRES - AYUDANTE JUAN CARLOS TORRES - AYUDANTE RICARDO GOMEZ - AYUDANTE FELIPE GAITAN - AYUDANTE	HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA RETRO EXCAVADORA 320
--	--	--	-----------	---	---	---	--





**IBAGÜE
VIBRA**



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGÜERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.

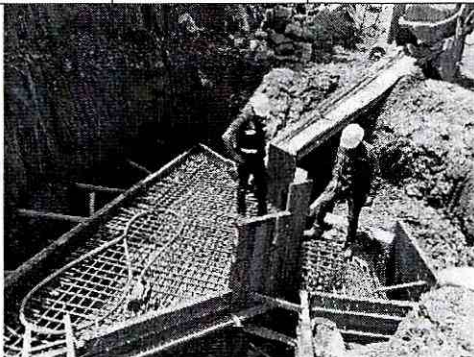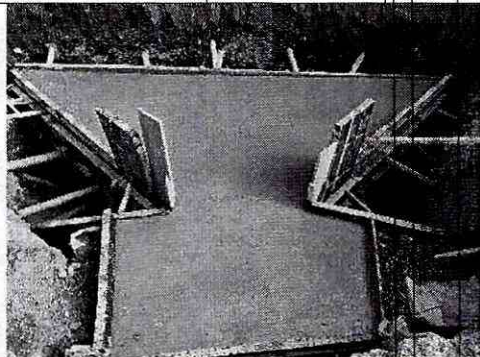

			<p>JUAN CARLOS IBAÑES - AYUDANTE DAVID IBAÑEZ - AYUDANTE BRAYAN IBAÑEZ - AYUDANTE PAULA ALMONACAL - SST</p>	
		 		
K1+304.40	<p>3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MPA, INCLUYE TRANSPORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN)</p>	<p>SE REALIZA EXCAVACION DEL ANCLAJE PIH 23 CON MAQUINA Y PERSONAL DE APOYO PARA CONTROL VIAL TAMBIEN SE REALIZA FIGURADO DE ACEROS PARA EL MISMO ANCLAJE</p>	<p>ALVARO GOMEZ SUAREZ - AYUDANTE LUIS ALFONZO CASTAÑO - OFICIAL JULIO CARDENAS - OPERADOR MICHAEL SERGEY - CADENERO JOSE ORTIZ - CADENERO RUBEN DARIO HERRERA - AYUDANTE YEISON SANCHEZ - AYUDANTES OSCAR SANCHEZ - AYUDANTES NICOLAS PORTILLA - AYUDANTE</p>	<p>HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA RETRO EXCAVADORA 320</p>




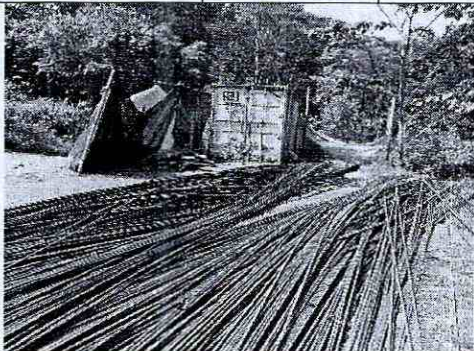
**IBAGUÉ
VIBRA**



IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.I JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



			WILLIAM TORRES - AYUDANTE JUAN CARLOS TORRES - AYUDANTE RICARDO GOMEZ - AYUDANTE FELIPE GAITAN - AYUDANTE JUAN CARLOS IBAÑES - AYUDANTE DAVID IBAÑEZ - AYUDANTE BRAYAN IBAÑEZ - AYUDANTE PAULA ALMONACAL - SST		
					
K7+558.20 - K7+565.04		SE REALIZA CONSTRUCCIO N Y TERMINACION DEL PUEnte PEATONAL PROVISIONAL, SE INSTALA SEÑALIZACION ADECUADA Y SE PONE EN FUNCIONAMIE NTO.	Simón Molano: maestro Simón Molano Ortiz: oficial Yesid Molano: maestro Yimy Salazar R: oficial Jonatan Villamil: ayudante	EQUIPO DE SOLDADUR A HERRAMIEN TA MENOR	




IBAGÜE
VIBRA




IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGÜERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.
R.L. JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C. 5.829.473 DE IBAGÜE.

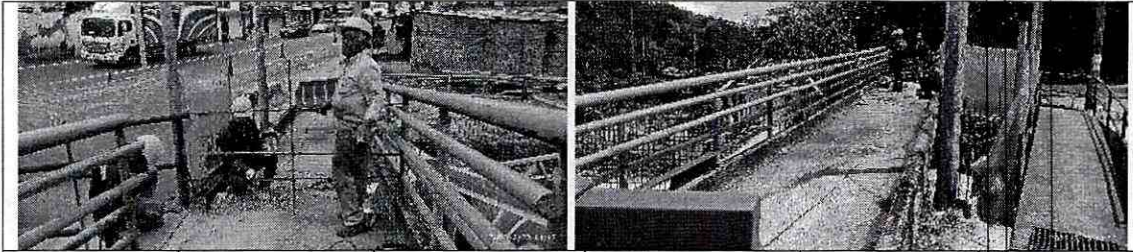

<p>K9+130 - K9+800</p>	<p>2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD</p>	<p>SE REALIZA EXCAVACION DE CARCAMO PARA TUBERIA SECTOR PUENTE 17 SE REALIZA TRASLADO DE MATERIAL DE EXCAVACION Y TRITURADOS PARA LAS OBRAS DEL CARCAMO.</p>	<p>Edwin Oviedo: operador de pajarita - retro excavadora</p> <p>Édison Gutiérrez: operador de oruga</p> <p>Yiovany Cardozo: oficial</p> <p>Jeison Ruíz: ayudante</p> <p>Daniel Hernández: ayudante</p> <p>Fernando Cardoso: ayu dante</p> <p>Luis Téllez - Sst</p>	<p>RETROEXCA VADORA 320 RETRO EXCAVADO RA DE ORUGA</p>	
----------------------------	---	--	--	--	--



<p>K10+880 - K11+100</p>	<p>2.5.4 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO</p>	<p>SE REALIZA DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO DEL TUNEL ADYACENTE AL TUNEL FALSO, SE REALIZA CARGUE Y RETIRO DE</p>	<p>Topógrafo Rodrigo Cardoso Andrés Calderón Ayudantes obra</p> <p>Ramiro Bernal Arsenio Acosta Operador</p>	<p>RETRO EXCAVADO RA 310 RETRO EXCAVADO RA PAJARITA HERRAMIE NTA MENOR</p>	
------------------------------	---	--	--	--	--
