



IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBACUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



K9+580 - K9+780	2.1.4.1 EXCAVACION A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZA LA EXCAVACION PARA ELABORACION DE TERRENO DE TRABAJO PARA LA MAQUINA E INICIO DE EXCAVACION PARA LA INSTALACION DE TUBERIA GRP 36"	TOPOGRAFO RODRIGO CARDOSO ANDRÉS CALDERÓN YIOVANY CARDOZO: OFICIAL JEISON RUIZ: AYUDANTE DANIEL HERNÁNDEZ: AYUDANTE FERNANDO CARDOSO: AY UDANTE LUIS TELLEZ - SST EDINSON GUTIÉRREZ: OPERADOR DE ORUGA	RETROEXCA VADORA 320 EQUIPO DE TOPOGRAFI A	
K1+304.40	3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MP A, INCLUYE TRANSPOR	SE REALIZA INSTALACION DE ACEROS Y FORMALETA PARA ANCLAJE PIH 023.	ALVARO GOMEZ SUAREZ - AYUDANTE LUIS ALFONZO CASTAÑO - OFICIAL JULIO CARDENAS - OPERADOR MICHAEL SERGEY -	HERRAMIEN TA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOM BA RETRO EXCAVADO RA 320	SE REALIZA CORRECCIO N DE ACEROS DE ESTE ANCLAJE YA QUE NO SE PRESENTABA LA INSTALACION DE ACEROS QUE RODEAN




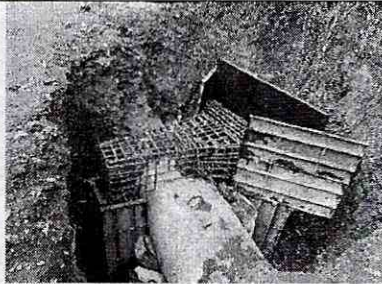
**IBA&UE
VIBRA**



IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



	TE, FIGURADO Y COLOCA CIÓN)		CADENERO JOSE ORTIZ - CADENERO RUBEN DARIO HERRERA - AYUDANTE YEISON SANCHEZ - AYUDANTES OSCAR SANCHEZ - AYUDANTES NICOLAS PORTILLA - AYUDANTE WILLIAM TORRES - AYUDANTE JUAN CARLOS TORRES - AYUDANTE RICARDO GOMEZ - AYUDANTE FELIPE GAITAN - AYUDANTE JUAN CARLOS IBAÑES - AYUDANTE DAVID IBAÑEZ - AYUDANTE BRAYAN IBAÑEZ - AYUDANTE PAULA ALMONACAL - SST		EL TUBO, POR ESTE MOTIVO SE FUNDE EL ANCLAJE CON RECUBRIMIEN TO COMPLETOD E LA TUBERIA
					
K1+159.12	3.3.1 ACERO DE	SE REALIZA INSTALACION DE	ALVARO GOMEZ SUAREZ	HERRAMIEN TA MENOR	



**IBAGÜE
VIBRA**



IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBACUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.

R.I JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.

C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



	<p>REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MP A, INCLUYE TRANSPORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN)</p>	<p>ACEROS Y FORMAleta PARA ANCLAJE PIH 020</p>	<p>- AYUDANTE LUIS ALFONZO CASTAÑO - OFICIAL JULIO CARDENAS - OPERADOR MICHAEL SERGEY - CADENERO JOSE ORTIZ - CADENERO RUBEN DARIO HERRERA - AYUDANTE YEISON SANCHEZ - AYUDANTES OSCAR SANCHEZ - AYUDANTES NICOLAS PORTILLA - AYUDANTE WILLIAM TORRES - AYUDANTE JUAN CARLOS TORRES - AYUDANTE RICARDO GOMEZ - AYUDANTE FELIPE GAITAN - AYUDANTE JUAN CARLOS IBAÑES - AYUDANTE DAVID IBAÑEZ - AYUDANTE BRAYAN IBAÑEZ - AYUDANTE PAULA ALMONACAL - SST</p>	<p>PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA RETRO EXCAVADORA 320</p>	
--	---	--	---	--	--







**IBA&UE
VIBRA**



IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBACUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.

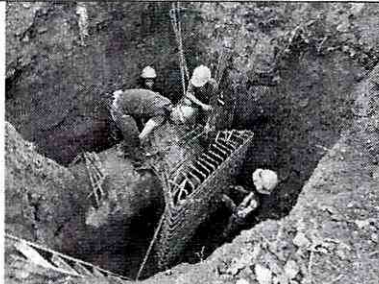

				
K2+901.95	3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MP A, INCLUYE TRANSPOR TE, FIGURADO Y COLOCA CIÓN)	SE REALIZA TRANSPORTE Y FIGURADO DE ACEROS PARA EL ANCLAJE PIH048	DAIRO PORTILLO - OFICIAL LUIS LOPEZ - AYUDANTE JONATHAN VERGARA - AYUDANTE ANTRES CALDERON - CADENERO ANA SOFIA LEON - TOPOGRAFA JHON ALEXANDER CANDIA - OPERADOR	RETRO EXCAVADO RA 320, PLANTA, PULIDORAS, HERRAMIE NTA MENOR
				
K1+391.11	2.1.4.1 EXCAVACI ÓN A MAQUINA A CUALQUIE R PROFUNDI DAD	SE REALIZA EXCAVACION DEL ANCLAJE PIH 025 CON MAQUINA Y PERSONAL DE APOYO PARA CONTROL VIAL SE ALISTA PARA FUNDIR SOLADO DE LIMPIEZA	ALVARO GOMEZ SUAREZ - AYUDANTE LUIS ALFONZO CASTAÑO - OFICIAL JULIO CARDENAS - OPERADOR MICHAEL SERGEY - CADENERO	HERRAMIE NTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOM BA RETRO EXCAVADO RA 320



**IBAGÜE
VIBRA**




IBAL

SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



			JOSE ORTIZ - CADENERO RUBEN DARIO HERRERA - AYUDANTE YEISON SANCHEZ - AYUDANTES OSCAR SANCHEZ - AYUDANTES NICOLAS PORTILLA - AYUDANTE WILLIAM TORRES - AYUDANTE JUAN CARLOS TORRES - AYUDANTE RICARDO GOMEZ - AYUDANTE FELIPE GAITAN - AYUDANTE JUAN CARLOS IBAÑES - AYUDANTE DAVID IBAÑEZ - AYUDANTE BRAYAN IBAÑEZ - AYUDANTE PAULA ALMONACAL - SST		
--	--	--	---	--	--

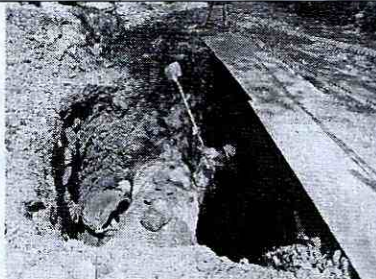

ACTIVIDADES DE OBRA 03 DE MARZO DEL 2023

**IBAL**SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOCONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.

UBICACIÓN DE ACTIVIDADES	ITEM CONTRACTUAL	ACTIVIDADES Y/O DESCRIPCIÓN DIARIA	PERSONAL EN OBRA POR PARTE DE CONTRATISTA	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN OBRA	NOVEDADES
PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA	2.1.1.1 EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE 0,00 A 2,00M	SE REALIZAN ACTIVIDADES DE EXCAVACION MANUAL PARA LAS ESTRUCTURAS DE LLEGADA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA POLA.	BERNULFO OSPINA - AYUDANTE OSCAR PEÑA - OFICIAL JESUS ARROYO - OFICIAL LUIS TELLEZ - SST	HERRAMIENTA MENOR	NO SE EVIDENCIA AVANCES DE OBRA YA QUE NO SE CUENTA CON MAQUINARIA O EQUIPO ADECUADO PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE ESTAN REALIZANDO
					
K9+580 - K9+780	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZA LA EXCAVACION PARA ELABORACION DE TERRENO DE TRABAJO PARA LA MAQUINA E INICIO DE EXCAVACION PARA LA INSTALACION DE TUBERIA GRP 36"	TOPOGRAFO RODRIGO CARDOSO ANDRÉS CALDERÓN YIOVANY CARDOZO: OFICIAL JEISON RUIZ: AYUDANTE DANIEL HERNÁNDEZ: AYUDANTE FERNANDO CARDOSO: AYUDANTE LUIS TELLEZ - SST EDINSON GUTIÉRREZ: OPERADOR DE ORUGA	RETROEXCAVADORA 320 EQUIPO DE TOPOGRAFIA	



IBAQUE VIBRA



IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.

R.I JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



K10+880 - K11+100	2.5.4 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO	SE REALIZA DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO DEL TUNEL SE REALIZA CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION	AYUDANTES OBRA RAMIRO BERNAL ARSENIO ACOSTA OPERADOR FAUSTINO SARMIENTO DOS CONTROLADO RES VIALES MARIA FERNANDA VALDEZ GERARDO CHACÓN SST LEIDY RODRÍGUEZ	MOTONIVEL ADORA RETRO EXCAVADO RA PAJARITA HERRAMIENTA MENOR	
K9+130 - K9+800	3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MP A,	SE REALIZA TRASLADO DE MATERIAL DE EXCAVACION, TRITURADOS Y ACEROS PARA LAS OBRAS DEL CARCAMO. SE REALIZA	EDWIN OVIEDO: OPERADOR DE PAJARITA - RETRO EXCAVADORA YIOVANY CARDOZO:	RETRO EXCAVADO RA DE LLANTA	





**IBAGÜE
VIBRA**



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.

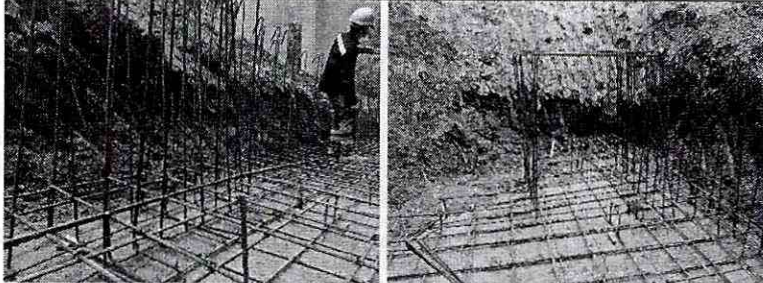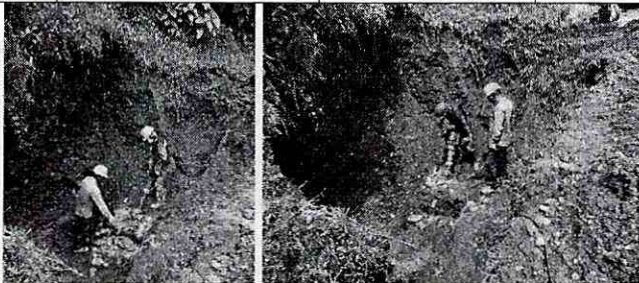

	INCLUYE TRANSPORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN)	INSTALACION DE ACEROS PARA EL CARCAMO.	OFICIAL JEISON RUIZ: AYUDANTE DANIEL HERNÁNDEZ: AYUDANTE FERNANDO CARDOSO: AYUDANTE LUIS TELLEZ - SST		
					
K3+053.62	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZA EXCAVACION Y DEMOLICION DE ROCAS DEL ANCLAJE PIH 028 CON MAQUINA Y PERSONAL DE APOYO PARA CONTROL VIAL	DAIRO PORTILLO - OFICIAL LUIS LOPEZ - AYUDANTE JONATHAN VERGARA - AYUDANTE ANTRES CALDERON - CADENERO ANA SOFIA LEON - TOPOGRAFA JHON ALEXANDER CANDIA - OPERADOR	RETRO EXCAVADO RA 320, PLANTA, PULIDORAS, HERRAMIENTA MENOR, DEMOLEDO R ELECTRICO	
					
K1+391.11	2.1.4.1 EXCAVACION	SE REALIZA FIGURADO Y	ALVARO GOMEZ SUAREZ	HERRAMIENTA MENOR	



IBAL
SA ESP OFICIAL
 EMPRESA IBAGUERENA DE
 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
 R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
 C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



	<p>ÓN A MAQUINA A CUALQUIE R PROFUNDI DAD</p>	<p>AMARRE DE ACEROS DEL ANCLAJE PIH 025 CON PERSONAL DE APOYO PARA CONTROL VIAL</p>	<p>- AYUDANTE LUIS ALFONZO CASTAÑO - OFICIAL JULIO CARDENAS - OPERADOR MICHAEL SERGEY - CADENERO JOSE ORTIZ - CADENERO RUBEN DARIO HERRERA - AYUDANTE YEISON SANCHEZ - AYUDANTES OSCAR SANCHEZ - AYUDANTES NICOLAS PORTILLA - AYUDANTE WILLIAM TORRES - AYUDANTE JUAN CARLOS TORRES - AYUDANTE RICARDO GOMEZ - AYUDANTE FELIPE GAITAN - AYUDANTE JUAN CARLOS IBAÑES - AYUDANTE DAVID IBAÑEZ - AYUDANTE BRAYAN IBAÑEZ - AYUDANTE PAULA ALMONACAL - SST</p>	<p>PLANTA ELECTRICA MOTOBOM BA RETRO EXCAVADO RA 320</p>	
--	---	--	--	--	--



**IBAGÜE
VIBRA**



IBAL

LA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBACUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.

R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.

C.C 5.829.473 DE IBAGUE.




K1+304.40	3.1.2.5I INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO DE 20,7 MPA (3,000 PSI)	SE REALIZA FUNDIDA DEL ANCLAJE PIH 023 CON MAQUINA Y PERSONAL DE APOYO PARA CONTROL VIAL	ALVARO GOMEZ SUAREZ - AYUDANTE LUIS ALFONZO CASTAÑO - OFICIAL JULIO CARDENAS - OPERADOR MICHAEL SERGEY - CADENERO JOSE ORTIZ - CADENERO RUBEN DARIO HERRERA - AYUDANTE YEISON SANCHEZ - AYUDANTES OSCAR SANCHEZ - AYUDANTES NICOLAS PORTILLA - AYUDANTE WILLIAM TORRES - AYUDANTE JUAN CARLOS TORRES - AYUDANTE RICARDO GOMEZ - AYUDANTE FELIPE GAITAN - AYUDANTE JUAN CARLOS IBAÑES -	HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA RETRO EXCAVADORA 320	



IBAL
SA ESP OFICIAL
 EMPRESA IBAGUERENA DE
 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
 R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
 C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



			AYUDANTE DAVID IBAÑEZ - AYUDANTE BRAYAN IBAÑEZ - AYUDANTE PAULA ALMONACAL - SST		
					
K1+159.12	3.1.2.5I INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO DE 20,7 MPA (3,000 PSI)	SE REALIZA FUNDIDA DEL ANCLAJE PIH 020 CON MAQUINA Y PERSONAL DE APOYO PARA CONTROL VIAL	ALVARO GOMEZ SUAREZ - AYUDANTE LUIS ALFONZO CASTAÑO - OFICIAL JULIO CARDENAS - OPERADOR MICHAEL SERGEY - CADENERO JOSE ORTIZ - CADENERO RUBEN DARIO HERRERA - AYUDANTE YEISON SANCHEZ - AYUDANTES OSCAR SANCHEZ - AYUDANTES NICOLAS PORTILLA - AYUDANTE WILLIAM TORRES - AYUDANTE JUAN CARLOS	HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA RETRO EXCAVADORA 320	




**IBAGUÉ
VIBRA**



IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



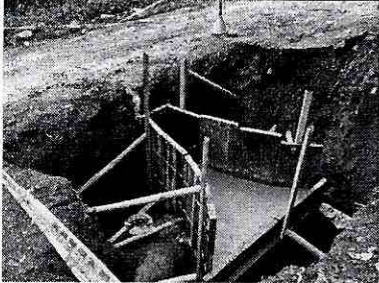



			TORRES - AYUDANTE RICARDO GOMEZ - AYUDANTE FELIPE GAITAN - AYUDANTE JUAN CARLOS IBAÑES - AYUDANTE DAVID IBAÑEZ - AYUDANTE BRAYAN IBAÑEZ - AYUDANTE PAULA ALMONACAL - SST		
					
ACTIVIDADES DE OBRA 04 DE MARZO DEL 2023					
UBICACIÓN DE ACTIVIDADES	ITEM CONTRACTUAL	ACTIVIDADES Y/O DESCRIPCIÓN DIARIA	PERSONAL EN OBRA POR PARTE DE CONTRATISTA	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN OBRA	NOVEDADES
K9+580 - K9+780	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINARIA CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZA LA EXCAVACION PARA ELABORACION DE TERRENO DE TRABAJO PARA LA MAQUINA E INICIO DE EXCAVACION PARA LA INSTALACION DE TUBERIA GRP 36"	TOPOGRAFO RODRIGO CARDOSO ANDRÉS CALDERÓN YIOVANY CARDOZO: OFICIAL JEISON RUIZ: AYUDANTE DANIEL HERNÁNDEZ: AYUDANTE FERNANDO CARDOSO: AYUDANTE	RETROEXCAVADORA 320 EQUIPO DE TOPOGRAFIA	SE IBA A REALIZAR LA INSTALACION DEL PRIMER TUBO PERO SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS Y SE DETIENEN LAS ACTIVIDADES.



IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.

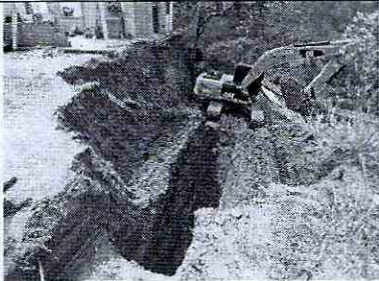


			LUIS TELLEZ - SST EDINSON GUTIÉRREZ: OPERADOR DE ORUGA		
					
K9+130 - K9+800	3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MP A, INCLUYE TRANSPOR TE, FIGURADO Y COLOCA CIÓN)	SE REALIZA TRASLADO DE MATERIAL DE EXCAVACION, TRITURADOS Y ACEROS PARA LAS OBRAS DEL CARCAMO. SE REALIZA INSTALACION DE ACEROS PARA EL CARCAMO.	EDWIN OVIEDO: OPERADOR DE PAJARITA - RETRO EXCAVADORA YIOVANY CARDOZO: OFICIAL JEISON RUIZ: AYUDANTE DANIEL HERNÁNDEZ: AYUDANTE FERNANDO CARDOSO: AY UDANTE LUIS TELLEZ - SST	RETRO EXCAVADO RA DE LLANTA	
					
K7+558.20 - K7+565.04	3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706	SE REALIZA FIGURADO Y AMARRE DE ACEROS PARA LA RECONSTRUCCION	SIMÓN MOLANO: MAESTRO SIMÓN MOLANO ORTIZ: OFICIAL	HERRAMIE NTA MENOR	USANDO LA MISMA FIGURACION DEL PUEBTE ORIGINAL SE REALIZA LA



IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



	GRADO 60 FY=420MP A, INCLUYE TRANSPOR TE, FIGURADO Y COLOCA CIÓN)	DEL PUENTE PEATONAL.	YESID MOLANO: MAESTRO YIMY SALAZAR R: OFICIAL JHONATAN VILLAMIL: AYUDANTE JAIDER PEÑUELA: AYUDANTE JOHAN ROBAYO: AYUDANTE NESTOR BONILLA: AYUDANTE MARLON RAMIREZ: AYUDANTE		INSTALACION DE ACEROS PARA LA RECONSTRUC CION, SE REALIZA CONSTRUCCI ON DE COLUMNAS DE APOYO CON ZAPATAS PARA LA ZONA ALTA Y MUROS DE ELEVACION PARA LA ZONA BAJA DEL PUENTE PEATONAL.
					
K2+901.95	3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MP A, INCLUYE TRANSPOR TE, FIGURADO Y COLOCA CIÓN)	SE REALIZA FIGURADO Y AMARRE DE ACEROS PARA EL ANCLAJE PIH048	DAIRO PORTILLO - OFICIAL LUIS LOPEZ - AYUDANTE JONATHAN VERGARA - AYUDANTE ANTRES CALDERON - CADENERO ANA SOFIA LEON - TOPOGRAFA JHON ALEXANDER CANDIA - OPERADOR	RETRO EXCAVADO RA 320, PLANTA, PULIDORAS, HERRAMIE NTA MENOR	



IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.I JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



K10+880 - K11+100		SE REALIZA NIVELACION Y RETIRO DEL BARRO QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TUNEL.	AYUDANTES OBRA RAMIRO BERNAL ARSENIO ACOSTA OPERADOR FAUSTINO SARMIENTO DOS CONTROLADO RES VIALES MARIA FERNANDA VALDEZ GERARDO CHACÓN SST LEIDY RODRÍGUEZ	VIBROCOM PACTADOR MOTONIVEL ADORA RETRO EXCAVADO RA PAJARITA HERRAMIENTA MENOR	
K1+391.11	3.1.2.5I INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO DE 20,7 MPA (3,000 PSI)	SE REALIZA FUNDIDA DEL ANCLAJE PIH 025 CON MAQUINA Y PERSONAL DE APOYO PARA CONTROL VIAL	ALVARO GOMEZ SUAREZ - AYUDANTE LUIS ALFONZO CASTAÑO - OFICIAL JULIO CARDENAS - OPERADOR	HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA RETRO EXCAVADO RA 320	



**IBAGUÉ
VIBRA**





IBAL

SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGUEREÑA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.
R.L. JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C. 5.829.473 DE IBAGUE.

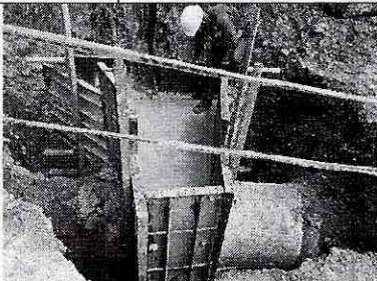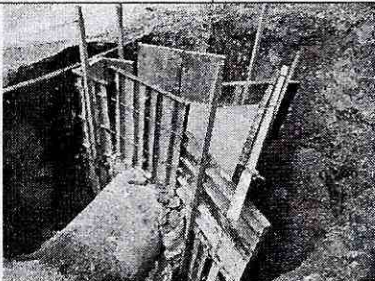

			<p>MICHAEL SERGEY - CADENERO JOSE ORTIZ - CADENERO RUBEN DARIO HERRERA - AYUDANTE YEISON SANCHEZ - AYUDANTES OSCAR SANCHEZ - AYUDANTES NICOLAS PORTILLA - AYUDANTE WILLIAM TORRES - AYUDANTE JUAN CARLOS TORRES - AYUDANTE RICARDO GOMEZ - AYUDANTE FELIPE GAITAN - AYUDANTE JUAN CARLOS IBAÑES - AYUDANTE DAVID IBAÑEZ - AYUDANTE BRAYAN IBAÑEZ - AYUDANTE PAULA ALMONACAL - SST</p>	
				





IBAQUE VIBRA



IBALE
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.I JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



ACTIVIDADES DE OBRA 06 DE MARZO DEL 2023					
UBICACIÓN DE ACTIVIDADES	ITEM CONTRACTUAL	ACTIVIDADES Y/O DESCRIPCIÓN DIARIA	PERSONAL EN OBRA POR PARTE DE CONTRATISTA	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN OBRA	NOVEDADES
K10+880 - K11+100	2.5.4 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO	SE REALIZA DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO DEL TUNEL SE REALIZA CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION, SE REALIZA EXCAVACION PARA CARCAMO AL INICIO DE TUNEL 1 PARA DESVIAR LAS AGUAS QUE ESTAN ENTRANDO AL TUNEL.	OPERADOR FAUSTINO SARMIENTO DOS CONTROLADORES VIALES MARIA FERNANDA VALDEZ GERARDO CHACÓN OPERADOR MOTONIVELADORA ÁLVARO CÉSPEDES VIBROCOMPACTADOR ANDRÉS GARZÓN TOPOGRAFÍA ANA SOFÍA LEÓN JOSÉ ORTIZ EDDY CARDOSO JENIFER CARDOSO	VIBROCOMPACTADOR. MOTONIVELADORA RETROEXCAVADORA PAJARITA HERRAMIENTA MENOR	
		 			
PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA	2.1.1.1 EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE 0,00 A 2,00M	SE REALIZAN ACTIVIDADES DE EXCAVACION MANUAL PARA LAS ESTRUCTURAS DE LLEGADA A LA PLANTA DE	BERNULFO OSPINA - AYUDANTE OSCAR PEÑA - OFICIAL JESUS ARROYO - OFICIAL LUIS TELLEZ - SST	HERRAMIENTA MENOR	NO SE EVIDENCIA AVANCES DE OBRA YA QUE NO SE CUENTA CON MAQUINARIA O EQUIPO







**IBAGÜE
VIBRA**



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBACUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



		TRATAMIENTO DE LA POLA.			ADECUADO PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE ESTAN REALIZANDO
					
K2+901.95		SE REALIZA LIMPIEZA DE LA ZONA DE EXCAVACION POR DERRUMBE QUE SE PRESENTA EL FIN DE SEMANA POR FUERTES LLUVIAS ANCLAJE PIH 048	DAIRO PORTILLO - OFICIAL JONATHAN VERGARA - OFICIAL WILSON GUERRA - AYUDANTE MICHAEL GRANADOS - CADENERO MANUEL RODRIGUEZ - CADENERO JHON ALEXANDER CANDIA - OPERADOR	RETRO EXCAVADORA 320, PLANTA, PULIDORAS, HERRAMIENTA MENOR	
					
K9+580 - K9+780	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDI	SE REALIZA LA EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERIA GRP 36"	JEISON RUIZ - AYUDANTE CARLOS VARGAS - AYUDANTE CARLOS OROZCO - AYUDANTE	RETROEXCAVADORA 320 EQUIPO DE TOPOGRAFIA	



IBAL


SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.

R.I JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.

C.C 5.829.473 DE IBAGUE.

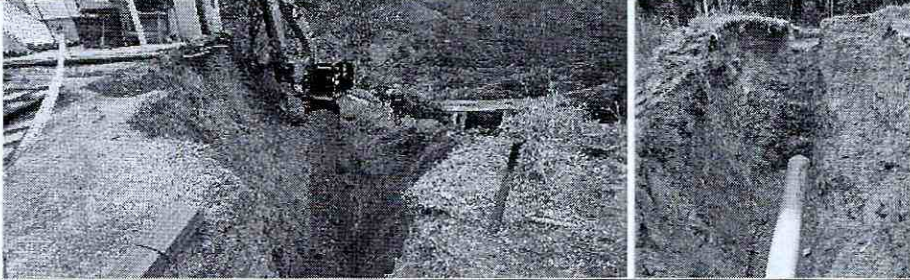

	DAD 4.17.5 INSTALACION TUBERIA GRP DE 32" A 36"		OPERADOR EDUIN OVIEDO TOPOGRAFIA RODRIGO CARDOSO ANDRÉS CALDERÓN AYUDANTES OBRA ARSENIO ACOSTA DANIEL HERNÁNDEZ GIOVANI CARDOSO - OFICIAL OPERADOR EDISON GUTIÉRREZ SST LEIDY RODRÍGUEZ		
					
K9+130 - K9+800	3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MP A, INCLUYE TRANSPOR TE, FIGURADO Y COLOCA CIÓN)	SE REALIZA TRASLADO DE MATERIAL DE EXCAVACION, TRITURADOS Y ACEROS PARA LAS OBRAS DEL CARCAMO. SE REALIZA INSTALACION DE ACEROS PARA EL CARCAMO.	EDWIN OVIEDO: OPERADOR DE PAJARITA - RETRO EXCAVADORA YIOVANY CARDOZO: OFICIAL JEISON RUIZ - AYUDANTE CARLOS VARGAS - AYUDANTE CARLOS OROZCO -	RETRO EXCAVADO RA DE LLANTA	SE REALIZALIMPI EZA DE ACEROS POR DERRUMBE QUE SE PRESENTA EL FIN DE SEMANA POR LAS FUERTES LLUVIAS



**IBAGÜE
VIBRA**



IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGÜERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



			AYUDANTE LUIS TELLEZ - SST		
K7+558.20 - K7+565.04	3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MP A, INCLUYE TRANSPOR TE, FIGURADO Y COLOCA CIÓN)	SE REALIZA FIGURADO Y AMARRE DE ACEROS PARA LA RECONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL.	SIMÓN MOLANO: MAESTRO SIMÓN MOLANO ORTIZ: OFICIAL YESID MOLANO: MAESTRO YIMY SALAZAR R: OFICIAL JHONATAN VILLAMIL: AYUDANTE JAIDER PEÑUELA: AYUDANTE JOHAN ROBAYO: AYUDANTE NESTOR BONILLA: AYUDANTE MARLON RAMIREZ: AYUDANTE	HERRAMIE NTA MENOR	USANDO LA MISMA FIGURACION DEL PUENTE ORIGINAL SE REALIZA LA INSTALACION DE ACEROS PARA LA RECONSTRUC CION, SE REALIZA CONSTRUCCI ON DE COLUMNAS DE APOYO CON ZAPATAS PARA LA ZONA ALTA Y MUROS DE ELEVACION PARA LA ZONA BAJA DEL PUENTE PEATONAL.
K1+304.40	3.1.2.5I INSTALACI ON Y SUMINISTR O DE CONCRET	SE REALIZA DESENCOFRADO DEL ANCLAJE PIH 023 CON MAQUINA Y PERSONAL DE	YEISON SANCHEZ - AYUDANTES OSCAR SANCHEZ - AYUDANTES	HERRAMIE NTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOM BA	DIFICULTADES CON LA ACTIVIDAD POR DERRUMBES EN LA ZONA



IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.I JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



	O DE 20,7 MPA (3.000 PSI)	APOYO PARA CONTROL VIAL	LUIS ALFONZO CASTAÑO - OFICIAL NICOLAS PORTILLA - AYUDANTE RUBEN DARIO HERRERA - AYUDANTE WILLIAM TORRES - AYUDANTE JUAN CARLOS TORRES - AYUDANTE RICARDO GOMEZ - AYUDANTE FELIPE GAITAN - AYUDANTE JAHN CARLOS IBAÑES - AYUDANTE DAVID IBAÑEZ - AYUDANTE BRAYAN IBAÑEZ - AYUDANTE ALVARO GOMEZ SUAREZ - AYUDANTE SERGIO MIRANDA - AYUDANTE JULIO CARDENAS - OPERADOR MICHAEL SERGEY - CADENERO JOSE ORTIZ - CADENERO PAULA ALMONACID - SST	RETRO EXCAVADO RA 320	POR FUERTES LLUVIAS DURANTE EL FIN DE SEMANA
--	---------------------------------	----------------------------	---	-----------------------------	--




**IBA&UE
VIBRA**



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBACUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.

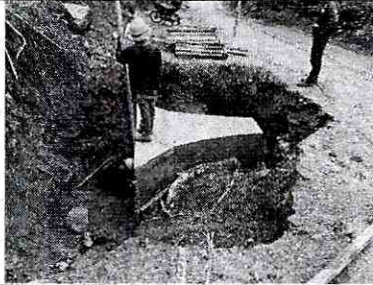

<p>K1+159.12</p>	<p>3.1.2.5I INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO DE 20,7 MPA (3,000 PSI)</p>	<p>SE REALIZA DESENCOFRADO DEL ANCLAJE PIH 020 CON MAQUINA Y PERSONAL DE APOYO PARA CONTROL VIAL</p>	<p>YEISON SANCHEZ - AYUDANTES OSCAR SANCHEZ - AYUDANTES LUIS ALFONZO CASTAÑO - OFICIAL NICOLAS PORTILLA - AYUDANTE RUBEN DARIO HERRERA - AYUDANTE WILLIAM TORRES - AYUDANTE JUAN CARLOS TORRES - AYUDANTE RICARDO GOMEZ - AYUDANTE FELIPE GAITAN - AYUDANTE JAHN CARLOS IBAÑES - AYUDANTE DAVID IBAÑEZ - AYUDANTE BRAYAN IBAÑEZ - AYUDANTE ALVARO GOMEZ SUAREZ - AYUDANTE SERGIO MIRANDA -</p>	<p>HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA RETRO EXCAVADORA 320</p>	<p>DIFICULTADES CON LA ACTIVIDAD POR DERRUMBES EN LA ZONA POR FUERTES LLUVIAS DURANTE EL FIN DE SEMANA</p>
------------------	--	--	--	--	--



**IBAGÜE
VIBRA**



IBAL
S.A ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



			AYUDANTE JULIO CARDENAS - OPERADOR MICHAEL SERGEY - CADENERO JOSE ORTIZ - CADENERO PAULA ALMONACID - SST		
--	--	--	---	--	--



ACTIVIDADES DE OBRA 07 DE MARZO DEL 2023

UBICACIÓN DE ACTIVIDADES	ITEM CONTRACTUAL	ACTIVIDADES Y/O DESCRIPCIÓN DIARIA	PERSONAL EN OBRA POR PARTE DE CONTRATISTA	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN OBRA	NOVEDADES
VIA ENTRE LOS TUNELES		SE REALIZA VISITA TECNICA DEL IBAL SE IDENTIFICAN PUNTOS CRITICOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA ZONA Y SE SOLICITA AL CONTRATISTA TRABAJAR EN LA INSTALACION DE LA TUBERIA INTERNA DE LOS TUNELES PARA AGILIZAR LAS ACTIVIDADES.	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IBAL, CONTRATISTA E INTERVENTORIA		SE SOLICITAN TRABAJOS NOCTURNOS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LAS ACTIVIDADES DE LOS TUNELES.



**IBAGÜE
VIBRA**



IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



<p>K9+130 - K9+800</p>		<p>SE REALIZA LIMPIEZA DE ACEROS Y ZONA POR DERRUMBE, SE REALIZA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA FUNDIDA DE PLACA</p>	<p>EDWIN OVIEDO: OPERADOR DE PAJARITA - RETRO EXCAVADORA</p> <p>YIOVANY CARDOZO: OFICIAL JEISON RUIZ - AYUDANTE CARLOS VARGAS - AYUDANTE CARLOS OROZCO - AYUDANTE LUIS TELLEZ - SST</p>	<p>RETRO EXCAVADORA DE LLANTA</p>	<p>SE REALIZALIMPIEZA DE ACEROS POR DERRUMBE QUE SE PRESENTA EL FIN DE SEMANA POR LAS FUERTES LLUVIAS</p>
<p>K7+558.20 - K7+565.04</p>	<p>3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MP A, INCLUYE TRANSPORTE, FIGURADO</p>	<p>SE REALIZA FIGURADO Y AMARRE DE ACEROS PARA LA RECONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL.</p>	<p>SIMÓN MOLANO: MAESTRO SIMÓN MOLANO ORTIZ: OFICIAL YESID MOLANO: MAESTRO YIMY SALAZAR R: OFICIAL JHONATAN VILLAMIL:</p>	<p>HERRAMIENTA MENOR</p>	<p>USANDO LA MISMA FIGURACION DEL PUENTE ORIGINAL SE REALIZA LA INSTALACION DE ACEROS PARA LA RECONSTRUCCION, SE REALIZA CONSTRUCCION</p>





**IBAGÜE
VIBRA**



IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



	Y COLOCA CIÓN)		AYUDANTE JAIDER PEÑUELA: AYUDANTE JOHAN ROBAYO: AYUDANTE NESTOR BONILLA: AYUDANTE MARLON RAMIREZ: AYUDANTE		ON DE COLUMNAS DE APOYO CON ZAPATAS PARA LA ZONA ALTA Y MUROS DE ELEVACION PARA LA ZONA BAJA DEL PUENTE PEATONAL.
					
K9+580 - K9+780	2.1.4.1 EXCAVACI ÓN A MAQUINA A CUALQUIE R PROFUNDI DAD 4.17.5 INSTALACI ON TUBERIA GRP DE 32" A 36"	SE REALIZA LA EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERIA GRP 36"	JEISON RUIZ - AYUDANTE CARLOS VARGAS - AYUDANTE CARLOS OROZCO - AYUDANTE OPERADOR EDUIN OVIEDO TOPOGRAFIA RODRIGO CARDOSO ANDRÉS CALDERÓN AYUDANTES OBRA ARSENIO ACOSTA DANIEL HERNÁNDEZ GIOVANI CARDOSO - OFICIAL OPERADOR EDISON GUTIÉRREZ SST	RETROEXCA VADORA 320 EQUIPO DE TOPOGRAFI A	



IBAGÜE VIBRA



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.
R.L. JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C. 5.829.473 DE IBAGÜE.



			LEIDY RODRÍGUEZ		
VEREDA ENTRE TUNEL FALSO Y TUNEL 1		SE REALIZA ARREGLO DE VIA CON MOTO NIVELADORA EN LA VEREDA PARA TRANSPORTE DE MATERIALES.	OPERADOR MOTONIVELADORA ÁLVARO CÉSPEDES	MOTONIVELADORA	
K10+880 - K11+100	2.5.4 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO	SE REALIZA DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO DEL TUNEL SE REALIZA CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION, SE REALIZA EXCAVACION PARA CARCAMO AL INICIO DE TUNEL 1 PARA DESVIAR LAS AGUAS QUE ESTAN ENTRANDO AL TUNEL.	OPERADOR FAUSTINO SARMIENTO DOS CONTROLADOS VIALES MARIA FERNANDA VALDEZ GERARDO CHACÓN VIBROCOMPACTADOR ANDRÉS GARZÓN TOPOGRAFÍA ANA SOFÍA LEÓN JOSÉ ORTIZ EDDY CARDOSO JENIFER CARDOSO	VIBROCOMPACTADOR. RETRO EXCAVADORA PAJARITA HERRAMIENTA MENOR	



IBAQUE VIBRA



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.







MORROCHUZO		SE REALIZA VISITA POR PARTE DE LOS INGENIEROS DE OTEK Y SE REALIZA REVISION DE LA TUBERIA A INSTALAR EN EL SECTOR DE MORROCHUZO	PERSONAL DE OTEK, CONTRATISTA E INTERVENTORIA	SE SOLICITA AL CONTRATISTA NO USAR UNO DE LOS TUBOS HASTA QUE SE REALICE EL ARREGLO DEL ESPIGO YA QUE PRESENTA DELAMINACION.
K10+880 - K11+100	2.5.4 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO	SE REALIZA DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO DEL TUNEL SE REALIZA CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION, SE REALIZA EXCAVACION PARA CARCAMO AL INICIO DE TUNEL 1 PARA DESVIAR LAS AGUAS QUE ESTAN ENTRANDO AL TUNEL.	OPERADOR FAUSTINO SARMIENTO DOS CONTROLADORES VIALES MARIA FERNANDA VALDEZ GERARDO CHACÓN VIBROCOMPACTADOR ANDRÉS GARZÓN TOPOGRAFÍA ANA SOFÍA LEÓN JOSÉ ORTIZ EDDY	VIBROCOMPACTADOR. RETRO EXCAVADORA PAJARITA HERRAMIENTA MENOR



IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.





			CARDOSO JENIFER CARDOSO		
					
PLANTA DE TRATAMIE NTO LA POLA	2.1.1.1 EXCAVACI ONES EN MATERIAL COMÚN DE 0,00 A 2,00M	SE REALIZAN ACTIVIDADES DE EXCAVACION MANUAL PARA LAS ESTRUCTURAS DE LLEGADA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA POLA.	BERNULFO OSPINA - AYUDANTE OSCAR PEÑA - OFICIAL JESUS ARROYO - OFICIAL LUIS TELLEZ - SST	HERRAMIE NTO MENOR	NO SE EVIDENCIA AVANCES DE OBRA YA QUE NO SE CUENTA CON MAQUINARIA O EQUIPO ADECUADO PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE ESTAN REALIZANDO
					
K3+053.62	3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MP A, INCLUYE TRANSPOR TE, FIGURADO Y COLOCA CIÓN)	SE REALIZA INSTALACION Y FIGURADO DE ACEROS DEL ANCLAJE PIH 028 CON MAQUINA Y PERSONAL DE APOYO PARA CONTROL VIAL	YEISON SANCHEZ - AYUDANTES OSCAR SANCHEZ - AYUDANTES LUIS ALFONZO CASTAÑO - OFICIAL NICOLAS PORTILLA - AYUDANTE RUBEN DARIO HERRERA - AYUDANTE WILLIAM	RETRO EXCAVADO RA 320, PLANTA, PULIDORAS, HERRAMIE NTO MENOR, DEMOLEDO R ELECTRICO	



IBAL
SA ESP OFICIAL
 EMPRESA IBAGUERENA DE
 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
 R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
 C.C 5.829.473 DE IBAGUE.

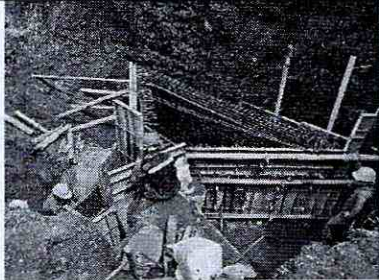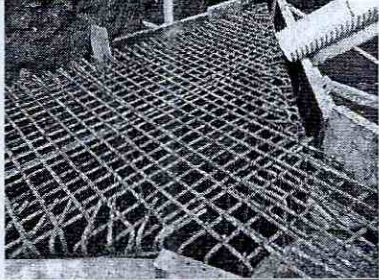

			TORRES - AYUDANTE JUAN CARLOS TORRES - AYUDANTE RICARDO GOMEZ - AYUDANTE FELIPE GAITAN - AYUDANTE JAHN CARLOS IBAÑES - AYUDANTE DAVID IBAÑEZ - AYUDANTE BRAYAN IBAÑEZ - AYUDANTE ALVARO GOMEZ SUAREZ - AYUDANTE SERGIO MIRANDA - AYUDANTE JULIO CARDENAS - OPERADOR MICHAEL SERGEY - CADENERO JOSE ORTIZ - CADENERO PAULA ALMONACID - SST		
					
K2+901.95		SE REALIZA LIMPIEZA DE LA ZONA DE EXCAVACION POR	DAIRO PORTILLO - OFICIAL JONATHAN	RETRO EXCAVADO RA 320, PLANTA,	





**IBAGÜE
VIBRA**



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGÜERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGÜE.



		DERRUMBE QUE SE PRESENTA EL FIN DE SEMANA POR FUERTES LLUVIAS ANCLAJE PIH 048	VERGARA - OFICIAL WILSON GUERRA - AYUDANTE MICHAEL GRANADOS - CADENERO MANUEL RODRIGUEZ - CADENERO JHON ALEXANDER CANDIA - OPERADOR	PULIDORAS, HERRAMIENTA MENOR	
					
ACTIVIDADES DE OBRA 08 DE MARZO DEL 2023					
UBICACIÓN DE ACTIVIDADES	ITEM CONTRACTUAL	ACTIVIDADES Y/O DESCRIPCIÓN DIARIA	PERSONAL EN OBRA POR PARTE DE CONTRATISTA	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN OBRA	NOVEDADES
K9+580 - K9+780	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINARIA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZA LA EXCAVACION PARA LA INSTALACION DE TUBERIA GRP 36"	JEISON RUIZ - AYUDANTE CARLOS VARGAS - AYUDANTE CARLOS OROZCO - AYUDANTE OPERADOR EDUIN OVIEDO TOPOGRAFIA RODRIGO CARDOSO ANDRÉS CALDERÓN AYUDANTES OBRA ARSENIO ACOSTA	RETROEXCAVADORA 320 EQUIPO DE TOPOGRAFIA	



IBAL
SA ESP OFICIAL
 EMPRESA IBAGUERENA DE
 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
 R.I JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
 C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



			DANIEL HERNÁNDEZ GIOVANI CARDOSO - OFICIAL OPERADOR EDISON GUTIÉRREZ SST LEIDY RODRÍGUEZ		
K7+558.20 - K7+565.04	3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MP A, INCLUYE TRANSPOR TE, FIGURADO Y COLOCA CIÓN)	SE REALIZA FIGURADO Y AMARRE DE ACEROS PARA LA RECONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL.	SIMÓN MOLANO: MAESTRO SIMÓN MOLANO ORTIZ: OFICIAL YESID MOLANO: MAESTRO YIMY SALAZAR R: OFICIAL JHONATAN VILLAMIL: AYUDANTE JAIDER PEÑUELA: AYUDANTE JOHAN ROBAYO: AYUDANTE NESTOR BONILLA: AYUDANTE MARLON RAMIREZ: AYUDANTE	HERRAMIE NTA MENOR	



**IBAGÜE
VIBRA**



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.





K10+880 - K11+100	2.5.4 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO	SE REALIZA EXCAVACION PARA CARCAMO AL INICIO DE TUNEL 1 PARA DESVIAR LAS AGUAS QUE ESTAN ENTRANDO AL TUNEL. REALIZAN TOPOGRAFIA DE LOS TUNELES PARA REPLANTEAR ESTRUCTURAS ADECUADAMENTE	OPERADOR FAUSTINO SARMIENTO DOS CONTROLADO RES VIALES MARIA FERNANDA VALDEZ GERARDO CHACÓN VIBROCOMPACTADOR ANDRÉS GARZÓN TOPOGRAFÍA ANA SOFÍA LEÓN JOSÉ ORTIZ EDDY CARDOSO JENIFER CARDOSO	VIBROCOMPACTADOR. RETRO EXCAVADORA PAJARITA HERRAMIENTA MENOR	
K9+130 - K9+800		SE REALIZA LIMPIEZA DE ACEROS Y ZONA POR DERRUMBE, SE REALIZA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA	EDWIN OVIEDO: OPERADOR DE PAJARITA - RETRO EXCAVADORA	RETRO EXCAVADORA DE LLANTA	



IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



		FUNDIDA DE PLACA	YIOVANY CARDOZO: OFICIAL JEISON RUIZ - AYUDANTE CARLOS VARGAS - AYUDANTE CARLOS OROZCO - AYUDANTE LUIS TELLEZ - SST		
					
K1+575.97	3.1.2.5I INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO DE 20,7 MPA (3.000 PSI)	SE REALIZA FUNDIDA DEL ANCLAJE PIH 028 CON PERSONAL DE APOYO PARA CONTROL VIAL	ALVARO GOMEZ SUAREZ - AYUDANTE LUIS ALFONZO CASTAÑO - OFICIAL JULIO CARDENAS - OPERADOR MICHAEL SERGEY - CADENERO JOSE ORTIZ - CADENERO RUBEN DARIO HERRERA - AYUDANTE YEISON SANCHEZ - AYUDANTES OSCAR SANCHEZ - AYUDANTES NICOLAS PORTILLA - AYUDANTE WILLIAM	HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA RETRO EXCAVADORA 320	





IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



			TORRES - AYUDANTE JUAN CARLOS TORRES - AYUDANTE RICARDO GOMEZ - AYUDANTE FELIPE GAITAN - AYUDANTE JUAN CARLOS IBAÑES - AYUDANTE DAVID IBAÑEZ - AYUDANTE BRAYAN IBAÑEZ - AYUDANTE PAULA ALMONACAL - SST		
--	--	--	--	--	--

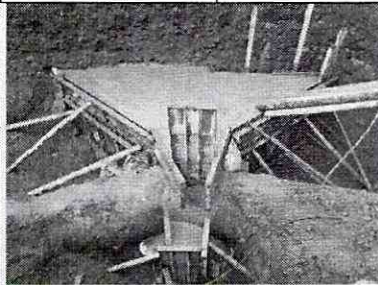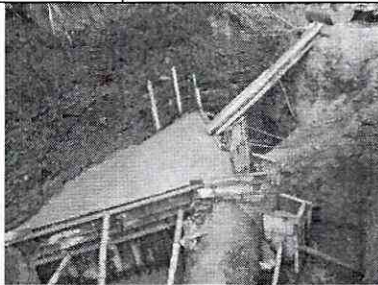

ACTIVIDADES DE OBRA 09 DE MARZO DEL 2023

UBICACIÓN DE ACTIVIDADES	ITEM CONTRACTUAL	ACTIVIDADES Y/O DESCRIPCIÓN DIARIA	PERSONAL EN OBRA POR PARTE DE CONTRATISTA	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN OBRA	NOVEDADES
K7+558.20 - K7+565.04	3.1.2.5I INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO DE 20,7 MPA (3.000 PSI)	SE REALIZAFUNDIDA DE PLACA MUROS Y ELEMENTOS DE APOYO PARA DEL PUENTE PEATONAL.	SIMÓN MOLANO: MAESTRO SIMÓN MOLANO ORTIZ: OFICIAL YESID MOLANO: MAESTRO YIMY SALAZAR R: OFICIAL JHONATAN VILLAMIL:	HERRAMIENTA MENOR MEZCLADORA 1 BULTO	



IBAGÜE
VIBRA







IBAL

SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGÜERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.




			AYUDANTE JAIDER PEÑUELA: AYUDANTE JOHAN ROBAYO: AYUDANTE NESTOR BONILLA: AYUDANTE MARLON RAMIREZ: AYUDANTE		
					
K9+130 - K9+800		SE REALIZA LIMPIEZA DE ACEROS Y ZONA POR DERRUMBE, SE REALIZA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA FUNDIDA DE PLACA	EDWIN OVIEDO: OPERADOR DE PAJARITA - RETRO EXCAVADORA YIOVANY CARDOZO: OFICIAL JEISON RUIZ - AYUDANTE CARLOS VARGAS - AYUDANTE CARLOS OROZCO - AYUDANTE LUIS TELLEZ - SST	RETRO EXCAVADO RA DE LLANTA	
					
K9+580 - K9+780	2.1.4.1 EXCAVACI	SE REALIZA LA EXCAVACION E	JEISON RUIZ - AYUDANTE	RETROEXCA VADORA	



IBAL
 SA ESP. OFICIAL
 EMPRESA IBAGUERENA DE
 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
 R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
 C.C 5.829.473 DE IBAGUE.

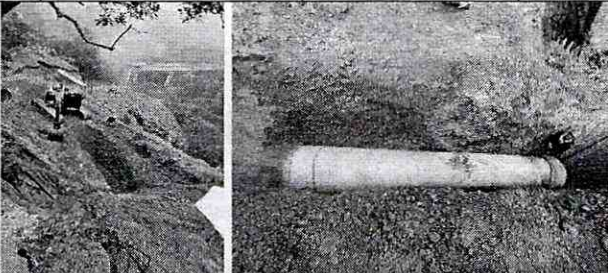


	ÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD 4.17.5 INSTALACION TUBERIA GRP DE 32" A 36"	INSTALACION DE TUBERIA GRP 36"	CARLOS VARGAS - AYUDANTE CARLOS OROZCO - AYUDANTE OPERADOR EDUIN OVIEDO TOPOGRAFIA RODRIGO CARDOSO ANDRÉS CALDERÓN AYUDANTES OBRA ARSENIO ACOSTA DANIEL HERNÁNDEZ GIOVANI CARDOSO - OFICIAL OPERADOR EDISON GUTIÉRREZ SST LEIDY RODRÍGUEZ	320 EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
					
K2+901.95	3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MP A, INCLUYE TRANSPOR	SE REALIZA FIGURADO Y AMARRE DE ACEROS PARA EL ANCLAJE PIH048 E INSTALACION DE FORMALETA PARA FUNDIDA DE ANCLAJE.	DAIRO PORTILLO - OFICIAL LUIS LOPEZ - AYUDANTE JONATHAN VERGARA - AYUDANTE ANTRES CALDERON - CADENERO	RETRO EXCAVADO RA 320, PLANTA, PULIDORAS, HERRAMIENTA MENOR	



IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.I JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.

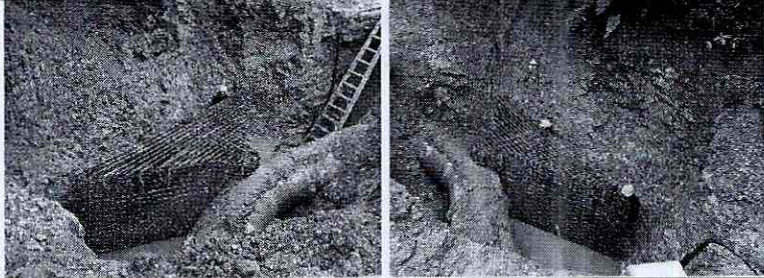

	TE, FIGURADO Y COLOCA CIÓN)		ANA SOFIA LEON - TOPOGRAFA JHON ALEXANDER CANDIA - OPERADOR		
					
ACTIVIDADES DE OBRA 10 DE MARZO DEL 2023					
UBICACI N DE ACTIVIDA DES	ITEM CONTRAC TUAL	ACTIVIDADES Y/O DESCRIPCIÓN DIARIA	PERSONAL EN OBRA POR PARTE DE CONTRATISTA	MAQUINARI A Y/O EQUIPOS EN OBRA	NOVEDADES
K10+880 - K11+100	2.1.1.1 EXCAVACI ONES EN MATERIAL COMÚN DE 0,00 A 2,00M	SE REALIZA EXCAVACION PARA CARCAMO AL INICIO DE TUNEL 1 PARA DESVIAR LAS AGUAS QUE ESTAN ENTRANDO AL TUNEL. REALIZAN EXTENDIDA DE MATERIAL BASE SOBRE TUNEL 1	OPERADOR FAUSTINO SARMIEN DOS CONTROLADO RES VIALES MARIA FERNANDA VALDEZ GERARDO CHACÓN VIBROCOMPA CTADOR ANDRÉS GARZÓN TOPOGRAFÍA ANA SOFÍA LEÓN JOSÉ ORTIZ EDDY CARDOSO JENIFER CARDOSO	VIBROCOM PACTADOR. RETRO EXCAVADO RA PAJARITA MOTONIVEL ADORA HERRAMIE NTA MENOR	SE SOLICITA RETIRAR EL MATERIAL YA QUE ESTE NO FUE COMPACTAD O Y SE ENCUENTRA MUY HUMEDO.



**IBAGÜE
VIBRA**



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.
R.L. JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C. 5.829.473 DE IBAGÜE.



K9+580 - K9+780		ACTIVIDADES DETENIDAS EL OPERADOR NO SE PRESENTA A OBRA		JEISON RUIZ - AYUDANTE CARLOS VARGAS - AYUDANTE CARLOS OROZCO - AYUDANTE OPERADOR EDUIN OVIEDO TOPOGRAFIA RODRIGO CARDOSO ANDRÉS CALDERÓN AYUDANTES OBRA ARSENIO ACOSTA DANIEL HERNÁNDEZ GIOVANI CARDOSO - OFICIAL OPERADOR EDISON GUTIÉRREZ SST LEIDY RODRÍGUEZ	RETROEXCA VADORA 320 EQUIPO DE TOPOGRAFI A	
K9+130 - K9+800	3.1.2.5I INSTALACI ON Y SUMINISTR	SE REALIZA FUNDIDA DE PLACA INFERIOR DEL CARCAMO,		EDWIN OVIEDO: OPERADOR DE PAJARITA -	RETRO EXCAVADO RA DE LLANTA	





IBAQUE VIBRA



IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



	<p>O DE CONCRET O DE 20,7 MPA (3,000 PSI)</p>	<p>POR DIFICULTADES EN LA FUNDIDA SE PRESENTA SITUACION EN LA QUE LA DIRECCION DE LA INTERVENTORIA SE REUNEN CON LA RESIDENTE DE OBRA DIANA MORA Y LE SOLICITA LA DEMOLICION Y LIMPIEZA DEL TRAMO QUE NO FUE FUNDIDO EN SU TOTALIDAD Y LA ADECUADA EJECUCION DE LA FUNDIDA EN EL CARCAMO.</p>	<p>RETRO EXCAVADORA</p> <p>YIOVANY CARDOZO: OFICIAL JEISON RUIZ - AYUDANTE CARLOS VARGAS - AYUDANTE CARLOS OROZCO - AYUDANTE LUIS TELLEZ - SST</p>		
					
<p>PUENTE BOCATOM A</p>		<p>SE REALIZA EL TRASLADO DE HEXAPODOS CON LA MAQUINARIA, PARA SU POSTERIOR INSTALACION SOBRE EL CAUSE DEL RIO DONDE SE ESTA PRESENTANDOLA SOCAVACION DEL TERRENO</p>	<p>JHON ALEXANDER CANDIA - OPERADOR</p>	<p>RETROEXCA VADORA DE LLANTA</p>	



**IBAGÜE
VIBRA**



IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGÜERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



K2+901.95	3.1.2.51 INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO DE 20,7 MPA (3,000 PSI)	SE REALIZA FUNDIDA DE CONCRETO PARA EL ANCLAJE PIH 048	DAIRO PORTILLO - OFICIAL LUIS LOPEZ - AYUDANTE JONATHAN VERGARA - AYUDANTE ANTRES CALDERON - CADENERO ANA SOFIA LEON - TOPOGRAFA JHON ALEXANDER CANDIA - OPERADOR	RETRO EXCAVADOR A 320, PLANTA, PULIDORAS, HERRAMIENT A MENOR, MEZCLADOR A DE 1 BULTO
K1+770.16	2.1.4.1 EXCAVACION A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZA EXCAVACION DEL ANCLAJE PIH 031 CON MAQUINA Y PERSONAL DE APOYO PARA CONTROL VIAL	ALVARO GOMEZ SUAREZ - AYUDANTE LUIS ALFONZO CASTAÑO - OFICIAL JULIO CARDENAS - OPERADOR MICHAEL SERGEY - CADENERO	HERRAMIENT A MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA A RETRO EXCAVADOR A 320



IBAQUE VIBRA



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBACUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



			JOSE ORTIZ - CADENERO RUBEN DARIO HERRERA - AYUDANTE YEISON SANCHEZ - AYUDANTES OSCAR SANCHEZ - AYUDANTES NICOLAS PORTILLA - AYUDANTE WILLIAM TORRES - AYUDANTE JUAN CARLOS TORRES - AYUDANTE RICARDO GOMEZ - AYUDANTE FELIPE GAITAN - AYUDANTE JUAN CARLOS IBAÑES - AYUDANTE DAVID IBAÑEZ - AYUDANTE BRAYAN IBAÑEZ - AYUDANTE PAULA ALMONACAL - SST		
--	--	--	---	--	--



ACTIVIDADES DE OBRA 11 DE MARZO DEL 2023



UBICACIÓN DE ACTIVIDADES	ITEM CONTRACTUAL	ACTIVIDADES Y/O DESCRIPCIÓN DIARIA	PERSONAL EN OBRA POR PARTE DE CONTRATISTA	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN OBRA	NOVEDADES
--------------------------	------------------	------------------------------------	---	--------------------------------	-----------



IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBACUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



<p>K7+558.20 - K7+565.04</p>		<p>SE REALIZA DESENCOFRADO DE LAS ESTRUCTURASS DEL PUENTE PEATONAL LIMPIEZA Y ORGANIZACIÓN DE LA ZONA.</p>	<p>SIMÓN MOLANO: MAESTRO SIMÓN MOLANO ORTIZ: OFICIAL YESID MOLANO: MAESTRO YIMY SALAZAR R: OFICIAL JHONATAN VILLAMIL: AYUDANTE JAIDER PEÑUELA: AYUDANTE JOHAN ROBAYO: AYUDANTE NESTOR BONILLA: AYUDANTE MARLON RAMIREZ: AYUDANTE</p>	<p>HERRAMIENTA MENOR MEZCLADORA 1 BULTO</p>	
					
<p>K9+130 - K9+800</p>	<p>3.1.2.5I INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO DE 20,7 MPA (3,000 PSI)</p>	<p>SE REALIZA FUNDIDA DE PLACA INFERIOR DEL CARCAMO REALIZANDO LAS ACORRECCIONES QUE LA INTERVENTORIA PLANTEA EN LA ANTERIOR VISITA.</p>	<p>EDWIN OVIEDO: OPERADOR DE PAJARITA - RETRO EXCAVADORA YIOVANY CARDOZO: OFICIAL JEISON RUIZ - AYUDANTE CARLOS</p>	<p>RETRO EXCAVADORA DE LLANTA, MEZCLADORA 1 BULTO.</p>	




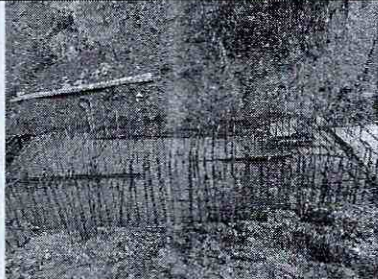


IBAQUE VIBRA



IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



			VARGAS - AYUDANTE CARLOS OROZCO - AYUDANTE LUIS TELLEZ - SST		
					
PUENTE BOCATOM A	5.14.1 CONSTRU CCION HEXÁPOD OS	SE REALIZA LA INSTALACION DE HEXAPODOS CON LA MAQUINARIA, EN LOS SITIOS DEL RIO DONDE SE ESTA PRESENTANDOLA SOCAVACION DEL TERRENO	JHON ALEXANDER CANDIA - OPERADOR	RETROEXCA VADORA DE LLANTA	
					
K10+880 - K11+100	2.1.4.1 EXCAVACI ÓN A MAQUINA A CUALQUIE R PROFUNDI DAD 2.4.14 GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500	SE REALIZA LA EXCAVACION E INSTALACION DEL FILTRO TIPO FRANCES PARA LA CONEXIÓN DEL TUNEL 1 AL BOX DE DESCOLE ENTRE LOS TUNELES	OPERADOR FAUSTINO SARMIENTO DOS CONTROLADO RES VIALES MARIA FERNANDA VALDEZ GERARDO CHACÓN VIBROCOMPA CTADOR ANDRÉS GARZÓN	VIBROCOM PACTADOR. RETRO EXCAVADO RA PAJARITA MOTONIVEL ADORA HERRAMIE NTA MENOR	



**IBAGÜE
VIBRA**



IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGÜERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



			TOPOGRAFÍA ANA SOFÍA LEÓN JOSÉ ORTIZ EDDY CARDOSO JENIFER CARDOSO		
ACTIVIDADES DE OBRA 13 DE MARZO DEL 2023					
UBICACIÓN DE ACTIVIDADES	ITEM CONTRACTUAL	ACTIVIDADES Y/O DESCRIPCIÓN DIARIA	PERSONAL EN OBRA POR PARTE DE CONTRATISTA	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN OBRA	NOVEDADES
K10+880 - K11+100	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINARIA CUALQUIER PROFUNDIDAD 2.4.14 GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500	SE REALIZA LA EXCAVACION E INSTALACION DEL FILTRO TIPO FRANCES PARA LA CONEXIÓN DEL TUNEL 1 AL BOX DE DESCOLE ENTRE LOS TUNELES	OPERADOR FAUSTINO SARMIENTO DOS CONTROLADO RES VIALES MARIA FERNANDA VALDEZ GERARDO CHACÓN VIBROCOMPACTADOR ANDRÉS GARZÓN TOPOGRAFÍA ANA SOFÍA LEÓN JOSÉ ORTIZ EDDY CARDOSO JENIFER CARDOSO	VIBROCOMPACTADOR. RETRO EXCAVADORA PAJARITA MOTONIVELADORA HERRAMIENTA MENOR	







IBAQUE VIBRA



IBAL
LA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGÜEÑA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.I JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.




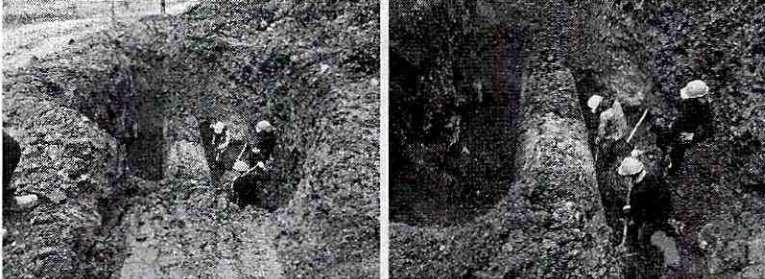
					
K9+130 - K9+800		SE REALIZA LIMPIEZA DEL SOLADO DE LIMPIEZA EXISTENTE PARA EL INICIO DE LA INSTALACION DE ACEROS PARA EL SIGUIENTE TRAMO DE CARCAMO Y CONSTRUCCION DEL MISMO.	EDWIN OVIEDO: OPERADOR DE PAJARITA - RETRO EXCAVADORA YIOVANY CARDOZO: OFICIAL JEISON RUIZ - AYUDANTE CARLOS VARGAS - AYUDANTE CARLOS OROZCO - AYUDANTE LUIS TELLEZ - SST	RETRO EXCAVADORA DE LLANTA	
					
PASO 2 BARRIO EL MANANTIAL		SE PRESENTA SITUACION DE CIERRE POR PARTE DE LA COMUNIDAD, EL INGENIERO JORGE DIAZ DEL IBAL SE PRESENTA PARA INTENTAR MEDIAR CON LA COMUNIDAD SIENDO IMPOSIBLE LLEGAR A UN ACUERDO EL ING SE COMPROMETE A			LA INTERVENTORI A REALIZA ACOMPAÑAMIENTO ASI COMO EL CONTRATISTA DE OBRA



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBACUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



		IR CON LA DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPO TECNICO PARA UNA REUNION			
					
K1+838.52	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZA EXCAVACION DEL ANCLAJE PIV 032 CON MAQUINA Y PERFILACION DE LA EXCAVACION A MANO, PERSONAL DE APOYO PARA CONTROL VIAL	DAIRO PORTILLO - OFICIAL LUIS LOPEZ - AYUDANTE JONATHAN VERGARA - AYUDANTE ANTRES CALDERON - CADENERO ANA SOFIA LEON - TOPOGRAFA JHON ALEXANDER CANDIA - OPERADOR		
					
K1+770.16	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER	SE REALIZA EXCAVACION DEL ANCLAJE PIH 031 CON MAQUINA Y PERSONAL DE APOYO PARA CONTROL VIAL	ALVARO GOMEZ SUAREZ - AYUDANTE LUIS ALFONZO CASTAÑO - OFICIAL JULIO CARDENAS -	HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA RETRO	



**IBAGÜE
VIBRA**



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGÜERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.




	PROFUNDI DAD		OPERADOR MICHAEL SERGEY - CADENERO JOSE ORTIZ - CADENERO RUBEN DARIO HERRERA - AYUDANTE YEISON SANCHEZ - AYUDANTES OSCAR SANCHEZ - AYUDANTES NICOLAS PORTILLA - AYUDANTE WILLIAM TORRES - AYUDANTE JUAN CARLOS TORRES - AYUDANTE RICARDO GOMEZ - AYUDANTE FELIPE GAITAN - AYUDANTE JUAN CARLOS IBAÑES - AYUDANTE DAVID IBAÑEZ - AYUDANTE BRAYAN IBAÑEZ - AYUDANTE PAULA ALMONACAL - SST	EXCAVADO RA 320	



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.
R.L. JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C. 5.829.473 DE IBAGUE.

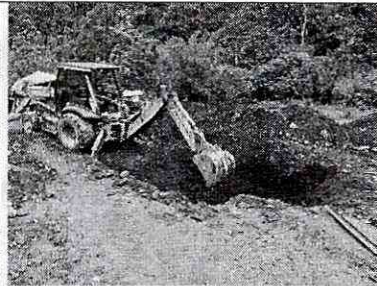

K3+053.62	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZA EXCAVACION DEL ANCLAJE PIH 049 CON MAQUINA Y PERFILACION DE LA EXCAVACION A MANO, PERSONAL DE APOYO PARA CONTROL VIAL	ALVARO GOMEZ SUAREZ - AYUDANTE LUIS ALFONZO CASTAÑO - OFICIAL JULIO CARDENAS - OPERADOR MICHAEL SERGEY - CADENERO JOSE ORTIZ - CADENERO RUBEN DARIO HERRERA - AYUDANTE YEISON SANCHEZ - AYUDANTES OSCAR SANCHEZ - AYUDANTES NICOLAS PORTILLA - AYUDANTE WILLIAM TORRES - AYUDANTE JUAN CARLOS TORRES - AYUDANTE RICARDO GOMEZ - AYUDANTE FELIPE GAITAN - AYUDANTE JUAN CARLOS IBAÑES -	HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA RETRO EXCAVADORA 320	







**IBAGÜE
VIBRA**



IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBACUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



			AYUDANTE DAVID IBAÑEZ - AYUDANTE BRAYAN IBAÑEZ - AYUDANTE PAULA ALMONACAL - SST		
					
ACTIVIDADES DE OBRA 14 DE MARZO DEL 2023					
UBICACIÓN DE ACTIVIDADES	ITEM CONTRACTUAL	ACTIVIDADES Y/O DESCRIPCIÓN DIARIA	PERSONAL EN OBRA POR PARTE DE CONTRATISTA	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN OBRA	NOVEDADES
K7+558.20 - K7+565.04		SE REALIZA FIGURADO Y REINSTALACION DE BARANDA PARA EL PUENTE PEATONAL	SIMÓN MOLANO SIMÓN ANDRÉS MOLANO ORTIZ YESID MOLANO YIMMY SALAZAR JONATHAN BARRERO JAIDER PEÑUELA JOHAN ROBAYO NÉSTOR BONILLA MARLON RAMÍREZ	HERRAMIENTA MENOR MEZCLADORA 1 BULTO	
					





**IBAGÜE
VIBRA**



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGÜERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGÜE.



<p>K9+130 - K9+800</p>	<p>3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MP A, INCLUYE TRANSPOR TE, FIGURADO Y COLOCA CIÓN)</p>	<p>SE REALIZA LA INSTALACION DE ACEROS PARA EL SIGUIENTE TRAMO DE CARCAMO Y CONSTRUCCION DEL MISMO.</p>	<p>OPERADOR MEDARDO VARÓN TRABAJADORE S ARSENIO ACOSTA JHON JAIRO GARCÍA GIOVANNI CARDOZO TOPOGRAFÍA RODRIGO CARDOSO HERNANDO BARRAGÁN SST LEIDY RODRÍGUEZ</p>	<p>RETRO EXCAVADO RA DE LLANTA</p>	
					
<p>K9+580 - K9+780</p>	<p>2.1.4.1 EXCAVACI ÓN A MAQUINA A CUALQUIE R PROFUNDI DAD 4.17.5 INSTALACI ON TUBERIA GRP DE 32" A 36"</p>	<p>SE REALIZA LA EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERIA GRP 36"</p>	<p>OPERADOR MEDARDO VARÓN TRABAJADORE S ARSENIO ACOSTA JHON JAIRO GARCÍA GIOVANNI CARDOZO TOPOGRAFÍA RODRIGO CARDOSO HERNANDO BARRAGÁN SST LEIDY RODRÍGUEZ</p>	<p>RETROEXCA VADORA 320 EQUIPO DE TOPOGRAFI A</p>	
