





**IBAL**  
SA ESP. OFICIAL  
EMPRESA IBAGUERENA DE  
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.  
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.  
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.

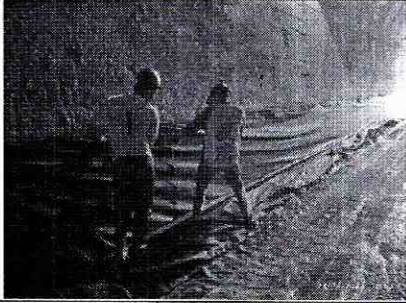

			TOPOGRAFÍA ANA SOFÍA LEÓN AUXILIAR SST MARIA FERNANDA VALDEZ		
					
K9+130 - K9+800	3.1.2.6I INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO 4.000 PSI ESTRUCTURAL A	SE FUNDIDA EN CONCRETO DE 4000 PSI PARA CARCAMO CON BOMBA ESTACIONARIA PARA CONCRETO Y FUNDIENDO DESDE ZONA ELEVADA AL LADO DE LA VIA DE LA VARIANTE.	TRABAJADORES LUIS CASTAÑO NICOLÁS PORTILLA RUBÉN DARÍO HERRERA ELIAN IBÁÑEZ ADRIÁN GÓMEZ JOSÉ LUIS CASTAÑO	HERRAMIENTA MENOR MEZCLADORA DE 1 BULTO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	SE REALIZA FUNDIDA DE CONCRETO DE 4000 PSI POR ORDEN DE LA INTERVENTORIA DE LA CONCESIÓN SE DETIENE LA FUNDIDA, EL FORMALETEO DE LA ESTRUCTURA DE CARCAMO PRESENTA UN FALLA Y SE RIEGA CONCRETO DE LA ESTRUCTURA EL CUAL SE RECOJE Y USA PARA LOS MUROS Y TRA PARTE PARA EL SOLADO DE LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA



**IBAQUE VIBRA**







**IBAL**

SA ESP OFICIAL  
EMPRESA IBAGÜEÑA DE  
ACUEDUCTO Y ALCAÑARILLADO

**CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.**  
**R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.**  
**C.C 5.829.473 DE IBAGUE.**

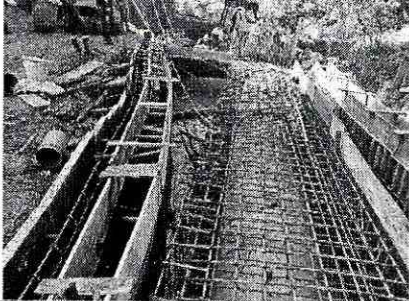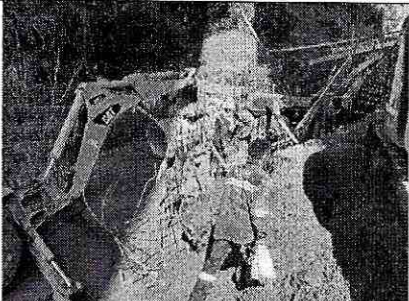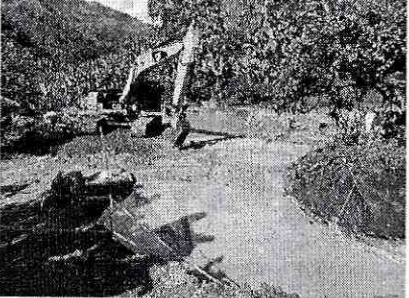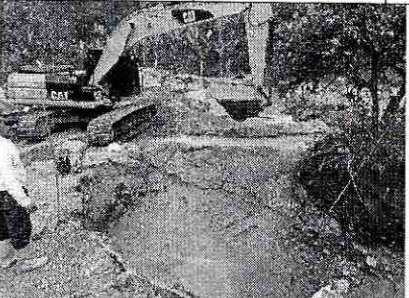



					
K9+000 - K9+200	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD 4.15.1 Instalación tubería CCP 36"	SE REALIZA BOMBEO Y LIMPIEZA DE ZONA DE EXCAVACION POR CRECIENTE DE QUEBRADA, SE REALIZA RETIRO DE MATERIAL SATURADO EN LA EXCAVACION.	TRABAJADORES JEISON RUIZ CARLOS OROZCO JOSÉ GUZMÁN GIOVANNI CARDOZO OPERADORES EDUIN OVIEDO MEDARDO VARÓN TOPOGRAFÍA EDDY CARDOSO JENNIFER CARDOSO SST LEIDY RODRÍGUEZ	RETROEXCAVADORA 320	K9+000 - K9+200
					
K4+375.88	3.1.2.5I INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO DE 20,7 Mpa (3,000 PSI)	SE REALIZA FUNDIDA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA EL ANCLAJE PIH 079	TRABAJADORES SIMON MOLANO JAIDER HUMBERTO PEÑUELA JHONATHAN BARRERO MARLON	HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA RETRO EXCAVADORA 320	



**IBAL**  
S.A. ESP. OFICIAL  
EMPRESA IBAGUERENA DE  
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.  
R.L. JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.  
C.C. 5.829.473 DE IBAGUE.

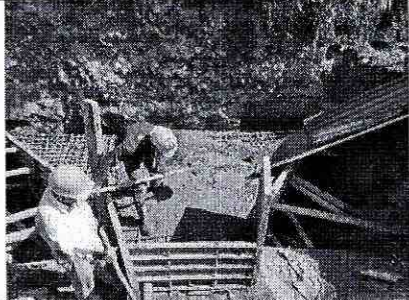

			<p>ESTEBAN RAMIREZ YESID MOLANO TOVAR JOHAN SEBASTIÁN ROBAYO SIMON MOLANO ORTIZ YIMY SALAZAR RODRÍGUEZ</p>		
					
K4+184.02	<p>3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MP A, INCLUYE TRANSPOR TE, FIGURADO Y COLOCA CIÓN)</p>	<p>SE REALIZA FIGURADO E INSTALACION DE ACEROS PARA EL ANCLAJE PIH 075, SE RELIZA INSTALACION DE FORMALETA</p>	<p>TOPOGRAFIA MIGUEL ANGEL TIJO TRABAJADORE S WILIAMS TORRES SERGIO MIRANDA JUAN CARLOS TORRES OSCAR SÁNCHEZ JONATHAN PERDONO OPERADOR RAFAEL SÁNCHEZ</p>	<p>HERRAMIEN TA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOM BA RETRO EXCAVADO RA 320</p>	K4+184.02
					




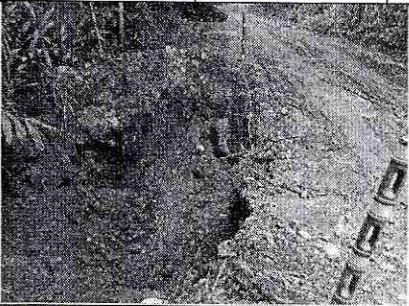



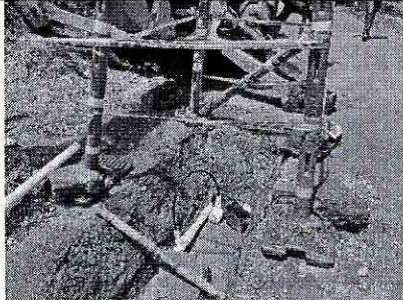
# IBAL

LA ESP OFICIAL  
EMPRESA IBAGUERENA DE  
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.  
R.I JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.  
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.

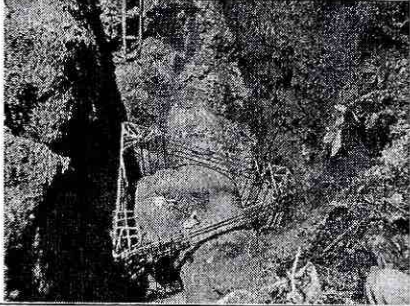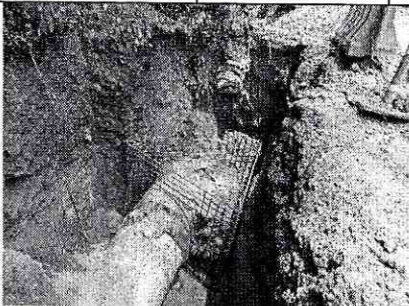

K4+123.99	3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MP A, INCLUYE TRANSPOR TE, FIGURADO Y COLOCA CIÓN)	SE REALIZA FIGURADO E INSTALACION DE ACEROS PARA EL ANCLAJE PIH 074	TOPOGRAFIA MIGUEL ANGEL TIJO TRABAJADORE S WILIAMS TORRES SERGIO MIRANDA JUAN CARLOS TORRES OSCAR SÁNCHEZ JONATHAN PERDONO OPERADOR RAFAEL SÁNCHEZ	HERRAMIE NTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOM BA RETRO EXCAVADO RA 320	
					
K3+871.00	2.1.4.1 EXCAVACI ÓN A MAQUINA A CUALQUIE R PROFUNDI DAD	SE REALIZA EXCAVACION A MAQUINA PARA EL ANCLAJE PIH 068.	OPERADOR RAFAEL SÁNCHEZ	RETRO EXCAVADO RA 320	
					
<b>ACTIVIDADES DE OBRA 29 DE ABRIL DEL 2023</b>					

UBICACIÓN DE ACTIVIDADES	ITEM CONTRACTUAL	ACTIVIDADES Y/O DESCRIPCIÓN DIARIA	PERSONAL EN OBRA POR PARTE DE CONTRATISTA	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN OBRA	NOVEDADES
K10+880 - K11+100	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINARIA CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE INICIAN LAS PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA TUBERIA, ESTAS PRESETAN DIFICULTADES YA QUE NO SE LOGRA LA PRESION ADECUADA, ESTO REQUIERE QUE SE APLACEN LAS PRUEBAS AL DIA MARTES. SE REALIZA INSTALACION DE FILTROS EN EL TUNEL 1	OPERADORES JHON CANDIA DIEGO GUZMÁN TRABAJADORES MANUEL RIBO URIEL MORALES WILLIAM LIZARAZO LIBARDO LEGUIZAMO JOSÉ MANCHADO JOSÉ RINCÓN GUSTAVO MELLADO JHON JAIRO PORTILLO JOSÉ MACHADO EDUAR MACHADO TOPOGRAFÍA ANA SOFÍA LEÓN AUXILIAR SST MARIA FERNANDA VALDEZ	2 RETRO EXCAVADORAS HERRAMIENTA MENOR	
					
PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINARIA	SE TERMINA DE REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA EXCAVACION SE FUNDE LO QUE	TRABAJADORES JESÚS ARROYO JHON DIAZ OSCAR PEÑA	RETRO EXCAVADORA HERRAMIENTA MENOR	



IBAGÜE  
VIBRA




**IBAL**

SA ESP OFICIAL  
EMPRESA IBAGUENENA DE  
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.  
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.  
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



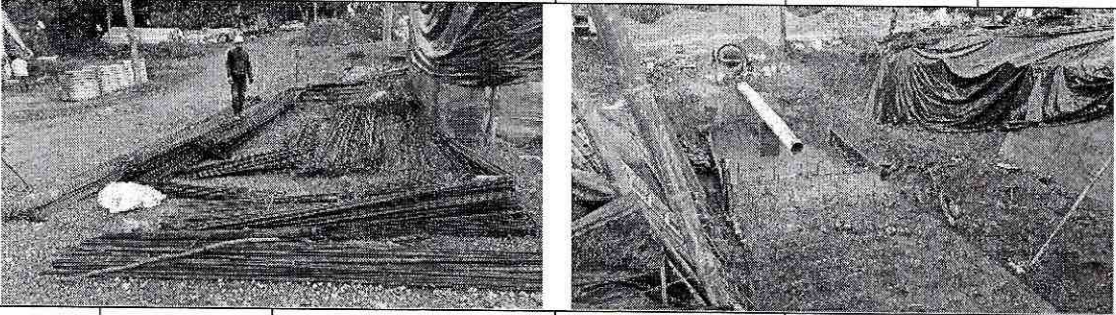



	CUALQUIER PROFUNDIDAD	FALTABA DE EL CONCRETO CICLOPEO, SE INICIA LA INSTALACION DE ACEROS PARA LA PLACA Y MUROS DEL TANQUE DE LA VALVULA DE FLUJO ANULAR.	BERTULFO ZAMBRANO AUX SST LUIS TÉLLEZ OPERADOR FAUSTINO SARMIENTO		
					
K2+874.66	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZA EXCAVACION A MAQUINA PARA EL ANCLAJE PIH 045.	TRABAJADORES SIMON MOLANO JAIDER HUMBERTO PEÑUELA JHONATHAN BARRERO MARLON ESTEBAN RAMIREZ YESID MOLANO TOVAR JOHAN SEBASTIÁN ROBAYO SIMON MOLANO ORTIZ YIMY SALAZAR RODRÍGUEZ	RETRO EXCAVADO RA 320	



**IBAL**  
SA ESP OFICIAL  
EMPRESA IBAGUERENA DE  
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.  
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.  
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.

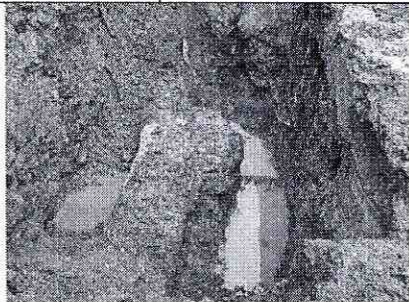

				
K2+888.58	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZA EXCAVACION A MAQUINA PARA EL ANCLAJE PIH 046.	TOPOGRAFIA MIGUEL ANGEL TIJO TRABAJADORES WILIAMS TORRES SERGIO MIRANDA JUAN CARLOS TORRES OSCAR SÁNCHEZ JONATHAN PERDONO OPERADOR RAFAEL SÁNCHEZ	RETRO EXCAVADORA 320
				
K4+184.02	3.1.2.5I INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO DE 20,7 Mpa (3,000 PSI)	SE REALIZA FUNDIDA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA EL ANCLAJE PIH 075	TOPOGRAFIA MIGUEL ANGEL TIJO TRABAJADORES WILIAMS TORRES SERGIO MIRANDA JUAN CARLOS TORRES OSCAR	HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA RETRO EXCAVADORA 320



**IBAGÜE VIBRA**







**IBAL**

SA ESP. OFICIAL  
EMPRESA IBAGUERENA DE  
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.  
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.  
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.

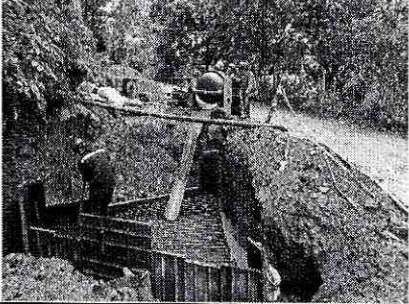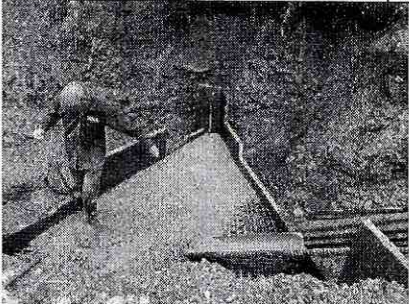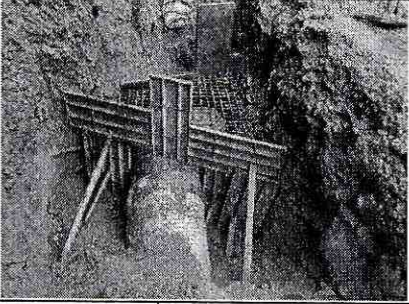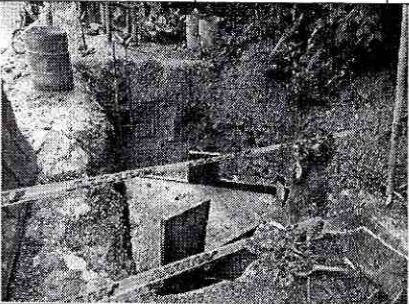

			SÁNCHEZ JONATHAN PERDONO OPERADOR RAFAEL SÁNCHEZ		
					
K4+123.99	3.1.2.5I INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO DE 20,7 Mpa (3,000 PSI)	SE REALIZA FUNDIDA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA EL ANCLAJE PIH 074	TOPOGRAFIA MIGUEL ANGEL TIJO TRABAJADORES WILLIAMS TORRES SERGIO MIRANDA JUAN CARLOS TORRES OSCAR SÁNCHEZ JONATHAN PERDONO OPERADOR RAFAEL SÁNCHEZ	HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA RETRO EXCAVADORA 320	
					
K9+000 - K9+200	2.1.4.1 EXCAVACION A MAQUINA CUALQUIE	SE REALIZA BOMBEO Y LIMPIEZA DE ZONA DE EXCAVACION POR CRESCIENTE DE QUEBRADA, SE	TRABAJADORES JEISON RUIZ CARLOS OROZCO JOSÉ GUZMÁN	RETROEXCAVADORA 320	


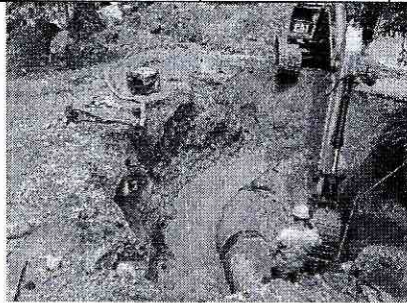
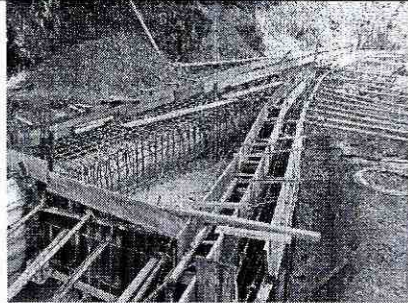
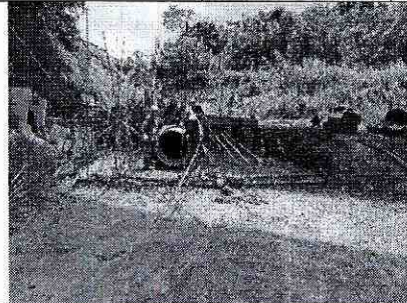






**IBAL**  
S.A. ESP. OFICIAL  
EMPRESA IBACUERENA DE  
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.  
R.L. JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.  
C.C. 5.829.473 DE IBAGUE.



	R PROFUNDI DAD 4.15.1 Instalación tubería CCP 36"	REALIZA RETIRO DE MATERIAL SATURADO EN LA EXCAVACION.	GIOVANNI CARDOZO OPERADORES EDUIN OVIEDO MEDARDO VARÓN TOPOGRAFÍA EDDY CARDOSO JENNIFER CARDOSO SST LEIDY RODRÍGUEZ		
					
K9+130 - K9+800	3.1.2.6I INSTALACI ON Y SUMINISTR O DE CONCRET O 4.000 PSI ESTRUCTUR A	SE REALIZA REVISION DE FORMALETA DE TODO EL TRAMO DEL CARCAMO CONSTRUIDO, SE FUNDE EL RESTO DEL SOLADO DE LIMPIEZA.	TRABAJADORE S LUIS CASTAÑO NICOLÁS PORTILLA RUBÉN DARÍO HERRERA ELIAN IBÁÑEZ ADRIÁN GÓMEZ JOSÉ LUIS CASTAÑO	HERRAMIE N TA MENOR MEZCLADO RA DE 1 BULTO RETROEXCA VADORA DE LLANTAS	
					
<b>ACTIVIDADES DE OBRA 30 DE ABRIL DEL 2023</b>					
UBICACI N DE	ITEM CONTRAC TUAL	ACTIVIDADES Y/O DESCRIPCIÓN DIARIA	PERSONAL EN OBRA POR	MAQUINARI A Y/O	NOVEDADES

ACTIVIDADES			PARTE DE CONTRATISTA	EQUIPOS EN OBRA	
PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA	3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MPA, INCLUYE TRANSPORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN)	SE REALIZAN TRABAJOS DOMINICALES EN LA INSTALACION DE ACEROS PARA LOS MUROS Y PLACA DEL TANQUE DE FLUJO ANULAR.	TRABAJADORES JESÚS ARROYO JHON DIAZ OSCAR PEÑA BERTULFO ZAMBRANO AUX SST LUIS TÉLLEZ OPERADOR FAUSTINO SARMIENTO	RETRO EXCAVADORA HERRAMIENTA MENOR	

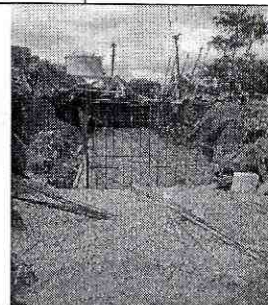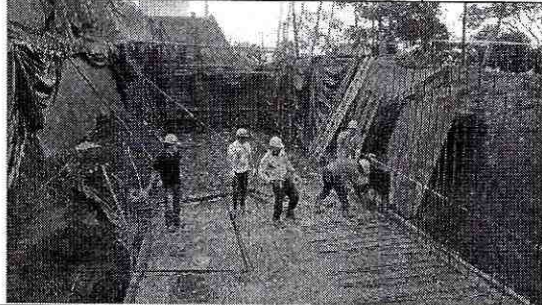

**ACTIVIDADES DE OBRA 02 DE MAYO DEL 2023**



UBICACIÓN DE ACTIVIDADES	ITEM CONTRACTUAL	ACTIVIDADES Y/O DESCRIPCIÓN DIARIA	PERSONAL EN OBRA POR PARTE DE CONTRATISTA	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN OBRA	NOVEDADES
K10+880 - K11+100	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINARIA CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZAN PRUEBAS DE PRESION EN LAS TUBERIA DE ACUEDUCTOS VEREDALES, SE REALIZA INSTALACION DE FILTROS EN EL TUNEL 1	AYUDANTES GUSTAVO MELLADO OSCAR JULIAN GÓMEZ JULIO CÉSAR RUBIO JHON JAIRO PORTILLO EDWAR MACHADO INGE RESIDENTE JOSÉ DANIEL RONDON OPERADORES	2 RETRO EXCAVADORAS HERRAMIENTA MENOR	



**IBAL**  
SA ESP OFICIAL  
EMPRESA IBAGUERENA DE  
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.  
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.  
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.

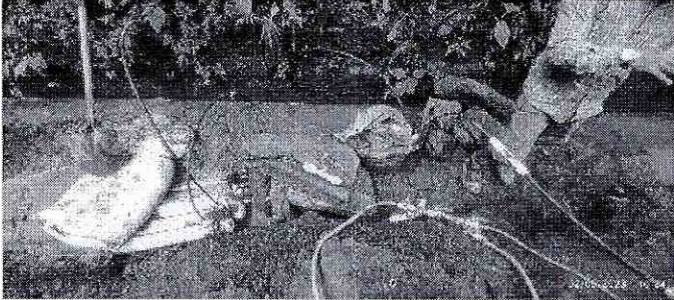

			<p>JHON ALEXANDER CANDIA FAUSTINO SARMIENTO TOPOGRAFÍA SOFIA LEON VILLANUEVA JOSÉ YAMID ORTIZ OFICIOS VARIOS WILLIAN LIZARAZO URIEL MORALES MANUEL RIVO RAMÍREZ AUXILIAR SST MARIA FERNANDA VALDEZ</p>		
					
PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA	<p>3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MP A, INCLUYE TRANSPORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN)</p>	<p>SE REALIZA LA INSTALACION DE ACEROS PARA LOS MUROS Y PLACA DEL TANQUE DE FLUJO ANULAR.</p>	<p>TRABAJADORES DAIRO PORTILLO JORGE GONZÁLEZ CRISTIAN ECHEVERRY YEISON CELEMIN JHONATAN VERGARA JESÚS ARROYO JHON DIAZ OSCAR PEÑA BERTULFO ZAMBRANO OPERADOR</p>	<p>RETRO EXCAVADO RA HERRAMIENTA MENOR</p>	



**IBAGÜE  
VIBRA**







**IBAL**

LA ESP. OFICIAL  
EMPRESA IBAGUERENA DE  
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.**  
**R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.**  
**C.C 5.829.473 DE IBAGUE.**

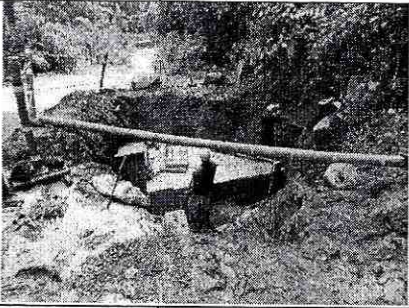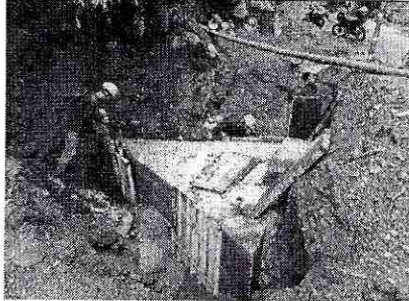



			DIEGO GUZMÁN AUX SST LUIS TÉLLEZ		
					
K4+184.02		SE REALIZA RETIRO DE FORMAleta Y RELLENOS PARA EL ANCLAJE PIH 075	TRABAJADORE S SIMON MOLANO JAIDER HUMBERTO PEÑUELA YESID MOLANO TOVAR SIMON MOLANO ORTIZ YIMY SALAZAR RODRÍGUEZ JHON MARTINEZ OMAR CULMA HELVER LEÓN MICHEL GRANADOS CADENERO JULIO CARDENAS CADENERO	HERRAMIEN TA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOM BA RETRO EXCAVADO RA 320	
					
K4+123.99		SE REALIZA RETIRO DE FORMAleta Y RELLENOS PARA EL ANCLAJE PIH 074	TRABAJADORE S SERGIO MIRANDA OSCAR	HERRAMIEN TA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOM	



**IBAL**  
SA ESP. OFICIAL  
EMPRESA IBAGUERENA DE  
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.  
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.  
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.

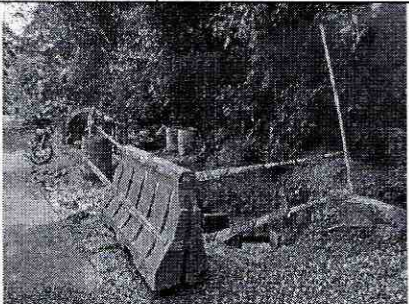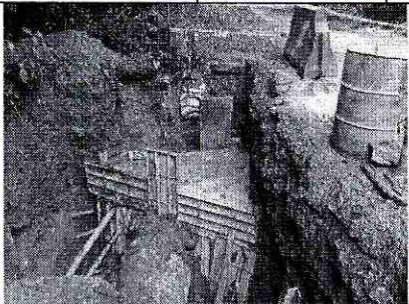

			SÁNCHEZ RAFAEL SÁNCHEZ MARLON RAMÍREZ MIGUEL TIJO CADENERO BRAYAN CAICEDO CADENERO PAULA ALMONACID SST	BA RETRO EXCAVADO RA 320	
					
K2+874.66	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZA EXCAVACION A MAQUINA PARA EL ANCLAJE PIH 045.	TRABAJADORES SIMON MOLANO JAIDER HUMBERTO PEÑUELA YESID MOLANO TOVAR SIMON MOLANO ORTIZ YIMY SALAZAR RODRÍGUEZ JHON MARTINEZ OMAR CULMA HELVER LEÓN MICHEL GRANADOS CADENERO JULIO CARDENAS CADENERO	HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA RETRO EXCAVADO RA 320	



**IBAGÜE VIBRA**



**IBAL**

SA ESP OFICIAL  
EMPRESA IBACUERENA DE  
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.  
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.  
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.




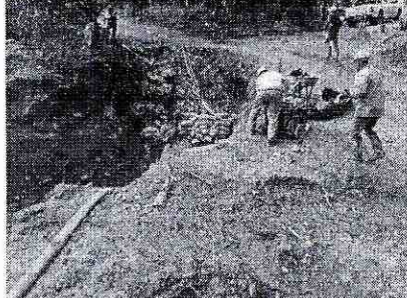
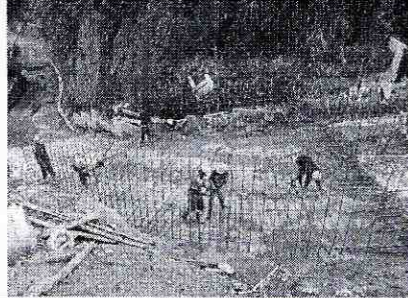

K2+888.58	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZA EXCAVACION A MAQUINA PARA EL ANCLAJE PIH 046.	TRABAJADORES SERGIO MIRANDA OSCAR SÁNCHEZ RAFAEL SÁNCHEZ MARLON RAMÍREZ MIGUEL TIJO CADENERO BRAYAN CAICEDO CADENERO PAULA ALMONACID SST	HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA RETRO EXCAVADORA 320	K2+888.58
K9+000 - K9+200	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD 4.15.1 Instalación	SE REALIZA BOMBEO Y LIMPIEZA DE ZONA DE EXCAVACION POR CRECIENTE DE QUEBRADA, SE REALIZA SOLDADURA DE UNIONES DE TUBERIA WSP PARA POSTERIOR	TRABAJADORES JEISON RUIZ CARLOS OROZCO FERNEY ROMERO GIOVANNI CARDOZO HILSON ARIAS OPERADORES EDUIN OVIEDO	HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA RETRO EXCAVADORA 320	



**IBAL**  
SA ESP OFICIAL  
EMPRESA IBAGUERENA DE  
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.  
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.  
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



	tubería CCP 36"	CONSTRUCCION DE LOS DIAPERS	MEDARDO VARÓN TOPOGRAFÍA EDDY CARDOSO JENNIFER CARDOSO HERNANDO BARRAGÁN SST LEIDY RODRÍGUEZ		
					
K9+130 - K9+800	3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MP A, INCLUYE TRANSPORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN)	SE REALIZA REVISION DE FORMALETA DE TODO EL TRAMO DEL CARCAMO CONSTRUIDO, SE REALIZA FIGURADO E INSTALACION DE ACEROS EN EL TRAMO DE CARCAMO RECUBIERTO EN CONCRETO.	TRABAJADORE S LUIS CASTAÑO NICOLÁS PORTILLA RUBÉN DARÍO HERRERA ELIAN IBÁÑEZ ADRIÁN GÓMEZ JOSÉ LUIS CASTAÑO	HERRAMIENTA MENOR MEZCLADORA DE 1 BULTO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	
					

ACTIVIDADES DE OBRA 03 DE MAYO DEL 2023



# IBAL

SA ESP. OFICIAL  
EMPRESA IBAGUEREÑA DE  
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.  
R.L. JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.  
C.C. 5.829.473 DE IBAGUE.



UBICACIÓN DE ACTIVIDADES	ITEM CONTRACTUAL	ACTIVIDADES Y/O DESCRIPCIÓN DIARIA	PERSONAL EN OBRA POR PARTE DE CONTRATISTA	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN OBRA	NOVEDADES
K10+880 - K11+100	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINARIA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZAN PRUEBAS DE PRESION EN LAS TUBERIA DE ACUEDUCTOS VEREDALES, SE REALIZA INSTALACION DE FILTROS EN EL TUNEL 1, SE REALIZA BUSQUEDA Y REPARACION DE FUGAS EN LA TUBERIA DAÑOS QUE GENERAN PERDIDA DE PRESION EN LAS PRUEBAS QUE SE ESTAN REALIZANDO	AYUDANTES GUSTAVO MELLADO OSCAR JULIAN GÓMEZ JULIO CÉSAR RUBIO JHON JAIRO PORTILLO EDWAR MACHADO INGE RESIDENTE JOSÉ DANIEL RONDON OPERADORES JHON ALEXANDER CANDIA FAUSTINO SARMIENTO TOPOGRAFÍA SOFIA LEON VILLANUEVA JOSÉ YAMID ORTIZ OFICIOS VARIOS WILLIAN LIZARAZO URIEL MORALES MANUEL RIVO RAMÍREZ AUXILIAR SST MARIA FERNANDA VALDEZ	2 RETRO EXCAVADORAS HERRAMIENTA MENOR	





**IBAL**  
S.A. ESP. OFICIAL  
EMPRESA IBAGUERENA DE  
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.  
R.L. JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.  
C.C. 5.829.473 DE IBAGUE.



<p>PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA</p>	<p>3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MPA, INCLUYE TRANSPORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN)</p>	<p>SE REALIZA LA INSTALACION DE ACEROS PARA LOS MUROS Y PLACA DEL TANQUE DE FLUJO ANULAR.</p>	<p>TRABAJADORES DAIRO PORTILLO JORGE GONZÁLEZ CRISTIAN ECHEVERRY YEISON CELEMIN JHONATAN VERGARA JESÚS ARROYO JHON DIAZ OSCAR PEÑA BERTULFO ZAMBRANO OPERADOR DIEGO GUZMÁN AUX SST LUIS TÉLLEZ</p>	<p>HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA RETRO EXCAVADORA 320</p>
<p>PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA</p>		<p>SE REALIZA REVISION DE LA ENTRADA DE LA TUBERIA DE 24" A LA CAMARA DE ENTRADA DE LA POLA YA QUE LO QUE SE EVIDENCIA EN LOS PLANOS, ES LA ENTRADA DE</p>	<p>PERSONAL DE SUPERVISION IBAL, PERSONAL DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA</p>	



IBAGÜE  
VIBRA



IBAL

LA ESP OFICIAL  
EMPRESA IBAGUERENA DE  
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.  
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.  
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



		<p>ESTA TUBERIA POR EL MISMO MURO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA SALIDA PARA PLANTA 2, ESTO QUEDA EN CONSIDERACION DEL INGENIERO JOAQUIN ALVARES PARA EL CAMBIO DE TRAZADO.</p>			
					
K6+940.73	<p>2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD</p>	<p>SE REALIZA EXCAVACION A MAQUINA PARA EL ANCLAJE H 73</p>	<p>TRABAJADORES SIMON MOLANO JAIDER HUMBERTO PEÑUELA YESID MOLANO TOVAR SIMON MOLANO ORTIZ YIMY SALAZAR RODRÍGUEZ JHON MARTINEZ OMAR CULMA HELVER LEÓN MICHEL GRANADOS CADENERO JULIO CARDENAS CADENERO</p>	<p>HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA RETRO EXCAVADORA 320</p>	



**IBAL**  
LA ESP. OFICIAL  
EMPRESA IBAGUERENA DE  
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.  
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.  
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



K2+888.58	3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MP A, INCLUYE TRANSPOR TE, FIGURADO Y COLOCA CIÓN)	SE REALIZA FIGURADO E INSTALACION DE ACEROS PARA EL ANCLAJE PIH 046.	TRABAJADORE S SERGIO MIRANDA OSCAR SÁNCHEZ RAFAEL SÁNCHEZ MARLON RAMÍREZ MIGUEL TIJO CADENERO BRAYAN CAICEDO CADENERO PAULA ALMONACID SST	HERRAMIEN TA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOM BA RETRO EXCAVADO RA 320	
K2+874.66	2.1.4.1 EXCAVACI ÓN A MAQUINA A CUALQUIE R PROFUNDI DAD	SE REALIZA EXCAVACION A MAQUINA PARA EL ANCLAJE PIH 045.	TRABAJADORE S SIMON MOLANO JAIDER HUMBERTO PEÑUELA YESID MOLANO TOVAR SIMON MOLANO ORTIZ YIMY SALAZAR	HERRAMIEN TA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOM BA RETRO EXCAVADO RA 320	



# IBAL

SA ESP. OFICIAL  
EMPRESA IBAGUEREÑA DE  
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.  
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.  
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



			RODRÍGUEZ JHON MARTINEZ OMAR CULMA HELVER LEÓN MICHEL GRANADOS CADENERO JULIO CARDENAS CADENERO		
K9+130 - K9+800	3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MP A, INCLUYE TRANSPOR TE, FIGURADO Y COLOCA CIÓN)	SE REALIZA REVISION DE FORMALETA DE TODO EL TRAMO DEL CARCAMO CONSTRUIDO, SE REALIZA FIGURADO E INSTALACION DE ACEROS EN EL TRAMO DE CARCAMO SIGUIENTE QUE CUENTA CON SOLADO DE LIMPIEZA.	TRABAJADORE S LUIS CASTAÑO NICOLÁS PORTILLA RUBÉN DARÍO HERRERA ELIAN IBÁÑEZ ADRIÁN GÓMEZ JOSÉ LUIS CASTAÑO	HERRAMIEN TA MENOR MEZCLADO RA DE 1 BULTO RETROEXCA VADORA DE LLANTAS	K9+130 - K9+800

**ACTIVIDADES DE OBRA 04 DE MAYO DEL 2023**



**IBAL**  
SA ESP OFICIAL  
EMPRESA IBACUEREÑA DE  
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.  
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.  
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



UBICACIÓN DE ACTIVIDADES	ITEM CONTRACTUAL	ACTIVIDADES Y/O DESCRIPCIÓN DIARIA	PERSONAL EN OBRA POR PARTE DE CONTRATISTA	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN OBRA	NOVEDADES
K10+880 - K11+100	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINARIA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZAN PRUEBAS DE PRESION EN LAS TUBERIA DE ACUEDUCTOS VEREDALES, SE REALIZA INSTALACION DE FILTROS EN EL TUNEL 1, SE REALIZA BUSQUEDA Y REPARACION DE FUGAS EN LA TUBERIA DAÑOS QUE GENERAN PERDIDA DE PRESION EN LAS PRUEBAS QUE SE ESTAN REALIZANDO	AYUDANTES GUSTAVO MELLADO OSCAR JULIAN GÓMEZ JULIO CÉSAR RUBIO JHON JAIRO PORTILLO EDWAR MACHADO INGE RESIDENTE JOSÉ DANIEL RONDON OPERADORES JHON ALEXANDER CANDIA FAUSTINO SARMIENTO TOPOGRAFÍA SOFIA LEON VILLANUEVA JOSÉ YAMID ORTIZ OFICIOS VARIOS WILLIAN LIZARAZO URIEL MORALES MANUEL RIVO RAMÍREZ AUXILIAR SST MARIA FERNANDA VALDEZ	2 RETRO EXCAVADORAS HERRAMIENTA MENOR	SE REALIZAN TRABAJOS NOCTURNOS HASTA LAS 2:30 AM PARA FINALIZAR LAS PRUEBAS DE PRESION DE LA TUBERIA QUE SE ENCUENTRA ENTERRADA QUEDA PENDIENTE LA PRUEBA DE 1 DE LAS TUBERIAS DE 2 PULGADAS QUE PRESENTA MANGUERA EN PDA Y TUBERIA EN PVC.



**IBA&UÉ  
VIBRA**



**IBAL**

LA ESP. OFICIAL  
EMPRESA IBAGUERENA DE  
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.**  
**R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.**  
**C.C 5.829.473 DE IBAGUE.**



<p>PLANTA DE TRATAMIE NTO LA POLA</p>	<p>3.1.2.6I INSTALACI ON Y SUMINISTR O DE CONCRET O 4.000 PSI ESTRUCTUR A</p>	<p>SE REALIZA FUNDIDA DE CONCRETO DE 4000 PSI PARA LA CAJA DE VALVULA DE FLUJO ANULAR, SE REALIZA CON CONCRETO PREMEZCLADO Y BOMBA ESTACIONARIA.</p>	<p>TRABAJADORE S DAIRO PORTILLO JORGE GONZÁLEZ CRISTIAN ECHEVERRY YEISON CELEMIN JHONATAN VERGARA JESÚS ARROYO JHON DIAZ OSCAR PEÑA BERTULFO ZAMBRANO OPERADOR DIEGO GUZMÁN AUX SST LUIS TÉLLEZ</p>	<p>HERRAMIEN TA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOM BA RETRO EXCAVADO RA 320</p>	<p>LA INTERVENTORI A REALIZA LA REVISION DE LOS ACEROS PREVIO A LA FUNDIDA Y SOLICITA EL REFUERZO DE ALGUNOS PUNTOS QUE LA SEPARACION DE LOS ACEROS EXCEDE LO DISEÑADO, ESTE REFUERZO SE REALIZA CON UNAS VARILLAS DEL MISMO DIAMETRO DE DISEÑO EN EL CENTRO DE LA SEPARACION.</p>
<p>K6+940.73</p>	<p>3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000</p>	<p>SE REALIZA FIGURADO, TRASLADO E INSTALACION DE</p>	<p>TRABAJADORE S SIMON MOLANO</p>	<p>HERRAMIEN TA MENOR PLANTA ELECTRICA</p>	





IBAGÜE  
VIBRA



**IBAL**  
SA ESP. OFICIAL  
EMPRESA IBAGÜERENA DE  
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.  
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.  
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.

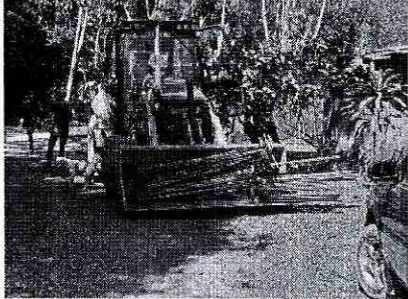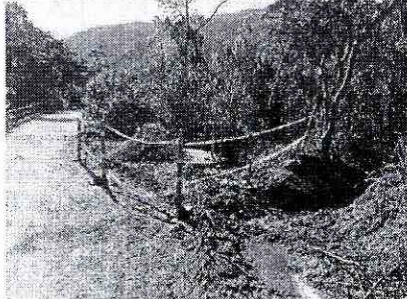

	PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MP A, INCLUYE TRANSPORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN)	ACEROS PARA EL ANCLAJE H 73	JAIDER HUMBERTO PEÑUELA YESID MOLANO TOVAR SIMON MOLANO ORTIZ YIMY SALAZAR RODRÍGUEZ JHON MARTINEZ OMAR CULMA HELVER LEÓN MICHEL GRANADOS CADENERO JULIO CARDENAS CADENERO	MOTOBOMBA RETRO EXCAVADORA 320	
					
K2+888.58	3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MP A, INCLUYE TRANSPORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN)	SE REALIZA FIGURADO E INSTALACION DE ACEROS PARA EL ANCLAJE PIH 046.	TRABAJADORES SERGIO MIRANDA OSCAR SÁNCHEZ RAFAEL SÁNCHEZ MARLON RAMÍREZ MIGUEL TIJO CADENERO BRAYAN CAICEDO CADENERO PAULA ALMONACID SST	HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA RETRO EXCAVADORA 320	



**IBAGÜE  
VIBRA**







**IBAL**

SA ESP. OFICIAL  
EMPRESA IBAGÜERENA DE  
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.  
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.  
C.C 5.829.473 DE IBAGÜE.**

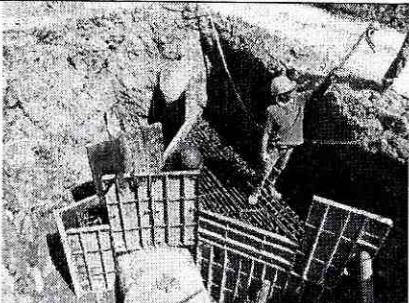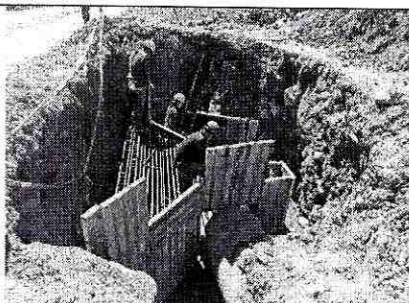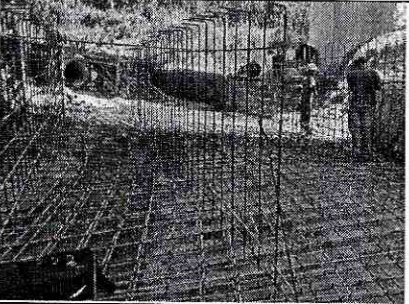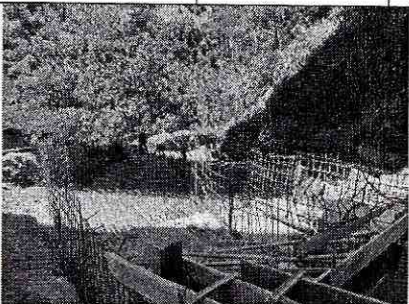

					
<p>K9+130 - K9+800</p>	<p>3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MP A, INCLUYE TRANSPOR TE, FIGURADO Y COLOCA CIÓN)</p>	<p>SE REALIZA REVISION DE FORMAleta DE TODO EL TRAMO DEL CARCAMO CONSTRUIDO, SE REALIZA FIGURADO E INSTALACION DE ACEROS EN EL TRAMO DE CARCAMO SIGUIENTE QUE CUENTA CON SOLADO DE LIMPIEZA.</p>	<p>TRABAJADORE S LUIS CASTAÑO NICOLÁS PORTILLA RUBÉN DARÍO HERRERA ELIAN IBÁÑEZ ADRIÁN GÓMEZ JOSÉ LUIS CASTAÑO</p>	<p>HERRAMIE NTA MENOR MEZCLADO RA DE 1 BULTO RETROEXCA VADORA DE LLANTAS</p>	
					
<p>K9+000 - K9+200</p>	<p>2.1.4.1 EXCAVACI ÓN A MAQUINA A CUALQUIE R PROFUNDI DAD</p>	<p>SE REALIZA EXCAVACIONES PARA TUBERIA GRP Y WSP DEL TRAMO INICIAL DE INSTALACION Y DEL TRAMO INICIAL DE VIA EN PENDIENTE RESPECTIVAMENTE.</p>	<p>TRABAJADORE S JEISON RUIZ CARLOS OROZCO FERNEY ROMERO GIOVANNI CARDOZO HILSON ARIAS OPERADORES EDUIN OVIEDO MEDARDO VARÓN</p>	<p>HERRAMIE NTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOM BA RETRO EXCAVADO RA 320</p>	







**IBAL**  
S.A. ESP. OFICIAL  
EMPRESA IBAGUEREÑA DE  
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.  
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.  
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



			TOPOGRAFÍA EDDY CARDOSO JENNIFER CARDOSO HERNANDO BARRAGÁN SST LEIDY RODRÍGUEZ		
					
ACTIVIDADES DE OBRA 05 DE MAYO DEL 2023					
UBICACIÓN DE ACTIVIDADES	ITEM CONTRACTUAL	ACTIVIDADES Y/O DESCRIPCIÓN DIARIA	PERSONAL EN OBRA POR PARTE DE CONTRATISTA	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN OBRA	NOVEDADES
K10+880 - K11+100	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINARIA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZAN LAS CONEXIONES DE LAS TUBERIAS DE ACUEDUCTOS VEREDALES QUE YA SE REALIZARON LAS PRUEBAS, SE REALIZA INSTALACION DE FILTROS EN EL TUNEL 1	AYUDANTES GUSTAVO MELLADO OSCAR JULIAN GÓMEZ JULIO CÉSAR RUBIO JHON JAIRO PORTILLO EDWAR MACHADO INGE RESIDENTE JOSÉ DANIEL RONDON OPERADORES JHON ALEXANDER CANDIA FAUSTINO SARMIENTO TOPOGRAFÍA SOFIA LEON VILLANUEVA	2 RETRO EXCAVADORAS HERRAMIENTA MENOR	SE REALIZAN TRABAJOS HASTA LAS 3 AM DEL DIA SABADO 6 DE MAYO



IBAGÜE  
VIBRA





**IBAL**

LA ESP OFICIAL  
EMPRESA IBAGUERENA DE  
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.  
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.  
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



			<p>JOSÉ YAMID ORTIZ OFICIOS VARIOS WILLIAN LIZARAZO URIEL MORALES MANUEL RIVO RAMÍREZ AUXILIAR SST MARIA FERNANDA VALDEZ</p>		
					
<p>PLANTA DE TRATAMIE NTO LA POLA</p>	<p>3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MP A, INCLUYE TRANSPOR TE, FIGURADO Y COLOCA CIÓN)</p>	<p>SE REALIZA FIGURADO E INSTALACION DE ACEROS PARA CONTINUAR EL ARMADO DE LOS MUROS DE LA CAJA DE LA VALVULA DE FLUJO ANULAR.</p>	<p>TRABAJADORE S DAIRO PORTILLO JORGE GONZÁLEZ CRISTIAN ECHEVERRY YEISON CELEMIN JHONATAN VERGARA JESÚS ARROYO JHON DIAZ OSCAR PEÑA BERTULFO ZAMBRANO OPERADOR DIEGO GUZMÁN AUX SST LUIS TÉLLEZ</p>	<p>HERRAMIEN TA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOM BA RETRO EXCAVADO RA 320</p>	

<p>K6+940.73</p>	<p>3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MP A, INCLUYE TRANSPOR TE, FIGURADO Y COLOCA CIÓN) 3.1.2.5I INSTALACI ON Y SUMINISTR O DE CONCRET O DE 20,7 Mpa (3,000 PSI)</p>	<p>SE REALIZA FIGURADO, TRASLADO E INSTALACION DE ACEROS PARA EL ANCLAJE H 73, SE REALIZA LA FUNDIDA EN CONCRETO DE 3000 PSI</p>	<p>TRABAJADORE S SIMON MOLANO JAIDER HUMBERTO PEÑUELA YESID MOLANO TOVAR SIMON MOLANO ORTIZ YIMY SALAZAR RODRÍGUEZ JHON MARTINEZ OMAR CULMA HELVER LEÓN MICHEL GRANADOS CADENERO JULIO CARDENAS CADENERO</p>	<p>HERRAMIEN TA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOM BA RETRO EXCAVADO RA 320</p>	
<p>K2+874.66</p>	<p>3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60</p>	<p>SE REALIZA FIGURADO E INSTALACION DE ACEROS PARA EL ANCLAJE PIH 045. SE REALIZA LA FUNDIDA EN</p>	<p>TRABAJADORE S SIMON MOLANO JAIDER HUMBERTO PEÑUELA</p>	<p>HERRAMIEN TA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOM BA RETRO</p>	



**IBAGÜE  
VIBRA**



**IBAL**

SA ESP. OFICIAL  
EMPRESA IBAGÜERENA DE  
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.  
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.  
C.C 5.829.473 DE IBAGÜE.**







	<p>FY=420MP A, INCLUYE TRANSPORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN) 3.1.2.5I INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO DE 20,7 Mpa (3,000 PSI)</p>	<p>CONCRETO DE 3000 PSI</p>	<p>YESID MOLANO TOVAR SIMON MOLANO ORTIZ YIMY SALAZAR RODRÍGUEZ JHON MARTINEZ OMAR CULMA HELVER LEÓN MICHEL GRANADOS CADENERO JULIO CARDENAS CADENERO</p>	<p>EXCAVADO RA 320</p>	
<p>K2+888.58</p>	<p>3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MP A, INCLUYE TRANSPORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN)</p>	<p>SE REALIZA FIGURADO E INSTALACION DE ACEROS PARA EL ANCLAJE PIH 046. SE DEJA FORMALETEADO PARA FUNDIR.</p>	<p>TRABAJADORES SERGIO MIRANDA OSCAR SÁNCHEZ RAFAEL SÁNCHEZ MARLON RAMÍREZ MIGUEL TIJO CADENERO BRAYAN CAICEDO CADENERO PAULA ALMONACID SST</p>	<p>HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA RETRO EXCAVADO RA 320</p>	



**IBAL**  
S.A. ESP. OFICIAL  
EMPRESA IBACUERENA DE  
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.  
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.  
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.

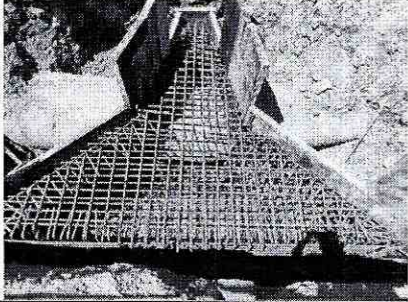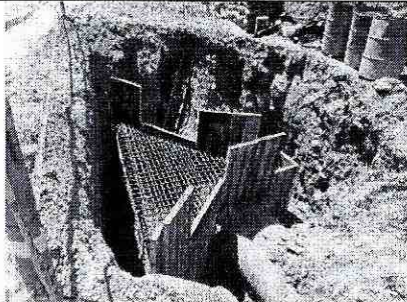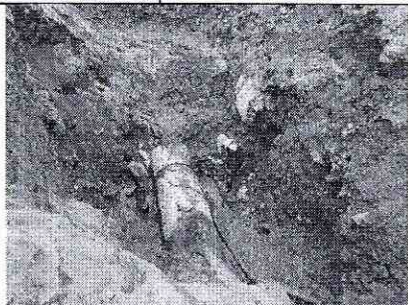

					
K9+000 - K9+200	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZA INSTALACION DE TUBERIA WSP EN EL INICIO DE LA VIA CON PENDIENTE, SE REALIZA LA EXCAVACION PARA LA SOLDADURA DE LA TUBERIA.	TRABAJADORES JEISON RUIZ CARLOS OROZCO FERNEY ROMERO GIOVANNI CARDOZO HILSON ARIAS OPERADORES EDUIN OVIEDO MEDARDO VARÓN TOPOGRAFÍA EDDY CARDOSO JENNIFER CARDOSO HERNANDO BARRAGÁN SST LEIDY RODRÍGUEZ	HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA RETRO EXCAVADORA 320	
					
K9+130 - K9+800	3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706	SE REALIZA REVISION DE FORMALETA DE TODO EL TRAMO DEL CARCAMO CONSTRUIDO, SE	TRABAJADORES LUIS CASTAÑO NICOLÁS PORTILLA RUBÉN DARÍO	HERRAMIENTA MENOR MEZCLADORA DE 1 BULTO RETROEXCA	SE DEJA TODO LISTO PARA FUNDIR EL DIA DOMINGO Y DE MAYO



**IBAGÜE VIBRA**







**IBAL**

SA ESP OFICIAL  
EMPRESA IBAGÜERENA DE  
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.  
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.  
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.**

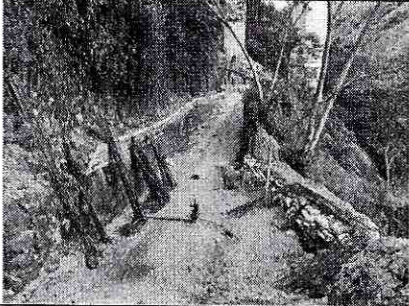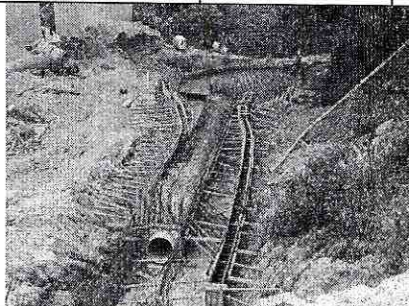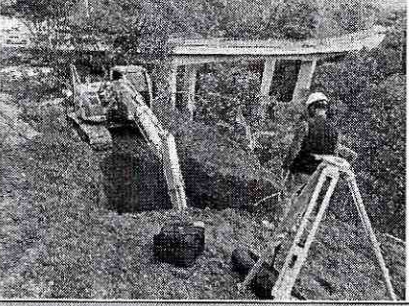

	GRADO 60 FY=420MP A, INCLUYE TRANSPOR TE, FIGURADO Y COLOCA CIÓN)	REALIZA FIGURADO E INSTALACION DE ACEROS EN EL TRAMO DE CARCAMO SIGUIENTE QUE CUENTA CON SOLADO DE LIMPIEZA.	HERRERA ELIAN IBÁÑEZ ADRIÁN GÓMEZ JOSÉ LUIS CASTAÑO	VADORA DE LLANTAS	
					
K9+580 - K9+780	2.1.4.1 EXCAVACI ÓN A MAQUINA A CUALQUIE R PROFUNDI DAD 4.17.5 Instalacion tuberia GRP de 32" a 36"	SE REALIZA EXCAVACION EN ZANJA PARA LA INSTALACION DE TUBERIA GRP 36" TAMBIEN SE REALIZA INSTALACION DE GRAVILLA PARA LA TUBERIA GRP	OPERADOR LUIS CAJAMARCA TRABAJADORE S ARSENIO ACOSTA DIEGO DUQUE ALBEIRO PUERTAS CESAR AUGUSTO CARMONA TOPOGRAFÍA RODRIGO CARDOSO GERARDO CHACÓN	RETROEXCA VADORA 320 EQUIPO DE TOPOGRAFI A	SE REALIZAN TRABAJOS DE FIGURADO Y ALISTAMIENT O DE TUBERIAS PARA LOS NIPLES QUE SE INSTALARAN.
					
<b>ACTIVIDADES DE OBRA 06 DE MAYO DEL 2023</b>					
