



PÁGINA 1 DE 3

CONTRATISTA CONSORCIO COCORA IBALTOL FECHA 04/12/13

CONTRATO No 144 de 2012 INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCONTRARE

**OBJETO DE CONTRATO:**  
CONTRATAR LAS CANTIDADES DE OBRA NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DESDE LA BOCATOMA COCORA HASTA LA PTAP LA POLA Y LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE SUR EN LA CIUDAD DE IBAGÜE

**I. OBJETO**

Acta de Entrega de Materiales a presidentes, Acueducto Comunitario Sectores Aguavivión - Acaavilla, Acaavivivión - Domo Comunal y Tuleles

**II. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA**

**III. TEMAS TRATADOS**

El día 07 de Diciembre del presente año el Consorcio Cocora Ibalto, da cumplimiento al compromiso a los presidentes de los acueductos Comunitarios de los sectores "Aguavivión - Acaavilla, Acaavivivión - Domo Comunal y Tuleles" de la entrega de Materiales:


- 12 tubos tipo presión de 3"
- 4 Uniones Reparadora de 3"
- 3. Surtidores tipo 23 de 3"

IV. DESARROLLO TEMAS

- 12. Tubos tipo presión de 2"
- 4. Unión reparadora de 2"
- 8 Semucodos Tipo 23 de 2"

Los Materiales entregados son para los empalmes de los acueductos Comunitarios de los Sectores Jaramín, la Isla - La Cruz y Darro Eduardici:

Estos materiales se hacen entrega a los presidentes Aniel Bello y Carmelo Mantelco.

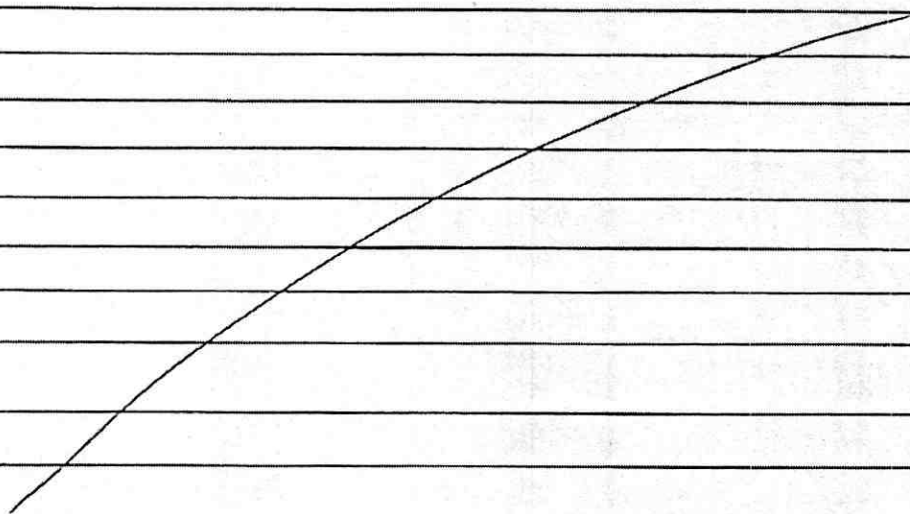

**B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA**

**RESPONSABLES**

Visita Profesional Social  
para levantar Acta de  
entrega de Materiales

*[Signature]*  
Carmelo Montalvo

*[Signature]*  
Profesional Social

**VII. PRÓXIMA REUNIÓN**

FECHA     
DIA MES AÑO

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en

( ) días del mes de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



PÁGINA 1 DE 3

CONTRATISTA CONSORCIO COCORA IBALTOL FECHA 23/11/23

CONTRATO No. 144 de 2022 INTERVENTORIA CONSORCIO INTER CONTRARE

**OBJETO DE CONTRATO:**

CONTRATAR LAS CANTIDADES DE OBRA NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DESDE LA BOCATOMA COCORA HASTA LA PTAP LA POLA Y LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE SUR EN LA CIUDAD DE ISAGÜE

**I. OBJETO**

Reunion Comunidad y Presidentes Acueducto Comunitaria para llegar acuerdos

**II. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA**

Dar cumplimiento a los acuerdos tomados el día 21-11-2023 mes de noviembre

**III. TEMAS TRATADOS**

Siendo los 08:00 hrs del día 23 de Noviembre del presente año se lleva reunión con la Comunidad del Sector de Bosques, Tanques y presidentes de Acueductos Comunitarios Avoniana, Avasila, Aayaymün, Dato Echumabán y Tanques por la finalidad de realizar unos acuerdos y llegar a Comodacuent

IV. DESARROLLO TEMAS

Compromisos.

1. Manejara y Socialización finales  
:- Actividades que están previstas en el plan de trabajo
2. Se revisará el tema de los Medidores para llegar a un acuerdo de reposición con la empresa Auatúnel
3. Empalme tuberia acueductos Veredales. el Consorcio Occidente Ibalal de Compuemel suministrar los materiales necesarios, para dicho empalme y cuya lista de materiales será suministrada por los presidentes de los acueductos Comunitarios, y se pagará la suma de quinientos mil pesos como reconocimiento de la mano de obra.
4. De acuerdo con la reunión, los asistentes manifiestan que no podrán ningún impedimento para que el Consorcio Occidente Ibalal continúe con el proceso constructivo.



CONSORCIO COCORA IBALTOI  
MIT. 901637146 - 1

CONTRATAR LAS CANTIDADES DE OBRA NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DESDE LA BOCATOMA COCORA HASTA LA FTAP LA POLA-CONTRATAR LAS CANTIDADES DE OBRA NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DESDE LA BOCATOMA COCORA HASTA LA FTAP LA POLA Y LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE SUR EN LA CIUDAD DE IRAGUÉ



Consorcio Cocora Ibalto

LUGAR: Centro Social Baquirin FECHA: Noviembre 23/2023 HORA: 8:00 AM

TEMA: Reunión Comunidad y Presidente Preside. Consorcio Cocora Ibalto

N°	NOMBRE	DIRECCIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO/CELULAR	FIRMA
1	Cecilia Flores	00779-03	79397679	3104258280	<i>[Signature]</i>
	Camilo Santos	Funel	93361161	3103899833	<i>[Signature]</i>
	Federación	Funel	19141271	3143356279	<i>[Signature]</i>
	Luis Alberto	Funel	10214107	3142154520	<i>[Signature]</i>
	Roberto	Funel	73929293	3108754516	<i>[Signature]</i>
	Roberto	Funel	5991887	3198678760	<i>[Signature]</i>
	Roberto	Funel	4225463	3195385951	<i>[Signature]</i>
	Yanick Herrera	Funel	65713974	3217105101	<i>[Signature]</i>



Consorcio Cocora Ibalto

PÁGINA

DE

CONTRATISTA

CONSORCIO COCORA IBALTOL

FECHA

10 | 12 | 23

CONTRATO No 144 de 2022

INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTER BONTRABE

**OBJETO DE CONTRATO:**

CONTRATAR LAS CANTIDADES DE OBRA NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DESDE LA BOCATOMA COCORA HASTA LA PTAP LA POLA Y LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE SUR EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ

**I. OBJETO**

Reunión Comunidad sector Higrera, funel, San Simón para dar a conocer Actividades de obra

**II. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA**

**III. TEMAS TRATADOS**

El día 10 de Diciembre del presente año se realizó reunión en el sector de la Higrera con el acompañamiento del Supervisor del Ibal el Ing. Jorge Diaz, el director de obra Consorcio Cocora Ibalto, Interventoría y profesional Social, con la finalidad de socializar actividades de obra en el sector de funel falso hacia Morro Chusco.

1. El ingeniero Jorge Diaz explica a la

IV. DESARROLLO TEMAS

PÁGINA

DE

Comunidad de los sectores Coral la tigrera, Tonels y Vereda San Simón la importancia de realizar la obra, teniendo en cuenta que la mayoría de obra ya se han realizado y queda por realizar el empate de la tubería en el sector de Tunnel falso y Monoclusco, el propósito del Ibal y el Consorcio Cocora Italtol es concluir esta obra de vital importancia y no volver a incomodar a la Comunidad con Olores.

2. El señor Carlos Caicedo presidente de la Vereda la tigrera pregunta al Ibal y Consorcio sobre la construcción de más alcantarillas ubicadas en el sector entre Tunnel falso y tigrera hacia monoclusco.

2. El ingeniero director de obra Carlos Alarcón hace claridad sobre algunos compromisos adquiridos con la Comunidad entre ellos es la construcción de cinco alcantarilla, la señalización en los túneles y la adecuación de tubería de Quevedo que suministra a la Dario Echandía. El Ing. Alarcón enfatiza que estos compromisos serán realizados al finalizar la obra, teniendo en cuenta que en el momento hay actividades más necesarias de atacar, le da la seguridad a la Comunidad que todos los compromisos serán realizados.



3. El Sr. Elodoro expone mensaje por parte de la Comunidad de la Tierreci donde de Claudi que ellos no le operen a las actividades de obra, sin embargo solicitan que estas actividades se realicen en enero del 2014 con la finalidad de no dañar las festividades y el aumento de sus productos de la región puesto que es el único entrada económica.

4. El ingeniero Jorge da como solución realizar actividades nocturnas o actividades donde no se obstruya el paso vehicular, sin embargo realizará Comité Técnico para Verificar

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA

RESPONSABLES

El Ing. Jorge Duez se compromete hacer un Comité para el día Lunes 11 de Diciembre para proyectar para granulación y socialización con la Comunidad.

IBAL y Construcción Ocuca Ibalto.

## VII. PRÓXIMA REUNIÓN

 FECHA     
DA MES AÑO

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en

( ) días del mes de

de



CONSORCIO COCORA IBALTOL  
NIT. 901637146-1



Registro fotografico de la Reunion Sector Cural la Tigresa





CONSORCIO COCORA IBALTOL  
NIT. 901637146 - 1

CONTRATAR LAS CANTIDADES DE OBRA NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DESDE LA BOCATOMA COCORA HASTA LA PTAP LA POLA CONTRATAR LAS CANTIDADES DE OBRA NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DESDE LA BOCATOMA COCORA HASTA LA PTAP LA POLA Y LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE SUR EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ



Consorcio Cocora Ibalto

LUGAR: Sector Rural la Tigretera FECHA: 10 Diciembre 2023 HORA: 10:00 AM

TEMA: Reunión Comunidad Sector . PRESIDE: Ibal y Conjorao Cocora Ibalto

N°	NOMBRE	Vereda	CÉDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO/CELULAR	FIAMA
	Camilo Montaña - Jueves		93361161	3103899833	
	Carlos Chicares - viernes		93296059	3224661639	Carpe Faicedo
	Jose L. Carrasco		14218304	3118479165	
	Arquímedes Acevedo		40762589	3132394968	
	La Lila Riario		65733079	3216931509	
	NOTORA COSIO		1121835662	3208525181	NOTORA COSIO.
	Cesar Becerra		6709452	3123004815	
	Flore Abadía		28541299	3113564197	Flore Abadía



CONSORCIO COCORA IBALTOL  
NIT. 901637146 - 1

CONTRATAR LAS CANTIDADES DE OBRA NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DESDE LA BOCATOMA COCORA HASTA LA PTAP LA POLA CONTRATAR LAS CANTIDADES DE OBRA NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DESDE LA BOCATOMA COCORA HASTA LA PTAP LA POLA Y LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE SUR EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ




Gobierno Cauca, Ibalto

LUGAR: Sector Rural la Tigraera      FECHA: 10 Diciembre 2023      HORA: 10:00 AM

TEMA: Reunión Comunidad Sector. PRESIDE: Ibal y Consorcio Coora Ibalto  
Tigraera - Teneles

N°	NOMBRE	Vereda	CÉDULA DE CIUDADANÍA	TELEFONO/CELULAR	FIRMA
	Javier	Figuera	582927	3209296041	Javier Fajal
	Alfonso	Tigraera	006150425	3102732321	Alfonso Garcia.
	Fajal Viní	la Tigraera	1114833040	3144580305	Fajal Viní
	Rafael Jairo	Tigraera	93.406341	3209387526	Rafael Jairo
	Dayana Avila	Tigraera	1010117528	3144860297	Dayana Avila.
	Ingrid Garcia	Tigraera	110.526.892	3128968409	Ingrid Garcia.
	Norma Natalia	Tigraera	110.441.810	3118417712	Norma Natalia



**IBAL**  
 S.A. S.P.A.  
 EMPRESA BACUENENSE DE  
 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO COCORA IBALTOL  
 NIT. 901637146 - 1

CONTRATAR LAS CANTIDADES DE OBRA NECESARIAS PARA LA PUESTA EN  
 FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DESDE LA  
 BOCATOMA COCORA HASTA LA PTAP LA POLA CONTRATAR LAS CANTIDADES DE OBRA  
 NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ACUEDUCTO  
 COMPLEMENTARIO DESDE LA BOCATOMA COCORA HASTA LA PTAP LA POLA Y LAS  
 LINEAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE SUR EN LA CIUDAD DE  
 IBAGUÉ



Consorcio Cocora Ibalto

LUGAR: Sector Corral la Tigreña      FECHA: Diciembre 10 - 2012 HORA: 10:00 hrs

TEMA: Reunión Comunidad sector Preside: Ibal y Consorcio Cocora Ibalto,  
 Tigreña - Teneles

N°	NOMBRE	Vereda	CÉDULA DE CIUDADANÍA	TELEFONO/CELULAR	FIRMA
	Luis Enrique B	La Tigreña	14231759	3144500355	Luis Enrique B
	Luz Day Mendoza	La Tigreña	31930595	3124834668	Luz Day Mendoza
	Bladimir Gonzalez	La Tigreña	14396.250	3024486626	B. G. A
	Jairon Salazar	La Tigreña	14295653	3239418128	Jairon
	Diana Marcela Avila	La Tigreña	1106484752	3203758070	Diana Marcela Avila
	Florencia	La Tigreña	79.608325	3044196513	Florencia
	Patricia J. de	Tigreña	1110482434	2209852692	Patricia J. de



CONSORCIO COCORA IBALTOL  
NIT. 901637146 - 1

CONTRATAR LAS CANTIDADES DE OBRA NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DESDE LA BOCATOMA COCORA HASTA LA PTAP LA POLA CONTRATAR LAS CANTIDADES DE OBRA NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DESDE LA BOCATOMA COCORA HASTA LA PTAP LA POLA Y LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE SUR EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ



Consorcio Cocora Ibalto

LUGAR: Sector Corral la Tigreva      FECHA: Diciembre 10-2023 HORA: 10:45  
 TEMA: Reunión Comunidad Sector      PRESIDE: Ibal y Consorcio Cocora Ibalto  
 Tigreva Tenets

N°	NOMBRE	Vereda	CÉDULA DE CIUDADANÍA	TELEFONO/CELULAR	FIRMA
	Santiago Cera	Urbana	1019073899	3125168900	
	Jorge Elmer Diaz	LA TIGREVA	93380630	3165377076	
	Aracely Yoceluzer	LA FIGUERO	25258		Aracely Yoceluzer
	Carlos Wilson cañido	La Tigreva	7024556745		Carlos cañido
	Rafael Dorley Holch	Calvaria	70960272	3115250943	
	John Freddy Gil	San simon	93415277	3112316348	John Freddy Gil



Consorcio Cocora Ibalto

PÁGINA 1 DE 3

CONTRATISTA **CONSORCIO COCORA IBALTOL**

FECHA 30 11 23

CONTRATO No 144 de 2022

INTERVENTORIA **COSORCIO INTER BONTRABE**

**OBJETO DE CONTRATO:**

CONTRATAR LAS CANTIDADES DE OBRA NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DESDE LA BOCATOMA COCORA HASTA LA PTAP LA POLA Y LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE SUR EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ

**I. OBJETO**

Visita técnica y social prodeco del señor William Rojas Sector Los Cristelinos

**II. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA**

**III. TEMAS TRATADOS**

El día 29 de Noviembre del presente año la Ingeniera Diana Mora realizó visita al prodeco del señor William Rojas Sector Los Cristelinos. Con la finalidad de recibir la solicitud del arreglo de tubo de alcantarillado que traza por la vía que conduce al prodeco de Don Jesús Moncaliano. La Ingeniera Diana Mora se compromete a realizar el arreglo el día 30 de Noviembre del año en curso.

## IV. DESARROLLO TEMAS

El día 30 de Noviembre se realiza nuevamente visita al predio de señor William Mora para llevar a cabo el arreglo de tubo de alamberrillado, esta visita se realiza con el acompañamiento de la Ino. Koldante Diana Mora, profesora Social y SST.

Se procede a realizarle el arreglo se dejó evidencia fotográfica.

Nota: Todas las actividades realizadas son de acuerdo importancia por el Ino. Jorge Diaz quien suministro tubo de cambio, ya que los anteriores antitratos de agua instalado el tubo con fuga, lo cual permitió que se tapara con material de lleno, el cual no dejó que las aguas negras corran libremente.

Por lo anterior la actividad se separara con cantidades de días, las cuales se verán reflejadas en el acta parafado del Comisario Carlos Baltol.



*(This section is crossed out with a diagonal line.)*

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
William Rojas Gutierrez 26729721 118048550	Diana Mora Res. Colon 28550650 3202068797
Ana Soledad Hernandez Profesora Soledad	

**VII. PRÓXIMA REUNIÓN**

FECHA 30 DE 11 DE 2023  
DIA MES AÑO

DOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.  
 En constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día,  
 a los 30 ( ) días del mes de 11 de 2023

### Registro Fotográfico De Visita Predio

El día 29 de noviembre del presente año la ingeniera residente Diana Mora realiza visita al predio del Señor William Rojas en el sector de las cristalinas para verificar en terreno daño de alcantarilla.



De acuerdo a lo dialogado y acordado el día 29 de noviembre entre el señor William Rojas y la Ingeniera Diana Mora el día 30 de noviembre se procede a realizar el arreglo de la alcantarilla, la profesional social junto a la ingeniera Diana levanta acta dejando establecido los compromisos y acuerdos con el señor William y dejando claridad que este arreglo se efectuó por directrices del Ing, Jorge Diaz supervisor del IBAL



✦ **DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.**

El CONSORCIO COCORA IBALTOL, dando cumplimiento a lo establecido en la legislación colombiana y de acuerdo a los requerimientos del decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 del 202019 cuenta con un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, el cual le permite enfocarse en los riesgos críticos identificados y establecer estrategias de control para asegurar un ambiente laboral seguro e incentivar la participación de los trabajadores en la toma de decisiones, hacia una mejora continua los procesos operacionales.

La organización establece un plan de trabajo anual teniendo en cuenta cada una de las actividades de los programas detallados.

A continuación, se presentan las actividades ejecutadas en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el periodo comprendido entre el **20 noviembre al 16 de diciembre de 2023**



**Foto. REUNION COPASST**

**✦ PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION**

La inducción es un requisito de obligatorio cumplimiento para cada nuevo colaborador, previo al inicio de sus labores en las instalaciones, terrenos y proyectos de las empresas; es también requisito para el inicio de labores de todo el personal que desarrollen labores de representación de las empresas y de los contratistas.

A continuación, se da a conocer el temario de la inducción y reinducción:

**Temas tratados en la inducción de bienvenida al personal de obra área SST.**

- Aspectos generales y legales en Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente:
- Reporte e Investigación de Accidentes de Trabajo
- Reporte de Actos y Condiciones Inseguras.
- Legislación aplicable a la Organización en Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente
- Objetivos del Sistema de Gestión SST
- Protocolo de Bioseguridad covid-19
- Responsabilidad civil del empleador
- Responsabilidad civil del trabajador
- Uso de EPI (elementos de protección individual), mantenimiento y reposición
- Política SST.
- Política No alcohol, No drogas, No tabaquismo
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- Riesgos: Físicos, Químicos, Físico – Químicos, Mecánicos, Locativos, Eléctricos, Biológicos, Biomecánicos, Psico laborales, Públicos, Naturales, Saneamiento Ambiental Básico.
- Factores de riesgo inherentes al cargo, y sus controles.
- Que hacer en caso de una emergencia.

**Tabla 1.** Identificación de riesgos

RIESGO	FACTOR DE RIESGO
Riesgos Físicos	Exposición a factores ambientales: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruido.</li> <li>• Radiaciones no ionizantes</li> <li>• Vibraciones.</li> <li>• Di confort térmico.</li> <li>• Humedad.</li> </ul>
Riesgos Físico – Químicos	Incendios y/o explosiones generadas por: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incompatibilidad físico-química en el almacenamiento de materias primas.</li> <li>• Presencia de materias y sustancias combustibles.</li> <li>• Presencia de sustancias químicas reactivas.</li> </ul>
Riesgos Químicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material Particulado.</li> <li>• Exposición a contaminantes químicos.</li> </ul>
Riesgos Biológicos	Presencia en el ambiente laboral de: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hongos.</li> <li>• Virus.</li> <li>• Bacterias.</li> <li>• Mordeduras de serpientes.</li> <li>• Covid-19</li> </ul>
Riesgos Psico laborales	Factores por condiciones personales y ambiente laboral: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Características de organización laboral.</li> <li>• Carga laboral.</li> <li>• Aspectos personales.</li> <li>• Entorno social.</li> </ul>
Riesgos Mecánicos	Exposición a factores presentes en maquinaria, equipos y herramientas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Punto de operación.</li> <li>• Partes móviles.</li> <li>• Puntos de atrapamiento.</li> <li>• Proyección de partículas.</li> <li>• Caída de objetos.</li> </ul>

<b>Riesgos Locativos</b>	Factores propios de las instalaciones locativas en el punto de trabajo, como: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Superficie del piso irregulares, deslizante o en mal estado.</li> <li>• Falta de orden y aseo.</li> <li>• Señalización y demarcación deficiente, inexistente o inadecuada.</li> <li>• Excavaciones abiertas</li> </ul>
<b>Riesgos de condiciones de seguridad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atropellamiento</li> <li>• Trabajo en alturas</li> <li>• Accidentes de tránsito</li> <li>• Excavaciones</li> </ul>
<b>Riesgos eléctricos</b>	Exposición a contacto fuentes de baja y media de tensión.
<b>Riesgos Públicos</b>	Factores presentes por agentes externos <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alteraciones del orden público.</li> <li>• Hurto.</li> <li>• Secuestro.</li> <li>• Extorción.</li> </ul>
<b>Riesgos naturales</b>	Exposición a condiciones del medio ambiente <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terremotos.</li> <li>• Derrumbes.</li> <li>• Tormenta eléctrica.</li> <li>• Inundaciones.</li> <li>• Crecientes del río.</li> </ul>
<b>Riesgos en saneamiento ambiental básico</b>	Factores presentes por: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disposición de basuras</li> <li>• Inadecuada recolección</li> <li>• Manipulación de residuos peligrosos</li> </ul>

El Programa de Inducción y Re inducción lo define el Decreto 1567 de 1998 como los “procesos de formación y capacitación dirigidos a facilitar y a fortalecer la integración del empleado a la cultura organizacional, a desarrollar en éste habilidades gerenciales y de servicio público y suministrarle información necesaria para el mejor conocimiento de la función pública y de la entidad, estimulando el aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional, en un contexto metodológico flexible, integral, práctico y participativo”.

Teniendo en cuenta lo anterior, el CONSORCIO COCORA IBALTOL cumple a modo satisfactorio, buscando desarrollar conocimientos y destrezas necesarias para que todo el personal contratado desempeñe sus funciones de manera segura y saludable, planteando objetivos en dicho programa, definiendo los temas a tratar en el proceso de inducción de los nuevos colaboradores

A continuación, se registran las inducciones que se realizaron durante el periodo:

INDUCCION Y REINDUCCION		
NUMERO DE PERSONAS NUEVAS	NUMERO DE INDUCCION PROGRAMADAS	EMPRESA
8	8	CONSORCIO COCORA IBALTOL

Se presenta la relación de trabajadores que se encuentran vinculados directamente por el Consorcio Cocora Iballol.



## PERSONAL CONSORCIO

PASO BOX			
1	NORMA PATRICIA COGUA	65762162	TOPOGRAFO
2	DIEGO MOLINA	1110572785	CADENERO 1
TUNEL FALSO			
3	BRAYAN CAICEDO	1006023766	OFICIOS VARIOS
4	DIANA MORA URREA		INGENIERA
5	ANDRES FELEPE RODRIGUEZ	1104937220	AYUDANTE DE OBRA
6	JHON AVILA	80895692	AYUDANTE DE OBRA
7	JHONATAN MAURICIO VERGARA TORRES	1.110.506.083	OFICIAL DE OBRA

NIT. 901637146-1

8	LEIDY RODRÍGUEZ JARA	1110508329	PROFESIONAL SST
<b>PUENTE 12</b>			
9	JORGE ELIECER GARCIA	1070584955	AYUDANTE DE OBRA
10	JAIME GUILLERMO	1024477168	AYUDANTE DE OBRA
11	FREDY BERRERA	1110533892	AYUDANTE DE OBRA
12	RAUMIR RODRIGUEZ	3057191	OFICIAL
13	EDDY BERTULFO CARDOZO	93127135	TOPOGRAFO
14	JONATHAN SUAREZ	1005780451	OFICIOS VARIOS
15	FABIAN TIQUE	1007647017	AYUDANTE DE OBRA
16	VICTOR CLAVIJO	114870400	AYUDANTE DE OBRA
17	JOSE ZABALA	1110518970	OFICIOS VARIOS
18	MANUEL RODRIGUEZ	1110602571	CADENERO 1
19	GINNA TRUJILLO	38360926	INGENIERO
20	LUIS TELLEZ	1005814348	AUXILIAR SST
<b>MORROCHUSCO</b>			
21	SIMON MOLANO ORTIZ	14,137,572	OFICIAL DE OBRA
22	HERLVER ANDREY LEON	1104935298	AYUDANTE DE OBRA
23	JOHAN ALEXANDER RESTREPO	1006130836	AYUDANTE DE OBRA
24	YESID MOLANO TOVAR	14,215,891	MAESTRO DE OBRA
25	RUSBELL RODRIGUEZ	1.006.157.513	AYUDANTE DE OBRA
26	SIMON MOLANO TOVAR	19313051	MAESTRO DE OBRA
27	YIMY SALAZAR RODRÍGUEZ	93020060	OFICIAL DE OBRA
28	PAULA ANDREA ALMONACID PENAGOS	1110551019	PROFESIONAL SST
29	HENRY SANCHEZ	14228299	OFICIAL
30	DAVINSON MATA LLANA	1105616867	AYUDANTE DE OBRA
31	GERARDO CHACON	5821835	OFICIOS VARIOS



NIT. 901637146-1

32	SAMUEL STIVEN ROBAYO	1005715541	AYUDANTE DE OBRA
33	ADRIAN RICARDO GOMEZ	1106632635	AYUDANTE DE OBRA
34	SERGIO ALEJANDRO MIRANDA	1000035277	AYUDANTE DE OBRA
35	JAIDER PEÑUELA	1005814314	AYUDANTE DE OBRA
36	ALEJANDRO SANCHEZ	1007420066	AYUDANTE DE OBRA
37	CRISTIAN ROMERO	1110527170	INGENIERO
38	SERGIO MIRANDA	1000035277	AYUDANTE DE OBRA
39	OSCAR MAURICIO SANCHEZ	1110512496	AYUDANTE DE OBRA
40	YERSYS DANIELA GONZALEZ	1001203465	AUXILIAR SST
41	JOHAN SEBASTIAN ROBAYO		AYUDANTE DE OBRA
42	YESID SANCHEZ CONDE	1110555187	AYUDANTE DE OBRA
43	DEIVER SALINAS CARANTON	5829164	AYUDANTE DE OBRA
44	LUIS FERNANDO FUQUE	1006127243	AYUDANTE DE OBRA
45	BLADIMIR PESCADOR	1130671559	AYUDANTE DE OBRA
46	OSCAR GONZALEZ	1049938843	AYUDANTE DE OBRA
47	RAFAEL SANCHEZ	1110535103	AYUDANTE DE OBRA
48	MICHAEL GRANADOS	1110577591	TOPOGRAFO
40	JUAN CARLOS TOVAR GUZMAN	14239847	INGENIERO RESIDENTE
50	NESTOR BONILLA		AYUDANTE DE OBRA
54	ROLANDO QUIROGA		AYUDANTE DE OBRA
<b>OFICINA</b>			
52	ANDREA CAROLINA CAMACHO	1110541812	ADMINISTRATIVA
53	CARLOS ALARCON	79347679	DIRECTOR DE OBRA
54	STEVEN RIASCOS MORENO	1111807474	ING. RESIDENTE
<b>PASO COMBEIMA</b>			
55	JOSE ORLANDO ZAMBRANO	2990969	OFICIAL
56	BRAYAN GARCIA	1005719830	AYUDANTE DE OBRA

CARRERA 7 No 9-43 OFICINA 302 SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

 Correo: [consorciococoraibal@gmail.com](mailto:consorciococoraibal@gmail.com)

57	LAURA VERGARA	110596277	INGENIERA
58	ALFREDO MARTINEZ	14223604	AYUDANTE DE OBRA
59	BERTULFO OSPINA	5820021	AYUDANTE DE OBRA

VIGILANCIA TUNEL FALSO			
60	RAMIRO BERNAL	14241362	OFICIOS VARIOS
61	JAIME ROA	13992048	OFICIOS VARIOS

Ver relación trabajadores contratistas del consorcio en Anexo 4

**Anexo 2.** Listado de personal

**Anexo 1.** Seguridad social y soportes afiliaciones

#### ✚ PROGRAMA DE CAPACITACION.

Tiene como propositito el desarrollo de habilidades y capacidades de todo el personal con el fin de formar un talento humano más competente y hábil. Además, se busca promocionar la salud, el autocuidado y prevenir la enfermedad y los riesgos. Sin embargo, más allá de esto, busca estimular el interés de todos sobre los beneficios de aplicar el sistema de gestión, incentivar la participación en las diferentes actividades sobre autocuidado, factores de riesgo y condiciones inseguras, busca mejorar el clima laboral, la productividad, la salud física y mental, y mejorar la capacidad de los empleados para identificar y reportar factores de riesgos presentes en su labor.

✦ CAPACITACION Y CHARLAS DE SEGURIDAD DEL PERIODO

CONSORCIO COCORA IBALTOL	FECHA	TEMAS
	22/11/2023	PLANIFICAR EL TRABAJO ANTES DE EJECUTARLO
	23/11/2023	PORQUE ES IMPORTANTE REPORTAR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO
	24/11/2023	PROTECCIÓN DE CAIDAS AL MISMO NIVEL
	25/11/2023	MANTENIMIENTO DE LOS EPP
	26/11/2023	SEGURIDAD EN MOVIMIENTO DE MAQUINARIA
	27/11/2023	MATERIALES PELIGROSOS
	28/11/2023	SEGURIDAD EN EL USO DE LA ESCALERA
	29/11/2023	RESPECTO A LAS SEÑALES
	30/11/2023	TODOS SOMOS SEGURIDAD
	1/12/2023	BUENAS PRACTICAS DE CONSUMO DE AGUA
	2/12/2023	ACTITUDES INSEGURAS
	3/12/2023	AGOTAMIENTO POR CALOR
	4/12/2023	VIGILAR A LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO
	5/12/2023	MANTENGAMOS LA OBRA LIMPIA
6/12/2023	RUIDO Y SUS CONSECUENCIAS	
7/12/2023	ALTERACIONES MUSCULARES	

8/12/2023	PICADURAS, ALERGIAS
9/12/2023	LA PUNTUALIDAD EN EL TRABAJO
10/12/2023	EL RESPETO
11/12/2023	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
12/12/2023	UNA BUENA ACTITUD FRENTE A LA SEGURIDAD
13/12/2023	TODOS LOS DIAS SE APRENDE ALGO NUEVO
14/12/2023	¿CUANDO FINALIZA LA JORNADA LABORAL?
15/12/2023	LO SABIA, PERO SE LE OLVIDO
16/12/2023	LA IMPORTANCIA DE DAR ORDENES EN FORMA ADECUADA
17/12/2023	IMPORTANCIA DE REALIZAR PAUSAS EN LA JORNADA LABORAL
18/12/2023	PREVENCIÓN EN EL IZAJE OBJETOS
19/12/2023	¿PORQUE SE PROHÍBE EL USO DEL CELULAR EN LA JORNADA LABORAL?
20/12/2023	USAR ROPA ADECUADA PARA SU TRABAJO
21/12/2023	LA PREVENCIÓN DE LOS ACCIDENTES ES RESPONSABILIDAD DE TODOS

**Anexo 5. Charlas SST**

CARRERA 7 No 9-43 OFICINA 302 SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

Correo: [consorciococoraibal@gmail.com](mailto:consorciococoraibal@gmail.com)



Fotos. Charlas de Seguridad

#### ✦ PROGRAMA DE INSPECCIONES

Se realizan inspecciones por observación directa antes de iniciar la labor, en caso de encontrar una situación subestándar el trabajador puede de inmediato corregir la situación o informar la condición por escrito al responsable, estas se registran en el reporte diario de actividades.

TIPO DE INSPECCIÓN	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
Inspección de orden y aseo	Supervisor SST/COPASST	Mensual
Inspección de EPP	Supervisor SST	Semanal
Inspección de Equipos de Emergencia	Supervisor SST	Mensual
Inspección diaria de equipo	Conductor / Operador	Diario
Inspección preoperacional herramientas	Trabajador	Semanal/Diario

**Anexo 08. Registro de Inspecciones.****Fotos. Inspección de Elementos respuesta ante emergencias y de herramientas y equipos**

- ✚ PERMISOS DE TRABAJO Y ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
- ✚ ANALISIS DE TRABAJO SEGURO "ATS"

El análisis de trabajo seguro es un proceso sistemático que consiste en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, previo al inicio de la ejecución de la labor y en la cual se establecen los controles que permita mitigar los riesgos, en la actividad de elaboración del ATS participan todos los trabajadores que ejecutaran la actividad.

El análisis de trabajo seguro, permite generar unas condiciones de trabajo adecuadas para la ejecución de las actividades de forma segura.

Todas las actividades a ejecutar deben contar con una identificación de peligros y valoración de riesgos dejándolo documentado, el cual debe estar publicado en el sitio de labor y divulgado a los trabajadores que ejecutan la actividad.

Para el diligenciamiento del ATS deben participar todos los involucrados en la actividad.
