
	SOLICITUD DE MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O PRÓRROGAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-037
		FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 00
		Página 1 de 3

FECHA DE LA SOLICITUD	02 de septiembre de 2021	
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
TIPO DE CONTRATO	Contrato de consultoría	
N° Y FECHA DEL CONTRATO	Contrato No. 035 del 11 de marzo de 2021.	
OBJETO:		
<p>CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y AL DETALLE DE LA REHABILITACION Y/O OPTIMIZACION DE LA BOCATOMA COCORA, EL ESTUDIO Y DISEÑO PARA EL TRATAMIENTO, SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS DE LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUE, Y LA VERIFICACION Y VALIDACION HIDRAULICA DE LA LINEA DE ADUCCION DESDE LA BOCATOMA COCORA HASTA LA PTAP LA POLA Y LINEA DE CONDUCCION DESDE TANQUE CIUDAD A TANQUE SUR CON SU LINEA DE DISTRIBUCION AL D3 DE LA CIUDAD DE IBAGUE.</p>		
CONTRATISTA	INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S.A. - IEH GRUCON SA	
SUPERVISOR	ING. ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS - PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3 LIDER GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES	
INTERVENTOR	No Aplica	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1,276,685,000.00 MCTE	
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CINCO (5) MESES	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	
14 DE ABRIL DE 2021	13 SEPTIEMBRE DEL 2021	
2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES		
PRÓRROGAS: NO APLICA		
PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CINCO (5) MESES	
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	13 SEPTIEMBRE DEL 2021	
3. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO		
El contrato a la fecha se encuentra en el siguiente avance:		
AVANCE FISICO:	Programado 93%	Ejecutado 60%
AVANCE FINANCIERO:	Programado 93%	Ejecutado \$ 0

Recibido
03-09-2021
9:00 am

	SOLICITUD DE MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O PRÓRROGAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-037
		FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 00
		Página 2 de 3

A la fecha el contratista tiene en trámite el pago del anticipo, el cual pertenece al 30% del valor total del contrato por una suma de \$ 383, 005,500.00, el cual será amortizado en las actas parciales y a la fecha no se ha tramitado ningún acta parcial, es de resaltar que estas actas parciales serán canceladas a contra entrega de los productos establecidos en las fases de ejecución del contrato de consultoría.

ANTICIPO DEL CONTRATO (NO APLICA)

Valor anticipo amortizado \$ _____ Valor anticipo por amortizar \$ 383,005,500.00

4. OBJETO DE LA SOLICITUD

Indique si la solicitud es de una modificación, adición o prórroga o seleccione las que le apliquen al contrato.

Modificación:

Adición:

Prórroga: X


Clausula que solicita modificar. (indicar que solicita modificación)	Valor de la adición solicitada (incluir si solicita adición)	Tiempo de prórroga solicitada (incluir si solicita prórroga)
CLAUSULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN	NO APLICA	63 días

5. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA SOLICITUD

Que mediante comunicado IHG-CEXS-013348-2021 con radicado IBAL N° 12726 del 01 de septiembre del 2021, el contratista solicita la ampliación del plazo contractual con base en las siguientes causas:

El fuerte invierno no ha permitido terminar los trabajos de topografía en la bocatoma Cocora, generando altos niveles del agua, los cuales han permanecido aun en los meses de julio y agosto, cuando usualmente se esperan cauces bajos.

Por otra parte, el acceso a los tramos por diseñar de la aducción que se encuentran en predios ocupados por la concesión vial Ibagué – Cajamarca, solo fue posible iniciar a partir del pasado viernes 13 de agosto del 2021, por motivos de tiempos en los trámites ante la agencia nacional de infraestructura (ANI) para el ingreso a las zonas de influencia de la construcción de la doble calzada Ibagué Cajamarca a cargo de la APP GICA, lo que ha retrasado en forma considerable la ejecución de los trabajos de campo de exploración de suelos y de topografía.

	SOLICITUD DE MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O PRÓRROGAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-037
		FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 00
		Página 3 de 3

Teniendo en cuenta lo expuesto por el contratista, esta supervisión reviso los motivos que dan origen a la solicitud y considera viable la presente prórroga, lo anterior con el fin poder contar con el tiempo necesario para poder suplir los inconvenientes sobrevinientes e impredecibles y así mismo cumplir a cabalidad con los productos objeto del presente contrato de consultoría.

Se anexa a la presente solicitud, el comunicado IHG-CEXS-013348-2021 con radicado IBAL N° 12726 del 01 de septiembre del 2021, en el cual se anexa el cronograma establecido para cumplir con la entrega de los diferentes productos en el tiempo establecido de la presente prórroga.

6. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA DE LA SOLICITUD

ACUERDO 001 DEL 14 de julio de 2020, por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Empresa IBAL SA ESP OFICIAL Artículo 59 "si durante la ejecución del contrato se presentan situaciones que ameriten su prórroga o adición, el interventor o supervisor deberá justificar la necesidad durante la vigencia del contrato (...) las adiciones en valor deben contar con la correspondiente apropiación presupuestal y no podrán adicionarse en más del cincuenta (50%) de su valor inicial. No hay límite para las prórrogas en tiempo."

7. RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA

Los supervisores del contrato en mención son responsables de la información técnica registrada en este documento y velará porque las razones por las cuales solicita la prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante el ordenador del gasto y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos de la Entidad.


ING. ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
 Líder grupo de proyectos especiales
 Supervisor

Anexos:
Comunicado IHG-CEXS-013348-2021 con cronograma (4 folios)




IBAL S.A. ESP. OFICIAL
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

No. RADICADO: 12726

FECHA: 01 SEP 2021 HORA 1009

FOLIOS: 12 MATRÍCULA

RECIBIDO POR: Maunor



IEH GRUCON
Una empresa del Grupo

Bogotá, agosto 24 de 2021
IHG-CEXS-013348-2021

Señores

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.

Atn. Erika Melissa Palma

Supervisora Contrato No. 035-2011

Carrera 4 bis No. 35 - 05 Piso 3 - Barrio Cádiz

Ibagué

REFERENCIA: Contrato No. 0035-2021 "CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y AL DETALLE DE LA REHABILITACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LA BOCATOMA CÓCORA, EL ESTUDIO Y DISEÑO PARA EL TRATAMIENTO, SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS DE LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ, Y LA VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN HIDRÁULICA DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DESDE LA BOCATOMA CÓCORA HASTA LA PTAP LA POLA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DESDE TANQUE CIUDAD A TANQUE SUR CON SU LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DEL D3 DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

ASUNTO: Solicitud de Ampliación del Plazo del Contrato

Respetada Ingeniera Palma:

Adjunto estamos enviando el cronograma ajustado del proyecto para su revisión y aprobación, en el cual estamos solicitando una ampliación del plazo hasta el 8 de noviembre de 2021, es decir 63 días calendarios adicionales al plazo contractual actual.

Los motivos que dan origen a esta solicitud son el invierno que no ha permitido terminar trabajos de topografía en la bocatoma por los altos niveles del agua, los cuales se han permanecido aún en los meses de julio y agosto, cuando usualmente se esperan caudales bajos.

Por otra parte, el acceso a los tramos por diseñar de la aducción que se encuentran en predios ocupados por la concesión vial Ibagué – Cajamarca solo fue posible a partir del pasado viernes 13 de agosto 2021, lo que retrasó en forma considerable la ejecución de los trabajos de campo de exploración de suelos y de topografía.

Las fechas propuestas para la entrega de productos se detallan a continuación:

EDT	PRODUCTO	FECHA
0	ESTUDIOS Y DISEÑOS OPTIMIZACIÓN DE LA BOCATOMA CÓCORA, TRATAMIENTO, SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNAS 12 Y 13, VALIDACIÓN ADUCCIÓN BOCATOMA CÓCORA - PTAP LA POLA Y CONDUCCIÓN DESDE TANQUE CIUDAD A TANQUE SUR CON DISTRIBUCIÓN DEL D3	
1	PRODUCTO N° 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS BOCATOMA SOBRE EL RÍO CÓCORA	
1.1	Subproducto No. 1.1 - ACTIVIDADES PRELIMINARES Y DIAGNÓSTICO	31/08/21
1.2	Subproducto No. 1.2 - TRABAJOS DE CAMPO	31/08/21
1.3	Subproducto No. 1.3 - ESTUDIOS DE CONSULTORÍA	20/10/21
2	PRODUCTO N° 2 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL TRATAMIENTO, SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS DE LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ	
2.1	Subproducto No. 2.1 - ACTIVIDADES PRELIMINARES Y DIAGNÓSTICO	1/09/21

Calle 82 No. 19A – 34, piso 5
Tel (571) 7470047 Bogotá – Colombia





IEH GRUCON
Una empresa del Grupo

EDT	PRODUCTO	FECHA
2.2	Subproducto No. 2.2 - ELABORACIÓN DE DISEÑOS DE DETALLE	22/10
2.3	Subproducto No. 2.3 - PROPIEDADES, DERECHOS Y SERVIDUMBRES, ASPECTOS AMBIENTALES	8/11
3	PRODUCTO N° 3 VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN HIDRÁULICA DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN BOCATOMA COCORA- PTAP LA POLA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE CIUDAD A TANQUE SUR CON SU LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN AL D3	30/09

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración al respecto.

Cordialmente,


CARLOS ALBERTO GIRALDO LÓPEZ
Director de Proyecto
IEH GRUCON S.A.

Anexo: Lo anunciado.
Copia: Archivo C-389.

Elaboró: J. Lozano
Revisó: F. Cardona
Aprobó: C. Giraldo



THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

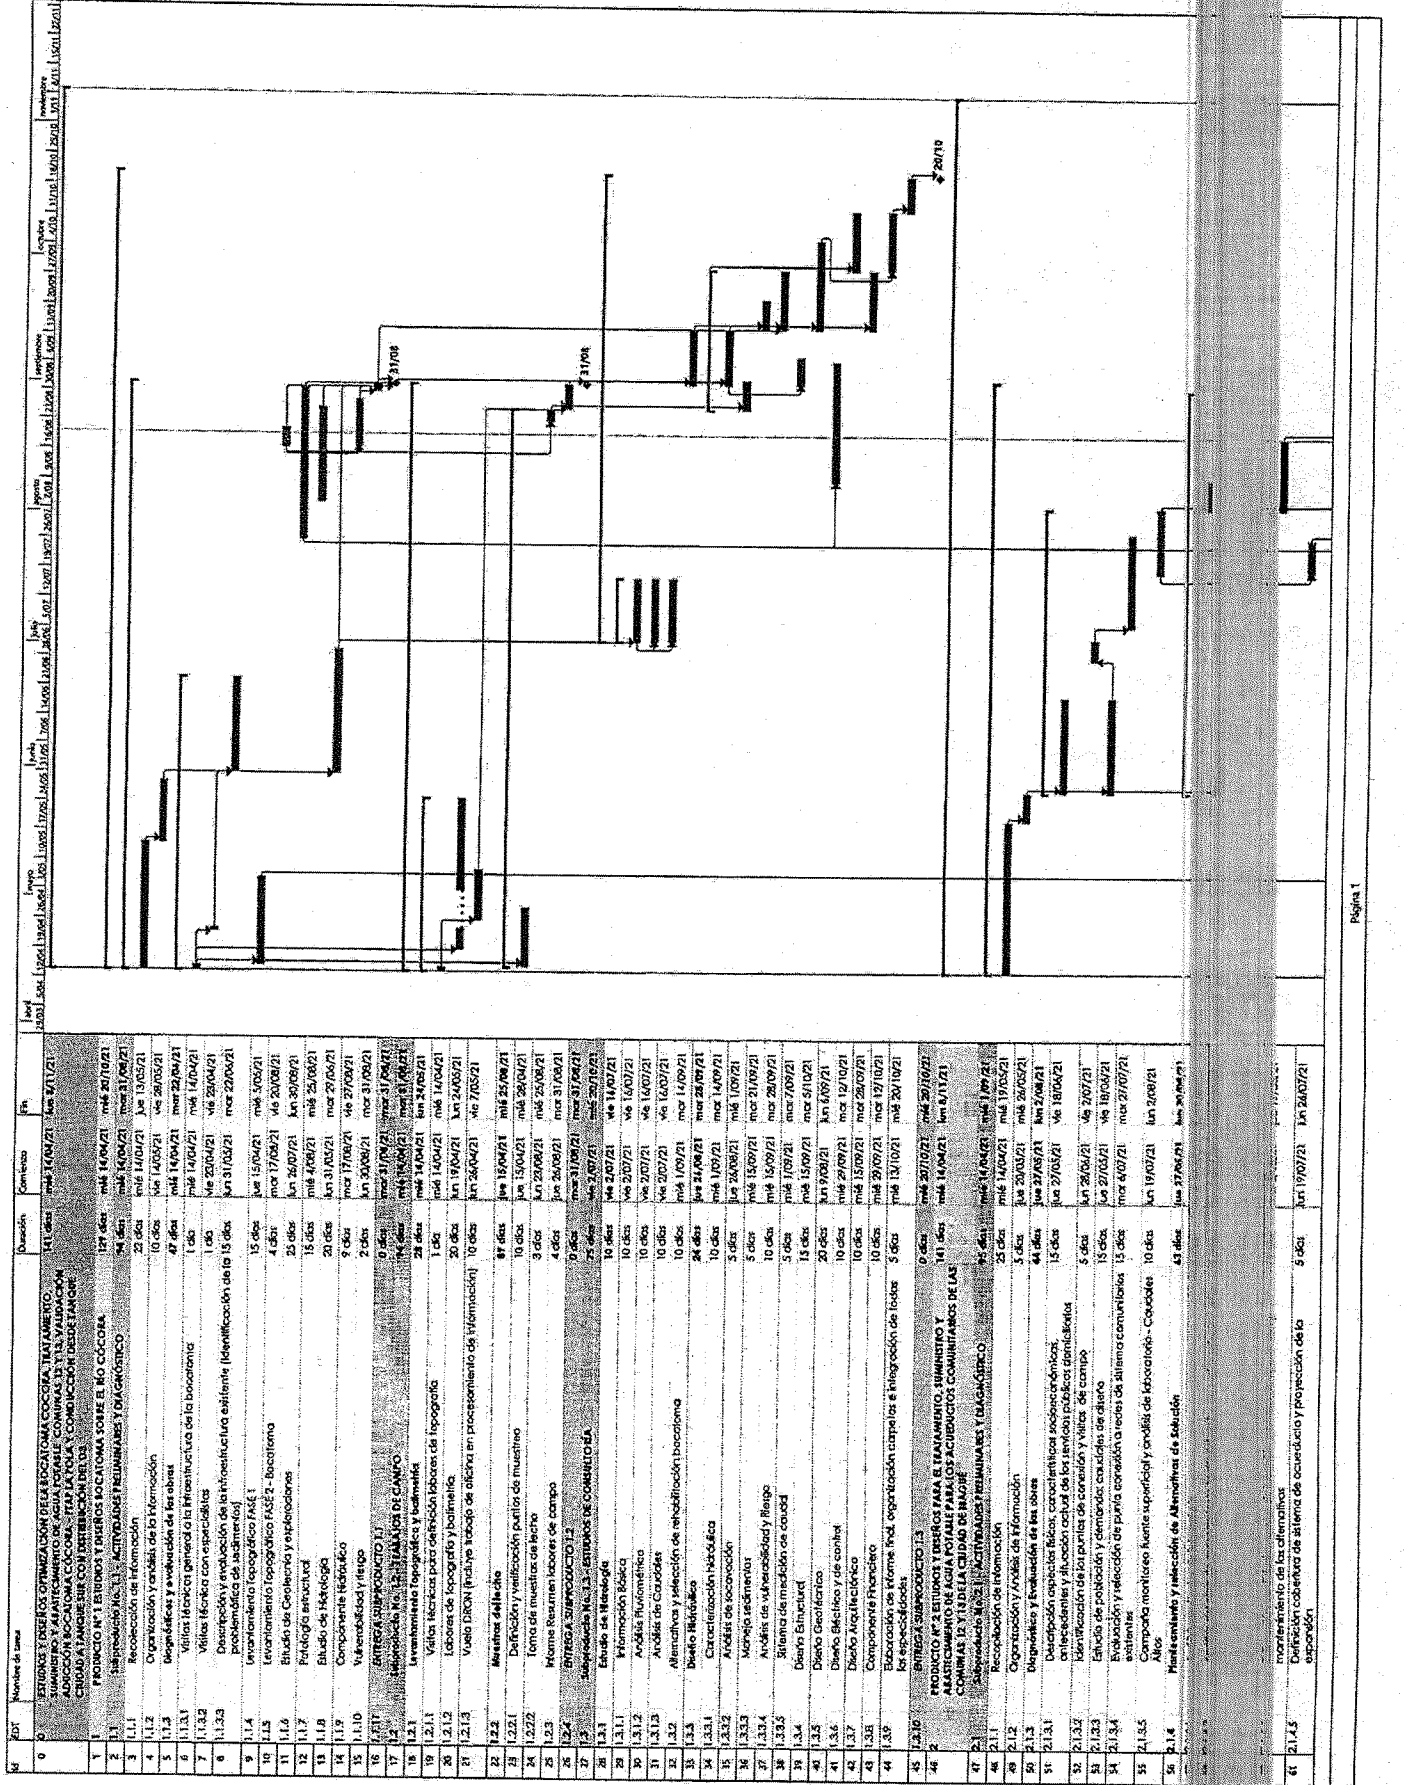





1
